


INFORME MENSUAL 04

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

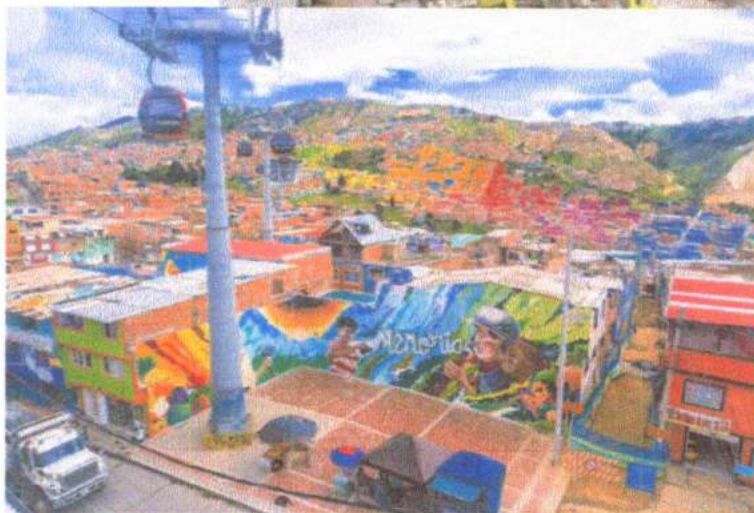

FEBRERO 28 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

- a) Contrato de Obra
- b) Contrato de Interventoría.
- c) INTRODUCCION

2. ASPECTOS TÉCNICO

- a) Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general
- b) Descripción y porcentaje % de avance técnico por vivienda.
- c) Programación de obra:
- d) Exposición de las situaciones de orden técnico que merecen atención por parte de la entidad.
- e) Soluciones adoptadas.
- f) Recomendaciones pertinentes
- g) De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.
- h) Estado del Tiempo

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a) Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.
- b) Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).
- c) Información sobre los requerimientos que, en el periodo Informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso
- d) Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.
- e) Pólizas

4. ASPECTOS SOCIALES

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

- a) Ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.
- b) Información de los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

CORTE 3 FEBRERO

- c) Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

1. ASPECTOS GENERALES

a) Contrato de Obra

CLASE: CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE		SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO		LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL		"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.			
DIRECCIÓN:		Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:		3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consortiado No. 1		CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT		900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.		10.894.408	
Consortiado No. 2		PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT		900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.		72.097.065	
PARTICIPACIÓN			
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG		60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA		40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR		JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO		4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN		3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO		5 MESES	
VALOR CONTRATO		\$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1		N/A	

VALOR ADICIÓN No. 1	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.728.543.252
FECHA PRÓRROGA No. 1	N/A
VALOR PRÓRROGA No. 1	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.728.543.252

b) Contrato de Interventoría.

CLASE: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	INPLAYCO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 860.524.168- 8	
REPRESENTANTE LEGAL:	GONZALO LIÉVANO HOYOS	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6 MESES	
VALOR CONTRATO	\$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	N/A	
VALOR ADICIÓN No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	N/A	
VALOR PRÓRROGA No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$894.285.952	

c) INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020, con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

Esta interventoría cuenta con el un equipo de trabajo compuesto por profesionales en arquitectura e ingeniería, personal técnico de obra, social , Salud y seguridad en el trabajo para así llevar el seguimiento al objeto del proyecto.

Para el periodo del mes de febrero de 2021, la interventoría como el contratista cumplen con protocolo de Bioseguridad, el cual es verificado y se informa a la SDHT sobre el cumplimiento de este en los informes semanales y mensuales, así mismo, se muestran las imágenes de los procesos de antes de ingresar a las viviendas que se encuentran en validación y ejecución.

Para cualquier inquietud y recomendación se estable el PAC (Punto de Atención al Ciudadano). Lugar donde el ciudadano beneficiario podrá realizar sus solicitudes e inconformidades y agradecimientos en donde se estableció los días de atención en el PAC para la atención a la comunidad

Dirección: CARRERA 18 K BIS N° 69 T SUR manitas - Ciudad Bolívar.

Martes: 9:00 am - 12:00 pm

Jueves: 1:30 pm - 3:30 pm

Sábados: 8:30 - 12:00 pm

Para el periodo de enero el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, continua realizando las validaciones y ejecutando las obras, señaladas en la programación entregada.

2. ASPECTOS TÉCNICO

a) Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general


Para este periodo el contratista continua con el proceso de validación y ejecución ya que en ocasiones el personal técnico y social se encuentran con algunas viviendas donde el beneficiario se encuentra laborando o no hay ninguna persona que pueda atender a los profesionales y es cuando se debe ajendar nuevas citas sin envargo el proceso de ejecución se procura realizar con mayor agilidad . El consorcio se encuentra ejecutando las actividades presentadas en su programación para el mes de febrero completando así 124 mejoramientos de vivienda entregadas al 100%.

Territorio o barrio a intervenir	Barrios - Desarrollo	Predios	Total Predios	Validación				Ejecución				
				Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	NUEVA COLOMBIA	39	284	38	0	1		0	38	1	13,97%	38
	JUAN PABLO II	27		26	0	1		0	26	1	10,00%	26
	MIRADOR NUTIVARA	36		34	1	1		26	8	2	5,38%	8
	URBANIZACIÓN COMPARTIR	2		1	1			1		1	0,00%	0
	ANTONIO JOSE DE SUCRE SECTORES 1 Y 2 (USMINIA)	10		10	0			1	9	0	3,85%	9
	NUEVO SAN LUIS (USMINIA)	1		1	0			0	1	0	0,65%	1
	EL BRILLANTE (USMINIA)	2		2	0			0	2	0	0,78%	2
	LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)	3		3	0			3		0	0,00%	0
	SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0			0		1	0,00%	0
	SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0			0		1	0,00%	0
	ALTOS DE JALISCO	29		28	0	1		6	21	2	8,20%	21
	VILLAS DEL DIAMANTE	21		16	4	1		16		5	2,09%	0
	ARBORIZADOR A ALTA	4		4	0			4		0	0,00%	0
	SANTA VIVIANA	2		2	0			2		0	0,00%	0
	VILLA ALEMANA II SECTOR	3		3	0			1	2	0	1,12%	2
Técnico Responsable	VISTA HERMOSA	1		1	0			1		0	0,00%	0
	ROCIO ALTOS DEL SUR	4		4	0			0	4	0	1,46%	4
	LA ESCALA	1		1	0			0	1	0	0,40%	1
	ACACIAS SUR	6		6	0			6		0	1,16%	0
	GIBRALTAR I Y II Y SUR	10		10	0			8	1	1	1,68%	1
	DOMINGO LAIN II SECTOR	9		8	0	1		3		6	0,14%	0
	DOMINGO LAIN I	8		8	0			0	4	4	1,52%	4
	LA ESCALA 3ER SECTOR	3		3	0			2	1	0	0,45%	1
	CIUDAD MILAGRO	4		4	0			4		0	0,57%	0
	JERUSALEN	1		1	0			1		0	0,00%	0
	EL MIRADOR	1		1	0			1		0	0,00%	0
	VILLA ISRAEL	1		1	0			0	1	0	0,32%	1
	VILLA ANITA SUR	1		1	0			1		0	0,14%	0
	EL ESPINO	1		1	0			0	1	0	0,30%	1
	EL VIRREY	1		1	0			0	1	0	0,39%	1
	LA ESPERANZA	1		1	0			1		0	0,10%	0

LAS DELICIAS SUR	3	3	0			3		0	0,00%	0
SAN LUIS	5	5	0			1	2	2	0,42%	2
LUCERO MEDIO	6	4	0	2		3		3	0,38%	0
SAN FERNANDO	2	2	0			1		1	0,15%	0
LORENZO ALCANTUZ	1	1	0			0	1	0	0,40%	1
PARAISO	1	0	0	1		0		1	0,00%	0
DOMINGO LAIN 3 ER SECTOR	1	1	0			1		0	0,04%	0
LAS MARGARITAS III SECTOR (BOSA LIBERTAD)	1	0	1			0		1	0,00%	0
TOTAL	254	238	7	9	0	97	124	33	56,06%	124

En tabla anterior el consorcio Mejoramiento presenta 9 renunciadas acumuladas entre los meses de diciembre, enero y febrero, lo que nos lleva a tener a la fecha de este informe 238 predios validados y 7 por validar., de las cuales a la fecha se encuentran 97 en ejecución, por ejecutar 33 y entregadas 124 al 100%., para un porcentaje de avance de obra del contratado del 56,06% y un 48,82% de ejecución de las viviendas entregadas al mes de febrero.


El siguiente cuadro presenta el avance correspondiente a la ejecución, valor y a la validación de los mejoramientos de vivienda, como acción inicial a las actividades de obra, donde relacionamos el estado entre las validaciones ejecutadas vs las viviendas en periodo de su ejecución referente a las localidades siguientes.

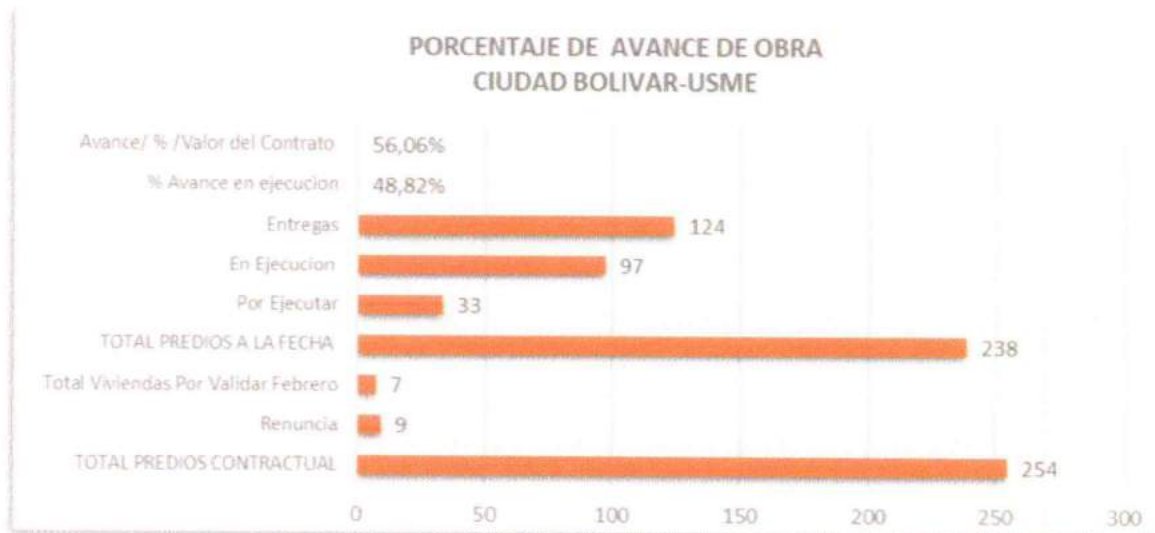

LOCALIDADES

NUEVA COLOMBIA	JUAN PABLO II
MIRADOR NUTIVARA	ALTOS DE JALISCO
VILLAS EL DIAMANTE	VISTA HERMOSA
ROCIO ALTOS DEL SUR	LA ESCALA
GIBRALTAR I Y II	DOMINGO LAIN II SECTOR

DOMINGO LAIN I	LA ESCALA 3ER SECTOR
CIUDAD MILAGRO	ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA
ARBORIZADORA ALTA	VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA
SANTA VIVIANA	ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO
SAN LUIS - SECTOR JALISCO	GIBRALTAR I Y II
LA ESCALA III SECTOR	VILLAS DEL DIAMANTE
JERUSALEN	EL MIRADOR
VILLA ISRAEL	EL ESPINO
EL VIRREY	SAN LUIS
LAS DELICIAS DEL SUR	DOMINGO LAIN III SECTOR
LUCERO MEDIO	LA ESPERANZA
SAN FERNANDO	SAN LUIS
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ	

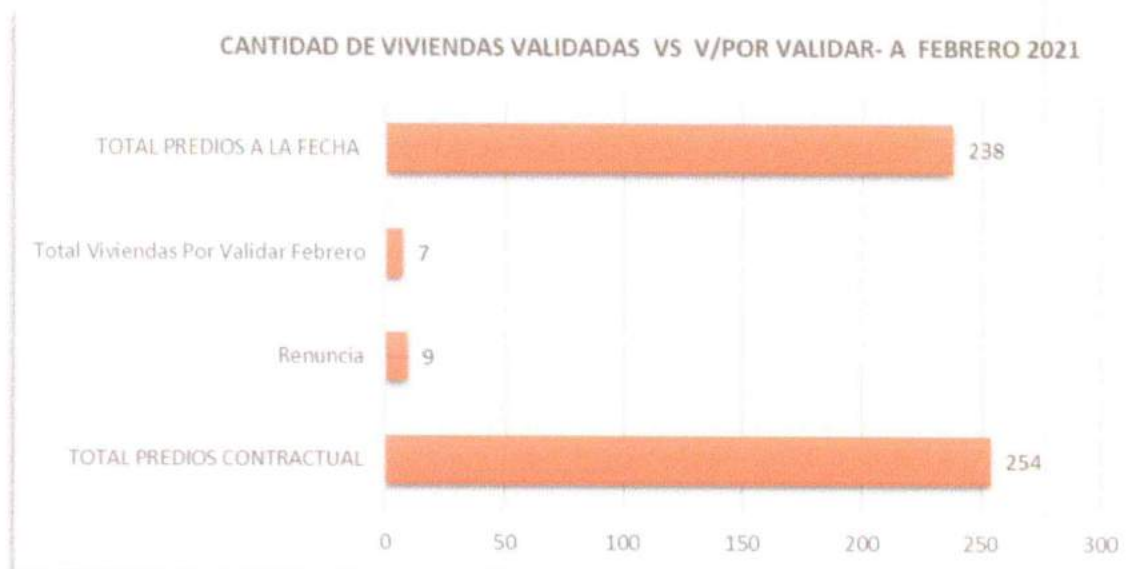

b) Descripción y porcentaje % de avance técnico por vivienda.

Para el presente informe del mes de febrero se registra la siguiente información presentando así los indicadores del estado de avance por vivienda en el mes transcurrido.

Estas viviendas se encuentran entre el 1% y 100%, de ejecución y entregadas por lo que el **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**, se encuentra con un avance significativo según programación en las actividades de las viviendas, ya que valida y ejecuta avanzando en el cumplimiento del contrato.

**DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE % DE AVANCE TÉCNICO POR
VIVIENDA**


% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA FEBRERO




% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA FEBRERO




% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA FEBRERO

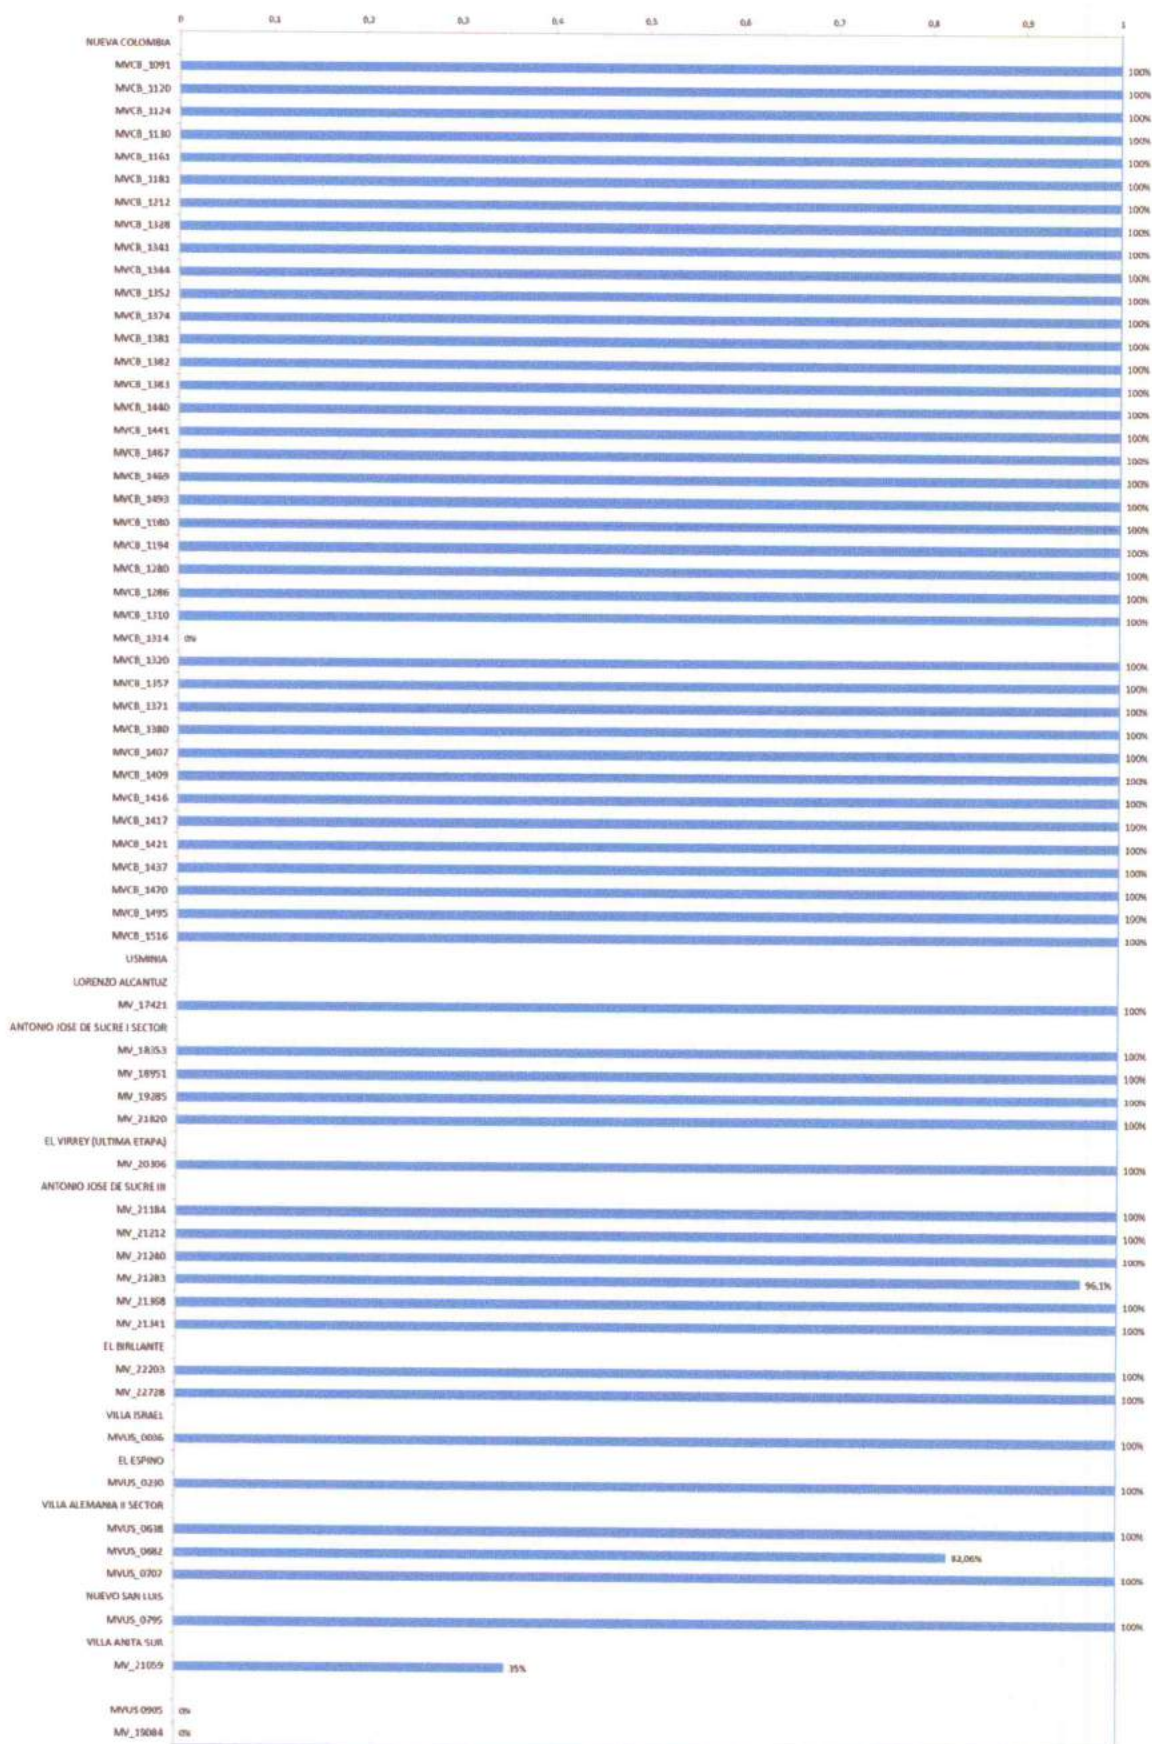

COSTO DIRECTO ACOMULADO MV - FEBRERO

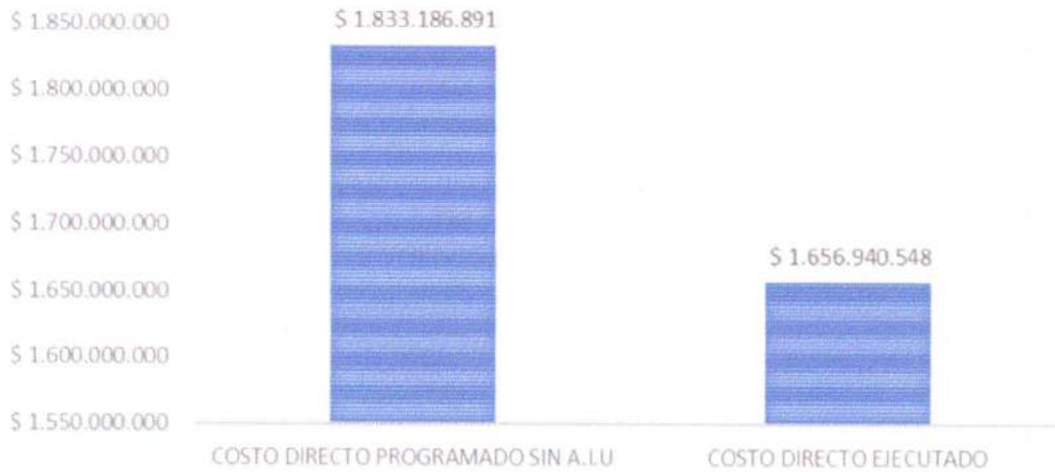

COSTO TOTAL CON A.I.U.

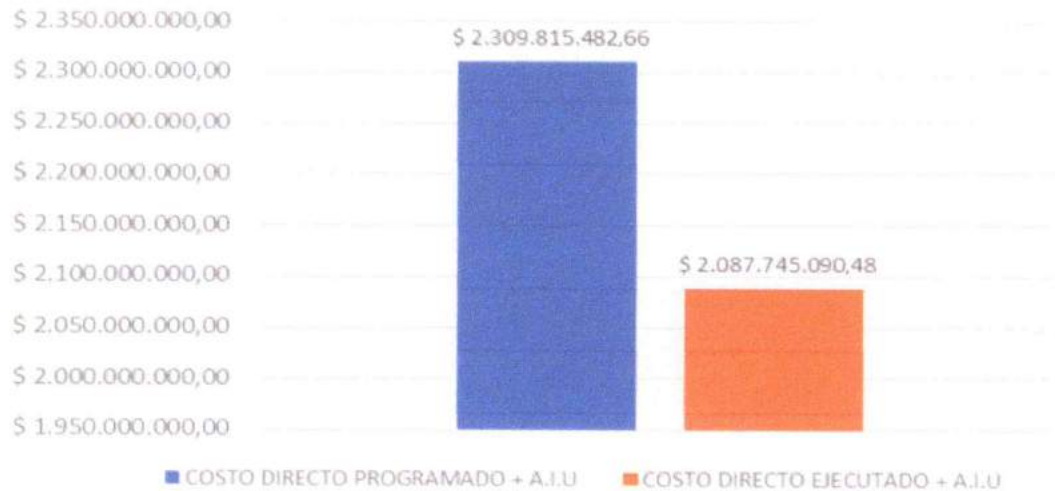

Valor acumulado de las actividades o productos conformes a la programación vigente.	62,02%
Valor acumulado de las actividades o productos aprobados por la Interventoria	56,06%

c) Programación de obra:

Según programación contractual en la presente etapa de este informe, el consorcio mejoramiento EP 2020, de acuerdo con el cronograma de obra presenta las siguientes actividades:

1. Para el mes de febrero se realizar la validación de 238 viviendas y se continua con el consonancia en validar y aperturar para ejecutar, adelantando así y evidenciando su avance de ejecución en lo programado. Para el mes de febrero de 2021, el contratista hace la entrega a la fecha de este informe de 124 mejoramientos de viviendas terminadas a la fecha por lo que se programa corte de 36 MV.
2. El Consorcio mejoramiento EP 2020 en este periodo del mes de febrero continuo con la ejecución de 97 viviendas teniendo a la fecha nueve (9) renunciadas, el cual son comunicadas al secretaria de hábitat para su reposición mientras tanto el contratista continua ejecutando los trabajos de mejoramiento.
3. El Consorcio mejoramiento EP 2020, cumple a la fecha constantemente con la ejecución y compromiso de continuar con la ejecución de obras y aperturas ya que abre mas frentes para así finalizar las validaciones.
4. Para esta fecha se realiza el corte de obra numero 3 entregando y cumpliendo con el cronograma de 36 MV al 100 % de su ejecución.

**PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RELACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE FEBRERO**

PROGRAMACION FEBRERO

NOMBRE	COMIENZO	FIN	VALIDADA	NO VALESADAS	EN EJECUCION	RENUNCIA	ENTREGADA
FIN FASE I	jue 17/12/20	jue 17/12/20					
FASE II	jue 17/12/20	mar 23/03/21					
COMIENZO FASE II	jue 17/12/20	jue 17/12/20					
BOSA LA LIBERTAD	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
SANTA INES	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVBL_2134	vie 18/12/20	jue 14/01/21	1				
SAN ANTONIO	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVBL_2838	vie 18/12/20	jue 14/01/21	1				
LAS MARGARITAS SECTOR III	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVBL_1875	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1			
CIUDAD BOLIVAR - BORDE RURAL	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
EL MIRADOR	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MV_05324	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
EL PARAISO	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MV_04993	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1	
CIUDAD BOLIVAR - BORDE SOACHA	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
ARBORIZADORA ALTA	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MV_08564	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MV_09494	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MV_15742	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MV_14629	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
SANTA VIVIANA	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MV_09083	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MV_14485	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
JERUSALEN	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MV_17151	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
JALISCO	vie 18/12/20	mié 10/02/21					
LA ESCALA	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_2672	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
LA ESCALA 3ER SECTOR	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_0519	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0502	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0530	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
LUCERO MEDIO	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_2315	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1	
MVJA_2524	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_2418	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_2617	vie 18/12/20	jue 14/01/21	1				
MVJA_2628	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_2414	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1	
SAN FERNANDO	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_2119	vie 18/12/20	jue 14/01/21	1				
MVJA_2139	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
ROCIO ALTOS DEL SUR	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_2981	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
MVJA_0186	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
MVJA_2812	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
MVJA_2909	vie 18/12/20	jue 14/01/21					1
CIUDAD MILAGRO	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_0235	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0328	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0395	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0286	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
ACACIAS SUR	vie 18/12/20	jue 14/01/21					
MVJA_0439	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_0598	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		
MVJA_3670	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1		



INPLAYCO S.A.S.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MVIA_0608	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_0675	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_1018	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
ALTOS DE JALISCO	vie 18/12/20	jue 14/01/21				
MVIA_0544	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_0567	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2371	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_2640	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_2660	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2712	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_2729	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2741	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_2830	vie 18/12/20	jue 14/01/21			1	
MVIA_2976	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3125	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3141	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3231	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3239	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3309	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3314	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3366	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2996	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_0252	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3146	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3335	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_4333	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_4350	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2992	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_2707	vie 18/12/20	jue 14/01/21	1			
MVIA_3119	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_0259	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_0890	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_3223	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
BARRIO GIBALTAR I Y II	vie 18/12/20	jue 14/01/21				
MVIA_0834	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3011	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3081	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3086	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3157	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3168	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_4375	vie 18/12/20	jue 14/01/21				1
MVIA_0944	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
MVIA_3397	vie 18/12/20	jue 14/01/21		1		
DOMINGO LAÍN I	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_0970	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
MVIA_1096	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2469	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2756	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
MVIA_0898	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
MVIA_2342	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2343	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_0899	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
DOMINGO LAÍN II SECTOR Y CONDOMINIO EL BOSQUE	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_1085	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_1119	jue 14/01/21	mar 9/02/21			1	
MVIA_1194	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_2476	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2598	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_2763	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			



INPLAYCO...

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTOS CONSTRUCTORES E INTERVENIENTOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	OTRO ESTADO	OTRO ESTADO	OTRO ESTADO
MVIA_0723	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_1129	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2479	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_1377	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_3257	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_1386	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
COLMENA	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_2062	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_2077	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_1896	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
DOMINGO LAM III SECTOR	jue 14/01/21	mié 10/02/21				
MVIA_3105	jue 14/01/21	mié 10/02/21		1		
SAN LUIS	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_1876	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVIA_3776	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
MVIA_1776	jue 14/01/21	mar 9/02/21				1
MVIA_2005	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVIA_2051	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
VISTA HERMOSA	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVSH_005	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
GIBRALTAR SUR	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_2395	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
LA ESPERANZA	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVIA_3607	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
HABITARTE 2019-MV	jue 14/01/21	mar 23/03/21				
VILLAS EL DIAMANTE	jue 14/01/21	mar 9/02/21				
MVCB_5110	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVCB_5122	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5295	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5128	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5129	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5156	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5157	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5209	jue 14/01/21	mar 9/02/21			1	
MVCB_5252	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVCB_5349	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVCB_5388	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5395	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5474	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5486	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5012	jue 14/01/21	mar 9/02/21	1			
MVCB_5118	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5314	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5464	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5482	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5491	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MVCB_5489	jue 14/01/21	mar 9/02/21		1		
MIRADOR (MUTIVARA)	mar 9/02/21	mié 10/03/21				
MVCB_1586	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1592	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1631	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1661	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1684	mar 9/02/21	mié 10/03/21				1
MVCB_1698	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1726	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1742	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1774	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1811	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1638	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1704	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1574	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1585	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1588	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1608	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1664	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		
MVCB_1681	mar 9/02/21	mié 10/03/21		1		



INPLAYCO



ALCALDÍA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MVCB_1692	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1692	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1708	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1733	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1745	mar 9/02/21	mié 10/03/21				1	
MVCB_1748	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1766	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1818	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1829	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1836	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1843	mar 9/02/21	mié 10/03/21	1				
MVCB_1866	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1867	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1873	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1886	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1907	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
MVCB_1908	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1914	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
URBANIZACIÓN COMPARTIR	mar 9/02/21	mié 10/03/21					
MVCB_0527	mar 9/02/21	mié 10/03/21	1				
MVCB_0252	mar 9/02/21	mié 10/03/21			1		
JUAN PABLO II	mar 9/02/21	mié 10/03/21					
MVCB_2926	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2932	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2993	mar 9/02/21	mié 10/03/21				1	
MVCB_3633	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3634	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3635	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_4919	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_4918	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2432	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2434	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2917	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2939	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2960	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2996	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2999	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3030	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3641	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3642	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3643	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3646	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_4923	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2967	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_4917	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2925	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_2991	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3020	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_3640	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
NUEVA COLOMBIA	mar 9/02/21	mar 23/03/21					
MVCB_1091	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1120	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1124	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1130	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1161	mar 9/02/21	mié 10/03/21					1
MVCB_1181	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1



INPLAYCO

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MVCB_1212	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1328	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1341	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1344	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1352	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1374	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1381	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1382	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1383	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1440	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1441	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1467	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1469	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1493	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1180	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1194	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1280	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1286	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1310	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1314	mié 24/02/21	mar 23/03/21				1	
MVCB_1320	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1357	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1371	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1380	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1407	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1409	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1416	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1417	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1421	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1437	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1470	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1495	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVCB_1516	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
USMINIA	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
LORENZO ALCANTUZ	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_17421	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_18353	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_18951	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_19285	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_21820	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
EL VIRREY (ULTIMA ETAPA)	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_20306	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
ANTONIO JOSE DE SUCRE III	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_21184	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_21212	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_21240	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_21283	mié 24/02/21	mar 23/03/21			1		
MV_21368	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_21341	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
EL BIRILLANTE	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_22203	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MV_22728	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
VILLA ISRAEL	mié 24/02/21	mar 23/03/21					



MVUS_0036	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
EL ESPINO	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MVUS_0230	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
VILLA ALEMANIA II SECTOR	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MVUS_0638	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
MVUS_0682	mié 24/02/21	mar 23/03/21			1		
MVUS_0707	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
NUEVO SAN LUIS	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MVUS_0795	mié 24/02/21	mar 23/03/21					1
VILLA ANITA SUR	mié 24/02/21	mar 23/03/21					
MV_21039	mié 24/02/21	mar 23/03/21			1		
			17	7	97	9	124

VALIDADAS	238
POR VALIDAR	7
TOTAL NV	254

RENUNCIAS	9
EN EJECUCION	97
ENTREGADAS	124



d) **Exposición de las situaciones de orden técnico que merecen atención por parte de la entidad.**

MV	SITUACIÓN PRESENTADA
MVJA_3670	CRISTÓBAL PITA CAMARGO: Radicado SDHT 1-2020-37091 Bajo derecho de petición tramitado a la personería Distrital respuesta de fondo sobre el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda según resolución 848 de 30, de diciembre de 2019 (...) CERRADA 6 DE ENERO
MVJA_0286	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR- Radicado SDHT 1-2020-37710 – MVJA_0286 – IIM Jalisco "(...) estoy muy inquieta porque habían quedado de venir a visitarme el día 28/12/2020 para revisar el presupuesto e iniciar la obra (...)" CERRADA 6 DE ENERO

e) **Soluciones adoptadas.**

• **MVJA 3670.**

Se remite respuesta por la SDHT informando: contrato de obra No. 694 de 2020, cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este, en un término de 5 meses, en su caso específico de tiene programada la visita de validación el día 6 enero de 2021 a las 10:00 am, en donde se le brindará la información correspondiente y se verificará las obras a realizar.

Se visita al beneficiario en su vivienda en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Se socializa al beneficiario la información suministrada durante la reunión de inicio adelantada el 06 de noviembre del 2020, a la cual no logra acceder debido a su edad, siendo estos componentes: Normativa, requisitos, modalidad de habitabilidad, proceso, número de viviendas, contratista e interventoría y recomendaciones. Adicionalmente, se indica que se hará nueva visita para informar el presupuesto, actividades y se ejecuta. **Esta PQR se soluciono el 6 de enero y queda cerrada**

• **MVJA_0286**

Se visita a la beneficiaria en su vivienda en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Se socializa a la beneficiaria la información suministrada durante la reunión de inicio: Normativa, requisitos, modalidad de habitabilidad, proceso, número de viviendas, contratista e interventoría y recomendaciones. Durante la visita se identifica por el área técnica

que la vivienda no cuenta con instalaciones hidráulicas y eléctricas. Adicionalmente, se indica que se hará nueva visita para informar el presupuesto, actividades a ejecutar y recomendaciones. **Esta PQR se soluciono el 6 de enero y queda cerrada**

f) Recomendaciones pertinentes

En cada intervención de las viviendas se genera recomendaciones en conjunto con el beneficiario, contratista e interventoría para dar continuidad a las adecuaciones de cada uno de los mejoramientos; referente a los cambios y dejando registro de las reformas y ajustes que consecutivamente puedan generar alguna reclamación o inconformidad. De igual manera, siempre se socializan con los titulares de las viviendas, cualquier afectación que se llegara a generar en el desarrollo de las actividades.

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales y en la parte estructural realizadas por los beneficiarios, por lo tanto, se decide intervenir otros espacios acuerdo que se toman en comité y charlas en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad, el contratista al encontrar mejoras verifica los espacios de la viviendas para así aprovechar el recurso asignado al beneficiario y se entrega a satisfacción.

g) De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.

Las situaciones de orden técnico expresadas en el punto anterior son informadas en los comités técnicos para tomar decisiones y seguir directrices a la fecha de este informe no se presentaron situaciones que ameritaran escalar dicha situaciones ya que fueron solucionados en terreno.

AVANCE EJECUCION MENSUAL INFORME TÉCNICO

Subsecretaría de Coordinación Operativa												
Subdirección de Barrios												
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad												
Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL 04												
Consortio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra												
Contratista de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses							
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habilitación de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo 1			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020							
CDP No.	No. 911 del 14 de julio de 2020			Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (\$3.724.135.119) M/Cta							
Gonzalo Llevano Hoyos-INPLAYCO S.A.S.												
Contratista de Interventoría	791-2020			Plazo	Seis (6) meses							
Objeto	Realizar la intervención técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habilitación en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020							
CDP No.	No. 891 del 14 de julio de 2020			Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS VI/CTE (\$894.285.952),							
Fase 1: Validación de la información entregada por el IDMT												
Territorio o barrio o manzana	Código de barrio - US de BOSA	Barrios - Insaneable	Pedidos	Total Pedidos	Validada	V/Por Validar	Remanente	En Ejecución	Terminada	En Espera	% de Avance	Acta de Entrega - Satisfacción
Año 0 - Ing. Responsable	Ciudad Izquier - US de BOSA											
	ANQ. WILLIAM GARDON - ING. HUMBERTO BLANCO - LEONARDO SOLANO	NOVEDA COLOMBIA	39		38	0	1	0	36	1	13.87%	38
	ANQ. WILLIAM GARDON - ANQ. LEONARDO SOLANO	BARRO PABLO Y	27		26	0	1	0	25	1	10.00%	26
	ANQ. WILLIAM GARDON - ANQ. LEONARDO SOLANO - ING. HUMBERTO BLANCO - INSP. CRISTIAN VELASCO	MARACON NUTIMARA	34		34	3	1	28	8	2	5.38%	8
	ANQ. WILLIAM GARDON	URBANCICLO - COMPARTE	2		1	1		1	1	1	0.00%	0
	ANQ. WILLIAM GARDON - ANQ. LEONARDO SOLANO - ING. HUMBERTO BLANCO - INSP. CRISTIAN VELASCO	ANTONIO JOSE SANCHEZ SECTORES 1 Y 2 LUMINAR	10		10	0		1	9	0	3.03%	9
	ANQ. WILLIAM GARDON	EL BRILLANTE (JORDAN)	1		1	0		0	1	0	0.00%	1
	ANQ. WILLIAM GARDON	LA COLONIA DEL SECTOR EDUCACIONAL	2		2	0		0	2	0	0.00%	2
	ANQ. WILLIAM GARDON	SANTA RITA (BOJALIA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	1	0.00%	0
	ANQ. WILLIAM GARDON	SAN ANTONIO (BOJALIA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	1	0.00%	0
Año 0 - Ing. Responsable	ING. P. CRISTIAN VELASCO - INSP. ERICK ALVAREZ	ALTOS DEL VALLE	29		28	0	1	6	21	2	8.30%	21
	ING. LEONARDO SOLANO - ING. HUMBERTO BLANCO - INSP. CRISTIAN VELASCO	VALLES DEL DIAMANTE	21		16	4	1	16	5	5	2.99%	0
	ING. HUMBERTO BLANCO - INSP. CRISTIAN VELASCO	ARBOREDAZON ALTA	4		4	0		4	0	0	0.00%	0
	ING. HUMBERTO BLANCO	SANTA IVONNA	2		2	0		2	0	0	0.00%	0
	ING. HUMBERTO BLANCO	VELLA ALMAVIVA SECTOR	3		3	0		1	2	0	1.12%	2
	ANQ. WILLIAM GARDON	VISTA HINDIA	1		1	0		1	0	0	0.00%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO	RODOLFO DEL SUR	4		4	0		0	4	0	1.46%	4
	INSP. CRISTIAN VELASCO	LA ESTALA	1		1	0		0	1	0	0.00%	1
	INSP. CRISTIAN VELASCO - INSP. ERICK ALVAREZ	ACACIAS SUR	5		8	0		6	0	0	1.16%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO - INSP. ERICK ALVAREZ	EL BALTAR Y EL SUR	10		10	0		8	1	1	1.60%	1
Año 0 - Ing. Responsable	INSP. ERICK ALVAREZ	DOMINGO LUNA SECTOR	9		8	0	1	3	6	0	0.14%	0
	INSP. ERICK ALVAREZ	DOMINGO LUNA I	8		8	0		0	4	4	1.32%	4
	INSP. CRISTIAN VELASCO - INSP. ERICK ALVAREZ	LA RECALA (SECTOR)	1		3	0		2	1	0	0.45%	1
	INSP. CRISTIAN VELASCO - INSP. ERICK ALVAREZ	CORRAL DEL SUR	4		4	0		4	0	0	0.37%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO	EL BALTAR	1		1	0		1	0	0	0.00%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO	EL AMADOR	1		1	0		1	0	0	0.00%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO	VILLA ISRAEL	1		1	0		0	1	0	0.12%	1
	INSP. CRISTIAN VELASCO	VELLA ALTA SUR	1		1	0		1	0	0	0.14%	0
	INSP. CRISTIAN VELASCO	EL ESPINO	1		1	0		0	1	0	0.00%	1
	INSP. CRISTIAN VELASCO	EL VINEY	1		1	0		0	1	0	0.10%	1
254												
Técnico Responsable:												

LA COLOMBIA II SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)											
31	MIJA 2066	DE SAA SUR 19 26	MERCEDIS WALTER JORJAS	B		\$10.737.741	26/02/2021	B	SELECCIÓN	26/02/2021	0.00%
32	MIJA 2077	DE SAA SUR 19 57	SOFIA PIERAS DE CALAMARCA	NO		\$11.807.778	26/02/2021	B	SELECCIÓN	26/02/2021	0.00%
33	MIJA 1806	DE SAA SUR 19 15	HERNANDO TOQUE E JIMAN	NO		\$11.822.934	26/02/2021	B	SELECCIÓN	26/02/2021	0.00%
SANTA NEB (BOJA LA LIBERTAD)											
34	MIJA 2131	DE SAA SUR 19 15	HERNANDEZ JORDAN JACEDO	B		\$11.791.888	EN FASE DE VALIDACIÓN	B	SELECCIÓN	EN FASE DE VALIDACIÓN	0.00%
SAN ANTONIO (BOJA LA LIBERTAD)											
35	MIJA 2031	DE SAA SUR 19 15	ALVARO BARRERA MORA	B		\$9.930.156	EN FASE DE VALIDACIÓN	B	SELECCIÓN	EN FASE DE VALIDACIÓN	0.00%
JUAN PABLO I											
36	WVCB_4919	KR 18M BIS 688-50 SUR MJ	URIEL PATINO RINCON	SI		\$11.696.006	17/11/2020	ENTREGADA	3/12/2020	100.00%	0.00%
37	WVCB_4923	KR 18M BIS 688-50 SUR	SILVIO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	NO		\$10.947.719	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.00%	0.00%
38	WVCB_2952	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	NO		\$11.700.811	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.00%	0.00%
39	WVCB_2956	TV 18N 69A 71 SUR	RODRIGO TORO DE TORRES Y OTRO	NO		\$11.800.475	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.00%	0.00%
40	WVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	JOSE ANTONIO CAERERA LOPEZ Y OTRO	NO		\$11.416.175	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100.00%	0.00%
41	WVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENEJIRA LEITON Y OTRO	NO		\$11.078.062	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100.00%	0.00%
42	WVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO	NO		\$11.553.359	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100.00%	0.00%
43	WVCB_2917	DG 69A BIS 6 SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS COMEZ	NO		\$11.229.192	18/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100.00%	0.00%
44	WVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHES AVILA	NO		\$11.811.376	2/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%
45	WVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO	NO		\$11.561.960	2/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%
46	WVCB_3650	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ P NEDA	NO		\$11.827.947	3/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%
47	WVCB_3653	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRO	NO		\$11.819.965	3/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%
48	WVCB_3654	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE MIRO Y OTRO	NO		\$10.782.650	3/12/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.00%	0.00%
49	WVCB_2959	TV 18N BIS 69A 94 SUR	MARILEY LOAISA	NO		\$11.086.579	4/12/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100.00%	0.00%
50	WVCB_4918	KR 18M BIS 688-56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA	NO		\$11.639.626	4/12/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.00%	0.00%
51	WVCB_3653	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVE SO GUERFERO	NO		\$10.296.334	3/12/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100.00%	0.00%
52	WVCB_4917	KR 18M BIS 688-62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	NO		\$10.136.993	4/12/2020	ENTREGADA	3/12/2020	100.00%	0.00%
NUEVA COLOMBIA											
53	WVCB_1310	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRERO ARIAS	SI		\$11.707.337	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100.00%	0.00%
54	WVCB_1383	CL 70K SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI		\$10.125.674	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
55	WVCB_1380	CL 70K SUR 18L 22	ROSALBA MONTE DE CARDONA	SI		\$11.330.297	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
56	WVCB_1382	CL 70K SUR 18L 30	MARIA CELIA RINCON RINCON	SI		\$11.818.990	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
57	WVCB_1381	CL 70K SUR 18L 26	NICHORA NOHEMI MAYORGA IBALUE	SI		\$8.886.491	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
58	WVCB_1374	CL 70K SUR 18L 11	OBED OSPINA RETREPO	SI		\$10.330.364	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
59	WVCB_1371	CL 70K SUR 18L 23	CONSUETO NAVARRO	SI		\$11.806.362	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
60	WVCB_1318	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CANDELLAS PAIZ	SI		\$10.521.578	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
61	WVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI		\$11.766.783	18/01/2021	ENTREGADA	18/01/2021	100.00%	0.00%
62	WVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	OSE GABRIEL HERREIA MEDINA	SI		\$11.783.941	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100.00%	0.00%
63	WVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI		\$11.776.217	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100.00%	0.00%
64	WVCB_1310	CL 70K SUR 18L 70	DORA AUCIA LOPEZ SANABRIA	SI		\$11.826.158	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100.00%	0.00%
65	WVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	SI		\$11.562.098	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100.00%	0.00%
66	WVCB_1260	CL 70K SUR 18L 85	BARBARA GALVIS CHINCHILLA	SI		\$11.798.701	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100.00%	0.00%
67	WVCB_1266	CL 70K SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	SI		\$11.176.968	19/01/2021	ENTREGADA	19/01/2021	100.00%	0.00%
VILLAS DEL DIAMANTE											
68	WVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VAÑEGAS VILLAMIL	SI		\$8.215.904	22/02/2021	B	SELECCIÓN	22/02/2021	0.00%
69	WVCB_5156	CL 69N SUR 18N 56 MJ	FRANCISCO JAVIER AMANGO GUTIERREZ	SI		\$9.918.506	22/02/2021	B	SELECCIÓN	22/02/2021	0.00%
70	WVCB_5159	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI		\$11.788.586	22/02/2021	B	SELECCIÓN	22/02/2021	0.00%
71	WVCB_5469	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	SI		\$10.903.021	22/02/2021	B	SELECCIÓN	22/02/2021	0.00%

DOMINGO LABRI									
193	MVJA_0869	CL 638 SUR 28 53	EFIGENIA GUZDA DE JANCHEZ	SI					
194	MVJA_0869	CL 638 SUR 28 53	DOMS ANYEL HERRERA OTALORA	NO					
195	MVJA_0973	CL 630 SUR 38 02	DOBIS CUJETA DE RODRIGUEZ	NO					
196	MVJA_2755	OR 18M 630 28 SUR	ESTHER ADOCA YABA	NO					
197	MVJA_2463	K1 18M 85 61C 19 SUR	CARMEN LILIA GOMEZ DE CASTAÑEDA	NO					
198	MVJA_2342	K1 18M 85 61C 15 SUR	MARIA DOLCRES CASTILLO DE SANCHEZ	NO					
199	MVJA_2343	K1 18M 85 61C 16 SUR	ERNESTO VERGARA NETO	NO					
200	MVJA_1063	CL 64 SUR 110 46	GONZALO ORANTE B PHILA	NO					
ALTOS DE JALECO									
201	MVJA_2741	F8 18M 624 14 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑOZ FRANKO	SI					
202	MVJA_2723	F8 18M 624 77 SUR	JOSE IGNACIO TAO BARBA	NO					
203	MVJA_0544	CL 62A SUR 58M 09	MIRCEDES BIANCO PARRA	NO					
204	MVJA_0567	CL 2A SUR 187A 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	NO					
205	MVJA_3303	KR 18P BIS B 51D 25 SUR	TEOFILO NORALES TUGUA Y OTRO	NO					
206	MVJA_3365	IR 24Q 61C 14 SUR	EDGARA ALORA CASTILLO	NO					
207	MVJA_4363	TV 14Q BIS C 018 87 SUR	MARIA BENDI A REDONDO CASTIBLANCO	NO					
208	MVJA_2863	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL LUIS ANDO RODRIGUEZ PRETO	NO					
209	MVJA_4333	TV 14Q BIS C 018 45 SUR	BEATRIZ CABALES ACERO	NO					
210	MVJA_0863	CL 638 SUR 38 56	HERNAN HUNBERTO PARRA	NO					
LA ESCALA 3ER SECTOR									
211	MVJA_0553	CL 62A SUR 38 07	LUIS ALIBIO LOPEZ DIAZ	NO					
212	MVJA_0519	CL 62A SUR 38 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PERA	NO					
CIBUALTAR 1º B									
213	MVJA_4375	TV 18R 61B 11 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRO	NO					
214	MVJA_3061	K1 18P BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCO PUENTES OLIVERO Y OTRO	NO					
215	MVJA_3085	KR 18P BIS A 61C 23 SUR	LUIS ALFREDO CAMPITANO Y OTRO	NO					
216	MVJA_3163	KR 18P 180 16 SUR	CUYLA BOLANDI	NO					
217	MVJA_2085	KR 18M 44A 12 SUR	DELIC MARTINEZ GABARA	NO					
218	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PARRA INACONA	NO					
ACACIAS SUR									
219	MVJA_3673	KR 182 42 31 SUR	CRISTOBAL PITA CALVARIO	NO					
220	MVJA_0439	CL 63 SUR 142 04	GAVIÑO RODRIGUEZ	NO					
LA ESPERANZA									
221	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JAMERIZ VEGA	NO					
CIUDAD MILAGRO									
222	MVJA_0283	CL 62 BIS SUR 18P 12	HASBERRY GIRA NOVA ESCOBAR	NO					
223	MVJA_0235	CL 63D SUR 18M 58	MARIELA OSORIO TILILLO	NO					
224	MVJA_0323	CL 62 BIS SUR 18A 55	VICTOR MANUEL URRUTIA ACOSTA	NO					
SAN LUIS									
225	MVJA_2061	DO 64A SUR 18V 14	FABIO Y LAOQUEZ CASALLERO	NO					
226	MVJA_1773	DO 64 BIS SUR 18V 15	UNA ESTHER BAQUERO DE DEL	NO					
SAN FERNANDO									
227	MVJA_2139	DO 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTIZON DE ALARCON	NO					
228	MVJA_2113	DO 64B SUR 19 16	MARIA CONCEPCION BAÑO	NO					
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 1º									
229	MVJA_1983	CL 65 SUR 14A 73	CRISTO BAL TUA ALP PIAON	NO					
LUCERO MEDIC									
230	MVJA_2324	KR 18P 64P 73 SUR	ARMANDO TURROSA BARRERA Y OTRO	NO					
231	MVJA_2617	K1 18L BIS 64F 07 SUR	CARILIANO CASTILLO DON INGAZ Y OTRO	NO					
232	MVJA_2623	K1 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MARECOA POVEDA	NO					
233	MVJA_2415	KR 18P 65A 15 SUR	BEATRIZ LIREDO	NO					
USMILLA - ANTONIO JOSE DE SUCRE 1 SECTOR									
234	MV_18355	CL 109 SUR 9 64	LUZ DANAIS CASTRO HUGARIN	NO					
235	MV_18651	CL 104A SUR 37 KM	LUIS ANTONIO RIVERA	NO					

FECHA	28-feb	PERIODO No.	4	DEL	19/02/2021	AL	28/02/2021
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la intervención técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de subsidiariedad en los recursos privados por la secretaría de Habitat.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 de la ejecución de 254 mejoramiento de vivienda, localizada en 3 localidades: Boja, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye el alto (4) intervenciones de Mejoramiento Integr.						
CONTRATO DE INTERVENTORIA							
CONTRATO No:	701-2020	PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO FINAL:	04-2020	5 meses	
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	FECHA DE TERMINACIÓN:	4 de noviembre de 2020	0	
FECHA DE RENOVACIÓN:	0	FECHA DE RENOVACIÓN:	0	FECHA DE RENOVACIÓN:	0	0	
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de febrero de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	0	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de febrero de 2021	0	
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0	0	
PLAZO TRANSICURRIDO:	0	PLAZO TRANSICURRIDO:	0	PLAZO TRANSICURRIDO:	0	0	
VALOR INICIAL:	\$ 85.285.950	VALOR INICIAL:	0	VALOR INICIAL:	0	0	
VALOR ADICIONALES:	0	VALOR ADICIONALES:	0	VALOR ADICIONALES:	0	0	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	VALOR ACTUALIZADO:	0	VALOR ACTUALIZADO:	0	0	
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	0	0	
VALOR POR PAGAR:	\$	VALOR POR PAGAR:	0	VALOR POR PAGAR:	0	0	
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENIOR:	0	INTERVENIOR:	0	0	
*** Inscribir las filas que regulen según el número de suspensiones y reintidos.							

2. CONTROL DE HITOS			
3. CONTROL DE HITOS			
Nº.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO
1	Validación	4/11/2020	30/4/2021
2	Entrega de informe de validación		
3	Ejecución		
4	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS /O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		

*** Ingrese las filas que regulen según el número de hitos, teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y finalización. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su V. Bo. Los hitos aprobados por la interventoría y SDHIT solo se podrán modificar previa autorización contractual que así lo requiera. La medida del seguimiento hacer parte del presente documento.

INDICADORES BARRIO O TERRITORIO			
No.	INDICADOR	VALORES CD + AL	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	Valor acumulados de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$2.308.915.482,00	62,02%
2	Valor acumulados de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	\$2.087.745.060,40	56,09%
DIFERENCIA (+) Adelanto (-) Retraso			
3. ASPECTOS GENERALES INFORME TECNICO			
Fase de validación y ejecución de obra.			
Fase de validación y apropiación.			
CIUDAD BOLIVAR - USME			
Costo directo acumulado			
Costo Directo Programado			
Costo Directo Ejecutado			
Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la			

4. COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021 - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOYAR - USME - ROSA - FECHA: 28 - FEB - 2021		
ARG. WILLIAM GARTON		
BARRIO NUEVA COLOMBIA		
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	LUZAILA TORRES BERNALDEZ
3	MVCB_1440	ALBA CARIEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	MARIA ESTER TORO GUERRERO
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE PANIUREZ
6	MVCB_1120	QUIRUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1001	LIGIA TEJADA DE BARRERO
JUAN PABLO II		
8	MVCB_0996	MARIA TERESA ANTUNEZ Y OTRO
9	MVCB_0969	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
10	MVCB_0991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
11	MVCB_0967	MARIA OLGA FARFAN GALEON
12	MVCB_0960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
13	MVCB_2434	MARGARITA MARIA MORALES CROZCO
14	MVCB_2432	AGUSTIN VILLANUEVA GUZMAN
15	MVCB_2030	TEODORA GAUCIA DE GARCIA
16	MVCB_2020	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA		
17	MV_1806	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
18	MV_1818	MERQUEIDE MONTANEZ UYOA
19	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ
20	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
21	MV_1766	CARMEN QUINQUE MARTINEZ
22	MV_1574	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
23	MV_1688	LUI NELLY RODRIGUEZ
24	MV_1628	ROSALBA HERNANDEZ FIRACHICAN
URBANIZACION COMPARTIR		
25	MV_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
VISTA HERMOSA		
26	MV SH-005	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ
BARRIO O TERRITORIO - ANTONIO JOSE DE SUICRE III SECTOR (USMINIA)		
27	MV 21541	ERIVELINDA HERNANDEZ
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)		
28	MVUS 07595	ANDA MARIA RUEDA NIETO
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)		
29	MV 22203	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA
30	MV 22728	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO

LA COMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)		
31	MVJA_2362	MERCEDES WALTEROS JOANAS
		SE REALIZA LA APERTURA DE LA VIVIENDA CON EL FIN DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
32	MVJA_2377	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA
		SE REALIZA LA APERTURA DE LA VIVIENDA CON EL FIN DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
33	MVJA_1986	HERNANDO T QUE GUZMAN
		SE REALIZA LA APERTURA DE LA VIVIENDA CON EL FIN DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
SANTA INES (ROSA LA LIBERTAD)		
34	MYBL_2134	HERMELINA LOSADA CAICEDO
		NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL MV. SE ENCUENTRA EN FASE DE VALIDACIÓN
SAN ANTONIO (ROSA LA LIBERTAD)		
35	MYBL_2336	ALVARO BARBERA ARIJA
		NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL MV. SE ENCUENTRA EN FASE DE VALIDACIÓN
ALF. LEONARDO SOLANO JUAN PABLO II		
36	MVCB_1919	URIEL PATIÑO RINCON
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
37	MVCB_1923	SIEVO MATIAS FIGUEROA CHAFARRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
38	MVCB_1932	MARIA TERESA PINEROS PINEROS
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
39	MVCB_1926	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
40	MVCB_1846	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
41	MVCB_1843	JOSE ARISTOBULO MEJURIA LEFON Y OTRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
42	MVCB_1925	MARTHA LUT CAMINO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
43	MVCB_1917	CLAUDIA PATENCIA VARGAS GÓMEZ
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
44	MVCB_1842	JULIO CESAR RICHAS A VILA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
45	MVCB_1841	CECILIA MENDEZ MORENO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
46	MVCB_1840	OCIVIO TELLEZ PINEDA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
47	MVCB_1835	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
48	MVCB_1834	AYDE NIÑO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
49	MVCB_1839	MARIEY LOAIZA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
50	MVCB_1918	ALVARO DIAZ AVILA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
51	MVCB_1803	FRANCISCO JAVIER MENDIVIELSO GUERRERO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
52	MVCB_1817	ALVARO ALCORNO MORENO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
NUEVA COLOMBIA		
53	MVCB_1320	SWENIA BARIETO ARIAS
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
54	MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
55	MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
56	MVCB_1382	MARIA CECILIA RINCON RINCON
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
57	MVCB_1381	INOHORA NOCHEBAI MA'ORGA IEAGUE
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
58	MVCB_1374	OBED OSPINA RESTREPO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
59	MVCB_1371	CONQUELO NAVARRO
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
60	MVCB_1328	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
61	MVCB_1352	MARIA RAMOS ORTIZ
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
62	MVCB_1341	JOSE GABRIEL HERREERA MEDINA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
63	MVCB_1344	ALEIRO RUIZ SANABRIA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
64	MVCB_1310	DORA AUCIA LOPEZ SANABRIA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
65	MVCB_1357	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
66	MVCB_1280	BARBARA GALVIS CHINCHILLA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
67	MVCB_1286	LUIS MINDA CASTRO PEÑA
		Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda

VILLAS DEI DIAMANTE			
68	MVCB_1528	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Alistado de piso en mortero 1.4, Demolición Enchape Muro Cocina Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en cerámicas rectificadas para baños y ropos.
69	MVCB_1529	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	No se evidencia inicio de actividades.
70	MVCB_1556	VICTOR MANUEL NUÑOZ VERGARA	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4
71	MVCB_1489	GLORIA INEZ PEÑA BELTRAN	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Alistado de piso en mortero 1.4, Demolición Enchape Muro Cocina Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en cerámicas rectificadas para baños y ropos.
72	MVCB_1482	LUIS HERNANDO MESA	Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4, Desmolite de Neón existente.
73	MVCB_1486	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Alistado de piso en mortero 1.4, Demolición Enchape Muro Cocina Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en cerámicas rectificadas para cocina.
74	MVCB_1514	ANA OTILIA GUACANEVE CUESTA	Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4
75	MVCB_1595	MARIA YOLANDA LOTANO VERGARA	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4
76	MVCB_1522	HERNAN LOPEZ GONZALEZ	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Alistado de piso en mortero 1.4, Demolición Enchape Muro Cocina Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en cerámicas rectificadas para baños y ropos.
77	MVCB_1557	ANA TERESA PEÑA ROJAS	No se evidencia inicio de actividades.
MIRADOR (NUTIVARA)			
78	MVCB_1586	MARIA DEL CARMEN RINCON	Se realiza Estructuración de Presupuesto para apertura de Ejecución de actividades
79	MVCB_1607	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se realiza Estructuración de Presupuesto para apertura de Ejecución de actividades
80	MVCB_1667	JOSE ALBER LUGO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Erchape pared en cerámica para baños, cocina Formato 60 x 30 o similar, Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
81	MVCB_1914	BLANCA ODILIA PATINO DE MARTINEZ Y CIRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
82	MVCB_1661	MARCELO ARIAS CERQUEIRA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Erchape pared en cerámica para baños, cocina Formato 60 x 30 o similar, Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
83	MVCB_1708	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Erchape pared en cerámica para baños, cocina Formato 60 x 30 o similar, Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
84	MVCB_1698	LUIZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4
85	MVCB_1585	ELIEZER RONCANCIO MARTINEZ	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería $\approx 1,5$ cm, Alistado de piso en mortero 1.4
USUMINIA			
86	MV_21_84	AMALIA MEECHAN SOJA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
87	MV_21088	ALEJANDRO PAVA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
88	MV_21040	ALFONSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
89	MV_21212	ERNESTINA CACEDO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
ING. HUMBERTO BLANCO (MIRADOR (NUTIVARA))			
90	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDALUUI MESA	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se fundió poyo de cocina, se inició instalación de cielo raso en sala comedor y cocina de la cocina principal; se avanzó en pintura con vitrol en muros de alcoba y sala comedor. Se instaló cerámica piso en alcoba y sala comedor. Continúa atraso en la ejecución. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
91	MVCB_1886	LUIZ MARIA ARIZA ARIZA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
92	MVCB_1836	DELA MARIA, MATEUS BOCAMILLA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda y se protocolaron los documentos haciendo entrega de obras al beneficiario. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obra proyectada.
93	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PAEZ PINO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
94	MVCB_1884	MIRIAM MARIQUE UJENA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
95	MVCB_1692	BEATRIZ ADELIA MARTINEZ JARAMILLO	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se instaló la cerámica de piso y guardasecabo en la alcoba principal; se aplicó vitrol sobre muros de comedor, pasillo, alcoba principal, cocina y baño. A nivel de segunda piso se enchapó el área de entrada a alcoba, se aplicó vitrol sobre muros de escalera, en el acceso y las dos alcobas. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
96	MVCB_1681	ALVARO ELIEZER VERGUGO RODRIGUEZ	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se terminó instalación de cerámica de piso y guardasecabo en las áreas de cocina y sala comedor. Continúa la instalación de enchape en pared y mesón de cocina. Se aplicó estuco sobre muros de sala comedor. En el área de lavandería de 3er. piso se terminó el enchape del piso y se inició el enchape de muros. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
97	MVCB_1838	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RANZO	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se desmontó el lavaplatos existente, se demolió la cerámica existente en piso, se levantaron moquetas y se fundieron mesones de cocina. Se avanzó en el enchape de pared y mesón de cocina. Se instaló cerámica de piso y guardasecabo en la alcoba 2. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
98	MVCB_1664	MARINA CLEENCIA RAMOS	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: En la zona de lavandería se avanzó en pañete del muro posterior y el frente de muro a media altura. En la zona de cocina se fundieron el poyo y el mesón superior. En el área de baño se desmontó el sanitario existente, se demolió la cerámica de piso existente, se avanzó en enchape de pared. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.

99	MVCB_1748	OLGA LUZ BEANCOURT LEON	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se avanzó en alistado de pisos en sala comedor y las tres alcobas, se ejecutaron mamparas para alistado de pasillo. Se registran en bitácora observaciones a la ejecución del alisado. Se finalizó cerámico en las tres alcobas, queda pendiente el embaqueado. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
100	MVCB_1704	ALEA LUCIA VALENCIA OCCAMPO	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se demontó lavaplatos existente, se demolicionó el enchape y mampara de cocina. Se avanzó en enchape de pared de cocina. Se armó tarima para fundir metano, bajo y superior de cocina. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
101	MVCB_1631	ELCISA LAVEIDE RIOS	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se trabajó en actividades preliminares de desmonte de mampara de baño, lavaplatos y mueble de cocina existentes. Se avanza en el pañeta de muros de cocina, sala comedor, baño, cocina, zona de jardín y escalera. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
102	MVCB_1592	HOLIER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: En el área de baño no hubo avance de actividades. Se pañetaron las caras de los columnatos ubicados en las alcobas 2 y 3 y se enchapó el piso de estas alcobas. Se efectuó el punto hidráulico y sanitario para la lavadora. En el área de cocina se demontó el lavaplatos, se demolicionó los enchapes antiguos de pared y piso, se inicia el enchape de muros. Se alistó el piso de la sala y se avanza en el alistado de piso del patio. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
103	MVCB_1908	JESUS MARIA COBA QUIROGA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda y se protocolizaron los documentos haciendo entrega de obras al beneficiario. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obra proyectada.
104	MVCB_1733	YINETH CUBICA ROA	El 16 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura. Se acaplan materiales. A la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de actividades en esta vivienda.
NUEVA COLOMBIA			
105	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
106	MVCB_1180	BLANCA TERESA CALVO DE GAIJON	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
107	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA ILLOA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
108	MVCB_1161	MARIA ROSA ELINA BECERRA SEGURA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
109	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
110	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
111	MVCB_1487	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
112	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
113	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
114	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MUJICA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
115	MVCB_1493	MARIA ELINA ALCIBIA GARCIA CASALLAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
116	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MUJICA RUIZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
117	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLETEROS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
118	MVCB_1416	ANA CENITH TORRES ROJAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
119	MVCB_1407	MARIA ELSA ORRES	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
120	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
VILLAS DEL DIAMANTE			
121	MVCB_1118	CARLOS ALFREDO CLAVILLO ROZO	El 22 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado obras en esta vivienda.
122	MVCB_1464	IRMA ROJAS ROJAS	El 28 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado obras en esta vivienda.
123	MVCB_1481	LEONILDE BUITRAGO MORENO	El 22 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado obras en esta vivienda.
ABSORBIDORA ALTA			
124	MV_14629	HILDA MIRIAM NIÑO	El 24 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
125	MV_08564	ELSY CARDENAS MONROY	El 24 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
126	MV_09094	GLADYS CASALLAS SUAREZ	El 24 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades, en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.

		SANTA VIVIANA		El 24 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades en la vivienda. Se hicieron presentes al personal técnico y social de interventoría y control. Los residentes técnicos de interventoría y control explicaron al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bicóloras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.	
127	MV_14485	FLIPNO SANALIBRA SANDOVAL	El 24 de febrero de 2021, se realizó el protocolo de apertura de actividades en la vivienda. Se hicieron presentes al personal técnico y social de interventoría y control. Los residentes técnicos de interventoría y control explicaron al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bicóloras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.		
128	MV_09083	RUTH GORDONS CASTAÑEDA			
		VILLA ALEM/NA II SECTOR			
129	MVUS_0638	EDWIN ARLEY QUINABAYO QUINTERO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA		
130	MVUS_0862	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAIZ	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando lo siguiente: A nivel del 2º piso se instaló la cerámica de piso y guardacoba de las alcobas 1 y 2. Se terminó el enchape de piso, paredes y meñón de cocina. Continúa el avance de enchape de muros y piso de baño. En el primer piso se demolió y se demarcaron los enchapes de muro y meñón de cocina y se avanzó en el nuevo enchape de pared y meñón; se demolió los alcos del área de lavandería y del baño; se demarcaron el lavadero. Se alista piso del patio y se la inicia instalación de cerámica de piso. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.		
131	MVUS_0707	LIZ MERY YARA MATONIA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA		
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III			
132	MV_21283	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de seguimiento al avance y calidad de las obras. La interventoría no ha recibido respuesta de los requerimientos efectuados.		
		SAN LUIS			
133	MVJA_2005	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAS..		
134	MVJA_3776	LUS STELLA FONSECA OSORIO	Se formalizaron las actividades proyectadas en esta vivienda y se protocolizaron los documentos haciendo entrega de obras al beneficiario. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obra proyectada.		
		ACACIAS SUR			
135	MVJA_0075	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO	Se llevó a cabo visita de seguimiento técnico en la cual se verificó: Se instaló cerámica de piso y guardacoba en áreas de sala, cocina, hall de acceso y habitación 1. Se terminó la actividad de estuco en muros de sala, cocina, hall de acceso. Se terminó la instalación de cielo raso pvc en la sala, hall de acceso y cocina.		
		INSP. CRISTIAN VELASCO			
		ALTOS DE JAISCO			
136	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GAZON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
137	MVJA_2992	ISAIIRA AREVALO MALAGON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
138	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
139	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
140	MVJA_3314	MARIA OLIVIA MOLANO ROMERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
141	MVJA_3239	NAIVIDAD SLEDANA CELYS VUICA DE GAICIA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
142	MVJA_0259	ALEA ROSA HURTADO CANCEDO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
143	MVJA_3223	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
144	MVJA_3231	SOFIA MORENO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
145	MVJA_3119	LIZ YANID PADUA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
146	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
147	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
148	MVJA_2996	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BIENEFICARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
149	MVJA_2712	JOSE ALBERTO ORTIZ CAJEREA Y OTRA	NO ATIENDEN		
150	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectónico para cálculo de cantidades de obra		
151	MVJA_2840	PACILA ANDREA BARBERA PELAEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA NI INICIO DE ACTIVIDADES		
152	MVJA_2371	ANA EDELMIRA ATARA EPIFANIA	VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO NO SE EVIDENCIAN MATERIALES NI PERSONAL DE OBRA NI AVANCE EN ACTIVIDADES		
153	MVJA_2976	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO SE EVIDENCIAN MATERIALES PERO NO PERSONAL DE OBRA NI AVANCE EN ACTIVIDADES		
		MIRADOR NUYARA			
154	MVCB_1774	JOSE WILSON MARILANDA GIRALDO	SE REALIZA APERTURA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
155	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	SE REALIZA APERTURA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
156	MVCB_1891	GINNA PAOLA MANECHA FORBIO	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR. DE IGUAL MANERA SE REALIZA APERTURA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS		

FOLIO ALTOS DEL SUR					
157	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
158	MVJA_2812	ANDREA JENIFFER ACOSTA MEJIVELSO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
159	MVJA_0186	ISABEL ARDILA VARGAS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
160	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
LA ESCALA					
161	MVJA_2872	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.		
ACACIAS SUR					
162	MVJA_0596	RODOLFO BEJARANO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
163	MVJA_0808	MARIA LUCINDA VARGAS AGUIRRE	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
164	MVJA_1018	MARIA LEONOR APOITE VIUDA DE LOPEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
BARRIO GUERRA Y II					
165	MVJA_0934	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
166	MVJA_3011	RIKA DEL CARMEN POINSECA CAMARGO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
167	MVJA_3157	IRIA ESTHER SILVA	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
168	MVJA_3397	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIAN TRABAJADORES NI AVANCES EN EJECUCION		
LA ESCALA 3ER SECTOR					
169	MVJA_0902	ROSALBA JAFIA DE ROJAS	VISTA DE SEGUIMIENTO SE EVIDENCIAN MATERIALES PERO AUN NO HAY TRABAJADORES NI AVANCES EN EJECUCION		
CIUDAD MILAGRO					
170	MVJA_0395	JOSE ORVEY ORTIZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDADES		
VILLAS DEL DIAMANTE					
171	MVCB-6474	OLYVIA RIVERA	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
172	MVCB-6395	MARIA CRISTINA GONZALEZ GARCIA	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
173	MVCB-6388	DUERNEY ARIAS BETANCUR	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
ARBOREDAZONA ALTA					
174	MV-15142	DONELIA PATINO MURILLO	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
ARUSALEN					
175	MV-17151	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
EL MIRADOR					
176	MV-05124	ALCEMAR DUARTE LOPEZ	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA		
VILLA ISRAEL					
177	MVUB_0036	EMERENCIATR RODRIGUEZ LOPEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		
VILLA ARIETA SUR					
178	MV_21059	ALEXANDER EERNAL AYENDIANO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCION		

179	MVJA_0230	JORGE GABRIEL BUTRAGO INFANTE	EL ESPINO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
180	MV_20306	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	EL VIRREY	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
181	MVJA_1876	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SAN LUIS	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
182	MVJA_3237	NELY PIZA BUTRAGO	LAS DELICIAS DEL SUR	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA
183	MVJA_1377	CORNELIO ANTONIO MOLINA LEON		SE REALIZA VISITA DE VALIDACION, SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR. DE IGUAL MANERA SE REALIZA APERTURA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
184	MVJA_3105	BLANCA NELY Y HERNÁNDEZ	DOMINGO LAIN III SECTOR	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL NO SE EVIDENCIAN TRABAJADORES NI AVANCES EN EJECUCIÓN
185	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	INSP. ERICK ALVAREZ	DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE
186	MVJA_1085	MARIA NERY ECHEVERRY DE RES REPO		Se hace seguimiento, la vivienda no cuenta con ningun servicio publico (agua, luz y gas) por tal motivo aun no se inician actividades, se suscribe acta en la cual el beneficiario se compromete a realizar la gestion necesaria para contar con el suministro de luz y agua para poder dar comienzo a la ejecución de la mejora.
187	MVJA_7598	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ		Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se recita levantamiento arquitectónico para a calcular de cantidades de obra.
188	MVJA_3476	JAMIE HUMBERTO BORDA LIBERATO		Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
189	MVJA_2763	CARLOS JESUS SECERRA PEREZ		Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se recita levantamiento arquitectónico para calcular de cantidades de obra.
190	MVJA_1194	MICISES RODRIGUEZ BE ANCOURT		Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se recita levantamiento arquitectónico para calcular de cantidades de obra.
191	MVJA_1129	ANA BERTILDE GAMBOA VELANCIA		Se hace seguimiento, se evidencia a personal ejecutando actividades de bafete y aliado de piso, beneficiario se encuentra conforme
192	MVJA_2479	CRISTOBAL V ALBUENA		Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se recita levantamiento arquitectónico para calcular de cantidades de obra.
193	MVJA_0888	ERGENIA GUITA DE SANCHEZ	DOMINGO LAIN I	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
194	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
195	MVJA_0970	DORIS CUETA DE RODRIGUEZ		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
196	MVJA_2756	ESTHER AROCA YARA		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
197	MVJA_2469	CARMEN LILIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
198	MVJA_2342	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
199	MVJA_2343	ERNESTO VERGARA NIETO		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.
200	MVJA_1096	GONZALO ORATE BONILLA		Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento, se entrega kit ecológico.

ALTOS DE JALISCO			
201	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑOZ FRANCO	Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
202	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
203	MVJA_0644	MELCEDES RIAÑO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
204	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
205	MVJA_3309	TEOFILO MOJALES TURGA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
206	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
207	MVJA_4350	MARIA BENDITA REDONDO CASTILANCO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
208	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
209	MVJA_4333	BEATRIZ CABALES ACERO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
210	MVJA_0890	HERNAN HUI/BERTO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
LA ESCALA 3ER SECTOR			
211	MVJA_0530	LUIS ALBIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
212	MVJA_0519	NESTOR JAVIER VALBUENA PEÑA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
GIBALTAR I Y II			
213	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
214	MVJA_3081	JOSE UNILCIO CIENTES QUINTERO Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
215	MVJA_3086	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
216	MVJA_3168	OLIVIA BOLAÑOS	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
217	MVJA_2385	DELO MARTINEZ GAMILA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
218	MVJA_0922	FRANCISCO FIAMBA AVALONA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
ACACIAS SUR			
219	MVJA_3670	CRISTOBAL RIVERA CAMARGO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en baño.
220	MVJA_0439	GAVI ROTO RODRIGUEZ	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en baño.
LA ESPERANZA			
221	MVJA_3607	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de demolición de muro en manpostería.
CIUDAD MILAGRO			
222	MVJA_0286	HASBURY GINA ROJAS ESCOBAR	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalación de mesón en concreto.
223	MVJA_0235	MARIELA OSCARIO TRUJILLO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalación de mesón en concreto.
224	MVJA_0328	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalación de mesón en concreto.
SAN LUIS			
225	MVJA_3051	PAOLO VELASQUEZ CABALLERO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectónico para cálculo de cantidades de obra.
226	MVJA_1776	UYA ETHER BAQUERO DE GIL	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega lit ecológico.
SAN FELIPE			
227	MVJA_2139	MARIA ELIOD ORTEGO DE ALARCON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en habitación.
228	MVJA_2119	MARIA CONCEPCION RIAÑO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectónico para cálculo de cantidades de obra.
230			
229	MVJA_1366	CRISTOBAL RIVERA ALBARRACIN	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
LUCERO MEDIO			
230	MVJA_2324	ARMANDO GUIROGA BARRIGA Y OTRA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de pintura y estuco.
231	MVJA_2617	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectónico para cálculo de cantidades de obra.
232	MVJA_2628	MARIA ALCIA MANRICA POVEDA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
233	MVJA_2418	BERILDA URREGO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en cocina, baño y habitación.

ANTONIO JOSE DE SUCKE I SECTOR			
234	MV_18153	LIZ DAMARI CASTRO PULGARIN	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
235	MV_18151	LIZ ANTONIO RINCON	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
236	MV_19285	JAILIO ANTONIO ESPINOSA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
237	MV_21120	JUAN EIDES ORJUELA GARZON	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
LORENTO ALCANTUZ			
238	MV_17421	OLGA BARRETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
RENUCIAS			
1	MVCE_2993	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	Por motivos de salud tiene planeado trasladarse de ciudad
2	MVCE_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	Por temas jurídicos se termina dando renuncia al programa de Mejoramiento
3	MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	Beneficiaria renuncia al subsidio por razones familiares.
4	MVCE_1745	ROSA GERTUDIS MARTINEZ UZABAZO	Propietaria renuncia al beneficio ya que la vivienda se encuentra en construcción
5	MVJA_1119	GERARDO FONSECA AJIAS	Propietario renuncia al beneficio ya que no habita en Bogotá, se traslada a Yopal
6	MVJA_2830	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA	Propietaria solicita que se contratista dejara los materiales en el predio, y que ella se encargara de la obra, por tal motivo no se asigna al beneficiario
7	MVCE_1209	MARCELYNDA MUJICA	Se finaliza proceso, ya que no se pudo tener contacto con el beneficiario
8	MVJA_2315	ANISAL INFANTE NAVARETE	Se presenta renuncia ya que el beneficiario falleció y los hijos no se pusieron de acuerdo para recibir dicho beneficio
9	MV_4093	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	Se finaliza proceso, ya que no se pudo tener contacto con el beneficiario
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS E IDENTIFICADO EN EL MATERIAL ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA			
ACCIÓN			RESPONSABLE
En conjunto con el contratista y esta interventoría se continúa con la supervisión a cada uno de los presupuestos, se hacen aperturas de viviendas para el inicio de obras, donde ya se evidencia avances, como alistado de pisos, paneles, estucos, instalación de enchufes en cocinas, baños y pisos, etc.			Arq. William Garzón
Se le solicita al contratista hacer entrega oportuna de los materiales y que el personal a cargo de la ejecución cumpla con los horarios mínimos establecidos de jornada laboral.			Insp. Cristian Velasco
En el presente periodo se completan 236 MV validados, donde 97 MV se encuentran en ejecución y se han recibido 124 MV a satisfacción de esta interventoría, presentando así un avance de ejecución de obra del 55.05%. Además se presentan otras renunciaciones y casos especiales, completando así 9 renunciaciones en total			
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES			
Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejorías en los acabados finales realizados por los beneficiarios, por lo tanto se decide intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas			
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando áreas terminadas y viabilizando áreas Primarias			
7. COMENTARIOS DEL INTERVENIDOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las distintas empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexar los actos de seguimiento realizados en la semana correspondiente al periodo del informe.			
Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR - USJE			
Se presentaron fuertes lluvias en el sector, que ocasionaron grandes escorrentías en las vías.			
En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad con o sin hallazgos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda			
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE MENSUAL			
SE: ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO			


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 21341	
ENTREGA DE OBRA	



FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV115 0795	
ENTREGA DE OBRA	

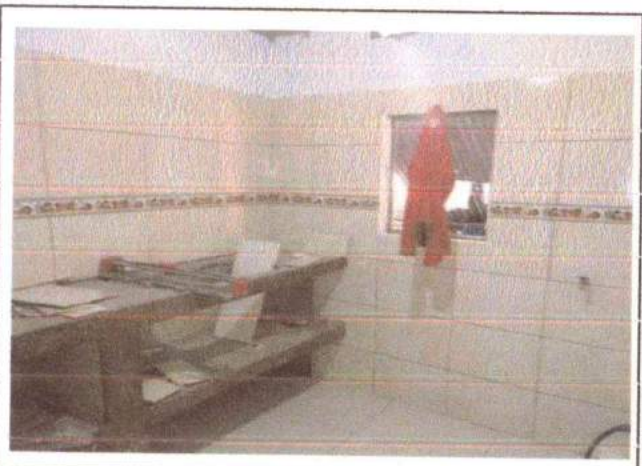

FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 1811	
Avance de obra	

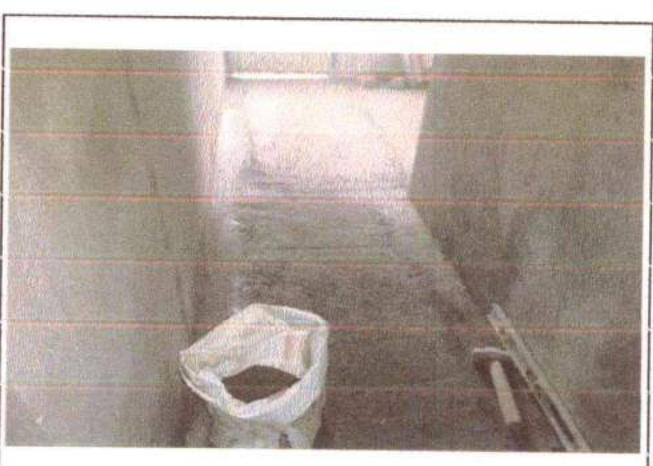

FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 1726	
Avance de obra	




FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV_1574	
Avance de obra	



FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV_1588	
Avance de obra	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

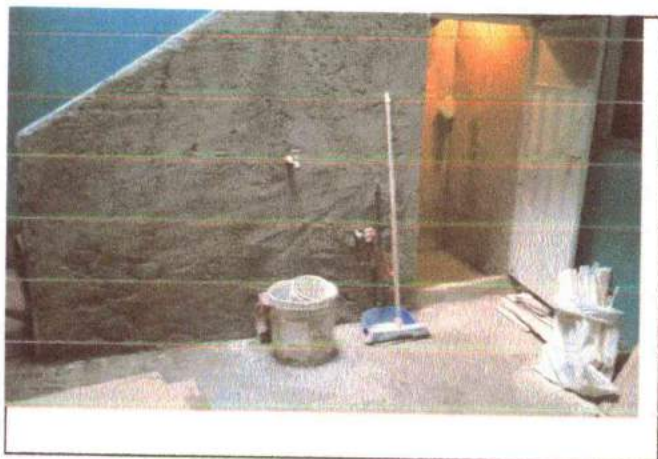

FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV_1608	
	Avance de obra



FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB_0252	
	APERTURA DE VIVIENDA



FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV SH-005	
	APERTURA DE VIVIENDA



FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA 2062	
	APERTURA DE VIVIENDA





FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA 2077	
	APERTURA DE VIVIENDA



FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA 1896	
	APERTURA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRAFICO

45

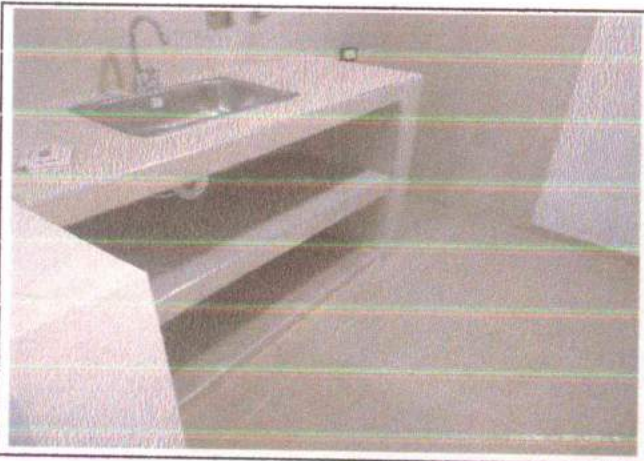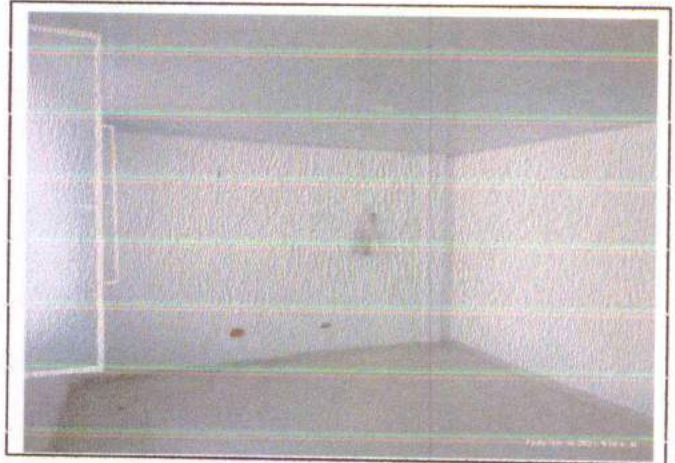


FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB-1586

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB-1586

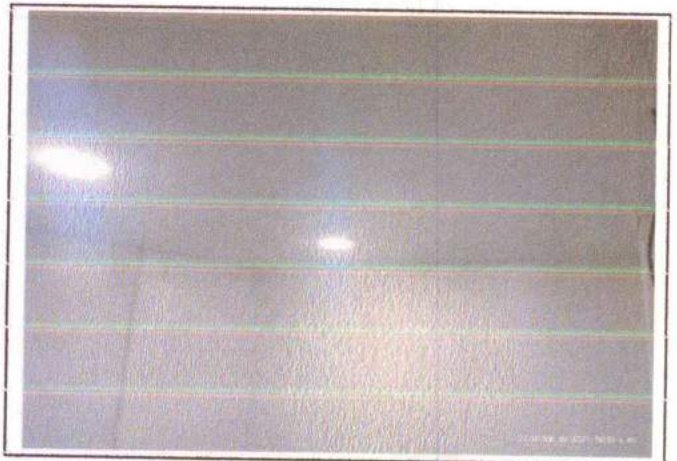

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1280


FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1280

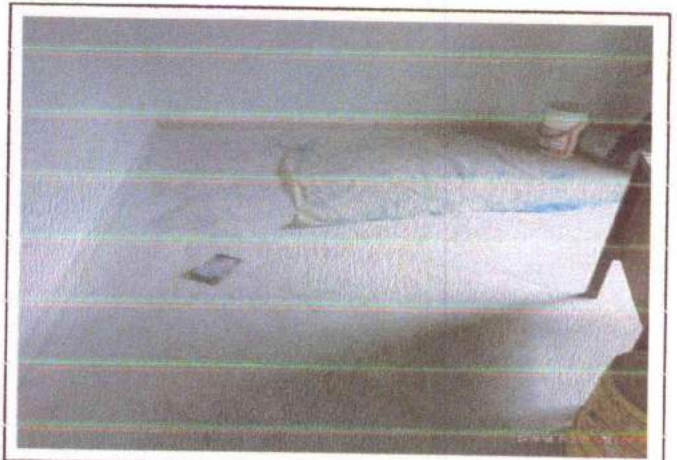

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1907

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1907


REGISTRO FOTOGRAFICO

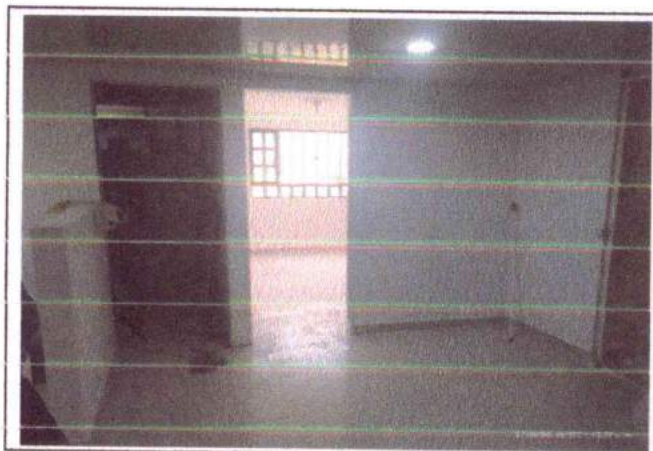


FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB-1586



FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB-1586

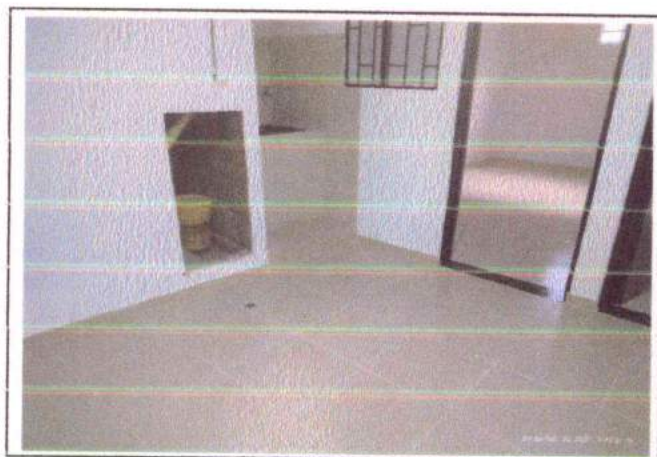


FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1867

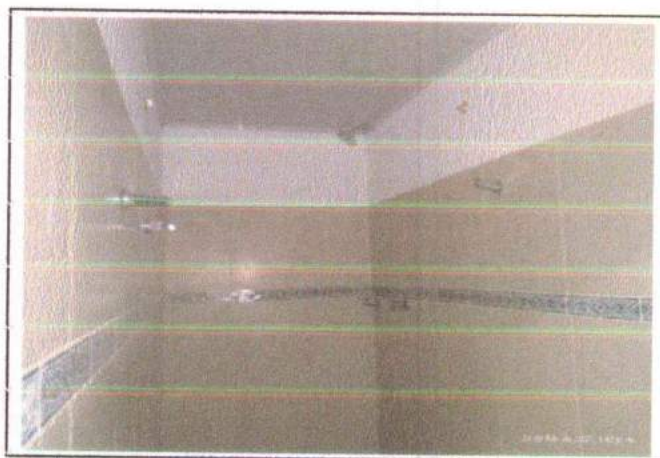

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1867




FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1867

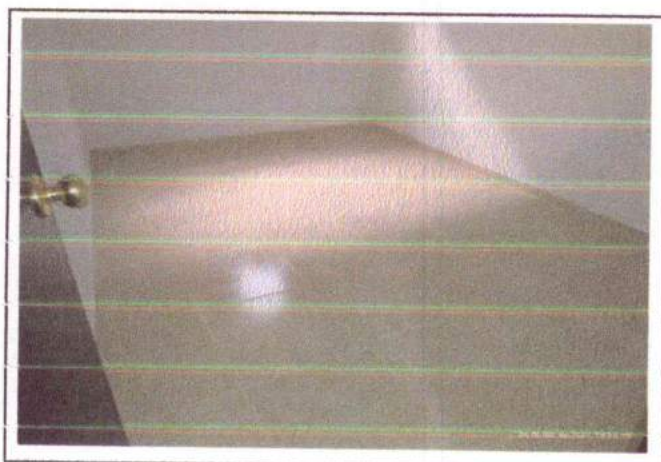

FECHA	domingo, 28 de febrero de 2021
DESCRIPCION	
	MVCB_1867


REGISTRO FOTOGRÁFICO

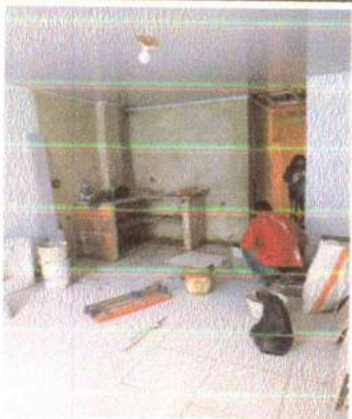


FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1873	
Avance de obra, enchape de piso en sala comedor y mesón de cocina	



FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1692	
Avance de obra en comedor, enchape de piso y vinilo sobre muros	

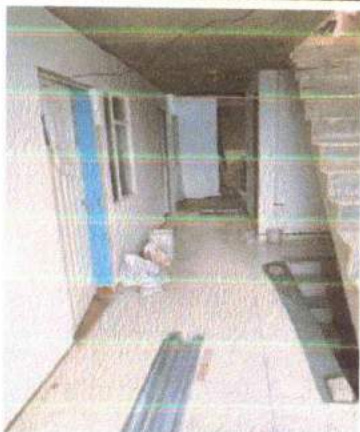


FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1681	
Avance de obras, enchape de piso y estuco en área social	

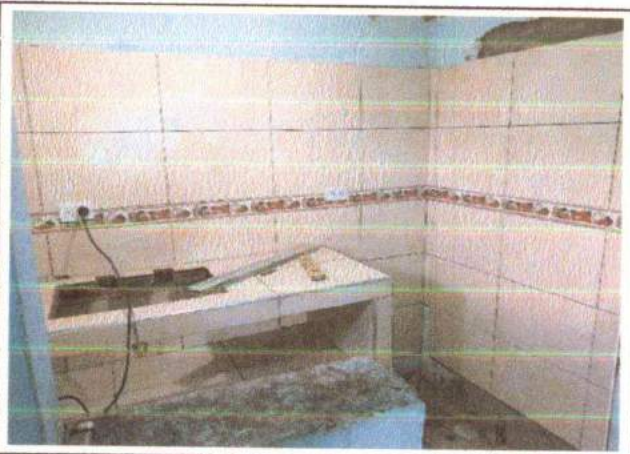

FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1638	
Avance de obras en área de la cocina	



FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1664	
Avance de obras en área de la cocina, fundida de poyo y mesones	

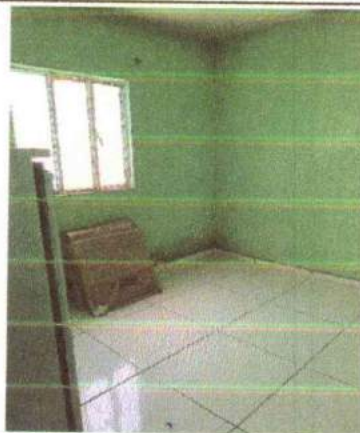

FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1748	
Avance de obras en alcoba No. 2, enchape de piso	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA sábado, 27 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVCB 1704


Avance de obras en área de la cocina: enchape de pared



FECHA sábado, 27 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVCB 1631


Avance de obra en sala y zona de jardín, pañete de muros

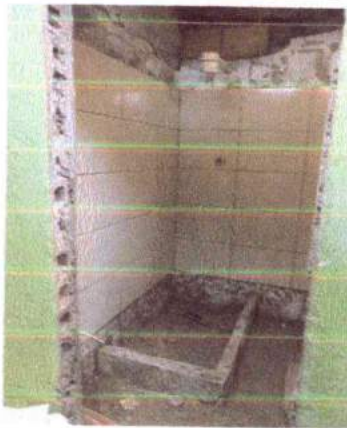

FECHA sábado, 27 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVCB 1592


Avance de obra en área de baño, demolición de enchape cerámico antiguo, inicio de enchape de muro

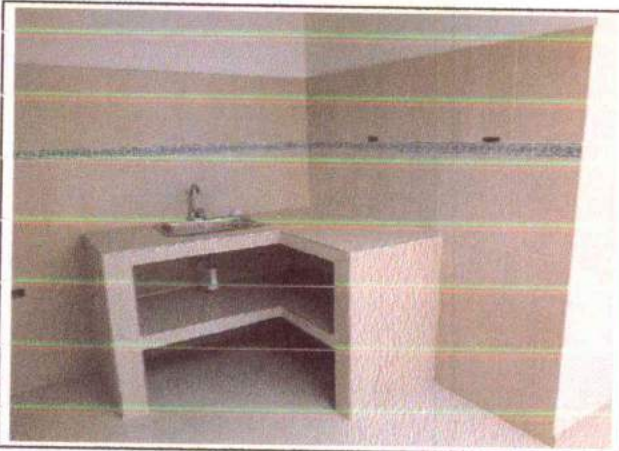

FECHA lunes, 22 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVCB 1908

Entrega de vivienda, vista final de la cocina terminada

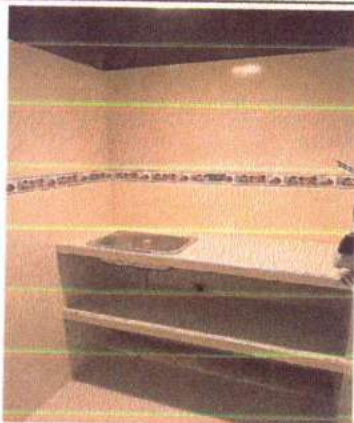

FECHA viernes, 26 de febrero de 2021

DESCRIPCION MV 0682

Avance de obra en área de cocina del 2° piso, enchapes de piso, pared y mesón




FECHA jueves, 25 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA 3776

Entrega de vivienda, vista final de la cocina del 1er. Piso

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV-1774

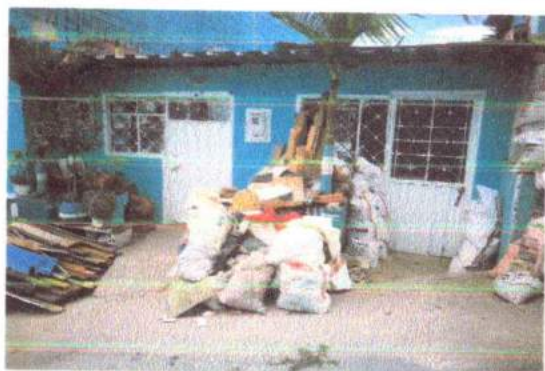

FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO




FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO




FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO



FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO

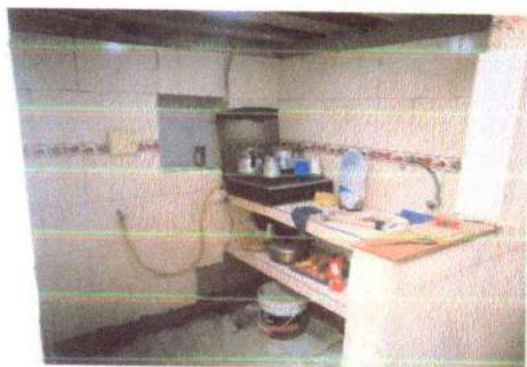


FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO

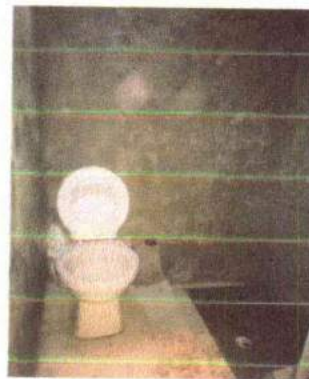

FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
	SEGUIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV -1742



FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

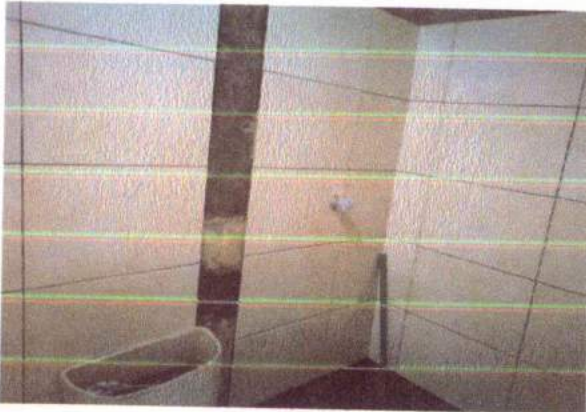

FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	lunes, 22 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA sábado, 27 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_2598

Apertura



FECHA jueves, 25 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_2756

Entrega



FECHA jueves, 25 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_2756

Seguimiento



FECHA sábado, 27 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_0519

Apertura



FECHA martes, 23 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_3081

Seguimiento




FECHA martes, 23 de febrero de 2021

DESCRIPCION MVJA_3168


Seguimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	miércoles, 24 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3670	
Seguimiento	

FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_1776	
Entrega	

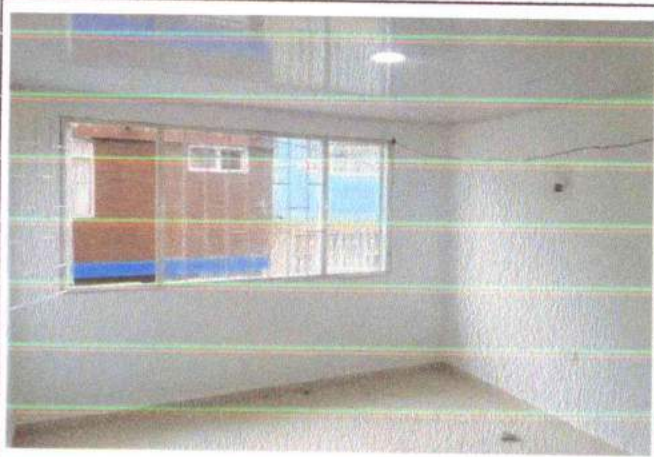

FECHA	jueves, 25 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_1776	
Entrega	


FECHA	sábado, 27 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_1386	
Apertura	

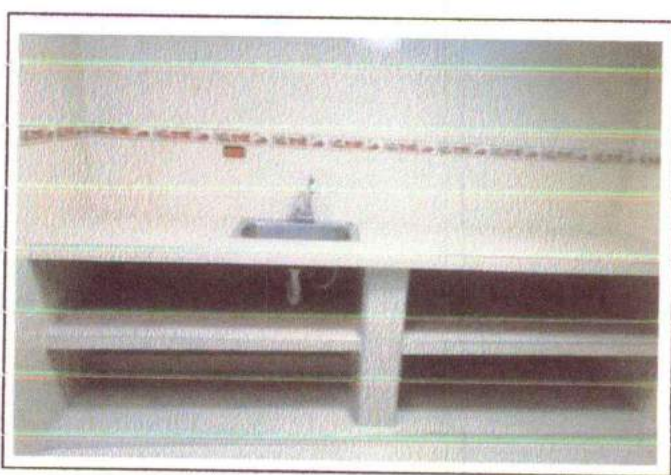

FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV_21820	
Entrega	

FECHA	viernes, 26 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV_21820	
Entrega	

h) Estado del Tiempo

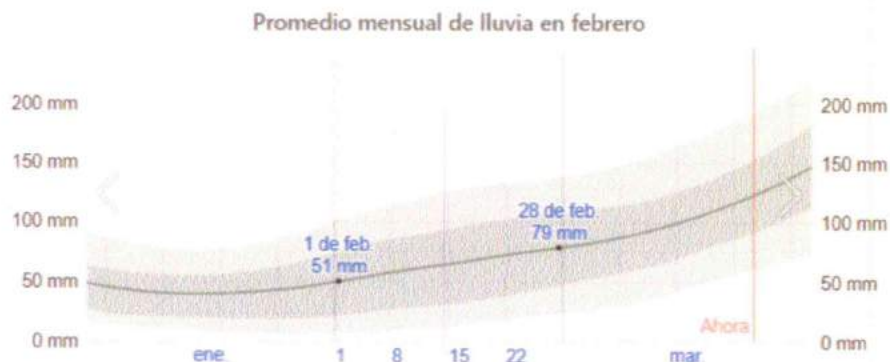

La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo móvil de 31 días centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es el equivalente de nieve en líquido promedio correspondiente.

<https://es.weatherspark.com/m/23324/2/Tiempo-promedio-en-febrero-en-Bogot%C3%A1-Colombia#Sections-Rain>

• Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo móvil de 31 días centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante 31 días móviles en febrero en Bogotá aumenta rápidamente, comenzando el mes con 51 milímetros, cuando rara vez excede 102 milímetros o es menos de 7 milímetros, y terminando el mes con 79 milímetros, cuando rara vez excede 138 milímetros o es menos de 24 milímetros.

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Bogotá, la probabilidad de un día mojado durante el mes de febrero aumenta muy rápidamente, comenzando el mes en 30 % y terminando el mes en 41 %.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a) **Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.**

Para el mes de febrero del presente informe no se registran situaciones de incumplimiento por parte del contratista toda observación es resuelta.

- b) **Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).**

- VER ANEXO SISO CD
- VER ANEXO INTERVENTORÍA CD

- c) **Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso**

COMUNICADOS EMITIDOS POR INTERVENTORIA FEBRERO. (ANEXOS)

OFICIO	ASUNTO
INP- SDHT-G1- 2020- 050 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	EXPEDIENTES DIGITALES
INP- SDHT-G1- 2020- 051 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	CONFIRMACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A CITACIONES.
INP- SDHT-G1- 2020- 052 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	ENTREGA DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE RENUNCIA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MVJA_1119, GERARDO FONSECA ARIAS (copias).
INP- SDHT-G1- 2020- 053 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	APROBACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
INP- SDHT-G1- 2020- 054 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	CERTIFICADO ENTREGAS VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 694 2020
INP- SDHT-G1- 2020- 055 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	NULO
INP- SDHT-G1- 2020- 056 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	REQUERIMIENTOS A CALIDAD DE OBRAS EN EL MV_21283 Y MVUS_0707
INP- SDHT-G1- 2020- 057 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	RESPUESTA AL RADICADO No 2-2020-50376.Inf. No 1 Mensual Noviembre
INP- SDHT-G1- 2020- 058 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	CONFIRMACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A CITACIONES.
INP- SDHT-G1- 2020- 059 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	ENTREGA UNILATERAL MVJA 0890

OFICIO	ASUNTO
INP- SDHT-G1- 2020- 060 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	ENTREGA DE EXPEDIENTES DE RENUNCIAS
INP- SDHT-G1- 2020- 061 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	INFORME DE CASO ESPECIAL, MVJA_2830.
INP- SDHT-G1- 2020- 062 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	ENTREGA DE EXPEDIENTES DE CASOS ESPECIALES
INP- SDHT-G1- 2020- 063 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	AVISO ATRASO EN PROGRAMACION DE ENTREGAS..
INP- SDHT-G1- 2020- 064 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	SOLICITUD DE MV DIGITALES No MVCB_3534- MVCB_3540-MVCB_3537- MVCB_3523- MVCB_3524.
INP- SDHT-G1- 2020- 065 CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020	INFORMES DE CASOS ESPECIALES MVUS_0905, MV_04993 Y MVCB_5209.

COMUNICADOS EMITIDOS POR EL CONTRATISTA FEBRERO (ANEXOS).

OFICIO	ASUNTO
CONTRATO DE OBRA 694-2020-045	RENUNCIAS MVCB_2993 Y MVJA_1119
CONTRATO DE OBRA 694-2020 046	RENUNCIAS MVCB_2414 - MARIA ELENA RINCON RINCON
CONTRATO DE OBRA 694-2020 047	ENTREGA DE CARPETAS CON BITACORA CORTE 1,2 Y 3
CONTRATO DE OBRA 694-2020 048	CORTE No 3
CONTRATO DE OBRA 694-2020 049	RENUNCIAS MVJA_2315-ANIBAL INFANTE NAVARRETE
CONTRATO DE OBRA 694-2020 050	ACTAS DE VISITAS MVUS_0905 LUIS EDUARDO GUATIBONZA GUATIBONZA
CONTRATO DE OBRA 694-2020 051	ACTAS DE VISITAS MVJA_2830 MARIA LUISA CONTRERA SANABRIA
CONTRATO DE OBRA 694-2020 052	ACTAS DE VISITAS MV_04993 ROSABILNA ZABALETA MENDOZA
CONTRATO DE OBRA 694-2020 053	ACTAS DE VISITAS MVCB_5209 MARCELINA MURCIA

d) Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

No hay modificación en el contrato

e) Pólizas

POLIZAS CONTRATISTA

**DATOS GENERALES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	No POLIZA	
BOGOTA D.C	NORTE	15	15-44-101233647	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		Nit:		
CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020		901.422.027		
Dirección: Cll 31 Nro 4-46		Ciudad: Montería, CORDOBA		
No. De póliza	15-44-101233647			
FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		
13-11-2020	04-11-2020	06-04-2024		
DATOS DEL ASEGURADOR /BENEFICIARIO				
ASEGURADO/ BENEFICIARIO: BOGOTA D.C SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9		
Dirección: CL 52 NRO 13-64		CIUDAD, D.C DISTRITO CAPITAL		
AMPARO				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL	SUMA ASEGURADA/ANTERIO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DEL ANTICIPO	04/11/2020	07/10/2020	\$ 1.117,240,595.70	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/11/2020	07/10/2021	\$ 744,827,063.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/11/2020	06/04/2024	\$ 186,206,765.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 744,827,063.80	



POLIZAS DEL CONTRATISTA

59



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101233647		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 11 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 04 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.422.027-8			
DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 4 - 46						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA				TELÉFONO: 7777777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3581600	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUI008, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N 694-2020 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. Grupo 1 la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramiento Integral.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/11/2020	07/10/2021	\$1,117,240,595.70	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/11/2020	07/10/2021	\$744,827,063.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/11/2020	06/04/2024	\$186,206,765.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$744,827,063.80	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **21,708,647.00	\$ *****25,000.00	\$ ***4,129,393.00	\$ *****25,863,041.00	\$ ****2,793,101,489.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INSURANCE BROKER SOLUTIONS LTDA.	143751	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101233647

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Planes

FIRMA TOMADOR

LUIS F.D.O. CARRILLO

LISTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 98-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

RICARDO VALENZUELA

1

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

60



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-44-101233647		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 11 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 04 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.422.027-8
DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 4 - 46	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA
	TELÉFONO: 7777777

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3581000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

CORPORACION MULTIACTIVA EMPRENDEUR ONO

PROJECT CENTER LTDA

IDENTIFICACION

900164714-9

900236613-3

PARTICIPACION

60.00

40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101233647

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

LUIS F.DO CARRILLO

FIRMA TOMADOR

RICARDO VALENZUELA 2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

61



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-40-101066957		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 11 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 04 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.422.027-8			
DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 4 - 46						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA				TELÉFONO: 7777777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3581800	
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL								ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATO N 694-2020 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Grupo 1 la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramiento Integral.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASBO ACTUAL	SUMA ASBO ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 7.00 SHOLV	04/11/2020	06/04/2021	\$351,120,800.00		

ACLARACIONES

POR EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****264,927.00	\$ *****2,000.00	\$ *****50,716.00	\$ *****317,644.00	\$ *****351,120,800.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			CONTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INSURANCE BROKER SOLUTIONS LTDA.	143751	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

Mmsm?

LUIS F.DD CARRILLO

15-40-101066957
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicespresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15			NO.POLIZA 15-40-101066957			ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 11 2020			A LAS HORAS 00:00			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 04 2021			A LAS HORAS 23:59		
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA														

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.422.027-8	
DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 4 - 46		CIUDAD: MONTERÍA, CORDOBA	
		TELÉFONO: 7777777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3581600	
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL 1
NOMBRE
CORPORACION MULTIACTIVA EMPRENDER ONG
PROJECT CENTER LTDA

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900164714-9	60.00
900236613-3	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-26 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-40-101066957

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

LUIS F.DD CARRILLO

FIRMA TOMADOR

RICARDO VALENZUELA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZAS INTERVENTORIA

POLIZA INTERVENTORIA

DATOS GENERALES EQUIDAD SEGUROS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			CODIGO DE PRODUCTO		CODIGO DE AGENCIA			No POLIZA	
BOGOTÁ D.C.			0403		00071			AA008916	
PRODUCTO			CUMPLIMIENTO ESTATAL						
FECHA DE EXPEDICION			DESDE	14	10	2020	HORA	12:00	FECHA DE IMPRESION
			HASTA	14	04	2024	HORA	12:00	29 10 2020
29	19	2020							
TOMADOR						Nit:			
INPLAYCO S.A.S						860524168			
Dirección: Carrera 16ª No 82-13 OF :201						Ciudad: BOGOTÁ D.C			
ASEGURADO						DIRECCION			
SECRETARIA DEL HABITAT						CALLE 52 No 13-64			
AFIANZADO						DIRECCION			
INPLAYCO S.A.S						Dirección: Carrera 16ª No 82-13 OF :201			
INFORMACION RIESGO ASEGURADO						VIGENCIAS GARANTIA			
GARANTIAS OTORGADAS			VALOR AFIANZADO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DIAS DE VIGENCIA	
Cumplimiento de contrato			\$ 178.857.190.40			14/10/2020	14/10/2021	365	
Calidad del Servicio			\$ 178.857.190.40			14/10/2020	14/04/2022	547	
Pago de Salarios, Prestaciones Social e Indemnización Laboral			\$ 44.714,297.60			14/10/2020	14/04/2024	1278	
VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 402,428,678.40									

CODIGO DE RECAUDO
111071025229

PÓLIZA
AA008916

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

FACTURA
AA025229



equidad
seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 PRODUCTO CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 CERTIFICADO AA024557 DOCUMENTO Modificación TEL: 7039628
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA DIRECCIÓN CARRERA...25-# 62-60.-PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
29	10	2020	DESDE	14	10	2020	HORA	12:00	29 10 2020
			HASTA	14	04	2024	HORA	12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR #PLAYCO SAS
DIRECCION CARRERA 16 A # 82 - 13 OF. 201
ASEGURADO SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
DIRECCION CALLE 52 N° 13-64
BENEFICIARIO SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
DIRECCION CALLE 52 N° 13-64
AFIANZADO INPLAYCO SAS
DIRECCION CARRERA 16 A # 82 - 13 OF. 201
E-MAIL gonzaloliveano@yahoo.es
E-MAIL WWW.BOGOTA.GOV.CO
E-MAIL WWW.BOGOTA.GOV.CO
E-MAIL gonzaloliveano@yahoo.es

NIT/CC 860524168
TEL/MOVI 6180878
NIT/CC 899999061
TEL/MOVI 3581600
NIT/CC 899999061
TEL/MOVI 3581600
NIT/CC 860524168
TEL/MOVI 6180878

INFORMACIÓN RIESGOASEGURADO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

CIUDAD	BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
LOCALIDAD	BOGOTA
DIRECCION	BOGOTA

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
Cumplimiento del Contrato	\$178.857.190,40
Calidad del Servicio	\$178.857.190,40
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$44.714.297,60

VIGENCIAS GARANTIA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
14/10/2020	14/10/2021	365
14/10/2020	14/04/2022	547
14/10/2020	14/04/2024	1278

VALOR ASEGURADO TOTAL \$402.428.678,40

NÚMERO DE RIESGOS	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
	\$	\$	\$	\$

FORMA DE PAGO Contado

CONSEGURO	
COMPANIA	PARTICIPACION
	%

ENTIDAD BANCARIA

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CODIGO	NOMBRE	PARTICIPACION
900220290	AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar. Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop/>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro. De igual forma, en el evento que corresponda, certifico que me fue entregada la tarjeta de asistencia y/o carné correspondiente a la póliza.

CLAUSULADO N°.

FIRMA AUTORIZADA
LAEQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



APRECIADO CUENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919338
#324

VIGILADO

66

CODIGO DE RECAUDO
111071025229

PÓLIZA
AA008916

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

FACTURA
AA025229



INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 09071 **CERTIFICADO** AA024557 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 26 # 62-60 PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
29	10	2020	DESDE	14	10	2020	HORA	12:00	29 10 2020
			HASTA	14	04	2024	HORA	12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR INPLAYCO SAS

DIRECCIÓN CARRERA 16 A # 82 - 13 OF. 201

E-MAIL gonzalolevano@yahoo.es

NIT/CC 960524168

TEL/MOVIL 6180878

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

EL PRESENTE SEGURO Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉL, NO EXPIRARÁN POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, NI PODRÁN SER REVOCADOS UNILATERAL POR EL TOMADOR O AFIANZADO DE LA PÓLIZA O DE LA ASEGURADORA.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.5.

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 14082019-1501-P-05-000000000000403-0100. EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

OBJETO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

*****MODIFICACION****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN FECHAS TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO FUE APROBADO EN LA PLATAFORMA EL 14 DE OCTUBRE DE 2020.

TOMADOR/AFIANZADO

INPLAYCO SAS NT 860.524.168-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NT 899.999.061-9

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538

SEGURO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA008917

FACTURA
AA025230



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Modificación	PRODUCTO	R.C.E. ENTIDAD ESTATAL	ORDEN	1
CERTIFICADO	AA024594	FORMA DE PAGO	Contado	USUARIO	JIBANEZ71
AGENCIA	AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA	TELEFONO	7039828		
		DIRECCIÓN	CARRERA 26-# 62-60-PISO 3		
FECHA DE EXPEDICIÓN	03 11 2020	VIGENCIA DE LA POLIZA		FECHA DE IMPRESIÓN	03 11 2020
	DD MM AAAA	DESDE	DD 14 04 2021	HORA	12:00
		HASTA	DD 14 04 2021	HORA	12:00

DATOS GENERALES

TOMADOR	INPLAYCO SAS	EMAIL	gonzalezleivano@yahoo.es	NIT/ CC	860524168
DIRECCIÓN	CARRERA 16 A # 82 - 13 OF. 201			TEL/ MOVIL	6180878
ASEGURADO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	EMAIL	WWW.BOGOTA.GOV.CO	NIT/ CC	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52 No 13-64 PISO 12			TEL/ MOVIL	3358000
BENEFICIARIO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	EMAIL	WWW.BOGOTA.GOV.CO	NIT/ CC	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52 No 13-64 PISO 12			TEL/ MOVIL	3358000

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD DEPARTAMENTO LOCALIDAD DIRECCIÓN CANAL DE VENTA	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA BOGOTA Franquicia

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Predios Labores y Operaciones.	\$175.560.600,00	10.00%	1.00\$MM/LV	\$0.00
Contratistas y Subcontratistas.	\$0.00	10.00%	1.00\$MM/LV	\$0.00
Responsabilidad Civil Patronal.	\$0.00	10.00%	1.00\$MM/LV	\$0.00
Gastos Medicos	\$0.00	10.00%	1.00\$MM/LV	\$0.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
\$175.560.600,00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
COMPANIA	COASEGURO	INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
	PARTICIPACIÓN	CODIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
		900220290	AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.

Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop/>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro. De igual forma, en el evento que corresponda, certifico que me fue entregada la tarjeta de asistencia y/o carné correspondiente a la póliza.

CLAUSULADO N°.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Seguros 018000919538
#324

SEGURO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA008917

FACTURA
AA025230



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Modificación	PRODUCTO	R.C.E. ENTIDAD ESTATAL	ORDEN 1
CERTIFICADO	AA024594	FORMA DE PAGO	Contado	USUARIO JIBANEZ71
AGENCIA	AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA	TELEFONO	7039828	
		DIRECCIÓN	CARRERA 25 # 62-80 PISO 3	
FECHA DE EXPEDICIÓN		VIGENCIA DE LA PÓLIZA		FECHA DE IMPRESIÓN
03	11	2020	DESDE 14	03 11 2020
			HASTA 14	AAAA
			04	
			2021	
			HORA 12:00	
			HORA 12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR INPLAYCO SAS
DIRECCIÓN CARRERA 16 A # 82 - 13 OF. 201

EMAILgonzalojevano@yahoo.es

NIT/ CC 960524168
TEL/MOVIL 6180878

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 25-02-2015-1501-P-06-0000000001007. EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop.

OBJETO

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DAÑOS A BIENES OCASIONADOS POR EL DESARROLLO DE CONTRATO No 791-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA VIGENCIA DE LOS AMPAROS INICIAN EL 14 DE OCTUBRE DE 2020 DIA EN QUE EL CONTRATO FUE APROBADO.

TOMADOR/AFIANZADO

INPLAYCO SAS NT 860 524 168-8

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - EQUIDAD SEGUROS es un miembro de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS

VIGILADO

FIRMA AUTORIZADA
LAEQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Linea Segura 018000919538

K324

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 4



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1



INPLAYCO S.A.S.
INTERVENCIÓN CONTRACTUAL E INTEGRACIÓN

FECHA	28/02/2021	PERIODO No.	4	DEL	01/02/2021	AL	28/02/2021
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la Interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la localidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distal de Habitat.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramiento Integral.						
CONTRATO DE INTERVENTORIA							
CONTRATO No.	701-2020						
PLAZO INICIAL	5 meses						
FECHA DE INICIACIÓN	4 de noviembre de 2020						
FECHA DE SUSPENSIÓN	0						
FECHA DE REINICIACIÓN	0						
FECHA DE TERMINACIÓN	3 de mayo de 2021						
PLAZO ACTUALIZADO	0						
PLAZO TRANSCURRIDO	894.285.962.00						
VALOR INICIAL	8						
VALOR ADICIONALES	8						
VALOR ACTUALIZADO	8						
VALOR ANTICIPO	8						
VALOR POR PAGAR	8						
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELAIZ MURILLO						
** Inserte las flas que requiera según el número de suspensiones y rendidos.							
2. CONTROL DE HITOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO						
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
1	Validación						
2	Entrega de informe de validación						
3	Ejecución						
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
*** Inserte las flas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de hito y terminación. Los hitos aprobados por la Interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vn. Bo. Los Hitos aprobados por la Interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.							
No.	INDICADORES						
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.						
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.						
3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL							
COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA							
LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR							
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA							
MVCB_1386 LUZ MINDA CASTRO PEÑA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1352 MARÍA RAMOS ORTÍZ, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1380 BARBARA GALVIS, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1328 EDILBERTO CÁRDENAS PÁEZ, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1387 MARTHA LILIA AGUDELO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1320 ISMENIA BARRETO ARIAS, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1310 DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1383 EDGAR FERNANDO CAMARGO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							
MVCB_1371 CONSUELO NAVARRO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.							

DIFERENCIA
(+) ADELANTO
(-) ATRASO

MVCB_1381: NOHORA NOHEMI MAYORIGA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1380: ROSALBA MONTES DE CAROONA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1341: JOSÉ GABRIEL HERRERA MEDINA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1344: ALBEIRO RUÍZ SANABRIA , durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1382: MARÍA CELIA RINÓN RINCÓN , durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1374: OBED OSPINA RESTREPO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA	
MVCB_1704: ALBA LUCÍA VALENCIA OCAMPO, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_1638: MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RUAÑO, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_1631: ELOISA LAVERDE RÍOS, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_1692: HOBER FABIAN BARRERA GUTÉRREZ, durante este periodo se abrió y se hicieron un seguimiento en la vivienda.	
MVCB_1664: MARINA CLEMENCIA RAMOS, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_1681: ÁLVARO ELÍECER VERDUGO RODRÍGUEZ, durante este periodo se hicieron seguimientos	
MVCB_1607: ANA ROSA LLANOS DE GARCÍA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1614: BLANCA ODILIA PATIÑO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1774: JOSÉ WILSON MARULANDA GIRALDO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cinco seguimientos	
MVCB_1742: ANA ELVIRA MENDOZA DE HERNÁNDEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos	
MVCB_1691: GINNA PAOLA MAHECHA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos	
MVCB_1828: DIANA PATRICIA PÁEZ FINO, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1684: MIRYAM MANRIQUE URUEÑA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1686: LUZ MARÍA ARIZA ARIZA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1686: MARÍA DEL CARMEN RINCÓN, durante este periodo se abrió la vivienda, hicieron seguimientos y entrega de la misma.	
MVCB_1673: BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA, durante este periodo se hicieron seguimientos.	
MVCB_1908: JESÚS MARÍA COBA QUIROGA, durante este periodo se hicieron seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVCB_1748: OLGA LUZ BETANCOURT LEÓN, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos	
MVCB_1836: DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y una entrega.	
MVCB_1682: BEATRIZ ADIELA MARTÍNEZ JARAMILLO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron tres seguimientos	
MVCB_1733: YINETH CUENCA ROA, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_1746: ROSA GERTRUDIS MARTÍNEZ LIZARAZO, renuncia. No se realiza apertura de vivienda debido a que la beneficiaria decide renunciar voluntariamente porque actualmente está haciendo labores constructivas en el predio y no puede recibir el subsidio	

MVCB_1661: MARI CIELO ARIAS CERQUERA, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron tres seguimientos.	
MVCB_1608: ROSALBINA HERNÁNDEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
MVCB_1688: LUZ NELLY RODRÍGUEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_1574: JOSÉ HIPÓLITO GUTIÉRREZ, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_1585: ELIÉCER RONCANCIO, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
MVCB_1698: LUZ AMALFI GUTIÉRREZ FRANCO, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
MVCB_1843: FLOR ALBA GUTIÉRREZ BELTRÁN, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_1811: ROSA ELVIRA GONZÁLEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_1728: EMPERATRIZ ACOSTA MARTÍNEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_1786: CARMEN QUIQUE MARTÍNEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
MVCB_1892: BEATRIZ ADIELA MARTÍNEZ JARAMILLO, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_1705: MARÍA EUGENIA TRUJILLO, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_5482: LUIS HERNANDO MESA, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
BARRIO O TERRITORIO: VISTA HERMOSA	
MVSH_006: MARÍA CUSTODIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
BARRIO O TERRITORIO: JERUSALÉN	
MV_17161: GUSTAVO VILLARREAL BERMÚDEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda.	
BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO	
MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIÉRREZ GARZÓN, durante este periodo se entregó la vivienda.	
MVJA_3148: CLARA INÉS GIL BÁEZ, durante este periodo se entregó la vivienda, pero la beneficiaria no permitió la foto de entrega.	
MVJA_2371: ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO, durante este periodo se firmó video de finalización de historia de vida.	
MVJA_2840: PAOLA ANDREA BARRERA PELÁEZ, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVJA_2878: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO, durante este periodo se aperturo la vivienda con cónyuge Pedro Becerra y se hicieron dos seguimientos.	
MVJA_2712: JOSÉ ALIRIO ORTÍZ CABRERA Y OTRA, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVJA_3238: NATIVIDAD SILDANA CELYS, durante este periodo se hicieron dos seguimientos.	
BARRIO O TERRITORIO: ACACIAS SUR	
MVJA_0698: RODOLFO BEJARANO, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron cinco seguimientos, en uno de estos se hizo acta de cambio de actividad por solicitud del beneficiario.	
MVJA_0608: MARÍA LUDINA VARGAS AGUIRRE, durante este periodo se aperturo la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos.	

MVJA_101E: MARÍA LEONOR APONTE VIUDA DE LÓPEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos	
MVJA_097E: JENNY XIMENA CAMELO VELASCO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_387E: CRISTÓBAL PITA CAMARGO, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron tres seguimientos	
MVJA_043E: GAVI ROZO RODRÍGUEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
DESARROLLO: LA ESCALA III SECTOR	
MVJA_060E: ROSALBA JARA DE ROJAS, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron dos seguimientos y entrega de la vivienda	
MVJA_001E: NÉSTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA, durante este periodo se abrió la vivienda	
DESARROLLO: DOMINGO LAIN I	
MVJA_275E: ESTHER AROCA YARA, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron dos seguimientos y se entregó a conformidad de la beneficiaria	
MVJA_310E: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron tres seguimientos	
DESARROLLO: DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE	
MVJA_119E: MOISÉS RODRÍGUEZ BETANCOURT, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_268E: FLOR ÁNGELA MORANTES LÓPEZ, durante este periodo se abrió la vivienda	
BARRIO O TERRITORIO: LUCERO MEDIO	
MVJA_241E: MARÍA ELENA RINCÓN RINCÓN, apertura fallida en la vivienda figuran 4 hermanos. 3 de ellos no se encuentran de acuerdo con el mejoramiento ya que el subsidio no abarca todas las zonas del predio. La beneficiaria solicita por dicho motivo la renuncia. En el momento de diligenciar los formatos pertinentes la beneficiaria y una hermana se agredieron física y verbalmente. La beneficiaria cogió un ladrillo y un objeto corto punzante (cuchillo). Profesionales las separaron y se procedió a llamar a la policía. La beneficiaria manifestó que en el momento de la valoración otro hermano también presentó disgustos.	
MVJA_231E: ANIBAL INFANTE NAVARRETE, seguimiento de clación, se realiza visita de clación, en el predio se encuentran presentes dos de los hijos del señor fallecido, expresan que ellos están a la espera de aprobación de subsidio para la vivienda de ellos entonces no ven conveniente el hacerse cargo y esperar el subsidio para la vivienda del señor Anibal, deciden optar por la renuncia en dicha vivienda, se generan acta de visita y acta de renuncia	
MVJA_241E: BERTILDA URREGO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_233E: ARMANDO QUIROGA BARRIGA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento	
MVJA_202E: MARÍA ALICIA MAHECHA POVEDA, durante este periodo se abrió la vivienda	
BARRIO O TERRITORIO: GIBRALTAR I Y II	
MVJA_313E: IRINA ESTHER SILVA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento	
MVJA_092E: FRANCISCO PIAMBA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_339E: LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron tres seguimientos	
MVJA_314E: OLIVIA BOLAÑOS, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento	
MVJA_339E: LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_308E: LUIS ALFREDO CARPINTERO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento	
MVJA_308E: JOSÉ UNILCIO CIFUENTES, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos	
MVJA_301E: RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO, visita de seguimiento interventoria y contrasta, la beneficiaria manifiesta estar muy satisfecha con las actividades ejecutadas y los acabados. Se observa personal de obra trabajando	
MVJA_083E: CLARA INÉS OCHOA GUTIÉRREZ, durante este periodo se abrió la vivienda	

BARRIO O TERRITORIO: ROCÍO ALTOS DEL SUR	
MVJA_2081: LEONOR TOVAR BARRERO, durante este periodo se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario.	
BARRIO O TERRITORIO: URBANIZACIÓN COMPARTIR	
MVCB_0057: LINA ROSA CÁRDENAS PATIÑO, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVCB_0222: JESÚS ANTONIO BARRERA FANDIÑO Y OTRO, durante este periodo se abrió la vivienda.	
DESARROLLO: LA ESPERANZA	
MVJA_3607: LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VEGA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
DESARROLLO: COLMENA	
MVJA_2077: SOFÍA PORRAS DE CAJAMARCA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVJA_2082: MERCEDES WALTEROS JOANIAS, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVJA_1895: HERNANDO TIQUE GUZMÁN, durante este periodo se abrió la vivienda.	
DESARROLLO: LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	
MVJA_3257: NELLY PIZA BUTRAGO, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVJA_1386: CRISTÓBAL SUI ALBARRACÍN, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVJA_1377: CORNELIO ANTONIO MOLINA LEÓN, durante este periodo se abrió la vivienda.	
DESARROLLO: SAN LUIS	
MVJA_1876: JOSÉ OMAR CAMACHO TÉLLEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVJA_3776: LUZ STELLA FONSECA OSORIO, durante este periodo se abrió la vivienda, se hizo un seguimiento y se entregó a conformidad de la beneficiaria.	
MVJA_1776: UVA ESTHER BAQUERO, durante este periodo se hacen seguimientos y entrega de la vivienda.	
MVJA_0795: AIDA MARÍA RUEDA NIETO, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron cuatro seguimientos y entrega de la vivienda. Pátele a ello se cerró la PQR recepcionada por la SDHT, se visitó la vivienda por parte de la P. Social María Isabel Serrano, quien verifica el proceso con la beneficiaria.	
MVJA_2005: AURORA MARGARITA ROJAS VELÁZQUEZ, durante este periodo se visitó la vivienda.	
BARRIO O TERRITORIO: SAN FERNANDO	
MVJA_2118: MARÍA CONCEPCION RIAÑO, durante este periodo se visitó la vivienda en dos oportunidades teniendo en cuenta las actividades que se deben priorizar en la vivienda.	
MVJA_2138: MARÍA ELIUD ORTEGÓN, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
DESARROLLO CIUDAD MILAGROS	
MVJA_0395: JOSÉ ORVEY ORTÍZ, durante este periodo se abrió la vivienda.	
MVJA_0286: HASBLEIDY GINA ROJAS, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVJA_0328: VÍCTOR MANUEL URREA ACOSTA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVJA_0235: MARIELA OSORIO TRUJILLO, durante este periodo se abrió la vivienda y se hizo un seguimiento.	

BARRIO O TERRITORIO: VILLAS EL DIAMANTE	
MVCB_5209: MARCELINDA MURCIA, durante este periodo se hicieron las visitas del 9 y el 20 de febrero, pero no fue posible contactar a la beneficiaria, por lo que se hace labor de recordario y se hacen actas con los profesionales asistentes, el proceso finaliza posterior a la tercera notificación por correo certificado en las que se informaron las visitas planeadas para caracterización técnica y social.	
MVCB_5398: DUBERNEY ARIAS BETANCOURT, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5399: MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ GARCÍA, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5474: OLIVIA RIVERA, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5499: MARÍA DEL CARMEN ALONSO POSADA, durante este periodo se apertura la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_5499: GLORIA INÉS PEÑA BELTRÁN, durante este periodo se apertura la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_5110: LILIA MARITZA HUERTAS CAMACHO, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5122: HERNÁN LÓPEZ GIRALDO, durante este periodo se apertura la vivienda y se hizo un seguimiento.	
MVCB_5128: FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIÉRREZ, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5128: DIEGO MARIO VAÑEGAS VILLAMIL, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5157: ANA TERESA PEÑA ROJAS, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5158: VÍCTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5484: IRMA ROJAS ROJAS, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5491: LEONIDES BUITRAGO, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5116: CARLOS CLAVILLO, durante este periodo se apertura la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
MVCB_5362: MARÍA DE LA CRUZ TRUJILLO ÁVILES, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5395: MARÍA YOLANDA LOZANO VERGARA, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5314: ANA OTILIA GUACANEME CUESTA, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5349: JHON JAIRO MELO MARTÍN, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5012: MARGARITA FORERO ARTEAGA, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MVCB_5395: MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ GARCÍA, durante este periodo se apertura la vivienda.	
DESARROLLO: ARBORIZADORA ALTA	
MV_15743: DONELIA PATIÑO MURILLO, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MV_08964: ELEY CÁRDENAS MONROY, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MV_14829: HILDA MIRIAM NIÑO, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MV_09484: GLADYS CASALLAS SUÁREZ, durante este periodo se apertura la vivienda.	
DESARROLLO: SANTA VIVIANA	
MV_14488: PLINIO SANABRIA SANDOVAL, durante este periodo se apertura la vivienda.	
MV_09083: RUTH GORDONS CASTAÑEDA, durante este periodo se apertura la vivienda.	

DESARROLLO: EL MIRADOR	
MV_0534: ALDEMAR DUARTE LÓPEZ, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron dos seguimientos.	
DESARROLLO: EL PARAÍSO	
MV_0493: ROSALBINA ZABALA MENDOZA, durante este periodo se realizaron dos visitas para caracterización técnica y social, pero fue imposible debido a que en la vivienda no se encuentran miembros del grupo familiar, adicionalmente se envían notificaciones por correo certificado para un adecuado proceso.	
LOCALIDAD: USME	
DESARROLLO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I SECTOR	
MV_1933: LUZ DAMARIS CASTRO PULGARÍN, durante este periodo se hizo un seguimiento y entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria.	
MV_1891: LUIS ANTONIO RINCÓN, durante este periodo se entrega la vivienda a conformidad del beneficiario.	
MV_1826: SANDRA PINZÓN, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria.	
MV_2182: JUAN EUIDES ORJUELA GARZÓN, durante este periodo se hicieron dos seguimientos	
HISTORIA DE VIDA	
MV_2182: JUAN EUIDES ORJUELA GARZÓN, durante este periodo se hicieron dos seguimientos	
DESARROLLO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE III SECTOR	
MV_2118: AMALIA MERCIÁN SOBA, durante este periodo se abrió la vivienda y se hicieron cuatro seguimientos.	
MV_2124: ALFONSO GUERRERO, durante este periodo se hizo un seguimiento y entrega de la vivienda a conformidad del núcleo familiar.	
MV_2134: ERMELINDA HERNÁNDEZ, durante este periodo se hicieron dos seguimientos de contratista e interventoría y uno con el acompañamiento de SDHT y entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria.	
MV_2138: ALEJANDRO PAVA, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron tres seguimientos y entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario.	
MV_2121: ERNESTINA CAICEDO, durante este periodo se abrió la vivienda, se hicieron tres seguimientos y entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria.	
MV_2134: ALFONSO GUERRERO, visita de secretaría, se realiza seguimiento por parte técnico, social y de secretaría de habilitat, se observa personal trabajando y avanza en la obra. Beneficiaria expresa conformidad y se aclaran actividades con contratista y Secretaria de Habilidadat.	
MV_2128: TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ, durante este periodo se hacen cinco seguimientos, uno de ellos con la P. Social de SDHT.	
MV_2134: ERMELINDA HERNÁNDEZ, visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria está conforme con el avance de obra en cocina, baño y habitaciones.	
MV_0908: LUIS EDUARDO GUATIBONZA, durante este periodo se hicieron dos visitas en las cuales fue imposible encontrar a un miembro del grupo familiar, las dos se notificaron por correo certificado a fin de reportar al proceso.	
MV_2128: TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ, durante este periodo se hicieron tres seguimientos de contratista e interventoría.	
DESARROLLO: EL BRILLANTE	
MV_2272: ECCEHOMO RIVERA RONCAMIO, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario.	
MV_2203: YENY ZURLEY LÓPEZ ULLOA, durante este periodo se hicieron tres seguimientos y entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria.	
DESARROLLO: VILLA ALEMANA II SECTOR	
MVUS_0707: LUZ MERY YARA MATOMA, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario.	
MVUS_0682: JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ PÁEZ, durante este periodo se hicieron dos seguimientos	

	DESARROLLO: VILLA ISRAEL
MVUS_0036: EMERATRIZ RODRÍGUEZ LÓPEZ, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario	
	DESARROLLO: EL ESPINO
MVUS_0230: JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE, durante este periodo se hicieron dos seguimientos y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario	
	DESARROLLO: VILLA ANITA SUR
MV_21059: ALEXANDER BERNAL AVEJANO, durante este periodo se hicieron tres seguimientos y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario.	
	DESARROLLO: EL VIRREY
MV_20308: JUAN FRANCISCO MEDINA BALAZAR, durante este periodo se abrió un seguimiento y se entregó la vivienda a conformidad del beneficiario.	
	DESARROLLO: LORENZO ALCANTUZ
MV_17421: OLGA BARRETO, durante este periodo se entregó la vivienda a conformidad de la beneficiaria	
	LOCALIDAD: BOGA
	DESARROLLO: MARGARITAS SECTOR III
MVBL_1875: MARÍA LUZ BONILLA, durante este periodo se hicieron dos visitas de seguimiento a las citaciones notificadas por correo certificado, pero no fue posible contactar a la beneficiaria ya que la vivienda está deshabitada	
4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANOMALIAS	
PQRS	
MVCB_4817: ÁLVARO ALONSO MORENO: En compañía de la SDHT a cargo de María Isabel Serrano, los profesionales técnicos y sociales de la intervención y contratista, se visitó el predio beneficiario para proceder a explicar al beneficiario el trámite de cierre a su petición teniendo en cuenta que ya se iniciaron labores constructivas en la vivienda, además se explican los costos directos e indirectos del subsidio. Por último, se decide llevar el caso de la vivienda a comité de obra para dialogar sobre las actividades de obra adicionales del contratista	
MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ, se entrega la vivienda con la intervención finalizada en la habitación N° 5, la cual había sido solicitada por la beneficiaria y aunque manifiesta inconformidad generalizada frente a las intervenciones, firma las actas de cierre, pero no a tomarse la foto de entrega	
MVUS_0796: ADA MARÍA RUEDA NIETO, se visita el predio en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría con la profesional social de la SDHT María Isabel Serrano, quienes socializan a la beneficiaria las actividades prioritarias, de acuerdo a las recomendaciones de habitabilidad del programa. Se brinda claridad al hogar beneficiario frente a las actividades a ejecutar de acuerdo a la validación aprobada la cubierta, la cual abarca un gran porcentaje del subsidio. Se exponen costos directos e indirectos, se verifica presupuesto existente y se sugiere por parte de la SDHT la claridad en cuanto a las unidades de medida, lo cual se debe plasmar en bitácora en la próxima visita	
MVJA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN RINCÓN, se cierra proceso mediante correo electrónico, respondiendo a la SDHT acerca de la petición instaurada por la hermana de la titular del beneficio, quien renunció el 09 de febrero de 2021, día en que se pretendían iniciar actividades de obra; posterior a un allanado familiar del cual fueron testigos los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Según manifestó la beneficiaria, no se ha hecho sucesión, por lo cual sus demás hermanos se encuentran en discusiones constantes frente al proceso jurídico. Apoyando la decisión de la hermana de postular el inmueble para este beneficio	
CASOS ESPECIALES	
Febrero 3 de 2021: MVJA_3899: MARÍA LUISA CONTRERAS SANABRIA, para este periodo se llevó a cabo la última visita en compañía de la P. Social de SDHT María Isabel Serrano, Coordinadoras sociales de contratista e interventoría, con el objetivo de verificar los motivos por los cuales la beneficiaria titular del subsidio no permitía el acceso de los profesionales que pretendían caracterizar la vivienda. En esta visita se escucharon las apreciaciones de la señora María Luisa frente al proceso y continúa mostrándose renuente a la dinámica establecida del proyecto. Por lo que se toma registro fotográfico y se hace acta de reunión la cual no firma la beneficiaria	
MV_04989: ROSALBINA ZABALA MENDOZA, en este periodo se hicieron las visitas del 6 y el 20 de febrero, pero no fue posible contactar a la beneficiaria, por lo que se hace labor de vecindario y actas con los profesionales asistentes, el proceso finaliza posterior a la tercera notificación enviada por correo certificado FEBRERO 9 de 2021: SEGUNDA CITACIÓN Esta citación se programó con el objetivo de caracterizar la vivienda por las áreas técnica y social, pero no se encuentra al beneficiario o persona a cargo del predio, se hace labor de vecindario, registro fotográfico y acta de soporte FEBRERO 20 de 2021: TERCERA CITACIÓN Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar al beneficiario, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, la cual no es atendida ni devuelta. Se toma registro fotográfico y acta de soporte	
MVCB_5209: MARCELINA MURCIA, durante este periodo se hicieron las visitas del 6 y el 20 de febrero, pero no fue posible contactar a la beneficiaria, por lo que se hace labor de vecindario y actas con los profesionales asistentes, el proceso finaliza posterior a la tercera notificación enviada por correo certificado FEBRERO 9 de 2021: SEGUNDA CITACIÓN Esta citación se programó con el objetivo de caracterizar la vivienda por las áreas técnica y social, pero no se encuentra al beneficiario o persona a cargo del predio, se hace labor de vecindario, registro fotográfico y acta de soporte FEBRERO 20 de 2021: TERCERA CITACIÓN Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar al beneficiario, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, pero el celular está fuera de servicio o inhabilitado. Se toma registro fotográfico y acta de soporte	

4

<p>INVIA_0905: LUIS EDUARDO GUATIBONZA, durante este periodo se hicieron dos visitas en las cuales fue imposible encontrar a un miembro del grupo familiar, las dos se notificaron por correo certificado a fin de soportar el proceso: FEBRERO 9 de 2021: SEGUNDA CITACIÓN</p> <p>Esta citación se programó con el objetivo de caracterizar la vivienda por las áreas técnica y social y en acompañamiento de la Profesional Social de la SDHT, pero no se encuentra al beneficiario o persona a cargo del predio, se hace labor de vecindario, registro fotográfico y acta de soporte</p> <p>FEBRERO 20 DE 2021: TERCERA CITACIÓN</p> <p>Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar al beneficiario, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, la cual no es atendida ni devuelta. Se toma registro fotográfico y acta de soporte</p> <p>INVL_1875: MARÍA LUZ BONILLA</p> <p>FEBRERO 20 de 2021: SEGUNDA CITACIÓN</p> <p>Durante este periodo se hizo una visita en la cual se continúa evidenciando el predio deshabitado, por lo que se hace labor de vecindario, acta y registro fotográfico como soporte.</p>		
RENUNCIAS		
<p>LUCERO MEDIO - FEBRERO 8</p> <p>INVIA_2315: ANIBAL INFANTE NAVARRETE, titular del beneficio falleció y los hijos desean obtener subsidios de mejoramiento de vivienda con sus respectivos predios</p> <p>LUCERO MEDIO - FEBRERO 9</p> <p>INVIA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN RINCÓN, titular renuncia al subsidio por disputas familiares con sus hermanos</p> <p>MIRADOR NUTIBARA - FEBRERO 24</p> <p>INVCB_1745: ROSA GERTUDIS MARTÍNEZ LUZARAZO, titular beneficiada está haciendo labores constructivas en el predio y no puede recibir el subsidio</p>		
CONFLICTOS Y ANOMALÍAS		
<p>ATENCIÓN DE INCONFORMIDAD:</p> <p>INVIA_3607: LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VEGA, visita de seguimiento contratista e interventoría, para atender inconformidad que interpuso el beneficiario ante la SDHT, el señor manifestó que está preocupado por el daño que le pueda generar en la placa el peso de 12 bultos de cemento que dejaron en una habitación, el área técnica explica que esto no pasará y si llegase a suceder se dará solución por cualquier daño ocasionado. Se reitera que hay unos números de atención a la comunidad para atender estas inconformidades, como ya se hizo la semana pasada. El subcontratista presenta al personal de obra para reanudar labores. Se elabora acta</p>		
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Elaborar y entregar a la SDHT, los informes de gestión social con las actuaciones adelantadas por parte del contratista e interventoría con las cuales se finalizó el proceso con el proyecto, ya que fue imposible contactar presencialmente a los beneficiarios.	Coordinadora social de interventoría - Inplayco SAS	Al entregar las carpetas de corte de obra
6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según correspondo (cuando aplique).		
<p>7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: Actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.</p> <p>El viernes 26 de febrero se hizo visita por parte de la Subdirección de barrios y algunos de sus profesionales, a cuatro predios beneficiados, en los cuales ya habían terminado la ejecución de actividades de obra.</p>		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VIVIENDAS

GRUPO 1



06/02/2021 - MVUS_0638 - EDWIN ARLEY QUINBAYO QUINTERO: Entrega, se realiza entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.



06/02/2021 - MV_18851 - LUIS ANTONIO RINCÓN: Se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico




06/02/2021 - MV_18363 - LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN: Entrega, se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico



06/02/2021 - MV_17421 - OLGA BARRETO: Entrega, se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico



17/02/2021 - MVCB_1320 - ISMENIA BARRETO ARIAS: Entrega, entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico

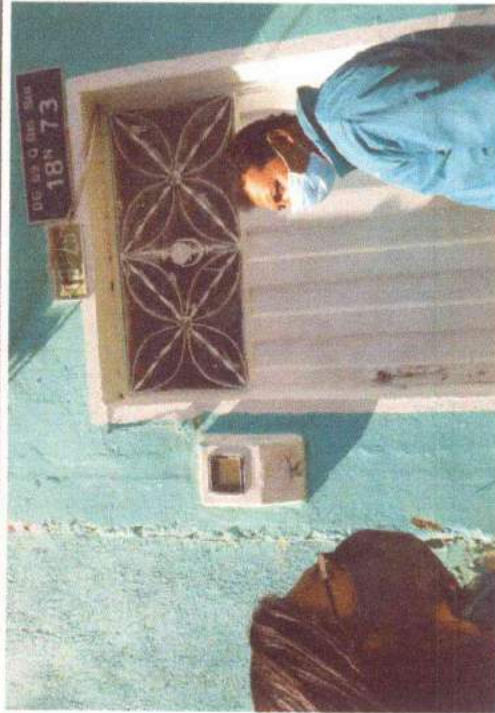

08/02/2021 - MVCB_5209 - MARCELINDA MURCIA, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (8am) y no se tiene claridad de hora de llegada. Se realiza acta con información dada por una vecina.



11/02/2021 - MVCB_1310 - DORA ALICIA LOPEZ SANABRIA: Entrega, entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico



08/02/2021 - MV_03993 - ROSALBINA ZABALA MENDOZA, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (7am) y no se tiene claridad de hora de llegada, una vecina informa también que beneficiaria ya tiene el número de contacto pero ella no se ha comunicado con el contratista. Se realiza acta con información dada por la vecina



4. ASPECTOS SOCIALES

a) Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos (PQR)

Durante este periodo se cierran tres requerimientos recibidos a través de la SDHT y una queja instaurada en el territorio. Se relacionan a continuación:

BENEFICIARIO	MV	DIRECCIÓN	TCO-LOCALIDAD	ESTADO
1. AIDA MARÍA RUEDA NIETO	MVUS_0795	KR 5A 112A 24 SUR	NUEVO SAN LUIS - Usme	Cerrada el 03 de febrero de 2021
2. ÁLVARO ALONSO MORENO	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	JUAN PABLO II - Ciudad Bolívar	Cerrada el 03 de febrero de 2021
3. CLARA INÉS GIL BÁEZ	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO – Ciudad Bolívar	Cerrada el 05 de febrero de 2021
4. LUZ MARINA RINCÓN	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	ALTOS DE JALISCO – Ciudad Bolívar	Cerrada el 24 de febrero de 2021

En los cuatro casos se realizan actuaciones por parte del contratista y la interventoría para tramitarlas administrativamente como es debido.

1. MVUS_0795: AÍDA MARÍA RUEDA NIETO

Se visita el predio en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría y la Profesional María Isabel Serrano, quienes socializan a la beneficiaria las actividades prioritarias, de acuerdo a las recomendaciones de habitabilidad del programa. Se brinda claridad al hogar beneficiario frente a las actividades a ejecutar de acuerdo al presupuesto de validación aprobados, brindando explicaciones frente a cubierta, la cual abarca un gran porcentaje del subsidio. Se exponen costos directos e indirectos, se verifica presupuesto existente y se sugiere por parte de la SDHT la claridad en cuanto a las unidades de medida, lo cual se debe plasmar en bitácora en la próxima visita.

2. MVCB_4917: ÁLVARO ALONSO MORENO

En compañía de la SDHT a cargo de María Isabel Serrano, los profesionales técnicos y sociales de la interventoría y contratista, se visita el predio beneficiario para proceder a explicar al beneficiario el trámite de cierre a su petición teniendo en cuenta las labores constructivas en la vivienda, además se explican los costos directos e indirectos del subsidio. Por último, se decide llevar el caso de la vivienda a comité de obra para dialogar sobre las actividades de obra adicionales del contratista.

3. MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ

Se entrega la vivienda con la intervención finalizada en la habitación N° 5, la cual había sido solicitada por la beneficiaria y aunque manifiesta inconformidad generalizada frente a las intervenciones, firma las actas de cierre, pero no accede a tomarse la foto de entrega. Queda cerrada la queja con el registro en la matriz social compartida con la SDHT.

4. MVJA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN: Mediante correo electrónico se informa a la SDHT, que la beneficiaria titular del subsidio correspondiente a la vivienda, renunció al proceso el 09 de febrero de 2021, día en que se pretendían iniciar actividades de obra; posterior a un altercado familiar del cual fueron testigos los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Según manifestó la beneficiaria, no se ha hecho sucesión, por lo cual sus demás hermanos se encuentran en discusiones constantes frente al proceso jurídico. Apelando la decisión de la hermana de postular el inmueble para este beneficio.

Ver anexos

b) Avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas.

AVANCES

Para este periodo ejecutado se ha brindado acompañamiento al contratista en todas las actividades informadas a la interventoría, teniendo un reporte de acumulado de actividades, así:

- Validaciones / caracterizaciones: 238 predios
- En ejecución actual: 97 predios
- Entregas a la fecha: 124 predios
- Renuncia: 3 beneficiarios durante este periodo, con un total de 9 acumuladas.

Se enfatiza que todas las viviendas mencionadas tuvieron visitas de seguimiento en el periodo de ejecución de obra, en éstas se indaga al beneficiario su conformidad con el proceso, sugerencias, inquietudes y se verifica el cumplimiento de las recomendaciones de bioseguridad y de tipo social para asegurar positivas percepciones del subsidio.

El contratista ha aceptado sugerencias emitidas por los Profesionales sociales que visitan los predios diariamente, de esta forma se genera una buena adaptación de los grupos en las zonas asignadas.

LOGROS:

- Se cumplen con las visitas programadas diariamente por los equipos de interventoría en terreno, dando una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos de los beneficiarios.
- Se cumplen con los protocolos de bioseguridad emitidos por las autoridades sanitarias, en las viviendas y PAC
- Se verifica el horario de atención a la ciudadanía en el PAC, el cual se brinda de acuerdo a la información del Plan de Gestión Social.

DIFICULTADES CUALITATIVAS:

- El personal de obra no se encuentra para resolver inquietudes y la intermitencia en el material de la zona de Jalisco ha generado inconformidades con algunos beneficiarios que a la fecha han sido manejados por los profesionales sociales en campo, pero que pueden trascender si se continúan demorando con la etapa de finalización.

DIFICULTADES CUANTITATIVAS:

- Los requerimientos conocidos a través de la SDHT, son solucionados positivamente y se cierran dentro de los tiempos establecidos por la legislación colombiana actual.
- Se presenta tres renunciaciones durante este periodo, discriminadas a continuación:

MV	BENEFICIARIO	FECHA DE RENUNCIA	DESARROLLO	MOTIVO
MVJA_2315	Anibal Infante Navarrete	Febrero 8	Lucero Medio	Titular del beneficio falleció y los hijos desean acceder con sus predios.
MVJA_2414	Maria Elena Rincón Rincón	Febrero 9	Lucero Medio	Titular renuncia al subsidio por diferencias entre hermanos.
MVCB_1745	Rosa Gertudis Martínez Lizarazo	Febrero 24	Mirador Nutibara	Está haciendo labores constructivas en el predio y no puede recibir el subsidio

- Se presentan situaciones especiales con algunos casos porque no se han podido contactar a los beneficiarios, a pesar de enviar notificaciones por correo certificado programando las visitas de caracterización, éstos se relacionan a continuación:

MV	NOMBRE	Nº DE NOTIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA	CARACTERIZACIÓN EFECTIVA
MVJA_2830	María Luisa Contreras Sanabria	3	Febrero 3 de 2021	No
MVCB_5209	Marcelinda Murcia	3	Febrero 20 de 2021	No
MV_04993	Rosalbina Zabala Mendoza	3	Febrero 20 de 2021	No
MV_0905	Luis Eduardo Guatibonza	3	Febrero 20 de 2021	No
MVBL_1875	María Luz Bonilla	3	Febrero 20 de 2021	No

Los correos certificados se emiten posterior a las visitas adelantada por los equipos técnicos y sociales de contratista e interventoría en las cuales no se logra contacto con el beneficiario titular del subsidio.



MATRIZ GENERAL SOCIAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MATRIZ PQR

BASE DE DATOS REQUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS											
SUBDIRECCION DE BARRIOS											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
Nº	IDENTIFICACION DE LA OBRAS	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION	FECHA DE ATENCION
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MJAA_3314	21/12/2020	30/12/2020								
2	MJAA_2812	23/12/2020	28/12/2020								
3	MJAA_3670	26/12/2020	06/01/2021								
4	MJAA_8266	26/12/2020	06/01/2021								

ASPECTOS PRESUPUESTALES

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a) Ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutando actividades de validación y ejecución de obra, a la fecha se presenta factura de corte No 3 para cobro por parte del **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020** de 36 mejoraminetos de vivienda.

RELACIÓN DE VALOR EN EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2021

CANT. DE MV.VALIDADOS	238	52,10%
CANT.MV ENTREGADOS	124	
VALOR EN EJECUCIÓN INCLUYE A.I.U	\$ 2.309.815.482,66	
% DE AVANCE	56,06 %	
TIEMPO DE EJECUCION A LA FECHA contados a la firma del acta de inicio	116 dias de ejecucion equivalentes al 77,33 % en tiempo al 28 de Febrero 2021	

b) Información de los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe se ha gestionado el anticipo del contrato. En lo referente a cortes el consorcio ha entregado dos facturas con la ejecución al 100% de 35 y 25 viviendas para un total de 60 mejoramientos en dos cortes en el mes de diciembre para el mes en curso febrero se genera el corte No 3 para 36 viviendas al 100%.

CORTE 1			DICIEMBRE		CORTE 2		
1	MVCB_3646	19	MVCB_2996	1	MVJA_3314	19	MVJA_4375
2	MVCB_3643	20	MVCB_2999	2	MVJA_3223	20	MVCB_1180
3	MVCB_3642	21	MVCB_2967	3	MVJA_3125	21	MVCB_1181
4	MVCB_3641	22	MVCB_2960	4	MVJA_2812	22	MVCB_1161
5	MVCB_3640	23	MVCB_2434	5	MVJA_2992	23	MVCB_1212
6	MVCB_3635	24	MVCB_2432	6	MVJA_0530	24	MVCB_1194
7	MVCB_3634	25	MVCB_3030	7	MVJA_0890	25	MVCB_1469
8	MVCB_3633	26	MVCB_3020	8	MVJA_0970		
9	MVCB_2939	27	MVCB_1124	9	MVJA_0898		
10	MVCB_4917	28	MVCB_1091	10	MVJA_0899		
11	MVCB_4918	29	MVCB_1120	11	MVJA_2660		
12	MVCB_4919	30	MVCB_1437	12	MVJA_2729		
13	MVCB_4923	31	MVCB_1440	13	MVJA_0544		
14	MVCB_2932	32	MVCB_1441	14	MVJA_0567		
15	MVCB_2926	33	MVCB_1421	15	MVJA_3309		
16	MVCB_2925	34	MVCB_1866	16	MVJA_3366		
17	MVCB_2917	35	MVCB_1818	17	MVJA_4350		
18	MVCB_2991			18	MVJA_4333		

RELACION DE PAGOS A LA FECHA CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

CORTE 1 CONTRATISTA 35 VIVIENDAS DICIEMBRE

		CANTIDAD	A.I.U	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD CORTE 1	CORTE DE OBRA	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 2.842.610.890,00	254	\$ 739.078.831	\$ 3.581.689.721	253		35		
TOTALES				\$ 2.842.610.890,0		\$ 3.575.169.946		\$401.444.720,0	
AIU				\$ 739.078.831				\$104.375.627,0	
COSTO TOTAL				\$ 3.581.689.721				\$505.820.347,0	
Implementación protocolos de bioseguridad				\$ 142.445.598				\$20.072.236,00	
VALOR TOTAL				\$ 3.724.135.319		CORTE 1		\$525.892.583,0	14,1%
VALOR DEL ANTICIPO	\$1.117.240.595,70								
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE CORTE (30%)	\$151.746.104,00							\$151.746.104,0	13,6%
VALOR PENDIENTE POR AMMOTIZAR	\$965.494.491,70								
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	\$374.146.479,00							\$374.146.479,0	10,4%

CORTE 2 CONTRATISTA 25 VIVIENDAS DICIEMBRE

		CANTIDAD	A.I.U	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD CORTE 2	CORTE DE OBRA	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$2.842.610.890,0	254	\$739.078.831	\$3.581.689.721	253		25		
TOTALES				\$ 2.842.610.890,0				\$276.614.112,00	
AIU				\$ 739.078.831				\$71.919.669,00	
COSTO TOTAL				\$ 3.581.689.721				\$348.533.781,00	
Implementación protocolos de bioseguridad				\$ 142.445.598				\$13.830.706,00	
VALOR TOTAL				\$ 3.724.135.319		CORTE 2		\$362.364.487,00	9,72%
VALOR DEL ANTICIPO	\$1.117.240.595,7								
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE CORTE (30%)	\$157.767.775,00							\$108.709.346,00	9,7%
VALOR PENDIENTE POR AMMOTIZAR	\$959.472.820,70								
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	\$368.124.808,00							\$253.655.141,00	7%

CORTE 3 CONTRATISTA 25 VIVIENDAS FEBRERO

		CANTIDAD	A.L.U	COSTO TOTAL	CANTIDA D	COSTO TOTAL	CANTIDAD CORTE 3	CORTE DE OBRA 3	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 2.842.610.890,0	254	\$ 739.078.831	\$ 3.581.689.721	253		36		
TOTALES				\$ 2.842.610.890,0		\$ 3.575.169.946		\$404.361.003,0	
A.U				\$ 739.078.831				\$105.081.861,0	
COSTO TOTAL				\$ 3.581.689.721				\$509.242.864,0	
Implementación protocolos de bioseguridad				\$ 142.445.598				\$20.208.050,0	
VALOR TOTAL				\$ 3.724.135.319		CORTE 3		\$529.450.914,00	13,6%
VALOR DEL ANTICIPO	\$1.117.240.595,7								
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE CORTE (30%)	\$157.767.775,00							\$158.835.274,0	13,6%
VALOR PENDIENTE POR AMOTIZAR	\$959.472.820,70								
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	\$368.124.808,00							\$370.615.640,0	10,35%

FACTURACION DE INTERVENTORIA CORTE 3 FEBRERO (corte n° 6)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 701 : (\$)		CONTRATO 694	TOTAL
		\$ 447.142.976,00	\$ 447.142.976,00
ADICIONES: (\$)			\$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$)		\$ 447.142.976,00	\$ 447.142.976,00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		13,66%	
VALOR DEL% DE AVANCE DE LA OBRA		\$ 61.070.599	\$ 61.070.599
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS	5%	\$ 3.053.530	\$ 3.053.530
		\$ 64.124.129	
TOTAL COSTO DIRECTO A PAGAR			\$ 51.319.831
IVA ACTA PARCIAL		19%	\$ 9.750.768
SUB TOTAL ACTA PARCIAL N° 1 DE INTERVENTORIA			\$ 61.070.599
VALOR TOTAL DEL ACTA PARCIAL N° 1 EJECUCION Y PROTOCOLOS			\$ 64.124.129

FACTURACION DE INTERVENTORIA CORTE 1 DICIEMBRE (corte n° 1)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 701 : (\$)		CONTRATO 694	TOTAL
		\$ 447.142.976,00	\$ 447.142.976,00
ADICIONES: (\$)			\$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$)		\$ 447.142.976,00	\$ 447.142.976,00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		14,1%	
VALOR DEL% DE AVANCE DE LA OBRA		\$ 63.047.159,62	\$ 63.047.160
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS	5%	\$ 3.152.358	\$ 3.152.358
		\$ 66.199.517,74	
TOTAL COSTO DIRECTO A PAGAR			\$ 52.980.806
IVA ACTA PARCIAL		19%	\$ 10.066.353
SUB TOTAL ACTA PARCIAL N° 1 DE INTERVENTORIA			\$ 63.047.160
VALOR TOTAL DEL ACTA PARCIAL N° 1 EJECUCION Y PROTOCOLOS			\$ 66.199.517,60

FACTURACION DE INTERVENTORIA CORTE 2 DICIEMBRE (corte n° 3)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 701 : (\$)		CONTRATO 694	TOTAL
		\$ 447.142.976 00	\$ 447.142.976 00
ADICIONES: (\$)			\$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$)		\$ 447.142.976 00	\$ 447.142.976 00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		9 72%	
VALOR DEL% DE AVANCE DE LA OBRA		\$ 43.462.297	\$ 43.462.297
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS	5%	\$ 2.173.115	\$ 2.173.115
		\$ 45.635.412	
TOTAL COSTO DIRECTO A PAGAR			\$ 36.522.939
IVA ACTA PARCIAL		19%	\$ 6.939.358
SUB TOTAL ACTA PARCIAL N° 1 DE INTERVENTORIA			\$ 43.462.297
VALOR TOTAL DEL ACTA PARCIAL N° 1 EJECUCION Y PROTOCOLOS			\$ 45.635.412



INFORME MENSUAL SISO

		INFORME HSE			
INFORME INTERVENTORIA SISO					
FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO			INFORME
DESDE	1/2/2021	"Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."			FEBRERO
HASTA	28/2/2021				
1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana					
<p>Acompañamiento a las actividades de Seguimiento a las mejoras en las viviendas por parte del equipo técnico, divulgación de los procedimientos de seguridad para realizar los trabajos, con las medidas preventivas evitando lesiones en el personal, dentro de estos procedimientos se verifica el uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro en alturas y manejo de material particulado cuando hay proceso de demoliciones, así como en los alistamientos de piso.</p> <p>La interventoría SISO, Continúa con el acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista y que es utilizado para el acceso a las viviendas y durante la estadia de los profesionales y los maestros y ayudantes de obra, este proceso de verificación se cumple durante los recorridos realizados, sin dejar de lado las actividades administrativas referente a informe semanal y revisión de documentos del personal contratado y del personal que se ha retirado. El contratista, toma temperatura a los beneficiarios y maestros preguntando sobre su estado de salud, reforzando tema de autocuidado y prevención, se revisan el contenido del kit de bioseguridad, se hace énfasis a los beneficiarios sobre el uso del tapabocas y evitar al máximo el contacto con los maestros de obra, en especial si se cuenta con enfermedades catalogadas de alto riesgo.</p> <p>Se hace énfasis especial en la recolección de Escombros y la prevención en los trabajos que se realicen en alturas superiores a 1.50 metros, para el tema ambiental se solicitó en diferentes ocasiones la realización de jornadas de aseo y recogida de escombros producto de las mejoras realizadas en las viviendas, se insiste en no acopiar en los exteriores de las viviendas y aumentar la periodicidad de recolección para evitar que se acumule, de igual manera en la ejecución de procedimientos de trabajo seguro durante las actividades.</p> <p>En la legislación se modifica la resolución 666 de 2020" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo, razón por la cual se solicitó y se realiza Ajuste de protocolo de bioseguridad según Resolución Numero 208 de 16 de Febrero de 2021." el cual se adoptan nuevas medidas para prevenir la transmisión del coronavirus.</p>					
• POSTURAS ADECUADAS EN EL SITIO DE TRABAJO • CONCIENCIA AMBIENTAL • QUE ES UNA CONDICION INSEGURA • RESOLUCION 223 DE 2021		SI	100%		
Adicional al tema principal de la charla se recalca sobre la aplicación del protocolo de bioseguridad.		La charlas se realizaron durante las visitas de seguimiento, se refuerza el tema de bioseguridad y se verifica su aplicación			
2. Gestión Ambiental					
<p>Durante el periodo se hizo disposición de 112 m³ de escombros en Cernex sitio autorizado por la autoridad ambiental, recibiendo soportes de la entrega. se han completado 246m³ durante el desarrollo del proyecto.</p> <p>Los contratistas fueron informados de como se debe hacer la disposición de los escombros, evitando que estén combinados con residuos de otro tipo y que evitando disponer en las afueras de las viviendas o en espacio publico, así como mantener buena periodicidad de recogida para evitar acumulación, de igual manera se le informó al beneficiario sobre la necesidad de destinar un espacio dentro de la vivienda para acopio temporal.</p>					
2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos					
Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones	
Escombros	112	248	Cernex	Se recibe copia de las remisiones	
3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)					
<p>Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, dando recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes. Se nota mayor cumplimiento en la entrega de EPP en las cuadrillas, sin embargo se debe insistir en el correcto uso por parte de los maestros y ayudantes.</p> <p>Se insiste en la prevención y el cumplimiento de los aspectos contemplados en la legislación durante las actividades en alturas superiores a 1.50 metros, se verificó ante el ministerio de trabajo los certificados que fueron entregados por parte del contratista.</p> <p>Se verifican afiliaciones de personal que ingresa y las planillas recibidas, así mismo se solicitaron los respectivos paz y salvo del persona retirado.</p> <p>Se hace énfasis a los beneficiarios sobre el uso del tapabocas y evitar al máximo el contacto con los maestros de obra, en especial si se cuenta con enfermedades catalogadas de alto riesgo.</p> <p>Se solicitó refuerzo con charla para uso de Tapaboca al personal que labora en el MV 3157, se realiza vista de seguimiento en el MV y la beneficiaria IRIA ESTER SILVA, e encontré inconforme porque los trabajadores no hacían uso debido del tapabocas, se le realizó charla de bioseguridad recordándoles uso obligatorio de este mismo, y a la beneficiaria se le recuerda el distanciamiento social.</p> <p>Por cambios en la legislación resoluciones 208 del 16 de febrero de 2021, se solicita ajustar el protocolo de Bioseguridad entregado por el Consorcio de Mejoramiento EP-2020.</p>					
3.1. Indices					
Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoria	Días Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Mes	11088	36	2304	0	0
Total Acumulado	47776	290	7644	10	0

3.1.1. Incidentalidad								
	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidentes Ambientales	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	0	0	0	0	1	0	0	0

3.2. Capacitaciones y Charlas

Durante el período se trataron los temas descritos a continuación, se hizo charla personalizada durante las visitas de seguimiento ya que por tema de la pandemia no es recomendable la reunión de personal en una sola área y la distancia entre sectores también hace difícil la logística.

- 1- POSTURAS ADECUADAS EN EL SITIO DE TRABAJO
- 2- "CONCIENCIA AMBIENTAL"
- 3- "QUE ES UNA CONDICION INSEGURA"
- 4- RESOLUCION 223 DE 2021 - se modifica la resolución 666 de 2020" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo. se realiza Ajuste de protocolo de bioseguridad según Resolución Número 208 de 16 de Febrero de 2021." el cual se adoptan nuevas medidas para prevenir la transmisión del coronavirus.

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continúa?
1	En Mv 1908 se evidenció falta alcohol en el kit de bioseguridad	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Situación corregida inmediatamente
2	En MV 3157 se solicita reforzar charla para incentivar el uso de tapaboca	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza charla al personal involucrado
3	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda: MV 0638	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza recolección
4	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda: MV 19285	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza recolección
5	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda: MV 1691	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza recolección

4. Registro Fotográfico

Toma de temperatura a beneficiarios



MV 1286



MV 1310



MV 1320

Kit de Bioseguridad



MV 1742



MV - 1592



MV 1664



MV 1774

Toma de temperatura a beneficiarios



MV 0682



MV 0707



MV 1686

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 3670



MV 2005



MV 2005

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 1867



MV 1681



MV 1586

Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



MV 3670



MV 2005



MV 2005

Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



MV 1908



MV 21240



MV 1310

Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



MV 1586



MV 4917



MV 0795

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 0682



MV 0707



MV 1907



INPLAYCO S.A.S.
AGENCIAS CONTRACTANTES E INTERMEDIARIAS

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%


ACTIVIDADES				GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.										
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3) para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O AREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DIAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCION APRENDIDA	PLAN DE ACCION Y FECHA
CONTRATO 884 - 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020			Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo I	74	11086	512	0.0		0	0	50	0	50			0	0					
				12	2304				0	0	50	0	50			0	0					
									0	0	45	0	45			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
										0	0	0	0	0			0	0				
				86	13382	512	0	0	0	0	145	0	145			0	0					0


ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST - CONTRATO No. 884-2020	
HORAS HOMBRE SEMANAL	
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	13.392
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	56.320
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DIAS DE INCAPACIDAD	0
No. DIAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	36
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	290

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	112
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	248
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
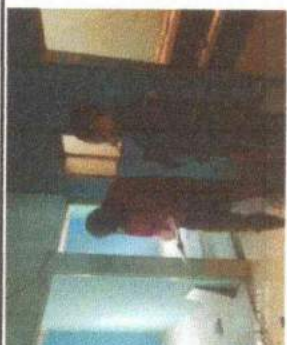
<div>  <div> INFORME SISO INPLAYCO SAS Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021 </div> <div>  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DEL HABITAT</small> </div> </div>		REGISTRO FOTOGRÁFICO			
RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIDAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA				
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo POSTURAS ADECUADAS EN EL LUGAR DE TRABAJO	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro				MV 1310 MV 1320 MV 1320
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo CONCIENCIA AMBIENTAL	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro				MV 1567 MV 0795 MV 1568

<div><div>INPLAYCO SAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO</div></div> <div><div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT</div></div><div>INFORME SISO INPLAYCO SAS Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021</div></div>		REGISTRO FOTOGRÁFICO					
RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA						
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo "QUE ES UNA CONDICION INSEGUERA"	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro		MV 1596		MV 1867		MV 1681
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo "RESOLUCION 223 DE 2021"	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro		MV 1684		MV 1681		



INFORME SISO

Fecha: 01 al 28 de febrero de 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO

CONTRATO: 694 - 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINUA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	KIT BIOSEGURIDAD	Falta contenido en recipiente de alcohol	1	1	2/2/2021	2/2/2021	Leda Lambis	 Se llenó con alcohol el recipiente
2	BIOSEGURIDAD	En MV 3157 se solicita reforzar charla para incentivar el uso de tapaboca	1	1	11/2/2021	13/2/2021	Leda Lambis	 Charla informativa, a los involucrados, ver registro charlas en informe mensual
3	AMBIENTAL	En MV 0638 se solicita recoger el escombro acopiado a la entrada de la vivienda.	1	1	6/2/2021	9/2/2021	Leda Lambis	

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
4	AMBIENTAL	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda. MV 19285	1	1	18/2/2021	21/2/2021	Leda Lambis	
5	AMBIENTAL	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda. MV 1691	1	1	25/2/2021	26/2/2021	Leda Lambis	
			5	5				

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	5
TOTAL ACCIONES CERRADAS	5

107



INFORME SISO

Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021



CONTRATO: 684-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativo	Personal afiliado Operativo (maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72.067.066	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19.144.052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	84.583.890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GOMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.855.988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA LRUETA	1.073.822.532	2/10/2020	20/06/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.348	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11.797.192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BEHAVIDEZ SANCHEZ	79.851.515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI		SI		
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	20/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.885	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.877.717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
19	CARLOS ALBERTO CACEDO HINOJOSA	1.111.617.731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
20	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
21	ANDAIR MONTEL VAQUERO	1.007.535.425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.286.107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10.307.972	26/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5.887.718	26/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
25	IDEL FONSO OFUENTES	19.332.722	26/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	26/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1.118.534.846	25/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.987.213	28/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
29	ILDEFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	98.381.399	1/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	1/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.588	1/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
32	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.278	1/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
33	ARLEY GIOVANNI CACEDO RAMIREZ	1.117.511.256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		

RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativo	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES	
									ACTIVO	RETRADO		
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	82008416111597	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
35	NUBIA VERGARA ALDANA	50.092.609	3/12/2020			1	SI		SI			Afiliado el 3 de diciembre, ingresa por cambio de fuente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	60.332.067	3/12/2020			1	SI			SI		
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16.537.810	3/12/2020			1	SI			SI		
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1.033.761.449	8/12/2020	18/12/2020		1	SI			SI		
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	60.373.803	13/12/2020	18/12/2020		1	SI			SI		
40	JULIO FERNY BEHAVIDES MENEZ	60.256.134	13/12/2020	18/12/2020		1	SI		SI			
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1.024.489.116	15/12/2020	18/12/2020		1	SI			SI		
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4.103.403	15/12/2020	18/12/2020		1	SI			SI		
43	JOSE IGNACIO CAMO NOVOA	7.330.323	15/12/2020	18/12/2020		1	SI			SI		
44	BRAVAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.802.601	17/11/2020			1	SI			SI		
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	60.084.358	17/11/2020			1	SI			SI		
46	EVANGELISTA BERNIZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	60.124.048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8.815.036	17/11/2020			1	SI			SI		
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.765.212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
50	VLADIMIR BRÑEZ MAHECHA	1.053.852.862	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1.049.830.871	17/11/2020			1	SI			SI		
52	RAUL OSORIO RINCON	79.059.250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
53	HAYDER CAMILO GALVZ	1.033.762.528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
54	CAMILLO HERNANDEZ SANCHEZ	1.049.839.842	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
55	EMITZO JOSE FANCIO FLOREZ	66.469.924	18/11/2020			1	SI			SI		
56	JULIO CESAR NEIRA BEHAVIDEZ	79.903.960	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.853.465	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.863.465	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.408	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79.770.115	18/11/2020			1	SI			SI		
61	OSCAR REINE BERNAL PAEZ	60.778.371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI			
62	MISIAEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	63.384.589	25/11/2020			1	SI		SI			
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
66	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
67	EDISON JOSE VENEZIA SARABIA	72.130.786	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
68	YODINSON JOSE VENEZIA MORENO	1.101.679.448	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	60.657.562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	90.858.697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		
72	JEISON ACERO	1.044.381.684	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI		

RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: masistas y audítes)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETRAIDO	
73	EDGAR VELANDIA	80.000.760	28/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.128.593	28/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80.746.213	28/11/2020			1	SI			SI	
76	LEONARDO SOLANO DEL Y	1.024.511.017	28/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.428	28/11/2020			1	SI			SI	
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1.077.435.835	28/11/2020			1	SI			SI	
79	LUZ ARIANA SILVA MUÑOZ	53.064.514	28/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI	SI	
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79.668.136	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.846.594	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1.000.033.268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.036.464	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
85	ANGEL IVAN DIAZ	79.924.351	1/12/2020			1	SI			SI	
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
87	CIRO ARTURO NIÑO	4.265.303	1/12/2020			1	SI			SI	
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020			1	SI			SI	
89	EDUAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1.033.754.705	1/12/2020			1	SI			SI	
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80.285.681	1/12/2020			1	SI			SI	
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1.033.735.370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1.091.170.297	1/12/2020			1	SI			SI	
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1.118.873.966	1/12/2020			1	SI			SI	
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1.033.683.233	1/12/2020			1	SI			SI	
95	CIPRIANO PIÑEROS	79.703.784	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8.686.840	1/12/2020			1	SI			SI	
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1.024.499.352	1/12/2020			1	SI			SI	
98	EDER GONZALEZ CASTELBLONDO	84.062.070	1/12/2020			1	SI			SI	
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1.033.721.855	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79.620.337	1/12/2020			1	SI			SI	
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	84.416.910	1/12/2020			1	SI			SI	
102	WILSON FERNY BERNAL GUARCA	1.033.707.175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI	SI	
103	YOISEN HADIN CHIBUQUE CAICEDO	1.007.413.403	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19.216.713	1/12/2020			1	SI		SI	SI	
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020			1	SI			SI	
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731.054.127,121.878	1/12/2020			1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1.031.178.991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80.774.466	1/12/2020			1	SI			SI	
109	GLORIA JIMENEZ	28.155.523	2/12/2020			1	SI		SI	SI	
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13.880.790	2/12/2020			1	SI		SI	SI	
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	4/12/2020			1	SI		SI	SI	
112	KEVIN SEBASTIAN APARICIO	1.000.064.803	10/12/2020			1	SI		SI	SI	

RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETRADO	
113	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	12/12/2020			1	SI			SI	
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80.885.628	15/12/2020			1	SI			SI	
115	JESSON LOPEZ MEJA	1.033.616.386	15/12/2020			1	SI			SI	
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVA	1.030.828.206	15/12/2020			1	SI			SI	
117	ALDEMAR CHAUX	98.357.448	16/12/2020			1	SI		SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17.982.809	16/12/2020			1	SI		SI		
119	HERNIA DARIO CHON MORA	1.024.452.739	22/12/2020			1	SI		SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79.250.468	22/12/2020			1	SI		SI		
121	WILLIAN ZABALA ALVAREZ	916.668.613.041.981	10/1/2021	9/1/2021		1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1.000.001.451	13/1/2021			1	SI		SI		
123	HARRY SAEENZ SUA	1.010.220.994	13/1/2021			1	SI		SI		
124	JORGE FINO MORENO	1.057.462.281	13/1/2021			1	SI		SI		
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1.024.482.810	16/1/2021			1	SI		SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8.000.191	16/1/2021			1	SI		SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79.419.331	16/1/2021			1	SI		SI		
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8.601.642	20/1/2021			1	SI		SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1.033.744.320	22/1/2021			1	SI		SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807.710.070	22/1/2021			1	SI		SI		
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1.116.990.533	22/1/2021			1	SI		SI		
132	JEFFERSON JUÑOJA BARBOSA	1.001.274.101	25/1/2021			1	SI		SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1.018.422.138	25/1/2021			1	SI		SI		
134	LEANDRO OIL MATELIS	1.033.743.641	31/1/2021			1	SI		SI		
135	JONATAN SAINENA LOPEZ	1.032.385.909	1/2/2021			1	SI		SI		
136	JOSE STEER MARTINEZ	1.044.032.473	30/1/2021			1	SI		SI		
137	RICHAR PIÑEREZ PEDROZO	1.067.303.337	30/1/2021			1	SI		SI		
138	LUIS ERNESTO FAJARDO	1033/92900	30/1/2021			1	SI		SI		
139	JORGE ARTURO PALACIO	10.172.986	3/2/2021			1	SI		SI		
140	SERGIO LUIS AJUNTICO NOVOA	1.033.753.797	3/2/2021			1	SI		SI		
141	JOSE TAPIERO COCOMA	14.420.134	10/2/2021			1	SI		SI		
142	PABLO CUELLAR TAMAYO	93.453.458	10/2/2021			1	SI		SI		
143	JHEVSSON LONDOÑO	1.013.627.861	10/2/2021			1	SI		SI		
144	ALEJANDRO GALLEGO LLANOS	80.741.119	11/2/2021			1	SI		SI		
145	BLANCA BEJARANO LLANO	1.051.138.363	11/2/2021			1	SI		SI		
146	GUSTAVO SANCHEZ CORREA	89.082.333	11/2/2021			1	SI		SI		
147	HAROL ZULUAGA ZULUAGA	80.747.595	11/2/2021			1	SI		SI		
148	JOSE SEGURA	80.311.182	11/2/2021			1	SI		SI		

RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativo	Personal afiliado operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETRADO	
149	OSCAR TORRES ZABALA	79.728.364	11/2/2021			1	SI		SI		
150	MICHEL MILARION ZABALA	1.033.785.162	15/2/2021			1	SI		SI		
151	JOSE UNBARLA ZAMBRANO	1.033.084.519	17/2/2021			1	SI		SI		
152	LUIS ROMERO LOPEZ	1.065.655.982	17/2/2021			1	SI		SI		
153	MOISES PALENCIA JIMENEZ	1.235.243.568	17/2/2021			1	SI		SI		
154	RAFAEL CHACON	P E 815649523031988	17/2/2021			1	SI		SI		
155	WILLIAN ANDRES JIMENEZ ROCHA	1031138321	17/2/2021			1	SI		SI		
156	GREIFE JOAQUIN RUBIANO FAJARDO	1022825336	20/2/2021			1	SI		SI		
157	MARTIN DE JESUS CASTRO FONSECA	1065140404	20/2/2021			1	SI		SI		
158	ARMANDO MACHACON CAMPO	1.043.613.351	22/2/2021			1	SI		SI		
159	CECILIO MACHACON CAMPO	1043813352	24/2/2021			1	SI		SI		
160	ALFONSO PARADA TENSA	80.370.018	26/2/2021			1	SI		SI		
161	ANGEL ALONSO VARGAS SANCHEZ	804.439.406	26/2/2021			1	SI		SI		
162	CHARLI MARTINEZ	1045763223	26/2/2021			1	SI		SI		
163	DAVID VELA	79136110	26/2/2021			1	SI		SI		
164	ISIDRO MANUEL BARBOZA SALCEDO	82552965	26/2/2021			1	SI		SI		
165	JHON ANDERSON JIMENEZ FLOREZ	1013668828	26/2/2021			1	SI		SI		
166	JHONATAN TOSCANO MERINO	1108787158	26/2/2021			1	SI		SI		
167	JOE CASTAÑEDA RIOS	1024573542	26/2/2021			1	SI		SI		
168	JOSE AGUSTIN CARABUENA	91041833	26/2/2021			1	SI		SI		
169	EDGAR CHACON CLARTE	79329968	5/3/2021			1	SI		SI		
170	GERARDO APONTE CASTILLO	P E 898969625011990	6/3/2021			1	SI		SI		
171	GERSAIN OLAYA GALINDO	3076553	6/5/2021			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
172											
173											
RESULTADOS:				3400668	18				72	99	



INFORME SISO

Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021



CONTRATO: 694-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACION PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO PERIÓDICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72.097.065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAMES RUJZ	19.144.052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64.563.860	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.956.868	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.616	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBBY PADILLA URUETA	1.073.822.332	2/10/2020	20/6/2020	1		SI			SI	
12	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI			SI	
13	GERSON ASPILLA LOPEZ	11.787.182	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79.861.515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.056	19/11/2020	18/11/2020	1		SI		SI		
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	29/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
17	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
18	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
19	YARU COLORADO PAZ	1.085.548.462	24/11/2020	29/11/2020		1	SI		SI		
20	CARLOS ALBERTO CAicedo HINOJOSA	1.111.817.731	24/11/2020	29/11/2020		1	SI		SI		
21	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	25/11/2020	29/11/2020		1	SI		SI		
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.286.107	25/11/2020	29/11/2020		1	SI		SI		
23	IDELFONSO CIFUENTES	19.232.722	25/11/2020	29/11/2020		1	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES	
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO		
24	ANDAR MONTEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI				SI	
25	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI				SI	
26	VICTOR RUZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI				SI	
27	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI				SI	
28	ILDEFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	98,381,369	17/11/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
29	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,536	17/11/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
30	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,063,043,278	18/11/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,566	17/11/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
32	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
33	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	838,084,181	3/12/2020	5/12/2020		1	SI				SI	
34	JHON WILLIAM BALLESTROS MARTINEZ	1,033,781,449	6/12/2020	19/12/2020		1	SI				SI	
35	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI		
36	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI					
37	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI				SI	
38	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI				SI	
39	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI				SI	
40	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
41	CAMILLO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI					
42	EVAGELISTA BRINEZ BUROS	6,030,390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
43	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
44	JEISON ACERO	1,044,351,894	25/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
45	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
46	JULIO CESAR NIERA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
47	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
48	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,663,466	18/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
49	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
50	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80,867,562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	
51	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI				SI	

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas			ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO		
52	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.786.212	17/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
53	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
54	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80.776.371	20/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
55	RAUL OSORIO RINCON	79.686.250	17/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
56	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
57	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
58	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.593	26/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
59	V.LADIMIR BRÍÑEZ MAHECHA	1.033.682.862	17/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
60	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
61	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1.101.879.446	25/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
62	CIPRIANO PIÑEROS	79.703.784	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
63	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1.031.176.991	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
64	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.656.697	25/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
65	WILSON FERNET BERNAL GUASCA	1.033.707.175	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
66	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
67	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1.033.735.370	1/12/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
68	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.036.484	27/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
69	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.769	25/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
70	HAYDER CAMILO GALVIZ	1.033.762.526	17/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
71	LEONARDO SOLANO CELY	1.024.511.017	26/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
72	YOISEN HADIN CHIBUQUE CAICEDO	1.007.413.403	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI		
73	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.493	18/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
74	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84.082.070	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI		
75	EDGAR VELANDIA	80.090.760	26/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
76	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.946.584	27/11/2020	21/2/2020		1	SI			SI		
77	WILLIAN ZABALA ALVAREZ	916.896.813.041.981	10/1/2021	9/1/2021		1	SI			SI		
RESULTADOS:					16	61	77	0	23	64		



INFORME SISO

Fecha: 01 al 28 de Febrero de 2021



CONTRATO: 684-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72.097.065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19.144.052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64.583.890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	IMARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.955.988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1.073.822.532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI			SI	
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.368	19/11/2020	24/11/2020	1		SI			SI	
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11.797.192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79.851.515	18/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	19/11/2020	11/11/2020	1		SI			SI	
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	28/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1.111.817.731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
20	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
21	ANDAR MONTEL VAQUIRO	1.007.535.425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.296.107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10.307.972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5.867.718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETRADO	
25	IDELFONSO CIFUENTES	19.232.722	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1.118.534.646	25/11/2020			1	SI			SI	
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.597.213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
29	ILDEFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96.361.399	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.566	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
32	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.276	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
33	ARLEY GIOVANNI CACEDO RAMIREZ	1.117.511.256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828086416111997	3/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI	SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
35	NURIA VERGARA ALDANA	53.092.809	3/12/2020			1	SI				Afiliado el 3 de diciembre , Ingresó por cambio de frente de trabajo en Febrero 3
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	60.332.087	3/12/2020			1	SI			SI	
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16.537.810	3/12/2020			1	SI			SI	
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1.033.781.448	8/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80.373.803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
40	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80.256.134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1.024.489.116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4.103.403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
43	JOSE IGNACIO CAMO NOVOA	7.330.323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.034.602.801	17/11/2020			1	SI			SI	
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80.084.356	17/11/2020			1	SI			SI	
46	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80.124.048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8.815.936	17/11/2020			1	SI			SI	
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.796.212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
50	VLADIMIR BRINEZ MAHECHA	1.033.682.982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1.046.630.871	17/11/2020			1	SI			SI	
52	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
53	HAYDER CAMILO GALVIZ	1.033.762.528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
54	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1.046.639.642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
55	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85.469.924	18/11/2020			1	SI			SI	
56	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79.903.950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETRADO	
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.663.495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.663.493	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79.770.115	18/11/2020			1	SI			SI	
61	OSBAR REINE BERNAL PAEZ	80.778.371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
62	MISAEEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.354.559	25/11/2020			1	SI		SI		
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
66	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
67	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.789	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
68	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1.101.879.446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80.857.562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.858.697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
72	JEISON ACERO	1.044.391.694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
73	EDGAR VELANDIA	80.090.780	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.563	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80.749.213	26/11/2020			1	SI			SI	
76	LEONARDO SOLANO CELY	1.024.511.017	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	26/11/2020			1	SI			SI	
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1.077.435.835	26/11/2020			1	SI			SI	
79	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53.094.514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79.666.136	27/11/2020			1	SI		SI		
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.646.584	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1.000.003.266	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.035.484	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
85	ANGEL IVAN DIAZ	79.824.351	1/12/2020			1	SI			SI	
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
87	CIRO ARTURO NIÑO	4.256.303	1/12/2020			1	SI			SI	
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020			1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETRADO	
89	EDUAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020			1	SI			SI	
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020			1	SI			SI	
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020			1	SI			SI	
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,966	1/12/2020			1	SI			SI	
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020			1	SI			SI	
95	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020			1	SI			SI	
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,499,352	1/12/2020			1	SI			SI	
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020			1	SI			SI	
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020			1	SI			SI	
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020			1	SI			SI	
102	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
103	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020			1	SI		SI		
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI			SI	
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731,054,127,121,978	1/12/2020			1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,465	1/12/2020			1	SI			SI	
109	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020			1	SI		SI		
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020			1	SI		SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020			1	SI		SI		
112	KEVIN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020			1	SI			SI	
113	HELLI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020			1	SI			SI	
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020			1	SI			SI	
115	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,368	15/12/2020			1	SI			SI	
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,205	15/12/2020			1	SI			SI	
117	ALDEMAR CHAUX	96,357,448	16/12/2020			1	SI		SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17,682,809	18/12/2020			1	SI		SI		
119	HERNAN DARIO CHON MORA	1,024,482,739	22/12/2020			1	SI		SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79,250,468	22/12/2020			1	SI		SI		
121	WILLIAN ZABALA ALVAREZ	916,866,813,041,981	10/1/2021	9/1/2021		1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1,000,001,451	13/1/2021			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETRADO	
123	HARRY SAENZ SUA	1,010,220,994	13/1/2021			1	SI		SI		
124	JORGE FINO MORENO	1,057,462,261	13/1/2021			1	SI			SI	
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1,024,482,810	18/1/2021			1	SI		SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8,090,191	18/1/2021			1	SI		SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79,419,331	18/1/2021			1	SI			SI	
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8,601,642	20/1/2021			1	SI		SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1,033,744,320	22/1/2021			1	SI		SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807,710,070	22/1/2021			1	SI			SI	
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1,116,690,533	22/1/2021			1	SI		SI		
132	JEFFERSON ZUÑIGA BARBOSA	1,001,274,101	25/1/2021			1	SI		SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1,018,422,138	25/1/2021			1	SI		SI		
134	LEANDRO GIL MATEUS	1,033,743,641	31/1/2021			1	SI			SI	
135	JONATAN SAINEA LOPEZ	1,032,385,909	1/2/2021			1	SI			SI	
136	JOSE STEER MARTINEZ	1,044,002,473	30/1/2021			1	SI		SI		
137	RICHAR PIÑEREZ PEDROZO	1,087,303,337	30/1/2021			1	SI		SI		
138	LUIS ERNESTO FAJARDO	1033762660	30/1/2021			1	SI		SI		
139	JORGE ARTURO PALACIO	10,172,596	3/2/2021			1	SI		SI		
140	SERGIO LUIS JUNTICO NOVOA	1,033,753,797	3/2/2021			1	SI		SI		
141	JOSE TAPIERO COCOMA	14,420,134	10/2/2021			1	SI		SI		
142	PABLO CUELLAR TAMAYO	93,453,456	10/2/2021			1	SI		SI		
143	JHEYSOON LONDOÑO	1,013,627,891	10/2/2021			1	SI		SI		
144	ALEJANDRO GALLEGU LLANOS	80,741,119	11/2/2021			1	SI		SI		
145	BLANCA BEJARANO LLANO	1,031,138,363	11/2/2021			1	SI		SI		
146	GUSTAVO SANCHEZ CORREA	93,062,333	11/2/2021			1	SI		SI		
147	HAROL ZULUAGA ZULUAGA	80,747,595	11/2/2021			1	SI		SI		
148	JOSE SEGURA	80,311,182	11/2/2021			1	SI		SI		
149	OSCAR TORRES ZABALA	79,728,364	11/2/2021			1	SI		SI		
150	MICHEL MLARION ZABALA	1,033,785,162	15/2/2021			1	SI		SI		
151	JOSE UMBARILA ZAMBRANO	1,033,684,519	17/2/2021			1	SI		SI		
152	LUIS ROMERO LOPEZ	1,085,855,962	17/2/2021			1	SI		SI		
153	MOISES PALENCIA JIMENEZ	1,235,243,588	17/2/2021			1	SI		SI		
154	RAFAEL CHACON	P E 8155-49523031868	17/2/2021			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
155	WILLIAN ANDRES JIMENEZ ROCHA	1031138321	17/2/2021			1	SI		SI		
156	GREIFE JOAQUIN RUBIANO FAJARDO	1022925336	20/2/2021			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETRADO	
157	MARTIN DE JESUS CASTRO FONSECA	1065140404	20/2/2021			1	SI		SI		
158	ARMANDO MACHACON CAMPO	1,043,613,351	22/2/2021			1	SI		SI		
159	CECILIO MACHACON CAMPO	1043613352	24/2/2021			1	SI		SI		
160	ALFONSO PARADA TENSA	80,370,018	26/2/2021			1	SI		SI		
161	ANGEL ALONSO VARGAS SANCHEZ	804,439,409	26/2/2021			1	SI		SI		
162	CHARLI MARTINEZ	1045783223	26/2/2021			1	SI		SI		
163	DAVID VELA	79136110	26/2/2021			1	SI		SI		
164	ISIDRO MANUEL BARBOZA SALCEDO	92552995	26/2/2021			1	SI		SI		
165	JHON ANDERSON JIMENEZ FLOREZ	1013666529	26/2/2021			1	SI		SI		
166	JHONATAN TOSCANO MERINO	1108787158	26/2/2021			1	SI		SI		
167	JOE CASTAÑEDA RIOS	1024573542	26/2/2021			1	SI		SI		
168	JOSE AGUSTIN CARABUENA	91041833	26/2/2021			1	SI		SI		
169	EDGAR CHACON OLARTE	79329896	5/3/2021			1	SI		SI		
170	GERARDO APONTE CASTILLO	P.E 98986628011990	8/3/2021			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
171	GERSAIN OLAYA GALINDO	3076553	6/3/2021			1	SI		SI		
172											
RESULTADOS:											
					16	155	171	0	72	59	


REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 0638




DESCRIPCIÓN Y FECHA: ESCOMBRO ACOPADO PARA RECOLECCIÓN
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 0638

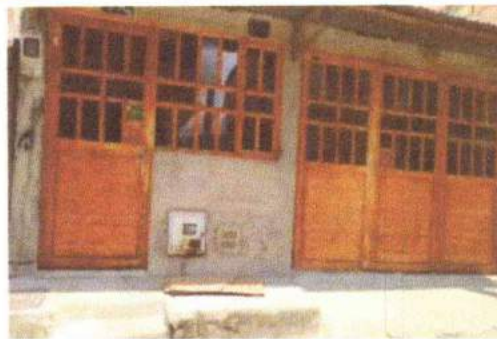


DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 1867

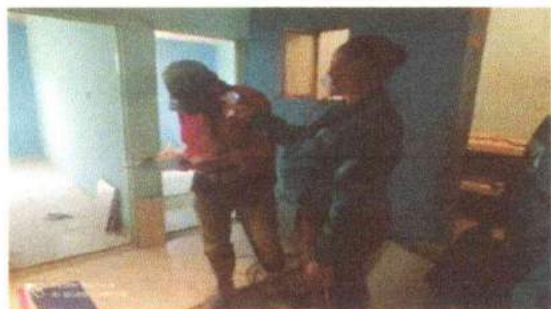

DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 1867



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 1907



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 1907



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 21184



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

MV - 21184



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 15 AL 21 Febrero 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 14485



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 14485



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 09494



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 09083



DESCRIPCIÓN Y FECHA: ANTES Y DESPUES RECOLECCIÓN ESCOMBROS
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 08654



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 5491



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 5118



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

MV - 1908



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 22 Al 28 Febrero 2021

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1018439196	ANGIE JACQUELINE QUINTERO PLATA	CRA 24 #6A 17 APT. 402	3100831	angiequintero22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BICURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ANTERIOR (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. EMBOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONAS				TOTAL A PAGAR
2021-02	2021-02	1	11/03/2021	48527741	\$256.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			Cotización Obligatoria
Código EPS	Nombre	NIT	
EP3005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliado
	No Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
0		0		0		0		113.600	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	600229735-0	145.400

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Fsp - Solididad	Aporte Fsp - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora Fsp	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		446.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NIT Cotización Obligatoria

	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliado
	No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Afora	Total a Pagar
Salud	1	113,900	113,900
Pensión	1	145,400	145,400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IOBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	259,300	259,300

[illegible]

128

 **¡Bien hecho!**
El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarte el resultado de la transacción.

Compra online ENLACE OPERATIVO S.A.

Tami



Nro. de recibo: 48393143
Descripción del pago: Pago de Seguridad Social
Identificación del contribuyente: 10.0.19.58
Concepto: CC
Razón Social: 72192215

Nro. de comprobante: 0000003639
Valor pagado: \$ 264.500.00
Cuenta: *****5927 - Ahorros

Ingresar tu email para enviar comprobante

Enviar

Ingresar solo el correo electrónico de la persona con contrato para recibir el comprobante

Finalizar

"Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla."



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-03-04 03:34:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Febrero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	Febrero de 2021
Empresa	CESAR ALFONSO FUENMAYOR SIADO
GEDULA CIUDADANA	CC 72192215
Código Sucursal (Nombre)	[]
Referencia de Pago/ Número Planilla	48393143
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	913357123
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 264.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suasporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Adjudico	Valor sin Mora	Total Ingresos Mora
N900236004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0
N800251440	EPS095	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.	1	\$ 113.600	\$ 0
NW0006942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 5.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 264.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 264.500



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 102555364		VELASCO CORONADO CRISTIAN FABIAN	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	67 73 # 33 a 30 sur Kennedy central	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5955595	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor									
2021-02	2021-02	923972490	9416636368	I	2021/03/15	2021/03/15	BANCOLOMBIA	0	\$295,000									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400
1	CC 102555364	VELASCO CRISTIAN	230101	30	\$908,326	\$145,400	EP9544	30	\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400
Total Afiliados(1)					\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400			\$908,326	\$145,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1059933064		VELASCO CORONADO CRISTIAN FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 73 f # 33 a 30 sur kensedy central	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-02	923972490	9416630368		2021/03/15	2021/03/15	BANCOLOMBIA	0	\$259,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							\$145,400		
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
TOTAL			1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014238664		ERICK LEONARDO ALVAREZ CADAVID	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 1 # 30-78 sur Int. 1 aptm 601	SOACHA-CUNDINAMARCA	3843057	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	909596021		9415985056	1	2021/03/18	2021/03/02	0	\$259,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Pension	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Total Aportes					
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)															
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)															
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)															
1	CC 1014238664	ALVAREZ ERICK													\$259,000
Total Afiliados: 1															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014238664		ERICK LEONARDO ALVAREZ CADAVID	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 1 # 30-78 sur Int. 1 aptm 601	SOACHA-CUNDINAMARCA	3843057	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	909596021		9415985056	1	2021/03/18	2021/03/02	0	\$259,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVEHIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
TOTAL				1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 19412829
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HUMBERTO BLANCO GONZALEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 64 C NO. 68B-98 BL 17 EN 1	TELÉFONO: 2107866
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7780899335	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 913704996

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400
SUBTOTAL:			1	\$ 145.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 113.600
SUBTOTAL:			1	\$ 113.600

TOTAL PAGADO:	\$ 259.000
----------------------	-------------------

Planilla Pagada

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TEL.FÓNICO	CORREO				
CC	1014235764	JESSICA ALEJANDRA REPULVEDA LAPOZ	Carrera 59 # 69 12 Torre 59 Apto 503	9632081	jessica_0624@live.com				
UNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				NO
	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES-AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I	15/03/2021	483019885	\$293.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			Coltización Obligatoria
Código EPS	Nombre	NIT	
EPS008	Compensar EPS	86009942-7	113.600

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliado
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	113,500	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código APP	Nombre	INT	Colación Obligatoria
23001	Ponestr	600224908-8	146.400

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Fisp - Solidaridad	Aporte Fisp - Subsidios	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fisp	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NIT
14-25	Riesgos prof. Comuna	900228176
		4.900

No. Autorización	Incapacidades		Aportes Oros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Sado a Favor	Valor Sado a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliado
	No. Autorización	Valor										
				4.800	0	0	4.800			48	4.800	1

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1		

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Díase Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALS PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Día/Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	SENA
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	ICBF
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	ESAP
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	MEN
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.900	113.900
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBP	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	263.900	263.900

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	101423784	JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ	Carrera 99 # 69 12 Torre 1 Apto 903
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente		
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
		CUIDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		TELÉFONO	6632981
		CORREO	jessik_0924@give.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		NO	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2021-02	2021-02	16/03/2021	45309885
PERIODO PENSIONES	2021-02	2021-02		
CANTIDAD EMPLEADOS				1
TOTAL A PAGAR				\$263.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Tipo		No. de identificación	Apellidos y Nombres		Colombiano	Extranjero	Indígena	Voluntario	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a ARL	Voluntario a



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-03-05, 09:22:51 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1035589001 Referencia pago(PIN) 8838235660
Período Cotización 202102 Período Servicio 202102

Cliente:

PAGADA 2021-02-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO SOLANO SOLANO	Dirección	CALLE 67 B BIS A N 111 74
Documento	CC 80174841	Teléfono	5482409
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80174841	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	SOLANO SOLANO LEONARDO	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo	BOGOTÁ D.C.	Ubicación Laboral	
Tipo Cotizante	57	00										

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código APP	Tarifa APP	Total Aporte APP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte FSP	Código ARL	Tarifa ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte FSP	Código CCF	Tarifa CCF	Total Aporte CCF	Total Aporte FSP	Código SENA	Tarifa SENA	Total Aporte SENA	Total Aporte FSP
ON	250301	18%	\$ 908.528	\$ 145.400	EP0002	12.5%	\$ 908.528	\$ 145.400	14-11	0.622%	\$ 505.125	\$ 4.000	100-CC	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	ICBF	ESAP	MEN	\$ 263.800
\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.800

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-02-23, 04:28:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2021
Empresa	PABLO ALEXANDER ORJUELA CHITIVA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030647671
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036011078
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	902246800
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 259.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 145.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 113.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 259.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 259.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79373252	ROBERT ROJAS TORRES		Calle 66A # 66 D 32	6501320	rojaar@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Indisociante			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$354,600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
EPS016	Coornisa EPS	808000427-1	150.000

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliado
	No Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION		
Código AFP	Nombre	NIT
25-14	Colpensiones	900336004-7
		192.000

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Certificación Obligatoria
14.23	Positiva Seguros	990011165-8	12.600

Iniciaciones		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliación
No. Autorización	Valor										
			12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
		SENA			
0	0	0	0	0	0
		ICBF			
0	0	0	0	0	0
		ESAP			
		IMEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	964.600	964.600

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	PAGAR PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLACADOS
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODES				1
2021-02	2021-02	1	04-03-2021	49065200	0
TOTAL A PAGAR					\$354.600

[illegible]

Información básica de la planilla

Empresa:	ROBERT ROJAS TORRES	NIT:	79373252
Tipo Planilla:	I	Período liquidación Pensiones:	febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	febrero 2021
Número de Radicación:	49065200	Total a pagar:	\$354,600
Fecha de vencimiento:	03/03/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/03/2021	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número Autorización:	912442800
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$12,600
25-14	9003336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$192,000
EPS016	805000427	Comeva EPS	1		\$0	\$150,000
						\$354,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 49065200, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

DATOS DEL APORTANTE										TELÉFONO	CORREO	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN								
CC	79964086	WILLIAM RODRIGUEZ GARZON RODRIGUEZ		Cra 9 e No 40 G 21 SUR					3112206910	ans.williamgarzon@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO						
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D.C.					NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALTO					1	0
2023-02	2023-02	1	08/03/2021	48820614	TOTAL A PAGAR \$293.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EP3017	Famasaar EPS	830003564-7
		113.600

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Celación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FISP - Solidaridad	Aporte FISP - Subvención	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora PGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201		800229736-0	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1
Proteccion (ING + Proteccion)												

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización
14-23	Positiva Seguros	6900111501-6	4.900	Va

Aportes Otros		Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
Sistemas		Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
		4.900	0	0	4.900			48	4.900	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.800	113.800
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
OCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	263.900	263.900

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	7999-0065	WILLIAM FERNANDO GARZON RODRIGUEZ	Cra 97 o No 40 G 21 SUR
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente		
		Ciudad / Municipio	BOGOTÁ, D.C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
		TELÉFONO	311226910
		CORREO	ari.williamgarzon@gmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2021-02	PERIODO PENSIONES	2021-02	48826514
				TOTAL A PAGAR
				\$263.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOYERAS												PENSION						SALUD				RECURSOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Antigüedad	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono
CC 1030563658		SIERRA MARIN SINDY YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 74 38-25 sur	5555555
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión		2021-02		Periodo Salud	2021-02	
Fecha limite de pago		2021/03/12		Fecha de pago	2021/03/11	
Días de mora		0		Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar			\$259,000	DATOS DE LA TRANSACCION		
Intereses de mora			\$0	Clave planilla	9416483122	
Salidos e incapacidades			\$0	Clave de pago	72695936	
Valor total			\$259,000	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 101 9048296		CAMARGO OSORIO YINETH LISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Trans 127 a bñ # 137 a 48	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5375703	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	919052798	9417662387		2021/03/23	2021/03/10	BANCOLOMBIA	0	\$322,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400		
PORVENIR	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$63,300	\$0	\$0	\$63,300		
POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS	860,011,153	6	1	\$63,300	\$0	\$0	\$63,300		
SEPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
SANITAS	800,251,440	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
TOTAL			1	\$322,300	\$0	\$0	\$322,300		

ANEXOS
CD
OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

Bogotá D.C., febrero 2 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 050
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701-2020

Señores
Consortio Mejoramiento EP 2020
LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ
Representante Legal
La Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Expedientes digitales

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Esta interventoría bajo el Contrato 701 de 2020, hace la entrega de la documentación recibida por parte la secretaria de hábitat, para la asignación al Consorcio Mejoramiento EP 2020, Quienes desarrollan bajo el No Contrato 694 de 2020, "CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETRIA DISTRITAL DEL HABITAT" de GRUPO 1, para un total de 2 expedientes para remplazo de renuncias de mejoramiento de vivienda.

MV_19084 OCTAVIO NIÑO ECHEVERRI Con cedula de Ciudadanía No 15.898.685
MVUS_0905 LUIS EDUARDO GUATIBONZA Con Cedula de Ciudadanía 79.311.430

Cordialmente,



GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
No CARPETAS 2
No Folios

Recibi:
LUIS FERNANDO CARRILLO
Mejoramiento EP 2020
Director de obra.
Fecha: 05/02/2021
10:00 am

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatgrupo1@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., febrero 03 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020-051
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO

SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS

Calle 52 No 13-64

Ciudad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2021-04029
FECHA: 2021-02-03 15:09 P50 034480 FOLIOS 1
ANEXOS:
ASUNTO: Confirmación de acompañamiento a
citaciones
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
TIPO: REMITE INFORMACIÓN
ORIGEN: INPLAYCO

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Confirmación de acompañamiento a citaciones.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención al comunicado referente a las citaciones programadas para validación el próximo miércoles 03 de febrero del año en curso; nos permitimos informar que se hará acompañamiento del equipo técnico y social de la Interventoría. Y de acuerdo a las directrices emitidas por la SDHT, se debe surtir el proceso en adelante notificando hasta por tercera vez de la misma forma, en caso de no cumplir el objetivo de las visitas por ausencia de los beneficiarios.

CITACIONES:

MVJA_2830	MARÍA LUISA CONTRERAS	MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021, 9:00 AM
MVCB_5209	MARCELINDA MURCIA	LUNES 8 DE FEBRERO DEL 2021, 9:00 AM
MV_04993	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	LUNES 8 DE FEBRERO DEL 2021, 11:00 AM
MVJA_2315	ANÍBAL INFANTE NAVARRETE	LUNES 8 DE FEBRERO DEL 2021, 1:00 PM
MVUS_0905	LUIS EDUARDO GUATIBONZA	MARTES 9 DE FEBRERO DE 2021, 9:00 AM

Cordialmente,

GONZALO LLEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatoruno1@gmail.com

Bogotá, febrero 4 del 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 052
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT.

Asunto: ENTREGA DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE RENUNCIA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MVJA_1119, GERARDO FONSECA ARIAS (copias).

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Realizamos entrega del documento soporte y recibido por el contratista de obra, de la renuncia del MVCB_1119, GERARDO FONSECA ARIAS quien renuncia al subsidio de mejoramiento de viviendas por venta del inmueble, por lo que se realizó el proceso con las profesionales sociales de la interventoría y contratista el cual se encuentra viviendo por fuera de la ciudad.

Este caso fue expuesto en comité el día 22 de enero de 2021, el cual se indico por parte de la SDTH recibir el documento, ya sea escaneado o por correspondencia se recibió por medio de una fotografía y la conversación con el beneficiario en el número telefónico 311 286507.

Anexos:
Renuncia
MVCB_1119 (Copia con la Imagen de la conversación por medio de WhatsApp).

Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,



GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
Folios: 3

Bogotá, D.C.

Señores
Secretaría Distrital del Hábitat
Ciudad

Asunto: Renuncia Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda

Respetados señores(as)

Conforme a mi solicitud, los abajo firmantes beneficiarios y miembros del grupo familiar, renunciamos al Subsidio Distrital de mejoramiento de Vivienda, por el siguiente motivo:

- ☒ A. Venta del predio
- ☐ B. Problemas de Salud
- ☐ C. Fallecimiento beneficiario (a)
- ☐ D. Otro: _____

Cordialmente,

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
Gerardo Fonseca Arias	4762702	Gerardo Fonseca Arias
		4762702

Dirección cl 64 Sur 78 N 27 Teléfono 377866307
Barrio Domingo León II Sector Localidad Ciudad Bolívar

Anexos: _____

12:02   ...  LTE 

  **+57 311 2866507**   
últ. vez hoy a las 12:00 p. m.

25 DE ENERO DE 2021

■ Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

Buenas tardes

Soy la persona de habiat

26 DE ENERO DE 2021

 **Geraldo Fonseca.pdf**

1 página • PDF

3:24 a.m.



0:10

Bogotá, febrero 11 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 053
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: APROBACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Nos permitimos hacer entrega del informe de seguimiento de la implementación de protocolo bioseguridad entregado, siguiendo los lineamientos establecidos en la resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Este protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y es implementado por el **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**, para sus empleados y trabajadores que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL.

Las siguientes son las responsabilidades establecidas:

- Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.
- Se Adopto medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo.
- Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de covid-19.
- Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención para brindar información de la enfermedad por parte de personal SST.
- Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que se desarrolle.
- Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.



INPLAYCO S.A.S.
INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
AL CALIFICAR LA CALIDAD

- Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes.

Se anexa archivo en Excel donde se relaciona cada una de las viviendas coherentes con la factura, el seguimiento es realizado por los profesionales SST de la Interventoría como el del contratista.

Atentamente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
FOLIOS 1



BOGOTÁ		SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Hábitat				
Objeto del contrato		EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 1.								
Contratista		Consortio Mejoramiento EP 2020				INTERVENIENTOS				
		Beneficiario				Trabajadores				
No.	ID DNV	DIRECCIÓN	Km Bioparidad Vivienda	Temperatura Beneficiario	Seguimiento de Bioparidad Beneficiario	Temperatura Trabajadores	Distanciamiento entre Trabajadores	Entrega y Uso de EPP Bioparidad Trabajadores	Seguimiento de Bioparidad Trabajadores	
			cumple	No cumple	cumple	No cumple	cumple	No cumple	cumple	No cumple
1	INVIA_3141	KR 18P 42 A 20 SUR MU	1							
2	INVIA_3146	KR 18P 42A 45 SUR MU	1							
3	INVIA_3336	KR 18P 18S 9 42A 46 SUR MU	1							
4	INVIA_0235	CL 61D SUR 18P 12 8N 5 MU1	1							
5	INVIA_3231	KR 18P 18S A 41B 12 SUR MU	1							
6	INVIA_3119	KR 18P 41A 47 SUR MU	1							
7	INVIA_3672	KR 18M 61 18 SUR MU	1							
8	INVIA_0184	CL 41C SUR 18N 03	1							
9	INVIA_2981	KR 18N 18S 61A 62 SUR	1							
10	INVIA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	1							
11	INVIA_0252	CL 61D SUR 18N 20 MU	1							
12	INVIA_2994	KR 18N 18S 61D 16 SUR	1							
13	INV_16353	CL 109 SUR 9 64	1							
14	INV_18951	CL 104A SUR 6 37 MU	1							
15	INVIA_0436	CL 115 SUR 3 36	1							
16	INVIA_17421	CL 102 SUR 5 49	1							
17	INVIA_1130	DG 86F SUR 18J 18	1							
18	INVIA_1447	CL 70H SUR 18J 20	1							
19	INVIA_1496	KR 18S 70H 10 SUR	1							
20	INVIA_1496	CL 70J SUR 18J 20	1							
21	INVIA_1616	KR 18S 70J 10 SUR	1							
22	INVIA_1417	CL 70J SUR 18L 20	1							
23	INVIA_1407	CL 70J SUR 18L 20	1							
24	INVIA_1409	CL 70J SUR 18L 21	1							
25	INVIA_1416	CL 70J SUR 18L 22	1							
26	INVIA_1470	KR 18S 70C 24 SUR	1							
27	INVIA_1380	CL 70J SUR 18L 22	1							
28	INVIA_1381	CL 70J SUR 18L 25	1							
29	INVIA_1382	CL 70J SUR 18L 30	1							
30	INVIA_1383	CL 70J SUR 18L 34	1							
31	INVIA_1374	CL 70J SUR 18L 11	1							
32	INVIA_1371	CL 70J SUR 18L 23	1							
33	INVIA_1362	CL 70K SUR 18L 64	1							
34	INVIA_1344	CL 70K SUR 18L 32	1							
35	INVIA_1341	CL 70K SUR 18L 20	1							
36	INVIA_1326	CL 70K SUR 18L 29	1							
36			36	0	0	36	0	0	36	0

POR EL CONTRATISTA

LUIS FERNANDO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

Profesional SST
LEDA LIZ LAMAR CASTRO
LIC SST: 26516 SSD del infranctico

POR LA INTERVENTORIA

GONZALO LIEVANO ROYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Profesional SST
ROBERTO ROJAS TORRES
LIC SST: 14885 SSB

Bogotá, febrero 12 de 2020

INP- SDHT-G1- 2020- 054
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT.

Asunto: CERTIFICADO ENTREGAS VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 694 2020

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, certifico que se hizo entrega de 36 viviendas correspondientes al contrato de obra 694 2020, por parte del contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**. Estas entregas se realizaron en el mes de enero de 2021 y corresponden al corte No 3.

CORTE 3		
MVJA_3141	MV_18353	MVCB_1407
MVJA_3146	MV_18951	MVCB_1409
MVJA_3335	MVUS_0638	MVCB_1380
MVJA_0259	MV_17421	MVCB_1381
MVJA_3231	MVCB_1130	MVCB_1382
MVJA_3119	MVCB_1467	MVCB_1383
MVJA_2672	MVCB_1495	MVCB_1374
MVJA_0186	MVCB_1493	MVCB_1371
MVJA_2981	MVCB_1516	MVCB_1352
MVJA_2909	MVCB_1417	MVCB_1344
MVJA_0252	MVCB_1416	MVCB_1341
MVJA_2996	MVCB_1470	MVCB_1328

Atentamente


GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C.19.100.962
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S



Bogotá, febrero 17 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 056
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
Consorcio Mejoramiento EP 2020
LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ
Representante Legal
La Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Requerimientos a calidad de obras en el MV_21283 y MVUS_0707

Cordial saludo.

En visita técnica realizada el día de hoy para verificar la calidad y avance de las obras proyectadas para el mejoramiento de las viviendas relacionadas en el asunto, me permito poner en su conocimiento las observaciones y requerimientos efectuados por la interventoría técnica a las obras que se están ejecutando, los cuales quedaron debidamente registrados en la bitácora de obra:

1. MV 21283: KR 7 115 15 SUR - ANTONIO JOSE DE SUCRE III – USMINIA

En el apto. No. 1:

- Falta enchapar pañetar y enchapar los laterales de las moquetas del lavadero e instalar el win correspondiente.
- Falta detallar y luego pintar con vinilo que permita un buen terminado, el área del pañete perimetral en acceso al baño.
- Falta pañetar y enchapar las moquetas del mesón de la cocina.
- Falta terminar enchape de piso del área de cocina.
- Se reiteró el requerimiento de corregir el acabado de la boca puertas en gravilla, los cuales presentan hendiduras y falta de agregado en algunas áreas, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha tenido en cuenta lo solicitado.
- Se requirió y recordó que en todas las esquinas que formen dos planos de enchape cerámico se deben terminar con win metálico, dado que en algunos sitios no se ha efectuado esta actividad.

Recibido
18/02/21

- Igualmente, el terminado donde se encuentran dos o más win metálico instalado en el mesón de cocina debe mejorarse, ya que se está generando filos cortantes que pueden llegar a causar heridas a los habitantes de la vivienda.
- Se requirió afinar el pañete ubicado sobre el enchape de pared de la cocina, teniendo en cuenta que se pintó sin tener en cuenta este detalle para dar la mejor terminación a esta zona.

En el apto. No. 2:

- Se requirió retirar pieza del enchape frontal del mesón superior de cocina, el cual debe seguir la misma línea del enchape instalado en la parte horizontal del mesón.
- Falta pañetar e instalar el enchape de las mochetas del mesón de la cocina.
- En todas las esquinas donde se encuentren dos planos de cerámica debe instalarse win metálico.
- Se debe retirar el enchape de la zona posterior de la columna contigua al mesón de la cocina, e instalarlo de tal manera que coincida la línea de junta con la del enchape de pared de la zona de lavandería.
- Debe corregirse el emboquillado del enchape instalado en mesón de cocina y zona de lavandería.
- Falta pañetar y enchapar las mochetas del lavadero.
- Debe corregirse el acabado de la boca puertas y franjas en gravilla, el cual presenta huecos y no hay uniformidad en su acabado.

2. MVUS_0707: KR 4 115 21 SUR - VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA

- El enchape de los frontales de los mesones superior e intermedio de la cocina de la zona social, deben conservar el mismo ancho en toda su longitud.
- La unión de los guardas escobas que se encuentren en esquinas, debe quedar a tope.
- Se reiteró el cambio de las tabletas cerámicas del piso de alcobas y sala que presentan vacíos.

Esta interventoría advierte que no recibirá ninguna obra que no esté ejecutada con la calidad y especificaciones requeridas.

Se le recomendó al contratista de obra tener en cuenta las observaciones y requerimientos anotados, y efectuar las correcciones necesarias para llevar a buen término la ejecución y recibo a satisfacción de las obras proyectadas para el mejoramiento de la vivienda.

Cordialmente,


GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C.19.100.962

REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S

Anexo: Registro fotográfico (7 fotos)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV 21283

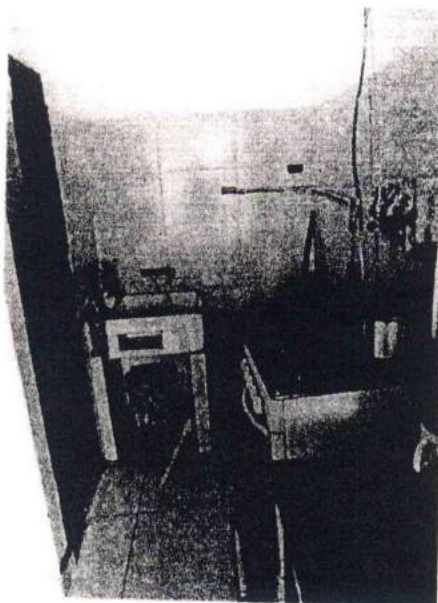


Foto 1: Se observa las moquetas de lavadero del apto. No. 1, falta enchape de laterales e instalación del win metálico

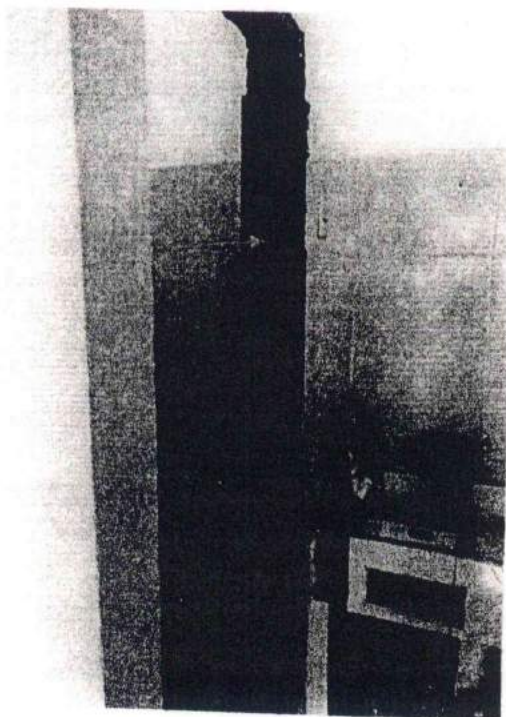


Foto 2: Dar terminación y pintar para dar el mejor acabado al pañete del muro de entrada al baño en el apto. 1

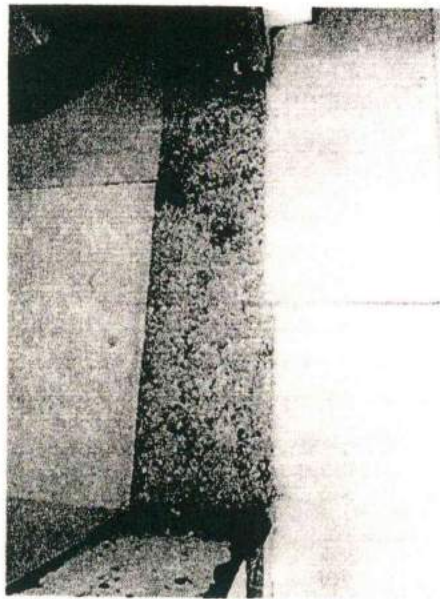


Foto 3: Detalle del pésimo acabado y terminación en la ejecución de los boca puertas en gravilla



Foto 4: Se aprecia el estado del pañete ubicado sobre el enchape del mesón de cocina del apto. 1, el cual se pintó sin dar la terminación adecuada para mejorar el acabado del área de cocina

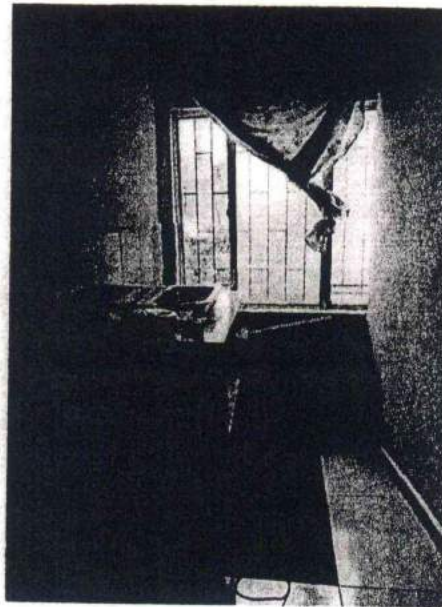


Foto 5. Mejorar la terminación de las uniones de los win en el mesón de cocina del apto. 1, el cual presenta filos cortantes que pueden llegar a causar heridas a los habitantes de la vivienda

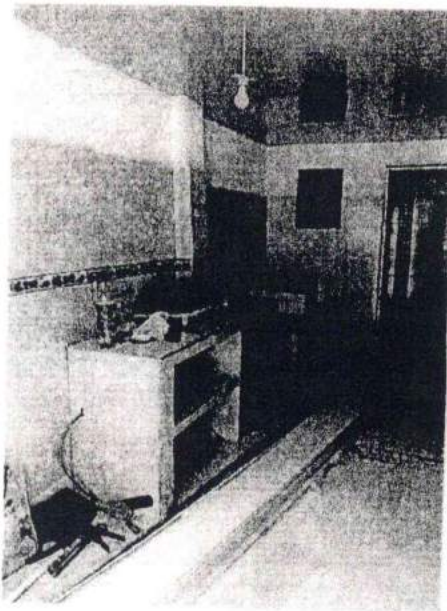
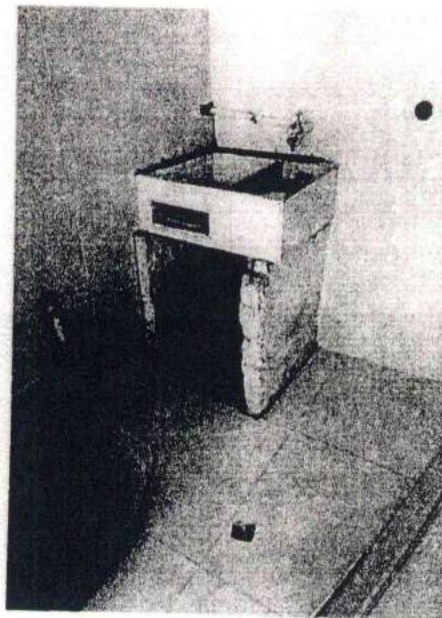


Foto 6: En el apto. No. 2, falta enchapar laterales internos de mesón de cocina y mochetas del lavadero, e instalar los win para dar terminación a las esquinas del enchape

Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
INPLAYCO S.A.S.
NÚMERO DE RESPUESTA: 1-2021-06933
FECHA: 2021-02-22 14:13 PRO 740752 FOLIOS: 1
ANEXOS: 126 - 1 cd
ASUNTO: respuesta radicado No. 2-2020-50376
Inf. No.
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación General
TIPO: REMITE INFORMACIÓN
ORIGEN: INPLAYCO

INP- SDHT-G1- 2020- 057
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad


REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Respuesta al Radicado No 2-2020-50376. Inf. No 1

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención a la presente entregamos el informe número 1, según los requerimientos indicados en el anexo técnico de interventoría el cual se anexa dicha documentación de manera digital y física. Cuya relación se encuentra en los anexos en el cd.

Cordialmente,


GONZALO MÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S.
Anexo 1- No de folios 123 -Cd 1

TOTAL: 126

123

162



RELACION DE ANEXOS EN CD

N° DE CARPETA	SUBCARPETA	CONTENIDO
01 TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	Informe técnico mes de Noviembre 2020
02 SOCIAL	INFORME SOCIAL	1. Informe mensual
		2. Registro fotográfico (7 páginas)
		3. Matriz de interventoría
03 SISO	1. INFORME INTERVENTORÍA SISO - G1	INFORME INTERVENTORÍA SISO - G1
	2. DOCUMENTOS PERSONAL DEL	CONSORCIO Documentos del personal del consorcio
		JALISCO OPERATIVO: Documentos personal Operativo ubicado en el área de Jalisco
		JUAN PABLO OPERATIVO: Documentos personal Operativo ubicado en el área de Juan Pablo
	3. AFILIACIONES Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	SEG. SOCIAL CONSORCIO: Afiliaciones del personal del Consorcio
		SEG. SOCIAL INTERVENTORÍA: Pagos de la seguridad social personal Interventoría
	4. CHARLAS NOVIEMBRE	Charlas Noviembre
	5. INCAPACIDAD MEDICA	Incapacidad Juan Andrés Corredor Mayorga – accidente no laboral
	6. VALES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	Vale escombro Cemex
	7. ENCUESTAS DE SALUD DE INTERVENTORÍA	Encuestas de Salud interventoría



COPIA

Bogotá, febrero 17 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 057
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: CORTE No 3

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, adjuntamos y se certifica que se hizo entrega de 36 viviendas correspondientes al contrato de obra 694 -2020 que hace parte del corte No 3, entregada por el **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**. Firmadas para el trámite correspondiente.

Atentamente


GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C.19.100.962
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
Folios 84


María Guisela Serrano P.
Transmisionera Social
R.E. 149791012-1
Indagado a Mon.
19 de febrero 2021

Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 057-A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701-2020

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO

SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS

Calle 52 No 13-64

Ciudad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.

1-2021-06935

FECHA: 2021-02-22 14:15 PRO 740754 FOLIOS: 1
ANEXOS: 58 + 1 cd

ASUNTO: Informe Semanal 3 mes noviembre
OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL
HÁBITAT.

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL
HÁBITAT.**

Asunto: INFORME SEMANAL 3 MES NOVIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención a la presente entregamos el informe semanal 3, según los requerimientos indicados en el anexo técnico de interventoría el cual se anexa dicha documentación de manera digital fotos y física. Cuya relación se encuentra en el anexos cd.

Cordialmente,



GONZALO MEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
Anexo Inf Semanal 3 folios 67-Cd 1



Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 057-B
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad


REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: INFORME SEMANAL 4 MES NOVIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención a la presente entregamos el informe semanal 4, según los requerimientos indicados en el anexo técnico de interventoría el cual se anexa dicha documentación de manera digital fotos y física. Cuya relación se encuentra en el anexo cd.

Cordialmente,


GONZALO MEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S
Anexo Inf Semanal 4 folios 65- Cd 1

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitaruno1@gmail.com

Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

COPIA

INP- SDHT-G1- 2020- 058
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.

1-2021-06927

FECHA: 2021-02-22 14:00 PRO 140745 FOLIOS: 1
ANEXOS:
ASUNTO: confirmación de acompañamiento a
citaciones
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
TIPO: REMITE INFORMACIÓN

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO **ES REALIZAR LA**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL
HÁBITAT.

Asunto: Confirmación de acompañamiento a citaciones.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención al comunicado referente a las citaciones programadas para validación el próximo sábado 20 de febrero del año en curso, nos permitimos informar que se hará acompañamiento del equipo técnico y social de la Interventoría. Y de acuerdo a las directrices emitidas por la SDHT, se debe elaborar acta de labor en el vecindario como soporte de la gestión realizada.

CITACIONES:

Nº CITACIÓN	MV	NOMBRE	DESARROLLO	HORA
3	MV_04993	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	EL PARAÍSO	11:00 AM
3	MVCB_5209	MARCELINDA MURCIA	VILLAS EL DIAMANTE	9:00 AM
3	MV_0905	LUIS EDUARDO GUATIBONZA	NUEVO SAN LUIS	9:00 AM
2	MVBL_1875	MARIA LUZ BONILLA	LAS MARGARITAS III	9:30 AM

Cordialmente,



GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx



Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 059
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
 Calle 52 No 13-64
 Ciudad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
 AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2021-06929
 FECHA: 2021-02-22 14:03 PRO 740747 FOLIOS 3
 ANEXOS: 8
 ASUNTO: Entrega unilateral MVJA 0890
 DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
 TIPO: REMITE INFORMACIÓN
 ORIGEN: INPLAYCO

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: ENTREGA UNILATERAL MVJA 0890

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente y conforme a los compromisos establecidos para la entrega de las actividades de la Vivienda, se genera el presente informe, en el cual se establecen los sucesos que se presentaron con la entrega del predio identificado con el MVJA 0890, beneficiario Hernán Humberto Parra, a quien el pasado 25 de noviembre del año 2020, se da apertura de obras de mejoramiento de vivienda (anexo 1). Desde el área de SST se explica y realiza protocolo de bioseguridad frente al COVID 19. Se socializa acta de autorización para el ingreso a la vivienda, la cual está firmada a conformidad por el beneficiario (anexo 2), desde el área técnica se socializa el presupuesto de obra de la vivienda atendiendo las inquietudes del beneficiario quien firma el presupuesto a conformidad (anexo 3).

ENTREGA UNILATERAL MVJA 0890
 BENEFICIARIO: HERNAN HUMBERTO PARRA
 IDENTIFICACION: CC: 4 149 771
 DIRECCION: CL 63 B SUR 18K-56

FECHA DE INICIO DE OBRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE
 FINALIZACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

PRESUPUESTO DE VALIDACIÓN INICIAL: \$ 10. 1 10.603 PRESUPUESTO
 EJECUTADO: \$ 10. 110.603

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
 Teléfono 6181167 Telefax 6180878
 Website: www.inplayco.com.co
 Email inplayco@yahoo.com.mx

Desde el área social se realiza acciones pedagógicas para fortalecer medidas preventivas:

- Despejar las áreas de intervención y proteger los elementos y objetos de la vivienda
- Tener en cuenta que se deja un espacio para acopio de escombros para no dejarlos en la calle.
- Se explican las acciones de intervención, se cuenta con la aprobación de beneficiario.

El día 2 de diciembre de 2020 se realiza visita social con el acompañamiento del personal siso, técnico y social de la interventoría, se evidencia que el beneficiario se encuentra de viaje, pero se dialoga con el beneficiario e hija quien autoriza el ingreso del material y comienzo de obras respectivo. El día 05 de diciembre se realiza visita social y técnica por parte de la interventoría, donde se dialoga con Emilce Parra quien es la hija del beneficiario, manifiesta la preocupación ya que no han traído material ni trabajadores. Se solicita al contratista que inicie labores lo más pronto posible.

El 08 de diciembre se realiza visita de seguimiento de contratista e interventoría, la visita es atendida por un familiar del beneficiario quien manifiesta inquietudes sobre el alistamiento del piso, la inquietud se atiende y se resuelve por parte del área técnica. Se evidencia avance en trabajos constructivos y personal laborando y finalmente atiende el beneficiario, se debe dar mayor ritmo a la ejecución. El beneficiario manifiesta inquietud sobre el desagüe y se informa que será consultado en comité técnico para dar alcance a su solicitud, referente a que el desagüe este seguro se da claridad al beneficiario sobre el trabajo a realizar en mesón de la cocina.

El 15 de diciembre se realiza visita de seguimiento por parte del área social y técnica del contratista se evidencia avance de obra en cuanto a enchapes e instalaciones. El beneficiario manifestó algunas inquietudes técnicas referentes al cielo raso y presupuesto. Desde el área técnica se dan las explicaciones normativas para instalaciones de PVC cielo raso y como se concluye. Se implementará el presupuesto de este ítem en otras actividades prioritarias. Se recomienda al beneficiario el Sr Hernán Parra realizar la adecuación de instalaciones eléctricas pendientes para poder avanzar en el mejoramiento. No se presentan más situaciones y el beneficiario manifiesta estar conforme con las labores realizadas.

18 de diciembre: se realiza visita de seguimiento técnico y social de interventoría, encontrando al beneficiario conforme con la obra, sin embargo, manifiesta inquietud de cielo raso en sala y habitación principal 1 lo cual se aclara que no se ejecutara por que presentan altura inadecuada La altura útil entre el cielo raso y el piso de la habitación debe ser de 2,40 m para no generar un ambiente sofocado y encerrado

El 19 de diciembre: Se realiza visita de seguimiento técnico-social de interventoría y técnico del contratista, al beneficiario manifiesta estar conforme con las actividades ejecutadas y el personal encargado.

El 22 de diciembre: Se realiza visita de seguimiento por parte de áreas técnicas de contratista y de interventoría. Durante la visita el beneficiario manifestó inquietudes sobre las instalaciones de del proyecto cielo raso, nuevamente se explica la normatividad para justificar la razón por la cual no es posible instalar este cielo raso en la vivienda, pero también se reitera que esta actividad de cielo raso en PVC se reemplaza por otras actividades que contempla el mejoramiento de vivienda.

Nota aclaratoria; se explica que las actividades por las cuales se realiza el cambio del cielo raso son:
Muro de la escalera
Alistamiento en los pisos
Mampostería en cocina
Lavadero y adecuación para el mismo


Cordialmente,



GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S.

ANEXOS (1)

Acta de Inicio de obra



2. Equipe de monitoria que faz o acompanhamento de todo o processo de implementação da política de saúde da família, avaliando a qualidade da assistência e a satisfação da população.

Anexo 2

Autorización de Ingreso a la vivienda

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LA VIVIENDA

Yo, Don Juan Carlos Rodríguez, titular de la vivienda ubicada en Calle 12 No. 45-47, Barrio San José, Ciudad de Panamá, declaro que autorizo el ingreso a la misma a Don Juan Carlos Rodríguez, con Cédula de Identidad No. 12345678, para que realice las gestiones necesarias para la obtención de la Permiso de Construcción de la Edificación que se encuentra en proceso de construcción en la vivienda.

En fe de lo cual, firmo y sello en la ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de Julio del año 2018.




Don Juan Carlos Rodríguez
Cédula de Identidad No. 12345678

Don Juan Carlos Rodríguez
Cédula de Identidad No. 12345678

El presente documento es válido por un periodo de 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para fines de inscripción o cancelación de la vivienda en el Registro Público.


Presupuesto inicial de obra


Fotos Durante

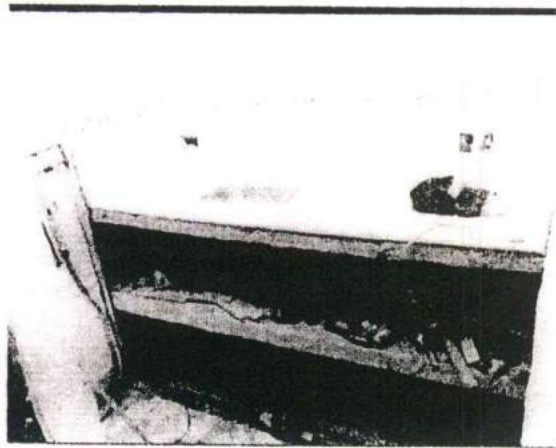


Anexo 4

Fotos antes de Mejoramiento de Vivienda

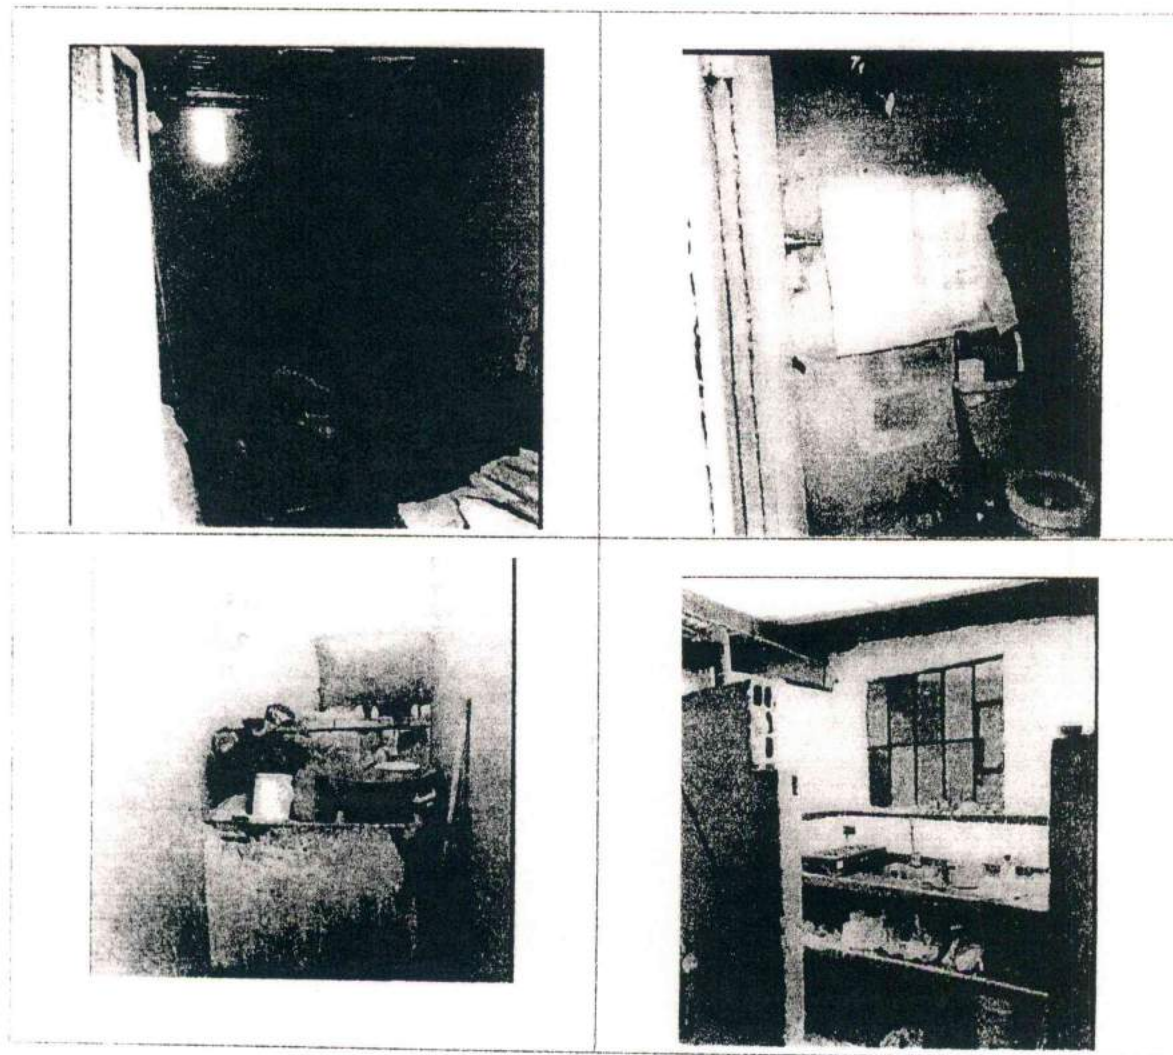



Fotos Después

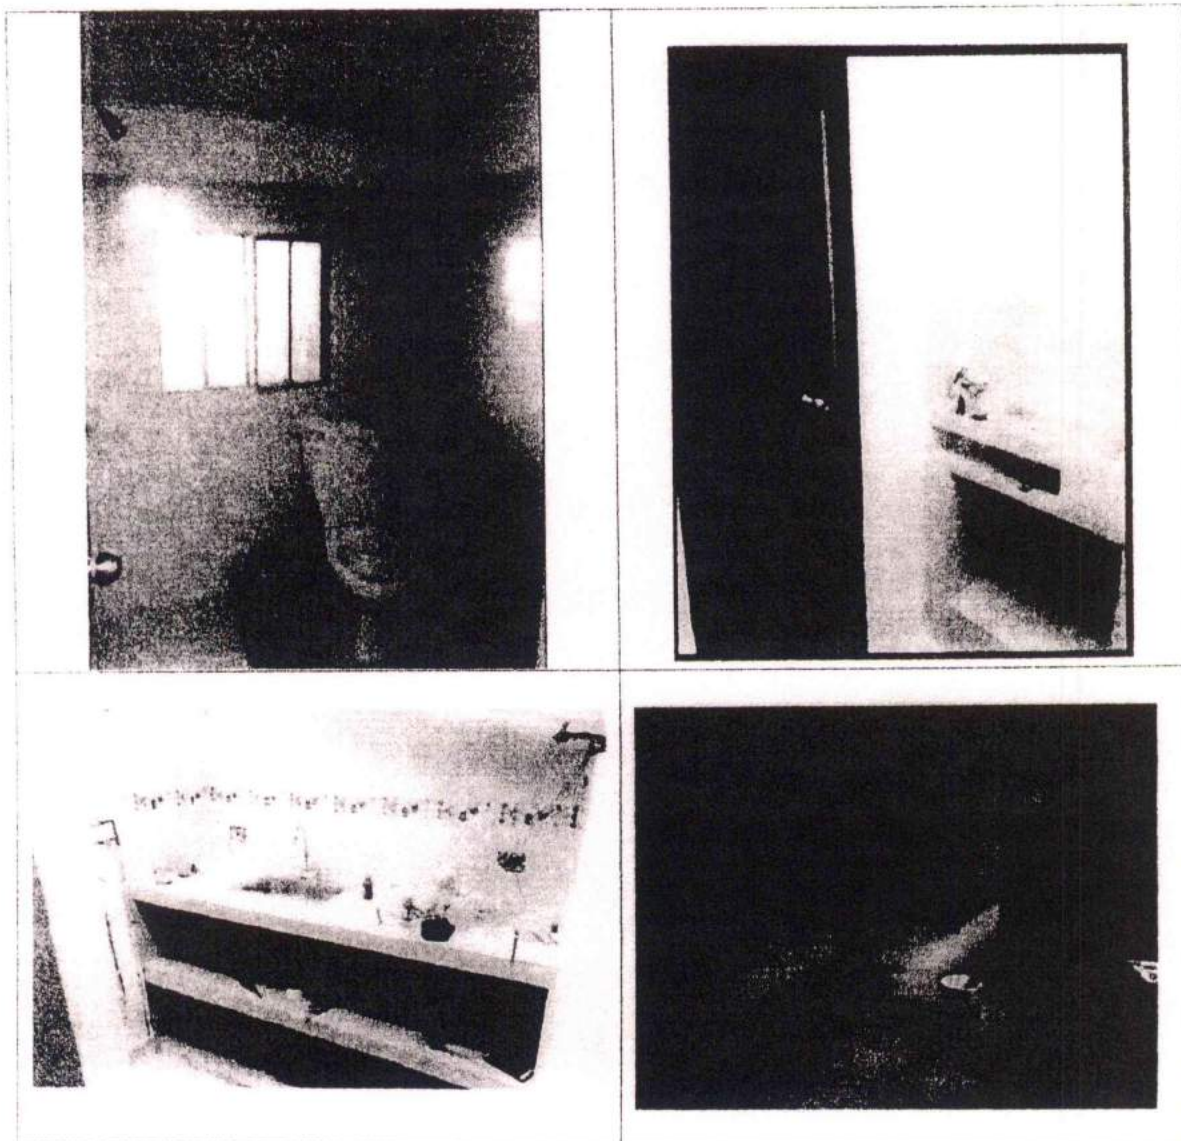


Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 060
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES **RENTA DE VIVIENDA**
INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL
HÁBITAT.



Asunto: Entrega de expedientes de renuncias


Estimados señores reciban un cordial saludo.


En atención al proceso adelantado en los casos de las viviendas relacionadas a continuación, nos permitimos hacer entrega de los expedientes con sus respectivos soportes en los que se puede apreciar el deseo de renuncia de los beneficiarios por los motivos expuestos dentro de sus documentos.

CITACIONES:

N°	MV	NOMBRE	DESARROLLO	FOLIOS
1	MVJA_2315	ANIBAL INFANTE NAVARRETE	LUCERO MEDIO	31
2	MVCB_2993	CARLOS JULIO CÁRDENAS T.	JUAN PABLO II	19
3	MVCB_1314	BERTHA LUCÍA LÓPEZ PEÑA	NUEVA COLOMBIA	24 *
4	MVJA_1119	GERARDO FONSECA ARIAS	DOMINGO LAÍN II Y CONDominio EL BOSQUE	24 *
5	MVJA_2414	MARÍA ELENA RINCÓN RINCÓN	LUCERO MEDIO	32

Cordialmente,


GONZALO MEVIANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S


Isabel Serrano P.
Trabajadora Social
R.P. 149791012-1
19 de febrero de 2021

* *1/2 tienen papeo radicado de Renuncia
tramitado ante la SDHT*
Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatuna1@gmail.com

1791



INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR

1-2021-06926

FECHA: 2021-02-22 13:59 PRO: 740744 EDUJOS

INP-SDHT-G1-2020-061

CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

ANEXOS: 6

TIPO: REMITE INFORMACIÓN

ORIGEN: INPLAYCO

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO

SUB DIRECCION DE BARRIOS

Calle 52 No 13-64

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

Asunto: Informe de caso especial, MVJA_2830.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención a lo solicitado en la última visita al predio en mención, nos permitimos allegar el informe con el registro fotográfico de la gestión adelantada por el contratista e interventoría ante el caso.

BENEFICIARIA	MV	DIRECCIÓN	TCO-LOCALIDAD
MARÍA LUISA CONTRERAS	MVJA_2830	KR 18M BIS 62 16	Altos de Jalisco – Ciudad Bolívar.
SANABRIA		SUR	

Para verificación de lo expuesto se anexan las actas correspondientes, (_5_) folios.

Atentamente,

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatgrupo1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INFORME DE GESTIÓN

MVJA_2830: MARÍA LUISA CONTRERAS SANABRIA

Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer a la Secretaría Distrital de Hábitat, el proceso hecho con una de las viviendas ubicadas en el barrio Altos de Jalisco, pues la beneficiaria y su núcleo familiar se niegan a cumplir con algunas obligaciones establecidas en la normativa que enmarca el proceso contractual del contrato.

A continuación, se relacionan detalladamente las visitas, fechas, registro fotográfico y una breve reseña de lo sucedido en cada una de éstas:

Noviembre 30 de 2020:

Esta primera visita se hace con el objetivo de caracterizar la vivienda, se encuentra a la beneficiaria, quien refiere que junto a su esposo siempre han sido quienes ejercen las labores constructivas de la vivienda, por lo que solicita e contratista entregue el material de trabajo para que ellos mismos hagan las mejoras, agrega que prefiere llevar acabo la reunión cuando su esposo se encuentre en la residencia, pues ella no toma determinaciones sin su consentimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Diciembre 10 de 2020:

Esta visita la programó telefónicamente la P. Social del contratista, pero al acercarse al predio en compañía de los demás profesionales técnicos y P. Social de la interventoría, no responden el llamado a la puerta. Por lo tanto, se realiza acta de visita fallida.



Diciembre 11 de 2020:

Dado que la beneficiaria al parecer no se encontraba el día anterior en la vivienda, se acercan nuevamente los equipos técnicos y sociales del contratista y la interventoría, en esta visita la beneficiaria continúa mostrándose renuente a la metodología del proceso de mejoramiento de vivienda indicando que ellos siempre serán quienes hagan los arreglos en su predio.




Diciembre 14 de 2020:

Por cuarta vez los equipos se acercan al predio con el fin de proceder a la caracterización, pero quien lo recibe en esta ocasión es el esposo de la beneficiaria expresándose con palabras soeces, aduciendo que el contratista no funge como corresponde en sus labores y desea demandar por casos ajenos al de su vivienda, el área social intenta sensibilizar al señor, pero se retiran por los gestos agresivos que tiene con los profesionales.

Teniendo en cuenta lo sucedido y en aras de salvaguardar la integridad de los profesionales asistentes, se envía notificación por correo certificado el 21 de diciembre de 2020, con el fin de soportar la gestión ante el subsidio de mejoramiento; la misma queda programada para el 28 de diciembre de 2020, a las 8:30 AM.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

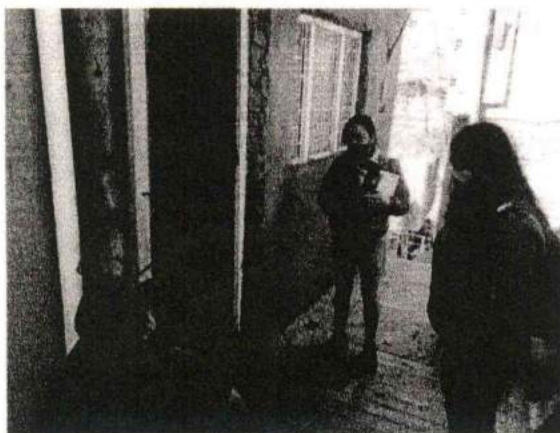

Diciembre 28 de 2020:

Se asiste en la fecha y hora informada, al llegar los equipos se encuentra a la beneficiaria, quien se niega a permitir el acceso a la vivienda y aunque atiende la visita por la ventana no acata la solicitud hecha por los profesionales de usar el tapabocas.

En esta visita se comunica a la Señora María Luisa que en atención a la reunión de inicio a la que asistió el 6 de noviembre del 2020, en la cual aceptan los compromisos como propietarios de los inmuebles en lo correspondiente al subsidio de mejoramiento de vivienda y según la normativa expuesta allí, lo siguiente:

- Normativa
- Modalidad o metodología del subsidio
- Etapas de la licitación y mejoramiento de vivienda
- Funciones del contratista y la interventoría

Sin embargo, continúa negando el acceso de los profesionales, agrega solicitud de entrega de materiales al núcleo familiar para labores propias, pero se enfatiza que no es el procedimiento.

Se refiere a la señora María Luisa que se programará visita nuevamente a través de correo certificado para la trazabilidad del proceso.

De acuerdo a la visita fallida, el contratista proyecta nueva visita, por lo que envía carta de citación el 30 de diciembre de 2020, programada para el 6 de enero de 2021.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Enero 6 de 2021:

En esta visita se acercan los equipos técnicos y sociales de contratista e interventoría encontrando a la beneficiaria, quien no permite el acceso al predio. Por consiguiente, se reiteran las obligaciones del hogar frente al subsidio de mejoramiento de vivienda, se hace entrega de la resolución 100 de 2018 y el decreto 623 de 2016 para su lectura y conocimiento; además se recalca la metodología de asignación del subsidio, el proceso de licitación, los precios manejados, las etapas durante la validación, ejecución y finalización.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

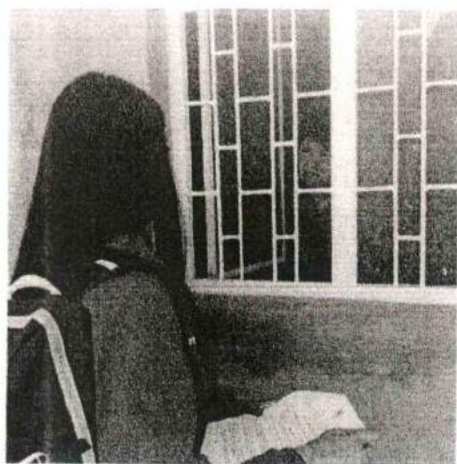

Febrero 3 de 2021:

Para concluir y evidenciar el proceso con la beneficiaria, se visita para constatación por parte de la P. Social de la SDHT María Isabel Serrano Piraquive, logrando contacto con la señora María Luisa (por la ventana), a quien se le indaga las razones consideradas para negar el la metodología de intervención del subsidio, ella aduce que no está de acuerdo con la metodología del subsidio, solicitando la entrega de los materiales para hacer las obras con su propio personal, o sea su familia. Se le explica que el subsidio establece en su normativa la entrega de actividades totalmente finalizadas, refuta indicando más experiencias de los vecinos, a lo que se le responde que ante la SDHT no se han presentado quejas de residentes del sector.

Se intenta persuadir para que tome oportunamente el subsidio, teniendo en cuenta que ya fue aprobado, pero sigue expresando renuencia; se ofrece la posibilidad de renuncia, la cual tampoco acepta; por lo tanto, se informa que se hará un acta de la visita, la cual no firma y se hace negar al volverla a llamar a la puerta.

Se firma el acta por los demás asistentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Con base en lo anterior y considerando agotados los recursos como contratistas de obra e interventores en el contrato 694 y 701 de 2020, frente a los que sucede con la beneficiaria referenciada, nos permitimos allegar este informe con los soportes que dan fe de la trazabilidad y gestión mancomunada para lograr positivamente las labores, para que se tomen las medidas que consideren.

Bogotá D.C., febrero 24 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 062
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Entrega de expedientes de casos especiales


Estimados señores reciban un cordial saludo.


En atención al proceso adelantado en los casos de las viviendas relacionadas a continuación, nos permitimos hacer entrega de los expedientes con sus respectivos soportes en los que se puede apreciar se surtió el debido proceso por parte del contratista y la interventoría.

CITACIONES:

Nº	MV	NOMBRE	DESARROLLO	FOLIOS
1	MVUS_0905	LUIS EDUARDO GUATIBONZA	NUEVO SAN LUIS	67
2	MVCB_5209	MARCELINDA MUCIA	VILLAS EL DIAMANTE	33
3	MV_04993	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	EL PARAÍSO	39
4	MVJA_2830	MARIA LUISA CONTRERAS	ALTOS DE JALISCO	49

Cordialmente,


GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S


Se recibe el día
26 de febrero de 2021
3:00pm
en Antonio José de
Siqueira
No adjunto informe.
Pendiente
Rodrigo
SDHT

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatarupo1@gmail.com



INPLAYCO

Comite del 25/02/2021

4:00 pm 180

Enviado Correo electronico

Bogotá, febrero 26 de 2021

INP- SDHT-G1- 2020- 063
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

Señores
Consortio Mejoramiento EP 2020
LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ
Representante Legal
La Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: AVISO ATRASO EN PROGRAMACION DE ENTREGAS.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

En cumplimiento con el control y vigilancia que debe realizar la interventoría en la ejecución de los trabajos. Esta interventoría le informa **al Consortio Mejoramiento EP 2020**, que presenta un atraso en la programación de entregas de ejecución de obras, queremos recordar el compromiso adquirido y lo descrito en la **CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION** subrayado fuera de texto. Que los tiempos de ejecución y tiempo de entrega a la fecha presentan 17 días de retraso en el cumplimiento de los mejoramientos de vivienda según programación.

VIVIENDAS TERMINADAS AL 100%

Entre el 9 y 10 de febrero según programación, correspondería a 129 viviendas ejecutadas equivalentes al 50,79% de ejecución.

ENTREGADAS AL 25 DE FEBRERO

A la fecha del 25 de febrero se han entregado 112 mejoramientos los cuales equivalen al 44,09%, de la ejecución, el cual señalan un atraso de 15 días y 17 viviendas por entregar el cual refleja un atraso del 6.69%.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com
interhabitacion1@gmail.com

[Handwritten signature and date 17/2/2021]

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de CINCO (5) MESES contado a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se establece el plazo de cinco meses calendario teniendo en cuenta:

En la tabla anexa se indican los tiempos de obra programados para las entregas desde la fecha de apertura de los mismos MV, lo que evidencia un atraso en la terminación de obras.

NOMBRE	COMIENZO	FIN
JALISCO	vie 18/12/20	mié 10/02/21
DOMINGO LAIN I	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1096	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2469	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2756	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2342	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2343	jue 14/01/21	mar 9/02/21
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO EL BOSQUE	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1085	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1119	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1194	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2476	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2598	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2763	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_0723	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1129	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2479	jue 14/01/21	mar 9/02/21
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1377	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_3257	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1386	jue 14/01/21	mar 9/02/21
COLMENA	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2062	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2077	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1896	jue 14/01/21	mar 9/02/21
DOMINGO LAN III SECTOR	jue 14/01/21	mié 10/02/21
MVJA_3105	jue 14/01/21	mié 10/02/21
SAN LUIS	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1876	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_3776	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_1776	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2005	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2051	jue 14/01/21	mar 9/02/21
VISTA HERMOSA	jue 14/01/21	mar 9/02/21


MVSH_005	jue 14/01/21	mar 9/02/21
GIBRALTAR SUR	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_2395	jue 14/01/21	mar 9/02/21
LA ESPERENZA	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVJA_3607	jue 14/01/21	mar 9/02/21
VILLAS EL DIAMANTE	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5110	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5122	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5295	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5128	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5129	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5156	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5157	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5209	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5252	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5349	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5388	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5395	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5474	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5486	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5012	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5118	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5314	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5464	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5482	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5491	jue 14/01/21	mar 9/02/21
MVCB_5489	jue 14/01/21	mar 9/02/21

Por lo anterior esta interventoría solicita al Consorcio Mejoramiento EP 2020, presentar e implementar de forma inmediata y urgente un plan de contingencia para subsanar los atrasos presentados, llevando así el objeto del contrato a una situación de normalidad.

Este impase deberá ser subsanado implementando las medidas necesarias antes de 8 días.

Compromiso adquirido en comité virtual realizado el día jueves 25 de febrero con la supervisión del proyecto SDHT.

Agradecemos la atención prestada.


 GONZALO LEIVANO HOYOS
 C.C. 19.100.762 DE BOGOTÁ D.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatorupo1@gmail.com

Bogotá, febrero 26 de 2021



Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

INP- SDHT-G1- 2020- 064
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.

1-2021-08426
FECHA: 2021-03-02 15:12 PRO. 744126 FOLIOS 1
ANEXOS:
ASUNTO: solicitud de MV digitales
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
TIPO: REMITE INFORMACIÓN
ORIGEN: INPLAYCO

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT.

Asunto: SOLICITUD DE MV DIGITALES No MVCB_3534-MVCB_3540-MVCB_3537-MVCB_3523- MVCB_3524.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

La presenté es para informar que esta interventoría reviso la documentación recibida en medio físico, en la cual se relaciona la identificación de los Mejoramientos de vivienda que suplirán los retiros que se han venidos efectuando por algunos beneficiarios., para poder realizar la validación de los inmuebles a intervenir de manera más ágil, solicitamos de manera cordial sean allegados de manera digital esta documentación; a continuación, relacionamos dicha información para su pronta entrega.

MVCB_3534 MARIA RODRIGUEZ GAMES 23.605.642
MVCB_3540 SANDRA PATRICIA BETANCOUR 52.299.628
MVCB_3537 EDILY JIMENEZ OSORIO 24601650
MVCB_3523 BLANCA INES RAMIREZ- C.C 41.483.297
MVCB_3524 REINED DE JESUS RODRIGUEZ C.C 14211551.

Agradecemos la atención prestada.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SA

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatgrupo1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA 140



Bogotá D.C., febrero 26 de 2021

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CONTRATO DE INTERVENTORIA 701-2020

1-2021-08427

FECHA: 2021-02-02 16:14 PRO T4165 FOLIOS: 9
ANEXOS: 9
ASUNTO: Informe de casos especiales
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
TIPO: REMITE INFORMACIÓN
ORIGEN: INPLAYCO

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Asunto: Informes de casos especiales MVUS_0905, MV_04993 y MVCB_5209.


Estimados señores reciban un cordial saludo.

En atención a lo solicitado en la última visita al predio en mención, nos permitimos allegar el informe con el registro fotográfico de la gestión adelantada por el contratista e interventoría ante el caso.

BENEFICIARIA	MV	DIRECCIÓN	TCO-LOCALIDAD
LUIS EDUARDO GUATIBONZA GUATIBONZA	MVUS_0905	CARRERA 5 A N° 111 B 21	Nuevo San Luis – Usminia.
MARCELINDA MURCIA	MVCB_5209	DIAGONAL 69 Q SUR N° 18 N 73	Villas el Diamante – Ciudad Bolívar
ROSALBINA ZABALA MENDOZA	MV_04993	CALLE 70 T SUR N° 27 C 23 MJ 1	El paraíso – Ciudad Bolívar

Se anexan nueve (9) folios.

Atentamente


GONZALO LEVANO HOYOS
C.C. 19.100.982 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
interhabitatgrupo1@gmail.com

INFORME DE GESTIÓN

MVUS_0905: LUIS EDUARDO GUATIBONZA GUATIBONZA


Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer a la Secretaría Distrital de Hábitat, el proceso hecho con la vivienda que se entregó por la entidad como reemplazo a la renuncia presentada durante la primera fase de la programación. Esta vivienda está ubicada en la Carrera 5 A N° 111 B 21, barrio Nuevo San Luis, localidad de Usme.

A continuación se relacionan detalladamente las llamadas, visitas, fechas, registro fotográfico y una breve reseña de lo sucedido en cada una de éstas:

En primera instancia, el equipo social del contratista e comunica telefónicamente con el beneficiario el 26 de enero de 2021, a las 2:00 PM, recibiendo como respuesta que no puede acercarse a su predio en los próximos días por cuestiones laborales. Sin embargo, se procede a visitar el predio el 28 de enero del año en curso, en la cual no se encuentra a ningún miembro del grupo familiar, por lo mismo, se hace labor de vecindario, indagando con residente cercano, quien indica que debido al trabajo el señor Luis Eduardo no se encuentra nunca durante el día y que vive solo.

Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

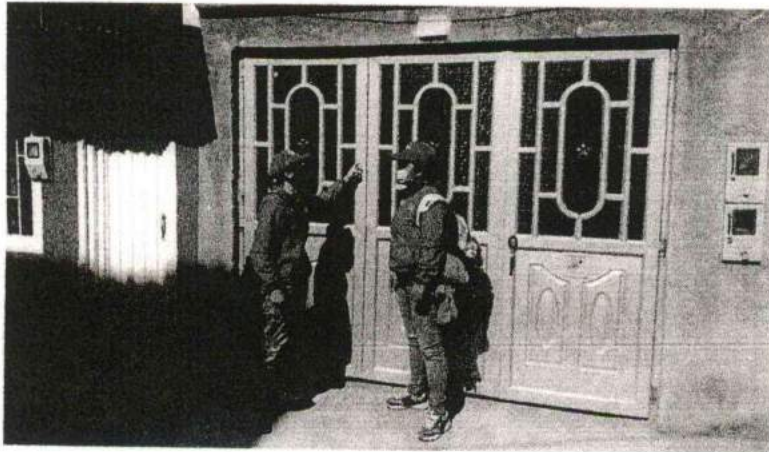

Por lo tanto, se procede a enviar por correo certificado la primera citación para caracterización de la vivienda por el equipo de profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Esta citación queda programada para el martes 9 de febrero del mismo año, a las 9:00 AM.

En esta visita es acompañada por la Profesional Social de la SDHT y no se encuentra a nadie en la vivienda, se hace labor de vecindario, en la cual se logra evidenciar por los vecinos que el beneficiario solo está los domingos.

Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita

REGISTRO FOTOGRÁFICO



En vista de lo sucedido se envía la siguiente citación por correo certificado, programando la citación para el sábado 20 de febrero, a las 9:30 AM.

Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar al beneficiario, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, la cual no es atendida ni devuelta. Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Con base en lo anterior y considerando agotados los recursos como contratistas de obra e interventores en el contrato 694 y 701 de 2020 respectivamente, frente a lo que sucede con el beneficiario de referencia, nos permitimos allegar este informe con los soportes que dan fe de la trazabilidad y gestión mancomunada para lograr positivamente las labores, para que se tomen las medidas que consideren.

INFORME DE GESTIÓN

MVCB_ 5209: MARCELINDA MURCIA

Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer a la Secretaría Distrital de Hábitat, el proceso hecho con la vivienda que se entregó por la entidad como reemplazo a la renuncia presentada durante la primera fase de la programación. Esta vivienda está ubicada en la Diagonal 69 Q SUR N° 18 N 73, barrio Villas el Diamante, localidad de Ciudad Bolívar.

A continuación se relacionan detalladamente las llamadas, visitas, fechas, registro fotográfico y una breve reseña de lo sucedido en cada una de éstas:


En primera instancia, se envía por correo certificado la primera citación para caracterización de la vivienda por el equipo de profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Esta citación queda programada para el viernes 29 de enero del 2021, a las 9:00 AM.

ENERO 29 DE 2021

Esta visita es realizada por los profesionales de contratista e interventoría, profesionales y técnicos, en la misma no se encuentra a nadie en la vivienda, se hace labor de vecindario, en la cual se logra saber por una vecina que la beneficiaria trabaja todo el día y llega en las horas de la noche. Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita

REGISTRO FOTOGRÁFICO



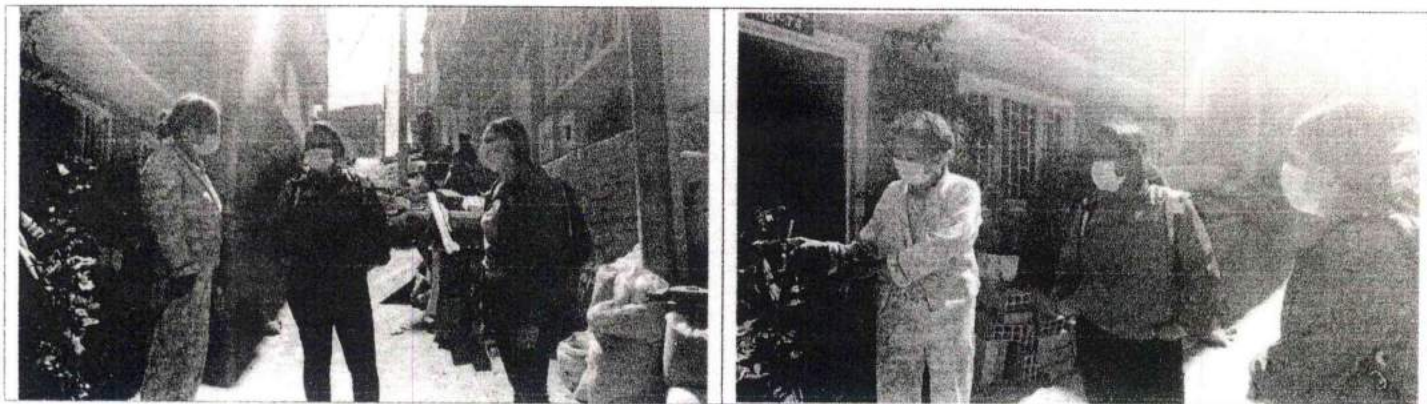

En vista de lo sucedido se envía la siguiente citación por correo certificado, programando la citación para el lunes 8 de febrero, a las 9:00 AM.

FEBRERO 8 DE 2021

Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar a la beneficiaria, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, la cual no es atendida ni devuelta.

Se hace labor de vecindario, indagando con una vecina llamada Leidy Lagos, quien manifiesta que sale muy temprano y regresa en las noches, que casi no la ven durante la semana.

Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita.



Nuevamente se envía citación por correo certificado, programada para el sábado 20 de febrero del mismo año, a las 9:00 AM.

FEBRERO 20 DE 2021

Esta no es atendida por ningún miembro del grupo familiar, por lo que se realiza acta de soporte con una vecina llamada Melba Duarte, quien se le facilita la información de contacto para que se comuniqué con el consorcio con el fin de proceder a la caracterización.



Con base en lo anterior y considerando agotados los recursos como contratistas de obra e interventores en el contrato 694 y 701 de 2020 respectivamente, frente a lo que sucede con el beneficiario de referencia, nos permitimos allegar este informe con los soportes que dan fe de la trazabilidad y gestión mancomunada para lograr positivamente las labores, para que se tomen las medidas que consideren.

INFORME DE GESTIÓN

MV_04993: ROSALBINA ZABALA MENDOZA

Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer a la Secretaría Distrital de Hábitat, el proceso hecho con la vivienda que se entregó por la entidad como reemplazo a la renuncia presentada durante la primera fase de la programación. Esta vivienda está ubicada en la Calle 70 T Sur N° 27 C 23 MJ 1, barrio El Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar.

A continuación se relacionan detalladamente las llamadas, visitas, fechas, registro fotográfico y una breve reseña de lo sucedido en cada una de éstas:

En primera instancia, se envía por correo certificado la primera citación para caracterización de la vivienda por el equipo de profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría.


Esta citación queda programada para el viernes 29 de enero del 2021, a las 11:00 AM.

ENERO 29 DE 2021

Esta visita es realizada por los profesionales de contratista e interventoría, profesionales y técnicos, en la misma no se encuentra a nadie en la vivienda, se intenta llamar pero el celular se encuentra fuera de servicio o presenta fallas en la red, se hace labor de vecindario, en la cual se logra evidenciar por una vecina llamada Ana Anzola que la beneficiaria reside junto a su hijo en la vivienda, pero trabajan todo el día. Se le suministra número de contacto del consorcio a la Señora Ana para que le facilite los datos a la beneficiaria.

Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita

REGISTRO FOTOGRÁFICO



De acuerdo a la visita fallida, se envía la siguiente citación por correo certificado, programando la citación para el lunes 8 de febrero, a las 11:00 AM.

FEBRERO 8 DE 2021

Se visita el predio en la fecha y hora definida, pero no es posible encontrar a la beneficiaria, por lo que se intenta establecer comunicación vía telefónica, la cual no es posible porque el número de celular al parecer no está en funcionamiento.

Se hace labor de vecindario, indagando con la misma vecina Ana Anzola, quien manifiesta que no la ven durante el día porque trabaja hasta altas horas de la noche.

Los profesionales hacen acta y registro fotográfico como soporte de la visita.




Nuevamente se envía citación por correo certificado, programada para el sábado 20 de febrero del mismo año, a las 11:00 AM.

FEBRERO 20 DE 2021

Esta no es atendida por ningún miembro del grupo familiar, por lo que se realiza acta de soporte con una vecina llamada Sharit Linares, quien se le facilita la información de contacto para que se comunique con el consorcio con el fin de proceder a la caracterización.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

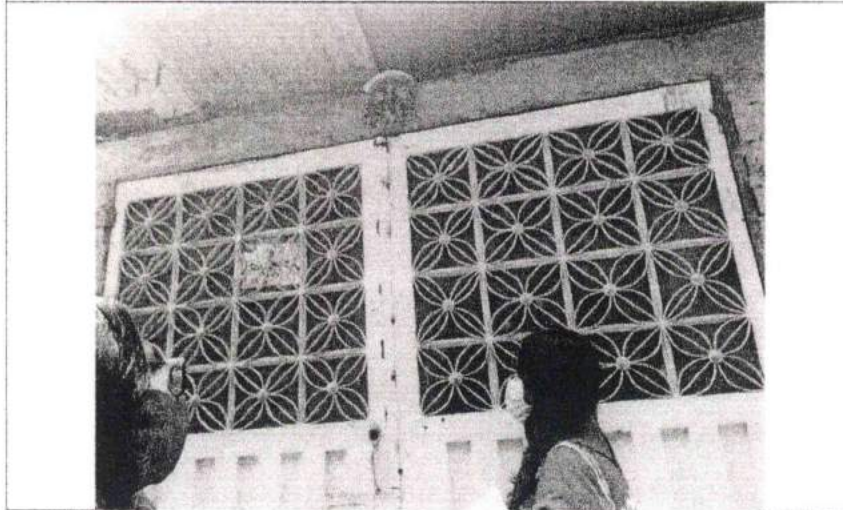

Con base en lo anterior y considerando agotados los recursos como contratistas de obra e interventores en el contrato 694 y 701 de 2020 respectivamente, frente a lo que sucede con el beneficiario de referencia, nos permitimos allegar este informe con los soportes que dan fe de la trazabilidad y gestión mancomunada para lograr positivamente las labores, para que se tomen las medidas que consideren.

CORRESPONDENCIA

RECIBIDA



202

CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NIT 901422027-8

BOGOTA D.C. FEBRERO 2 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 045

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

interhabitantegrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: RENUNCIAS MVCB_2993 Y MVJA_1119

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envían soportes de las renunciaciones **MVCB_2993** del señor CARLOS JULIO CARDENAS Y **MVJA_1119** del señor GERARDO FONSECA ARIAS.

Anexo:

RENUNCIAS


MVCB_2993 (ORIGINAL)

MVJA_1119 (COPIA CON IMAGEN ADJUNTA DEL ENVIO POR WASAP)

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS FDD CARRILLO
LUIS FERNANDO CARRILLO
Representante Legal
CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020

03

11:35 Am

Bogotá, DC. 18 de 11 del 2020

Señores
Secretaría Distrital del Hábitat
Ciudad

Asunto: Renuncia Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda

Respetados señores(as)

Conforme a mi solicitud, los abajo firmantes beneficiarios y miembros del grupo familiar, renunciamos al Subsidio Distrital de mejoramiento de Vivienda, por el siguiente motivo:

- ☒ A. Venta del predio
- ☒ B. Problemas de Salud
- C. Fallecimiento beneficiario (a)
- D. Otro: _____

Cordialmente,

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
carlos julio cardenas	307587	<i>[Firma]</i>

Dirección pg 69 A Bz B sur 78 M 35 Teléfono 3228647555
Barrio Juan Pablo n Localidad ciudad bolivar

Anexos:

1803 2203



204

CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NT 901422.027 8

BOGOTA D.C. 13 DE FEBRERO 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 046

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

interhabitargrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: RENUNCIA MVJA_2414 – MARIA ELENA RINCON RINCON

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envía renuncia de la señora MARIA ELENA RINCON RINCON MVJA_2414, quien renunció al subsidio de mejoramiento de vivienda debido a los problemas a nivel familiar que presenta.

Anexos:

Renuncia (original)

Acta de reunión realizada el día de la apertura.

Caracterización social

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS FDO CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NIT. 901422.027-8

205
02/15/2021
INPLAYCO

BOGOTA D.C. FEBRERO 14 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 047

Señores:
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Tel: 6181167
CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECREARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: ENTREGA DE CARPETAS CON BITACORAS CORTES 1, 2 Y 3

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Nos permitimos hacer entrega de las carpetas de la siguiente manera:

CORTE 1: 34 CARPETAS

1	MVCB_4919 ✓
2	MVCB_2917 ✓
3	MVCB_1818 ✓
4	MVCB_2925 ✓
5	MVCB 2932 ✓
6	MVCB 4918 ✓
7	MVCB 1437 ✓
8	MVCB 3640 ✓
9	MVCB 2960 ✓
10	MVCB 3641 ✓
11	MVCB 3030 ✓
12	MVCB 2991 ✓
13	MVCB 3633 ✓
14	MVCB 3642 ✓
15	MVCB 1866 ✓
16	MVCB 4923 ✓

pendiente MUJA 3314 (co)



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

NIT. 901.422.027-8

17	MVCB 1440 ✓
18	MVCB 1441 ✓
19	MVCB 1120 ✓
20	MVCB 1421 ✓
21	MVCB 2432 ✓
22	MVCB 1091 ✓
23	MVCB 1124 ✓
24	MVCB 3020 ✓
25	MVCB 2967 ✓
26	MVCB 3643 ✓
27	MVCB 3634 ✓
28	MVCB 2434 ✓
29	MVCB 2926 ✓
30	MVCB 2999 ✓
31	MVCB 3635 ✓
32	MVCB 2939 ✓
33	MVCB 3646 ✓
34	MVCB 2996

CORTE 2: 25 CARPETAS

1	MVCB 1194 ✓
2	MVCB 1180 ✓
3	MVJA 0898 ✓
4	MVJA 0544 ✓
5	MVCB 1212 ✓
6	MVCB 1181 ✓
7	MVCB 1161 ✓
8	MVJA 3314 → *Pendiente
9	MVCB 1469 ✓
10	MVJA_3223 ✓
11	MVJA_4375 ✓
12	MVJA_2812 ✓
13	MVJA_2992 ✓
14	MVJA_0530 ✓
15	MVJA_0890 ✓
16	MVJA_0970 ✓
17	MVJA_0899 ✓
18	MVJA_2660 ✓
19	MVJA_2729 ✓



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP

2020

NIT 901422027-8

20	MVJA_0567 ✓
21	MVJA_3309 ✓
22	MVJA_3366 ✓
23	MVJA_4350 ✓
24	MVJA_4333 ✓
25	MVJA_3125 ✓

CORTE 3: 36 CARPETAS

1	MVCB_1130 ✓
2	MVCB_1467 ✓
3	MVCB_1417 ✓
4	MVCB_1493 ✓
5	MVCB_1516 ✓
6	MVJA_2996 ✓
7	MVCB_1407 ✓
8	MVCB_1409 ✓
9	MVCB_1495 ✓
10	MVCB_1416 ✓
11	MVCB_1470 ✓
12	MV_17421 ✓
13	MV_18951 ✓
14	MVJA_2672 ✓
15	MVCB_1352 ✓
16	MVJA_0259 ✓
17	MVJA_3335 ✓
18	MVJA_2981 ✓
19	MVCB_1380 ✓
20	MVJA_3141 ✓
21	MVJA_2909 ✓
22	MVJA_3119 ✓
23	MVJA_0186 ✓
24	MVJA_0252 ✓
25	MVCB_1371 ✓
26	MVCB_1383 ✓
27	MVCB_1344 ✓
28	MVCB_1381 ✓
29	MV_18353 ✓
30	MVCB_1374 ✓
31	MVCB_1382 ✓



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP

2020

NIT 901.422.027-8

32	MVCB_1328	✓
33	MVUS_0638	✓
34	MVCB_1341	✓
35	MVJA_3231	✓
36	MVJA_3146	✓

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.DD CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO
Representante Legal
CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP

2020

BOGOTA D.C FEBRERO 16 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 048

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

Interhabitargrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: CORTE No 3

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Se adjunta documentos que hacen parte del corte ya aprobado por correo para las firmas y trámites correspondientes.

Anexo: 84 folios.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.DD CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NIT. 901622027 8

BOGOTA D.C. 18 DE FEBRERO 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 049

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

InterhabitarTEgrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: RENUNCIA MVJA_2315 – ANIBAL INFANTE NAVARRETE

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envía renuncia del señor ANIBAL INFANTE NAVARRETE MVJA_2315. El beneficiario falleció y los hijos no quisieron hacerse cargo de las obras de mejoramiento.

Anexos:

Renuncia (original firmada por 2 hijos)

Comprobante de estado de afiliación (página COMPROBADOR DE DERECHOS Secretaria de salud)

Comprobante de estado de afiliación ADRES.

Citación N° 1: 29 de enero de 2021 y acta levantada.

Citación N° 8: 8 de febrero de 2021 y acta levantada.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.D.O CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020

Bogotá, DC. 8 Feb / 2021

Señores
Secretaría Distrital del Hábitat
Ciudad

Asunto: Renuncia Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda

Respetados señores(as)

Conforme a mi solicitud, los abajo firmantes beneficiarios y miembros del grupo familiar, renunciamos al Subsidio Distrital de mejoramiento de Vivienda, por el siguiente motivo:

- A. Venta del predio
- B. Problemas de Salud
- C. Fallecimiento beneficiario (a)
- ☒ D. Otro:

Beneficiario Fallecio, firman 2 de los hijos.

Cordialmente,

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
<u>Luis Ernesto Infante</u>	<u>80952223</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Eni Infante Reyes</u>	<u>79.924180</u>	<u>[Firma]</u>

Dirección Kh 78 764 E70 Sur Teléfono 7657190
Barrio Lucero medío Localidad Ciudad Bolívar

Anexos: (si aplica)



COMPROBADOR DE DERECHOS

Secretaría Distrital de Salud



BOGOTÁ

PRECIO: ESTUOYUOZAL NIMPTUSERS LMA Y MTCNA/ANZON CONSULTA Resultados Fecha: 19/02/2021 9:09:49 AM

Seguimiento Administrativo Entidad Territorial al R. Subsidado - Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Fecha de corte: 19/02/2021

Vpr	Vpr	Vpr	Consecutivo	Tipa	No.	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Fecha	Nivel	EPS-S	EPS-S	Fecha	Estado
					Identificación	Apellido	Apellido	Nombre	Nombre	Sisben	Sisben	Anterior		Afiliación	
CHES	EMASO	REYES	3123002	CC	17107030	ISPRANTE	NAVARRETE	ANTIBAL		2408573	1		CAPITAL SALUD	31-05-2013	24-809 Pa. CC 20

Estado de Afiliación: Afiliado Fallecido

Estado: Posible fallecimiento

Subsidiado Bogotá - i Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/01/2021

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

Contributivo Bogotá - i Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/01/2021

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.



15:00
17:00

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud
Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	17107030
NOMBRES	ANIBAL
APELLIDOS	INFANTE NAVARRETE
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS "CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S."	SUBSIDIADO	01/06/2013	21/09/2020	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de impresión: 02/12/2021 09:36:15 Estación de origen: 192.168.70.1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2019 delimita que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información, en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como

Fecha 02/02/2021 10:37

Fecha Pago Fecha 03/02/2021



FACTURA DE VENTA No.: K637 1539

GUIA No.: 9128153070

DESTINATARIO	BOG		DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	10		BOGOTA	
	S09		CUNDINAMARCA	CONTADO
			NORMAL	TERRESTRE
CRA 18 J NO 64 F 10 SUR				
ANIBAL INFANTE NAVARRETE				
Teléfono 7451290 D I / NIT 17107030				
País COLOMBIA Cod Postal 111951				
e-mail				
Dato Contenedor (DOCUMENTO) Obs para entrega Vr Declarado \$ 5.000 Vr Flete \$ 0 Vr Sobreflete \$ 350 Vr Mensajería expresa \$ 5.300 Vr Total \$ 5.650 Vr a Cobrar \$ 0				
Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg) Peso (Vul) / / Peso (Kg) 1.00 No Remisión SE0000024709706 No Bolsa seguridad No Sobreporte Guia Retorno Sobreporte				

GUIA No. 9128153070



REMITENTE
Ministerio de Transportes, Licencia No. 803 de Marzo 5/2001, Modific. Licencia No. 1778 de Mayo 1/2010

ASUNTO: CITACIÓN

Cordial saludo,

Con la presente se hace citación para realizar visita de validación/caracterización de contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020 – INTERVENORIA INPLAYCO SAS**, ya que usted es beneficiaria del subsidio de mejoramiento de vivienda otorgado por la Secretaria Distrital de Habilidad resolución 848 de 2019, con **MVJA_2315**.

Esta citación se realiza debido a que en varias ocasiones los profesionales se han acercado al predio a realizar la misma pero no ha sido posible.

Fecha: **LUNES 8 DE FEBRERO 2021**

Hora: **1:00 PM**

Lugar: vivienda ubicada en **KR 18J 64F 10 SUR (LUCERO MEDIO)**

Ciudad: **Bogotá D.C.**

Quedo atenta a cualquier duda e inquietud.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

Atte. **SHIRLEY VITOLA S.**

Coordinadora social

Consortio Mejoramiento EP 2020

FECHA

HORA INICIO

HORA FINAL

08 02 2021 1:00 pm 1:30 pm

CONVOCADO POR Consejo EP 2020 - Contratista
Inplaceo SRS - Interventora

DIRECCIÓN Carrera 18J N 64 F-10 Sur MVIA-2315

OBJETIVO: Socializar temas a tratar en la reunión de inicio.
- Validación técnica y social.

TEMAS A TRATAR:

- Temas de la reunión de socialización.
- Validación técnico y social.

DESARROLLO:

Se visita el predio ubicado en la carrera 18J N. 64 F-10 Sur con el objetivo de contactar al beneficiario o algún integrante del núcleo familiar dado que no se ha podido contactar por vía telefónica.

En esta visita se logra contacto con 2 de los hijos del beneficiario Efraín Infante con cc. 79.824.180 y Luis Ernesto Infante con cc. 80952223; quienes en presencia nuestro se comunicaron con los demás hermanos vía telefónica y acordaron renunciar al mejoramiento de vivienda debido a falta de tiempo para estar pendiente del mismo.

Se procede a firmar la renuncia y solicitar



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

la copia de sus cédulas de ciudadanía a lo que contestaron no entregarlos por temor a que más adelante se perjudiquen con algún tema referente a subsidios. Se les explica que no, pero aun así no entregan las copias de las cédulas.

Se verifica Comprobador de derechos en la página de la secretaría distrital de salud donde se verifica el estado del beneficiario y en la página de ADRES.

Se adjuntan certificados de las páginas.



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones:

Registro fotográfico (si aplica):





ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Luis Ernesto Prieto	CONDUCTOR		3128087107	
Edwin Zuleta RA	CONDUCTOR	Infanfecem@991.com	79329180	
Parco Hamén	trabajador	marcehanna	32022349	Marco Hamén
Pablo Alexander Cuyula Chirio	Proposional Social Inventario	lex491942@jwll.com	3202390184	

Anexo:

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP

2020

NIT 901.422.027.5

BOGOTÁ D.C. ENERO 25 DE 2021

Señora: ANIBAL INFANTE NAVARRETE

C.C. 17.107.030

Dirección: KR 18J 64F 10 SUR

Teléfono: 7651290

ASUNTO: CITACIÓN

Cordial saludo,

Con la presente se hace citación para realizar visita de validación/caracterización de contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020 - INTERVENORIA INPLAYCO SAS, ya que usted es beneficiaria del subsidio de mejoramiento de vivienda otorgado por la Secretaría Distrital de Habitat resolución 848 de 2019, con MVJA_2315.

Esta citación se realiza debido a que en varias ocasiones los profesionales se han acercado al predio a realizar la misma pero no ha sido posible.

Fecha: VIERNES 29 de ENERO 2021

Hora: 1:00 PM

Lugar: vivienda ubicada en KR 18J 64F 10 SUR (LUCERO MEDIO)

Ciudad: Bogotá D.C.

Quedo atenta a cualquier duda e inquietud.

Agradeciendo su atención,

Cordialmente,

Ate. SHIRLEY VITOLA S.

Coordinadora social

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Celular: 313 785 2234 - 321 2231771
Correo: N.A. 47 oficio 501 2466

1999-2000



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
29	Enero	2021	1:00 PM	1:45 PM

CONVOCADO POR: CONSORCIO EP-2020 - CONTRATISTA
INPLAYCO SAS - INTERVENTORIA

DIRECCIÓN: Carrera 18 J N° 64 F - 10 SUR - MUJA-2315

OBJETIVO:

- Socializar temas a tratar en la reunión de inicio
- Validación técnica y social

TEMAS A TRATAR:

- Temas de reunión de socialización de inicio de obras
- Validación técnica y social

DESARROLLO:

Se visita el predio ubicado en la dirección: Carrera 18 J N° 64 F - 10 Sur, con el objetivo de contactar a algún integrante del núcleo familiar, dado que no se puede establecer comunicación para convocar al beneficiario a la reunión de inicio, pero no se logra en esta oportunidad.


En esta visita se adelanta labor de vecindario indagando con una vecina, Gladys Siervo, quien refiere que el Señor (fallecido) tiene un hijo, que está pendiente de lo referente a la vivienda; suministra teléfono 3134783457 - Isidro Infante, por lo mismo, se intenta llamar, pero no responde.

Por lo anterior, se comunicará por segunda vez mediante correo certificado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios




22



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones:

Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE PLANEACIÓN

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Enviar Segunda notificación	Shirley Utrata	30 Enero 2021

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Shirley Utrata	Coordinadora Social	cmepnamento@20103224@gmail.com	3023763199	AB
Yineth Camargo	Coord. Social Interventora	Interhabitatqup@gmcaileam	30524454	[Signature]

Anexo:

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:



CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NIT 901422027-8

C-15
2021/23/02
22

BOGOTA D.C. FEBRERO 22 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 050

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

interhabitar.tegrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: ACTAS VISITAS MVUS_0905 LUIS EDUARDO GUATIBONZA GUATIBONZA

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envían las citaciones y actas de visitas realizadas al señor **LUIS EDUARDO GUATIBONZA** con MVUS_0905, con el cual no se ha podido tener algún tipo de contacto. Las fechas de citaciones y actas levantadas son las siguientes:

1. 28 de enero 2021
2. 9 de febrero 2021
3. 20 de febrero 2021

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.DO CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP
2020
NIT 901422027-8

226

C-15
2021/23/02

BOGOTA D.C. FEBRERO 22 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 051

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

interhabitargrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: ACTAS VISITAS MVJA_2830 MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envían las citaciones y actas de visitas realizadas a la señora MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA con MVJA_2830, con el cual no se ha podido tener algún tipo de contacto.

Las fechas de citaciones y actas levantadas son las siguientes:

1. 30 noviembre de 2020
2. 10 diciembre de 2020
3. 11 diciembre de 2020
4. 14 diciembre de 2020
5. 28 diciembre de 2020
6. 6 de enero de 2021

Anexo: Actas originales

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.D.O CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO
MEJORAMIENTO EP

2020

NIT 901422077 9

227
C/S
2021/03/02

BOGOTA D.C. FEBRERO 22 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 052

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

interhabitargrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: ACTAS VISITAS MV_04993 ROSALBINA ZABALA MENDOZA

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envían las citaciones y actas de visitas realizadas a la señora ROSALBINA ZABALA MENDOZA con MV_04993, con el cual no se ha podido tener algún tipo de contacto.

Las fechas de citaciones y actas levantadas son las siguientes:

1. 29 ENERO de 2021
2. 8 FEBRERO 2021
3. 20 FEBRERO 2021

Anexo: Actas originales

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.DO CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020



CONSORCIO MEJORAMIENTO EP

2020

NIT. 901422027-8

2020/23/02

BOGOTA D.C. FEBRERO 22 DE 2021

CONTRATO DE OBRA 694 2020 - 053

Señores:

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVANO HOYOS

Representante Legal

InterhabitarTEgrupo1@gmail.com

Tel: 6181167

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 694 – 2020 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

ASUNTO: ACTAS VISITAS MVCB_5209 MARCELINDA MURCIA

Estimados señores, reciban un cordial saludo.

Adjunto se envían las citaciones y actas de visitas realizadas a la señora MARCELINDA MURCIA con MVCB_5209, con el cual no se ha podido tener algún tipo de contacto.

Las fechas de citaciones y actas levantadas son las siguientes:

1. 29 ENERO de 2021
2. 8 FEBRERO 2021
3. 20 FEBRERO 2021

Anexo: Actas originales

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

LUIS F.D.O CARRILLO

LUIS FERNANDO CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO MEJORAMIENTO 2020

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 26	(Mes): 02	(Año): 2021	2: 00 PM	5:00 PM

CONVOCADO POR:

Stella Acevedo – equipo de mejoramiento de vivienda subdirección de barrios.

DIRECCIÓN:

Cl 106b Sur - Kr 5b, Bogotá Antonio José de Sucre - Usme

OBJETIVO:

Hacer entrega a interventoría Inplayco contrato 701 de 2020 para la asignación al consorcio EP 2020 quienes desarrollan bajo el N° Contrato 694 de 2020, **“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.”**, de **GRUPO 1**, para un total de 5 expedientes para remplazos de renuncias y casos especiales de mejoramiento de vivienda.

TEMAS A DESARROLLAR:

Entrega de 5 Expedientes del **GRUPO 1** del contrato de ejecución de obra 694 del 2020.

DESARROLLO:

A continuación, el programa de mejoramiento de vivienda de la subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat hace remisión de 5 expedientes GRUPO 1 discriminados así:

INFORMACIÓN GENERAL HOGARES BENEFICIARIOS PROYECTO IIM HABITARTE - 2019					
N O.	ID_MV	Nombres y apellidos	Cédula	Chip	No Folios
1	MVCB_3534	MARIA ELISA RODRIGUEZ GAMEZ	23605642	AAA0027MEJZ	20
2	MVCB_3540	SANDRA PATRICIA BETANCUR RINCON	52299628	AAA0027MEPA	21
3	MVCB_3537	EDILY JIMENEZ OSORIO	24601650	AAA0027MEMR	19
4	MVCB_3523	BLANCA INES RAMIREZ	41483297	AAA0027MDWF	18
5	MVCB_3524	REINED DE JESUS RODRIGUEZ GRAJALES	14211551	AAA0027MDXR	20

Observaciones y/o conclusiones:

Para un total de 5 mejoramientos de vivienda para el desarrollo de las etapas definidas en el anexo técnico. Distribuidos los mejoramientos de vivienda por territorio así:

HABITARTE 2019.

5 Mejoramientos de vivienda.



230

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
25	02	2021	4:15 PM	5:00 PM

CONVOCADO POR:
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIRECCIÓN: Virtual

OBJETIVO:

Hacer seguimiento al contrato de obra 694 de 2020

TEMAS A TRATAR:

1. Avance ejecución de obra (puntos de atención).
2. Balance general financiero del contrato de obra.
3. Entrega expedientes mejoramientos terminados.
4. Corte para pago febrero de 2021.
5. Temas varios: área social.

DESARROLLO:

El presente comité da cuenta del avance de ejecución que lleva el contratista a la fecha y analiza las dificultades presentadas en los MV para fomentar un plan de contingencia que permita alcanzar los objetivos propuestos.

- Avance ejecución de obra

Viviendas terminadas al 100 % entre el 9 y 25 de febrero, según programación 129, lo que corresponde al 50,79 %.

A fecha de 25 de febrero se han entregado 112 viviendas, que corresponden al 44,09 %.

A continuación se relaciona el porcentaje de ejecución de obra, de acuerdo al último corte:

Total MV: 254

Renuncias y/o casos especiales: 10

Ejecutadas al 100 %: 112

Aperturadas o en ejecución: 79

Entregadas – facturadas: 96

Sin validar: 0

Por ejecutar: 142

Teniendo en cuenta la información anteriormente descrita, el contratista se encuentra en 44,09 % de ejecución.

- Caso especial zona Jalisco

Cantidad de viviendas 95



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones:

Algunos expedientes no son legibles, por lo que la SDHT recomienda que se escaneen a máquina en su totalidad.

Incluir una columna en la base de la próxima entrega de expedientes, donde se indique si se anexa bitácora.

Solicitud de plan de contingencia, con el objetivo de subsanar días de atraso en el sector de Jalisco.

Visitar MV 21283, para aclarar actividades y poder subsanar acabados.

Registro fotográfico (si aplica):

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 19	(Mes): 02	(Año): 2020	2: 00 PM	5:00 PM

CONVOCADO POR:

Stella Acevedo – Equipo de mejoramiento de vivienda subdirección de barrios

DIRECCIÓN:

Cl. 52 N°13-64, Bogotá Oficina mejoramiento de vivienda Piso 6

OBJETIVO:

Hacer entrega a la SDHT de 36 expedientes, de acuerdo a las funciones contractuales del contrato N° 701 de 2020, “CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”.

TEMAS A DESARROLLAR:



Entrega de 36 Expedientes del **GRUPO 1** a la **SDHT**, de acuerdo con las funciones contractuales del contrato 701 del 2020, correspondientes al tercer corte, periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2020 al 10 de febrero 2021.

DESARROLLO:

A continuación, el Director de interventoría César Fuenmayor y la Coordinadora Social Yineth Camargo hacen entrega de 36 expedientes del GRUPO 1, discriminados así:

CAJA	N°	MV	NOMBRE	CC	CHIP	FOLIOS
1	1	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	51983926	AAA0023MLFT	42 ✓
	2	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	41703661	AAA0023LYTO	47 ✓
	3	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	51930528	AAA0023LYBR	49 ✓
	4	MVJA_0259	ALBA ROSA HURTADO CAICEDO	41744946	AAA0023MUBS	45 ✓
	5	MVJA_3231	SOFIA MORENO	51825889	AAA0023KODE	40 ✓
	6	MVJA_3119	LUZ YANID PADUA	40393508	AAA0023KONX	43 ✓
	7	MVJA_2672	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	79421562	AAA0023LAXR	41 ✓
	8	MVJA_0186	ISABEL ARDILA VARGAS	55061451	AAA0023MXMS	42 ✓
	9	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	51575753	AAA0023MWYN	44 ✓
	10	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	51938929	AAA0023MXOE	54 ✓

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Yineth Camargo	Coordinadora social de interventoría	Interhabitatgrupo1@gmail.com	3058149514	
Isabel Serrano	Profesional Social SDHT	maria.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	 Isabel Serrano Coordinadora Social AP 1470412-1
Shirley Vitola Serrano	Coordinadora social de Obra	cmejoramientoepsocial2020@gmail.com	3023763199	

ELABORÓ: Yineth Camargo
APROBÓ: César Fuenmayor

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 19	(Mes): 02	(Año): 2020	2: 00 PM	5:00 PM

CONVOCADO POR:

Stella Acevedo – Equipo de mejoramiento de vivienda subdirección de barrios

DIRECCIÓN:

Cl. 52 N°13-64, Bogotá Oficina mejoramiento de vivienda Piso 6

OBJETIVO:

Hacer entrega a la SDHT de 24 expedientes, de acuerdo las funciones contractuales del contrato N° 701 de 2020, “CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”.

TEMAS A DESARROLLAR:



Entrega de 24 Expedientes del **GRUPO 1** del contrato de ejecución de obra 694 del 2020, correspondientes al primer corte, periodo comprendido entre el periodo del 16 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre 2020. *Segundo*

DESARROLLO:

A continuación, el Director de interventoría César Fuenmayor y la Coordinadora Social Yineth Camargo hacen entrega de 24 expedientes del GRUPO 1, discriminados así:

235

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Yineth Camargo	Coordinadora social de interventoría	Interhabitatgrupo1 @gmail.com	3058149514	
Isabel Serrano	Profesional Social SDHT	maria.serrano@habi tatbogota.gov.co	3057103451	 Trabajadora Social R.P. 149791012-4
Shirley Vitola Serrano	Coordinadora social de Obra	cmejoramientoepsoc ial2020@gmail.com	3023763199	

ELABORÓ: Yineth Camargo
APROBÓ: César Fuenmayor

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 19	(Mes): 02	(Año): 2021	2: 00 PM	5:00 PM

CONVOCADO POR:

Stella Acevedo – Equipo de mejoramiento de vivienda subdirección de barrios

DIRECCIÓN:

Cl. 52 N°13-64, Bogotá Oficina mejoramiento de vivienda Piso 6

OBJETIVO:

Hacer entrega a la SDHT de 34 expedientes, de acuerdo las funciones contractuales del contrato N° 701 de 2020, "CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

TEMAS A DESARROLLAR:

Entrega de 34 Expedientes del **GRUPO 1** del contrato de ejecución de obra 694 del 2020, correspondientes al primer corte, periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre 2020.



DESARROLLO:

A continuación, el Director de interventoría César Fuenmayor y la Coordinadora Social Yineth Camargo hacen entrega de 34 expedientes del GRUPO 1, discriminados así:

CAJA	N°	MV	NOMBRE	CC	CHIP	FOLIOS
1	1	MVCB_3646	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	19145903	AAA0027MLFT	38
	2	MVCB_3643	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	19055380	AAA0027MLCX	38
	3	MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	79920898	AAA0027MLBR	44
	4	MVCB_3641	CECILIA MENDEZ MORENO	38244955	AAA0027MLAF	39
	5	MVCB_3640	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	4399061	AAA0027MKZE	38
	6	MVCB_3635	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	79739176	AAA0027MKTD	35
	7	MVCB_3634	AYDE NIÑO Y OTRO	51850037	AAA0027MKSY	39
	8	MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	79669044	AAA0027MKRJ	40
	9	MVCB_2939	MARIEYE LOAISA	39715674	AAA0027LAFT	40
	10	MVCB_4918	ALVARO DIAZ AVILA	8712661	AAA0027PLEP	50

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 Subsecretaría de Coordinación Operativa
 Subdirección de Barrios

237

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Yineth Camargo	Coordinadora social de interventoría	Interhabitatgrupo1@gmail.com	3058149514	
Isabel Serrano	Profesional Social SDHT	maria.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	 Coordinadora Social R.P. 149791012-1
Shirley Vitola Serrano	Coordinadora social de Obra	cmejoramientoepsocial2020@gmail.com	3023763199	

ELABORÓ: Yineth Camargo
 APROBÓ: César Fuenmayor
