



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoría

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 16 PERIODO: 12/04/2021 al 18/04/2021

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		5,12%	CONTRATO DE OBRA				
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM			
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712		CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522			
VALOR INICIAL:	\$	41.888.000,00	VALOR INICIAL:	\$	818.871.366,16		
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	\$	41.888.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	818.871.366,16		
PLAZO INICIAL:	6 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses			
PLAZO ACTUALIZADO:	6 meses		PLAZO ACTUALIZADO:	6 meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			
FECHA DE INICIACIÓN:	31/12/2020		FECHA DE INICIACIÓN:	31/12/2020			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2021			
VALOR EJECUTADO:	\$	16.016.287,57	38,24%	VALOR EJECUTADO:	\$	313.103.497,01	38,24%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	25.871.712,43	61,76%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	505.767.869,15	61,76%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	60,89%	54,66%	6,23%		
Acumulado presente semana	67,56%	64,66%	2,90%		
Acumulado Actual	67,56%	64,66%	-2,90%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo		
181	108	73,00	-5,25		

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Item 1,1 Desmonte de salidas de tomacorrientes existentes, voz y datos.	100%	Desmonte de salidas de tomacorrientes existentes, voz y datos.	50%
Item 2,1 tendido de cable 1/0 x 3 Fases - 1 línea 1/0 Neutro - 1 línea 4 AWG Tierra	100%	tendido de cable 1/0 x 3 Fases - 1 línea 1/0 Neutro - 1 línea 4 AWG Tierra	12%



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha



Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	16	PERIODO:	12/04/2021	al	18/04/2021
OBJETO					
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".					
Item 2,3 canalización subterránea para ductos de 2"	100%	Suministro e instalacion de canalizacion subterránea ducto PVC de 2" incluye excavacion y relleno	100,00%		
Item 2,4 Tablero electrico de distribución 24 circuitos	100%	Suministro e instalacion tablero electrico de distribucion de 24 circuitos trifasico, en lamina galvanizada en caliente , con acabado en pintura de polvo, expuesto, con espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos(1) barraje para tierra 1 para neutro, con puerta y chapa, color gris el tablero debe cumplir RETIE, barraje de 206amp, 208v, incluye todos los elementos y accesorios para su adecuada instalacion y fijacion (pernos expansivo) y marcacion con placa en acrilico.	10,00%		
Item 2,8 Tablero general (solo suministro)	100%	Suministro e instalación de sub-tablero eléctrico de baja tensión (tg-bt) tipo intemperie certificado, elaborado en lamina galvanizada. según diagrama unifilar, incluye: celda de baja tensión, con las protecciones y capacidades de interrupción mostrada en planos, barrajes, breakers totalizadores a tableros y todos los demás materiales y elementos que hacen parte de la misma.	40,00%		
Item 3,1 Instalacion de tubería PVC de 1/2" SCH40 para luminarias de emergencia	100,00%	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC 1/2" SCH 40 empotrada y conductor n. 12 Awg Libre de halogenos. Incluye accesorios PVC, tomacorriente doble 20A, conectores de resorte	95,00%		
Item 3,4 Salida electrica para interruptor sencillo 120v	100%	Salida electrica para interruptor sencillo 120v.uso interior.15a empotrado en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	97,00%		
Item 3,5 Salida electrica para interruptor doble 120v	100%	Salida electrica para interruptor doble 120v.uso interior.15a expuesto en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	97,00%		
Item 3,6 Salida electrica para interruptor triple 120v	100%	Salida electrica para interruptor triple 120v.uso interior.15a expuesto en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	90,00%		
Item 3,8 salida electrica para condensadora en tubería PVC de 3/4"	100%	Salida electrica para condensadora en tubería PVC de 3/4"	95,00%		
Item 3,9 Lamparas led de 60x60 de 45 Vatios	100%	Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Led hermetica de 60x60 de 45w para uso interior, incluye tubos , incluye clavija y cinta de marcacion	100,00%		
Item 3,10 Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Led hermetica 2x18w	100%	Suministro e instalacion de lamparas tipo LED hermetica2x18w	100,00%		
Item 3,11 Iluminacion de emergencia	100%	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo aplique con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación	95,00%		
Item 3,12 Aviso de salida Luminoso	100%	Suministro e instalación de luminaria de avisos luminosos con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación.	95,00%		
Item 3,13 Ramales cable calibre 12 AWG	100%	Suministro e instalación de circuito ramal en tubería PVC 3/4" SCH y conductor 3xn. 12 Awg. Libre de Halogenos. incluye accesorios PVC.	11,00%		
Item 6,1 generador (planta electrica)	100%	Suministro e instalacion de grupo electrogeno de 400W, incluye silenciador de absorcion directa de 2 pulgada	100,00%		



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. <u>16</u>	PERIODO: <u>12/04/2021</u>	al	<u>18/04/2021</u>
OBJETO			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".			
NP-7(No previsto) Suministro e intalacion de canaleta Metalica 15x15	100%	Suministro e intalacion de canaleta Metalica 15x5 Se Compro el 100% solo compra	35,00%
NP-8(No previsto) Bandeja electrocincada portacables	100%	Suministro e instalacion de Bandeja Electrocincada 30x10CMx1 mt se compro el 100% solo suministro	68,00%
NP-9(No previsto) Suministro e instalacion de troquel doble	100%	Suministro e instalacion de troquel metlico doble liso 12cm color blanco	49,00%
NP-11(No previstos) Tomacorrientes GFCI para baños		Salida electrica para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 125v, 20A en caja PVC 2x4, con todos sus accesorios	37,00%
NP-13(No previsto) Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombro	100%	Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombro	100,00%
NP-15(No previsto) Registro de baja tensión de 60x60	100%	Registro de baja tensión de 60x60	100,00%
NP-16(No previsto) Tomacorriente normal en canaleta	100%	Salida electrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2*4, incluye 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tuberia pvc 1/2" SCH40 placa y ac BLANCO	53,00%
NP-17(No previsto) Tomacorrientes regulados en canaleta	100%	Salida electrica para toma regulado doble con polo a tierra color naranja, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2*4, incluye 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tuberia pvc 1/2" SCH40 placa y ac naranja	42,00%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Ing. FABIO MEJIA MEDINA



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoría

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha




1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 16 PERIODO: **12/04/2021** al **18/04/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

REGISTRO FOTOGRAFICO

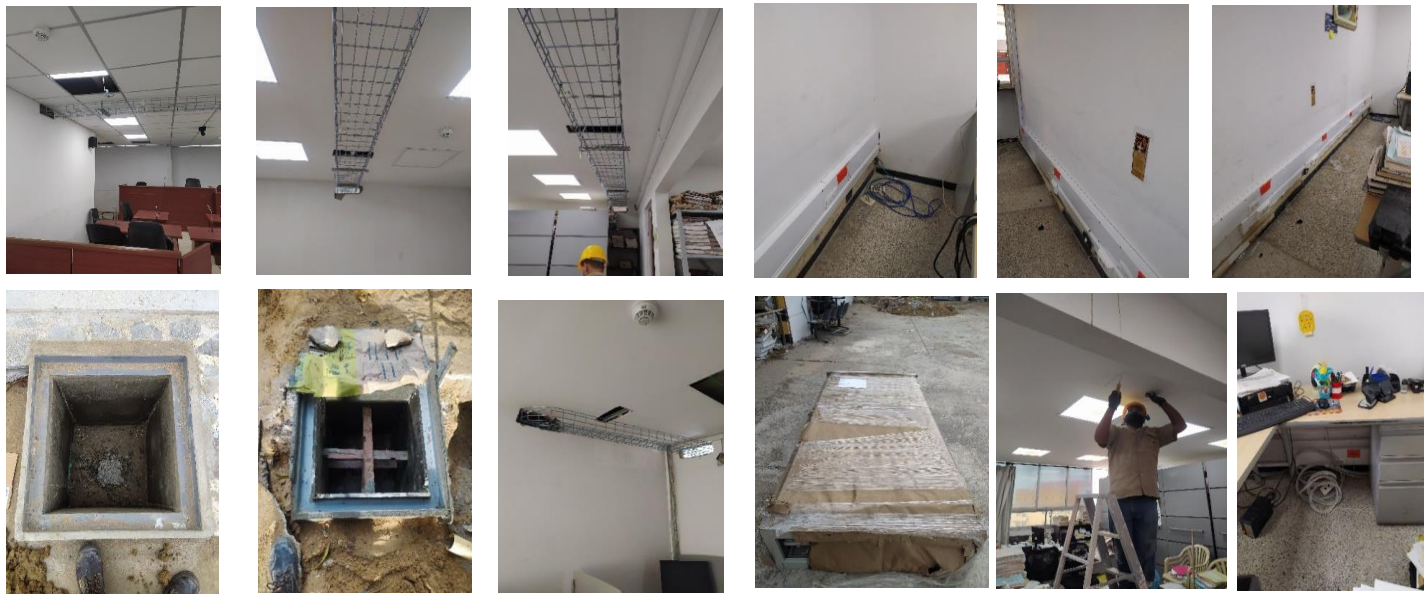

SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO
