



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2



INFORME TECNICO MENSUAL No.1

AREA TÉCNICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 362 DE 2019

PERIODO:

13 DE JULIO DE 2020 AL 12 DE AGOSTO DE 2020

BOGOTÁ D.C.


AGOSTO

 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
--	--	---

MODIFICACIONES

Índice de Revisión	Sección Modificada	Fecha Modificación	Observaciones
00		13/08/2020	Versión original

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Responsable de la elaboración:	Nombre	Ing. Fredy Ramírez Pinzón
Residente de Interventoría	Firma	
Responsable por aprobación:	Nombre	Ing. Nick Almeida Gamarra
Director de Interventoría	Firma	
	Fecha	13/08/2020

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE	CARGO
Sandra Yineth Fajardo Usaquen	Apoyo a la supervisión contrato 362 de 2019



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2



CONTENIDO

1	GENERALIDADES	5
1.1	DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.	5
1.2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
1.3	OBJETO DEL CONTRATO OBRA 358-2019	6
1.4	OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA 362-2019	6
1.5	FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	6
1.6	FECHAS DE INICIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6
1.7	PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA	7
1.8	PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	7
2	INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.....	7
2.1	GARANTÍAS: A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PÓLIZAS QUE SE HAN GENERADO A LO LARGO DE LOS CONTRATOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, EN LAS DIFERENTES FASES DEL MISMO, EN EL ANEXO NO. 1 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS, CON LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS EN EL ANEXO NO. 2	7
2.1.1	POLIZAS CONTRATO DE OBRA 358-2019.....	8
2.1.2	POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 345-2019	8
2.2	CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA	9
2.3	CUADRO DE CONTROL LEGAL DE LA INTERVENTORIA	10
2.4	RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 358 DE 2019	10
2.5	RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 345 DE 2019	11
2.6	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	11
2.7	MANEJO DEL ANTICIPO	11
2.8	METAS FISICAS – AVANCE FISICO	12
2.9	REQUERIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	13
3	INFORMACIÓN TÉCNICA.	13
3.1	CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL	13
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES	13
3.2.1	LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE REDES HIDRAULICAS	16
3.2.2	DISEÑOS.....	17
3.2.3	ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO.....	17
3.3	EQUIPO DE TRABAJO Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.....	17
3.4	DESCRIPCION DE LOS ATRASOS O ADELANTOS	19
3.5	CUADRO DE ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA DEL ESTADO DEL TIEMPO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. 19	
3.6	REPORTE DE AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	19
3.7	PLANES DE CONTINGENCIA	19
3.8	COPIA DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS.....	19
4	CONCLUSIONES.....	20

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1. ACTAS DE INICIO
- ANEXO 2. PÓLIZAS
- ANEXO 3. CRONOGRAMA DE OBRA
- ANEXO 4. CRONOGRAMA DE INTERVENTORIA
- ANEXO 5. PLAN ANUAL DE CAJA
- ANEXO 6. ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO
- ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

LISTA DE TABLAS

- TABLA NO. 1 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 2 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRATO 362-2019
- TABLA NO. 3 PÓLIZAS CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 4 PÓLIZAS CONTRATO 362-2019
- TABLA NO. 5 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 6 ACTAS SUSCRITAS CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 7 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 8 ACTAS SUSCRITAS CONTRATO 362-2019
- TABLA NO. 9 RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 358-2019
- TABLA NO. 10 RESUMEN FINANCIERO 362-2019
- TABLA NO. 11 META FÍSICA CONTRATO 358-362-2019
- TABLA NO. 12 EQUIPO DE TRABAJO Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA
- TABLA NO. 13 ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS

1 GENERALIDADES

Contrato de obra número 358 de 2019.

Contrato de interventoría número 362 de 2019.

1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

El proyecto que abarca el contrato de obra 358 de 2019 y el contrato de interventoría 362 de 2019, consiste en:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2".

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EL proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, localidad San Cristóbal, en Laureles y Aguas Claras.



 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
--	--	---

Tomado de: <http://www.sancristobal.gov.co/mi-localidad/mapas>

1.3 OBJETO DEL CONTRATO OBRA 358-2019

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2"

Contratista de obra: CONSORCIO TREMUN
NIT: 901.342.300-0
Representante Legal: Oscar David Vargas Galindo

1.4 OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA 362-2019

"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2".

Contratista de Interventoría: MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
NIT: 900.241.875-6
Representante Legal: Nick Randy Almeida Gamarra

1.5 FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla No. 1 fecha de inicio y terminación contrato 358-2019

NOMBRE	FECHA
Fecha acta de inicio	13 de julio de 2020
Terminación actual de obra.	12 de febrero de 2020

1.6 FECHAS DE INICIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla No. 2 fecha de inicio y terminación contrato 362-2019

NOMBRE	FECHA
Fecha acta de inicio	13 de julio de 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2	
---	---	---	---

Terminación actual de obra.	12 de febrero de 2020
-----------------------------	-----------------------

1.7 PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Acta de suscripción de acta de inicio:	julio 13 de 2020
Valor inicial del contrato:	\$ 5.674.948.847
Plazo inicial del contrato:	7 Meses.
Plazo actual del contrato:	7 Meses.
Valor final del contrato:	\$ 5.674.948.847

1.8 PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta de suscripción de acta de inicio:	julio 13 de 2020
Valor inicial del contrato:	\$ 607.283.789
Plazo inicial del contrato:	7 Meses.
Plazo actual del contrato:	7 Meses.
Valor final del contrato:	\$ 607.283.789

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

- 2.1 **GARANTIAS:** A continuación, se describen las pólizas que se han generado a lo largo de los contratos tanto de obra como de interventoría, en las diferentes fases del mismo, en el anexo No. 1 se adjuntan las actas de inicio de los contratos, con las respectivas pólizas en el anexo No. 2.

2.1.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA 358-2019

Tabla No. 3 pólizas contrato 358-2019

CONTRATO DE OBRA N° 317-2019					
Compañía	Riesgo	Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Desde - Hasta
ACTA DE INICIO					
EQUIDAD SEGUROS	cumplimiento del contrato	AA007907	396 días	\$ 1.702.484.654,10	(13/07/2020) -(13/08/2021)
EQUIDAD SEGUROS	buen manejo y correcta inversión del anticipo	AA007907	335 días	\$ 1.702.484.654,10	(13/07/2020) - (13/06/2021)
EQUIDAD SEGUROS	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	AA007907	1310 días	\$ 283.747.442,35	(13/07/2020) - (13/02/2024)
EQUIDAD SEGUROS	estabilidad y calidad de la obra	AA007907	1826 días	\$ 1.702.484.654,10	(13/02/2021) -(13/02/2026)

2.1.2 POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 362-2019

Tabla No. 4 pólizas contrato 362-2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 362-2019					
Compañía	Riesgo	Póliza No.	Valor Asegurado	Desde	Hasta
ACTA DE INICIO					
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101304774	\$ 182.185.136	13/07/2020	14/08/2021
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101304774	\$ 182.185.136	13/07/2020	14/02/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101304774	\$ 30.364.189,43	13/07/2020	14/02/2024

 BOGOTÁ	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2"	
--	--	---

2.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA

Tabla No. 5 cuadro de control legal contrato 358-2019

Tipo de contrato	OBRA
Objeto	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2"
Contratista	CONSORCIO TREMUN
Contrato No	358 DE 2019
Valor inicial	\$ 5.674.948.847
Valor total	\$ 5.674.948.847
Plazo Inicial	7 MESES
Fecha de Iniciación	13 DE JULIO DE 2020
Fecha de Terminación Obra inicial	12 DE FEBRERO DE 2020
Terminación actual de obra.	12 DE FEBRERO DE 2020
Interventor	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Anticipo entregado	\$ 1.702.484.654 EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRARO, QUE HASTA LA FECHA NO SE HA HECHO EFECTIVO

ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA 358 DE 2019

Tabla No. 6 actas suscritas contrato 358-2019

TIPO DE ACTA	Fecha de suscripción
Acta de inicio	13 de julio de 2020

2.3 CUADRO DE CONTROL LEGAL DE LA INTERVENTORIA

Tabla No. 7 cuadro de control legal contrato 358-2019

Tipo de contrato	INTERVENTORIA
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2".
Contratista	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Contrato No	362 DE 2020
Valor inicial	\$ 607.283.789
Plazo Inicial	7 MESES
Fecha de Iniciación	13 D EJULIO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	12 DE FEBRERO DE 2020
Terminación actual de obra	12 DE FEBRERO DE 2020
Supervisión	SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN

ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 345 DE 2019

Tabla No. 8 actas suscritas contrato 362-2019

TIPO DE ACTA	Fecha de suscripción
Acta de inicio	13 de julio de 2020

2.4 RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 358 DE 2019

Tabla No. 9 resumen financiero contrato 358-2019

 BOGOTÁ	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2	
---	---	---

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No. 358 - 2019					
CONCEPTO	FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	PAGADO	SALDO	OBSERVACIONES
VALOR CONTRATO DE OBRA 358-2019				\$ 5.674.948.847	
ANTICIPO DE OBRA	\$ 1.702.484.654		\$ 0	\$ 1.702.484.654	RADICADO MEDIANTE OFICIOMIRS-FDLSC – 013 – 2020 , SIN RECIBIR NUMERO DE RADICADO POR CDI

2.5 RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 362 DE 2019

Tabla No. 10 resumen financiero 362-2019

CONCEPTO	VALOR FIJO (7)% MENSUAL)	VALOR VARIABLE	FACTURADO TOTAL	PAGADO	SALDO	OBSERVACIONES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 362 -2019					\$ 607.283.789	

2.6 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, ha sido de acuerdo a los parámetros establecidos, por lo cual no se levantado ningún proceso de incumplimiento durante la ejecución del contrato de obra 358 de 2019.

2.7 MANEJO DEL ANTICIPO

Actualmente el anticipo por valor de \$ 1.702.484.654, no ha sido desembolsado al contratista de obra CONSORCIO TREMUN, en la fiduciaria ALIANZA.

2.8 METAS FISICAS – AVANCE FISICO

A continuación, se relacionan las metas físicas actuales, señalando los segmentos viales a intervenir bajo el contrato de obra 317-2019.

Tabla No. 11 meta física contrato 358-362-2019

Nº	UP Z	BARRIO	SEGMENTO	EJE	INICIO	FIN	LONGITUD	AREA	KM/CARRIL	ESTUDIOS Y DISEÑOS
1	32	Aguas Claras	50000852-4008149	CALLE 14A S	CRA 24 C Este	CRA 25 Este	54,60	309,33	0,09	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
2	32	Aguas Claras	4007128	CALLE 14A S	CRA 24 Este	CRA 24 C Este	112,06	674,83	0,19	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
3	32	Aguas Claras	50000853-4008475	CALLE 14 Bis S	CRA 24 C Este	CRA 25 Este	36,99	219,28	0,06	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
4	32	Aguas Claras	4007127	CALLE 14 Bis S	CRA 24 Este	CRA 24 C Este	143,04	936,07	0,27	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
5	32	Aguas Claras	4007126	CALLE 14 S	CRA 24 Este	CRA 24 C Este	178,31	1114,61	0,32	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
6	32	Aguas Claras	4007125	CALLE 13D S	TV 24A Este	CRA 24 C Este	175,35	1154,66	0,33	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
7	32	Aguas Claras	4007124	CALLE 13C S	TV 24A Este	CRA 24 C Este	132,71	841,07	0,24	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
8	32	Laureles	50000910-4008462	CALLE 12A Bis S	CRA 23B Bis Este	CRA 23C Este	48,26	365,81	0,10	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
9	32	Laureles	50000943-4008476	CRA 23B Este	CALLE 12A S	CALLE 12B S	30,74	251,86	0,07	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
10	32	Laureles	50000944	CRA 23B Este	CALLE 12 S	CALLE 12A S	29,13	219,27	0,06	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
11	32	Laureles	50000945-4008477	CRA 23B Este	CALLE 11D S	CALLE 12 S	10,96	79,39	0,02	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
12	32	Laureles	50000946-4008241	CRA 23B Este	CALLE 11C S	CALLE 11D S	20,12	173,80	0,05	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
13	32	Laureles	50000947-4008240	CRA 23B Este	CALLE 11B S	CALLE 11C S	31,33	239,53	0,07	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
14	32	Laureles	4008238-4008239-50000948-929	CRA 23B Este	CALLE 11A S	CALLE 11B S	33,66	212,44	0,06	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
15	32	Laureles	50000949-4008179	CALLE 12A S	CRA 23 Este	CRA 23B Este	64,65	383,66	0,11	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
16	32	Laureles	50000950-4008178	CALLE 12 S	CRA 23 Este	CRA 23B Este	85,61	647,41	0,18	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
17	32	Laureles	50000935-4008460	CALLE 11D S	CRA 23B Este	CRA 23B Bis Este	23,42	173,69	0,05	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
18	32	Laureles	50000934-4008459	CALLE 11D S	CRA 23B Bis Este	CRA 23C Este	14,30	94,54	0,03	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
19	32	Laureles	50000951-4008177	CALLE 11C S	CRA 23 Este	CRA 23B Este	83,23	565,31	0,16	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
20	32	Laureles	50000952-4008176	CALLE 11B S	CRA 23 Este	CRA 23B Este	78,99	498,92	0,14	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT
21	32	Laureles	50000953-4008175	CALLE 11A S	CRA 23 Este	CRA 23B Este	77,26	530,34	0,15	CONSULTORIA No. 511 DE 2016 SDHT

El avance evidenciado en el presente periodo, hace referencia al primer mes de los contratos en mención, correspondiente a la fase preliminar, por lo cual existe un avance administrativo, con el fin de proceder a ejecutar actividades de campo que conlleven a un avance físico.

2.9 REQUERIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se realizaron requerimientos al contratista de obra.

3 INFORMACIÓN TÉCNICA.

3.1 CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL

A la fecha no se cuenta con el cronograma de obra definitivo, esto debido a que esta interventoría recibió una versión inicial con errores por lo cual fue devuelta con una serie de observaciones que deberán ser corregidas antes de culminar el plazo contractual de un mes y 15 días, que se tiene para la fase previa del contrato, aun así, se adjunta el cronograma que se encuentra en periodo de revisión por parte de esta interventoría.

3.2 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes

Durante el periodo del presente informe se realizaron las actividades propias de la interventoría durante la etapa de actividades previas, las cuales se ven reflejadas principalmente en las actas de comité realizadas durante el periodo, es de aclarar que como productos finales de esta etapa, los cuales se reportaran en el informe No. 2, ya que este reflejara la culminación de la etapa en mención, se deben obtener los siguientes:

1. Diagnósticos.
2. Cantidades de obra a realizar.
3. Se elabora el presupuesto de cada vía para ser aprobado por la Interventoría del contrato y la Supervisión del mismo.
4. Acta de concertación con la comunidad de cada una de las vías.
5. Programación de obra inicial, en donde se especifica el tiempo, presupuesto estimado y actividades a realizar.
6. Solicitudes de intervenciones a las entidades correspondientes

7. Lo indicado en los pliegos de condiciones en cuanto al personal, equipo necesario, plan de inversión del anticipo y programa de insumos y personal.

Aun así, importante mencionar que el contratista de obra ha adelantado cada una de las actividades mencionadas con anterioridad de la siguiente forma:

1. El contratista de obra como de interventoría, antes de iniciar o firmar la respectiva acta de inicio, realizaron el proceso indicado por las autoridades locales, comandadas por la alcaldía mayor de Bogotá, en donde se solicitaba inscribirse en una plataforma para la reactivación económica, la elaboración del protocolo de bioseguridad y el plan de movilidad segura.
2. Tras la firma del acta de inicio, el contratista de obra con el acompañamiento de esta interventoría realizó los respectivos recorridos de identificación de los CIV contractuales, con el fin de iniciar con la etapa de diagnósticos necesaria para definir la intervención a realizar y de este modo actualizar y ajustar los diseños entregados por el FDLSC.
3. El contratista obra realizó el respectivo cobro del anticipo y fue emitido a la entidad contratante por medio de esta interventoría, esto con sus respectivos soportes, designados en el anexo técnico.
4. Se realiza la respectiva actividad de diagnóstico, con el fin de identificar el estado de los CIV dispuestos a intervenir, Se realiza el diagnostico desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, determinando la condición del suelo existente.






BOGOTÁ

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2

MIRS S.A.S
LATINOAMERICA



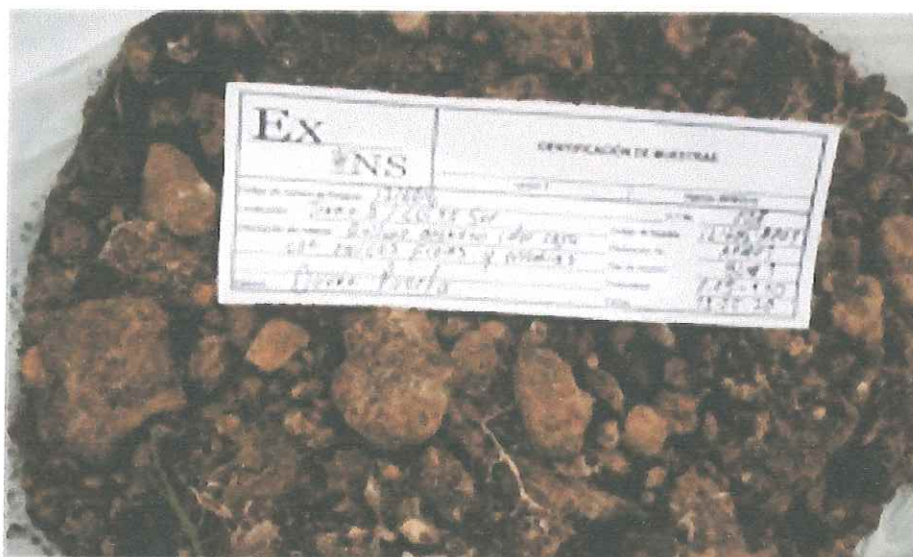

3.2.1 LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE REDES HIDRAULICAS

La inspección de redes hidráulicas no se ha efectuado, ya que no ha sido posible fijar el respectivo recorrido con la entidad encargada para identificar y saber el estado real de las vías, además el FDLSC ha manifestado que no es necesario realizar esta actividad porque las redes tienen menos de dos años de haberse construido y por el contrario se podría destinar los recursos financieros a otras actividades constructivas.

Cuando se ha logrado contacto con el "Profesional División Servicio Acueducto Zona 4", el señor Jorge Boada, se manifestó que era imposible realizar el recorrido debido a la pandemia COVID 19, por lo cual emitió un cuadro en Excel que expresa si la red esta construida o no, pero no manifiesta exactamente en qué estado se encuentra,

por lo cual en los 15 días restantes se deberá definir cómo proceder respecto a esta situación.

Aun así, esta interventoría manifiesta que este proceso es de gran importancia ya que a pesar de que sean redes nuevas no se conoce su estado real, por lo cual se sigue interactuando con la EAAB con el fin de recibir información más precisa.

3.2.2 DISEÑOS

El contratista de obra ha presentado la actualización y ajuste a los estudios y diseños entregados por el FDLSC, por lo que se encuentra en la respectiva revisión por parte del especialista designado por parte de la interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

3.2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Interventoría 362 de 2019, se realizarán los ensayos de control realizados a los granulares constitutivos una vez se dé inicio a la etapa de obra.

Los ensayos de control previstos a los granulares fueron: granulometría, resistencia al desgaste en la máquina de los ángeles, limpieza superficial, límites de Atterberg, índice de plasticidad, equivalente de arena, porcentaje de partículas fracturadas, índices de forma (aplanamiento, alargamiento) y peso específico, calidad de mezclas asfálticas, resistencia a la compresión de cilindros de concreto, resistencia a la flexión mediante vigas de concreto dando así cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente. Los resultados que se obtengan de los diferentes ensayos comprobarán que los materiales cumplen los requisitos exigidos en las especificaciones y que garantizan la calidad de las mezclas elaboradas con ellos.

3.3 EQUIPO DE TRABAJO Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA

Tabla No. 12 equipo de trabajo y funciones de la interventoría

CARGO	FUNCIONES
Director y Residente tecnico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistió a cada comité y reuniones que convocó el FDLSC, y comités de seguimiento. 2. Rindió informe semanal detallando el estado del proyecto y proponiendo alternativas claramente medibles y verificables para cumplir el cronograma de obra aprobado por la interventoría.



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO

2



CARGO	FUNCIONES
	<ol style="list-style-type: none"> Coordinación de todo el personal que participa en el proyecto con el fin de cumplir con las obligaciones estipuladas en los pliegos y sus anexos. Aprobación y revisión de las Actas de Obra. Coordino reuniones con los especialistas de las diferentes áreas.
<p>Residentes</p> <p>SG- SST Y AMBIENTAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> Reviso el componente ambiental del PIPMA. Aseguro el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas en el PIPMA, los pliegos de condiciones, el Contrato, normas y aspectos legales vigentes. Asistió a los comités ambientales y demás reuniones a las que se le requiera por parte del FDLSC. Elaborar e implementar los documentos ambientales requeridos por el FDLSC. Realizo seguimiento a la ejecución del presupuesto ambiental. Mantuvo informada al área técnica de la obra de todas las actividades de gestión ambiental que se realizaron. Verifico que todo el personal se encuentre afiliado a la seguridad social (EPS, ARL y AFP) antes de iniciar labores y que se realicen los pagos correspondientes en el tiempo oportuno, para las actividades realizadas en la etapa de diagnósticos. Verificar que se hayan programado y ejecutado los exámenes médicos ocupacionales requeridos para las actividades realizadas en la etapa de diagnósticos. Requirió el cumplimiento de todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en los pliegos de condiciones, el Contrato, normas, PIPMA y aspectos legales vigentes. Asistió a los comités y reuniones que se le requiera por parte del Contratista, o La FDLSC.
<p>Residente de</p> <p>Gestión Social</p>	<ol style="list-style-type: none"> Superviso el desarrollo de los programas del plan de gestión social. Reviso y aprobó la metodología y cronogramas de actividades de cada una de las actividades establecidas en el plan de gestión social. Asistió en los comités de seguimiento y cumplió con las obligaciones adquiridas en ellos. Asistió a todas las reuniones extraordinarias.

 	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
---	--	---

CARGO	FUNCIONES
	5. Verifico el cumplimiento de todas aquellas actividades de participación, gestión social y atención al ciudadano y las demás requeridas para el buen desarrollo de la gestión social del Contrato.
Especialista en Geotecnia y especialista en Pavimentos	1. Realizo recomendaciones en comités de seguimiento de situaciones imprevistas y puntuales, relacionadas con su especialidad. 2. Asistió a las visitas de los frentes de obra, a solicitud del director de obra, director de interventoría o ingeniero residente.
Especialista en estructuras	1. Realizo recomendaciones en comités de seguimiento de situaciones imprevistas y puntuales, relacionadas con su especialidad. 2. Asistió a las reuniones necesarias, a solicitud del director de obra, director de interventoría o ingeniero residente. 3. Realizo la revisión de los PMT y metodologías para volúmenes de tráfico.

3.4 DESCRIPCION DE LOS ATRASOS O ADELANTOS

A la fecha y según el cronograma de obra emitido por el CONSORCIO VIAL BOGOTA, se evidencia que el contratista de obra tiene un 0% de atraso en las actividades constructivas.

3.5 CUADRO DE ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA DEL ESTADO DEL TIEMPO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

Para el presente periodo no aplica.

3.6 REPORTE DE AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

En el presente periodo no se tuvieron afectaciones a la infraestructura de las ESP.

3.7 PLANES DE CONTINGENCIA

Durante el periodo no se requirieron planes de contingencia.

3.8 COPIA DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS

Durante el presente periodo se realizaron comités de seguimiento en las siguientes fechas:

Tabla No. 13 actas de seguimiento desarrolladas

NUMERO DE ACTA	FECHA
01	JUNIO 24 DE 2020
02	JUNIO 31 DE 2020
03	AGOSTO 05 DE 2020

Se adjunta copia de las actas de seguimiento mencionadas en la tabla inmediatamente anterior.

4 CONCLUSIONES

- Actualmente el contrato de obra se encuentra en etapa de actualización a los estudios y diseños, se han generado las actividades necesarias para llevar a cabo la correcta ejecución del contrato de obra 358 de 2019.
- La EAAB, manifiesta que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los frentes de obra a intervenir, se encuentran construidas, pero no es claro su estado o la no necesidad de intervención, por lo cual se deberá seguir insistiendo en la correcta y eficaz comunicación con la empresa encargada del tema mencionado.
- Han transcurrido 30 días de la fase previa del contrato, en donde se han adelantados todas aquellas actividades preliminares necesaria para iniciar con la ejecución de las actividades de obra, quedando así un plazo de 15 días para dar inicio a la fase de obra de los contratos en mención.

 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO</p> <p>2</p>	
--	---	---

ANEXO 1. ACTAS DE INICIO

ACTA DE INICIO

Clase contrato: CONTRATO DE INTERVENTORIA
N° de contrato: CI-362-2019
Contratista: MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
Identificación: NIT No. 900.241.875-6
Representante Legal: NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Identificación: C.C. N°. 72.005.623 Expedida en Barranquilla.
Objeto del Contrato: REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.
Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES
Valor: SEISCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte. (\$607.283.788,55)
Fecha de Inicio: 13 de julio de 2020
Fecha de terminación: 12 de febrero de 2021
Supervisor: ANDERSON ACOSTA TORRES

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de julio de Dos Mil Veinte (2020).

EL FONDO,


ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

EL CONTRATISTA,


NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Natalia Rojas Vallejo - Abogado Contratación FDLSC
Revisó: Nancy Moya Ramirez - Abogado Contratación FDLSC
Aprobó: Juan Sebastián Rivera - Asesor Jurídico Despacho

 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO</p> <p>2</p>	
--	---	---

ANEXO 2. PÓLIZAS



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

SUCURSAL
ANTIGUO COUNTRY

COD.SUC
21

NO.PÓLIZA
21-44-101315506

ANEXO
0

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA MES AÑO
09 01 2020

VIGENCIA DESDE
DÍA MES AÑO
23 12 2019

A LAS
HORAS
00:00

VIGENCIA HASTA
DÍA MES AÑO
23 07 2025

A LAS
HORAS
23:59

TIPO MOVIMIENTO

EMISION ORIGINAL

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL

MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACION

IDENTIFICACIÓN NIT: 900.241.875-6

DIRECCIÓN: CALLE 63 NBO. 75-35

CIUDAD:

BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO:

5478180

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN: AV 1 DE MAYO NRO. 1 - 40 SUR

CIUDAD:

BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO

3636660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 362 DE 2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRAN POR OBJETO: EJECUTAR A PECTOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REALISTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2019	23/01/2021	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2019	23/07/2025	\$182,185,136.57
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/12/2019	23/07/2023	\$182,185,136.57 \$30,364,189.43

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****1,987,065.00	\$ *****20,000.00	\$ *****381,342.00	\$ *****2,388,408.00	\$ *****394,734,462.57	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101315506

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

JOHANHAMONROY



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101315506		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 07 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 13 07 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 02 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACION		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.241.875-6	
DIRECCIÓN: CALLE 63 NBO. 75-35		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 5478180	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: AV 1 DE MAYO NRO. 1 - 40 SUR		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 3636660	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 362 DE 2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRAN POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C. GRUPO 2.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/07/2020	14/08/2021	\$182,185,136.57	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/07/2020	14/02/2026	\$182,185,136.57	\$182,185,136.57
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/07/2020	14/02/2024	\$30,364,189.43	\$30,364,189.43

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE CORREO POR PARTE DEL CONTRATANTE, SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA CON FECHA PREVISTA PARA EL INICIO A PARTIR DEL 13 DE JULIO DE 2020. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****394,734,462.57	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

Manuel Sarmiento

21-44-101315506

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidenta de Fianzas

Andreas Rodriguez

FIRMA TOMADOR

 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO</p> <p>2</p>	
--	---	---

ANEXO 3. CRONOGRAMA DE OBRA

id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	21
1		"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ	174,38 días	lun 13/07/20	vie 12/02/21	lun 13/07/20	NOD				\$ 4.230.317.225.53	18
2		ETAPA 1. ENTREGA DE DOC, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS.	45 días	lun 13/07/20	lun 7/09/20	lun 13/07/20	NOD				\$ 152.763.542.40	
3		ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	129 días	mar 8/09/20	lun 15/02/21	NOD	NOD				\$ 4.077.553.683.1	
4		TRAMO 1 AGUAS CLARAS CIVs 4008149 - 4007128 - 4008475	88,13 días	mar 8/09/20	jue 24/12/20	NOD	NOD				\$ 466.429.930	
5		1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mar 8/09/20	mar 15/09/20	NOD	NOD				\$ 21.114.253	
10		2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	74,75 días	mié 16/09/20	jue 17/12/20	NOD	NOD			-	\$ 269.580.601	
21		3- ESPACIO PUBLICO	58,75 días	mar 13/10/20	jue 24/12/20	NOD	NOD			-	\$ 175.735.076	

Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual			
	Hito externo		Resumen manual			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total
37										
38	TRAMO 2 AGUAS CLARAS CIVs 4007127	51,75 días	mar 27/10/20	mié 30/12/20	NOD	NOD				\$ 483.445.230
39	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mar 27/10/20	mar 3/11/20	NOD	NOD				\$ 14.803.391
44	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	38,63 días	mié 4/11/20	mar 22/12/20	NOD	NOD				\$ 246.016.948
55	3- ESPACIO PUBLICO	24,63 días	lun 30/11/20	mié 30/12/20	NOD	NOD				\$ 222.624.891

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Proyecto: Programacion de obra

Fecha: mié 9/09/20

Página 2

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total
71										
72	TRAMO 3 AGUAS CLARAS CIVs 4007126	51,75 días	mar 3/11/20	jue 7/01/21	NOD	NOD				\$ 442.851.783
73	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mar 3/11/20	mar 10/11/20	NOD	NOD				\$ 12.831.968
78	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	37,63 días	mié 11/11/20	mar 29/12/20	NOD	NOD				\$ 205.185.192
89	3- ESPACIO PUBLICO	21 días	vie 4/12/20	sáb 2/01/21	NOD	NOD				\$ 224.834.623

Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual			
	Hito externo		Resumen manual			

Página 3

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total
105										
106	TRAMO 4 AGUAS CLARAS CIVs 4007125	45,75 días	mié 11/11/20	jue 7/01/21	NOD	NOD				\$ 372.300.981
107	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mié 11/11/20	mié 18/11/20	NOD	NOD				\$ 13.478.126
112	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	34,63 días	jue 19/11/20	lun 4/01/21	NOD	NOD				\$ 211.796.701
123	3- ESPACIO PUBLICO	20 días	vie 11/12/20	jue 7/01/21	NOD	NOD				\$ 147.026.155

Proyecto: Programacion de obra
Fecha: mié 9/09/20

Tarea		Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo	Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo	Fecha límite	
Resumen		Tarea manual	Progreso	
Resumen del proyecto		Sólo duración	Progreso manual	
Tareas externas		Informe de resumen manual		
Hito externo		Resumen manual		

Página 4

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	21 18
139											
140	TRAMO 5 AGUAS CLARAS CIVs 4007124	47,88 días	mié 18/11/20	lun 18/01/21	NOD	NOD				\$ 362.549.781	
141	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mié 18/11/20	mié 25/11/20	NOD	NOD				\$ 13.187.272	
146	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	33,63 días	jue 26/11/20	jue 7/01/21	NOD	NOD				\$ 204.199.487	
157	3- ESPACIO PUBLICO	21 días	vie 18/12/20	sáb 16/01/21	NOD	NOD				\$ 145.163.022	
<div> <div> <div>Proyecto: Programacion de obra</div> <div>Fecha: mié 9/09/20</div> </div> <div> <div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> <div>Tareas externas</div> <div>Hito externo</div> </div> <div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>Sólo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> </div> <div> <div>Sólo el comienzo</div> <div>Sólo fin</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div> </div> <div> <div>⌂</div> <div>⌂</div> <div>⬇</div> <div>⬆</div> <div>⬆</div> <div>⬆</div> <div>⬆</div> </div> </div>											

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	
191	3- ESPACIO PUBLICO	27,63 días	mar 15/12/21	mié 20/01/21	NOD	NOD			-	\$ 144.765.137	21
208											18
209	TRAMO 3 LAURELES CIVs 50000950 - 935 - 9.48,88 días	mar 24/11/20	lun 25/01/21	NOD	NOD					\$ 377.950.595	
210	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mié 25/11/20	mar 1/12/20	NOD	NOD				\$ 13.620.228	

Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Resumen manual	
	Hito externo		Resumen manual		Resumen manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total
215	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	34,75 días	mié 2/12/20	lun 18/01/2	NOD	NOD			-	\$ 209.478.262
226	3- ESPACIO PUBLICO	21,75 días	lun 28/12/20	lun 25/01/2	NOD	NOD			-	\$ 154.852.105
243										

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso



Progreso manual

Proyecto: Programacion de obra




Fecha: mié 9/09/20

Página 8

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	21 18
278												
279		TRAMO 5 LAURELES CIVs 50000952	53,75 días	mar 1/12/20	vie 5/02/21	NOD	NOD				\$ 178.658.591	
280		1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mar 1/12/20	mié 9/12/20	NOD	NOD				\$ 7.130.306	
285		2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	40,63 días	jue 10/12/20	vie 29/01/21	NOD	NOD			-	\$ 106.906.790	

Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual			
	Hito externo		Resumen manual			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	21 18
296	3- ESPACIO PUBLICO	27,63 días	lun 4/01/21	vie 5/02/21	NOD	NOD			-	\$ 64.621.495	
313											
314	TRAMO 6 LAURELES CIVs 50000953	56,38 días	mar 1/12/20	mar 9/02/21	NOD	NOD				\$ 218.212.542	
315	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mar 1/12/20	mié 9/12/20	NOD	NOD				\$ 7.744.935	


Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual			
	Hito externo		Resumen manual			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	21 18
320	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	46,63 días	jue 10/12/20	vie 5/02/21	NOD	NOD			-	\$ 117.039.900	
331	3- ESPACIO PUBLICO	29,63 días	lun 4/01/21	mar 9/02/21	NOD	NOD			-	\$ 93.427.707	
348											
349	TRAMO 1 LAURELES CIVs 50000948 - 929 - 947 - 946 - 945 - 944 - 943	50,38 días	mié 9/12/20	mar 9/02/21	NOD	NOD				\$ 571.103.629	


Proyecto: Programacion de obra Fecha: mié 9/09/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
	Tareas externas		Informe de resumen manual			
	Hito externo		Resumen manual			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	VR Unitario	Cantidad	Vr Total	2118
350	1-REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	6 días	mié 9/12/20	mié 16/12/20	NOD	NOD				\$ 14.399.515	
355	2-RELLENOS Y PAVIMENTOS	40,63 días	jue 17/12/20	vie 5/02/21	NOD	NOD			-	\$ 221.486.672	
366	3- ESPACIO PUBLICO	23,63 días	mar 12/01/21	mar 9/02/21	NOD	NOD			-	\$ 335.217.442	

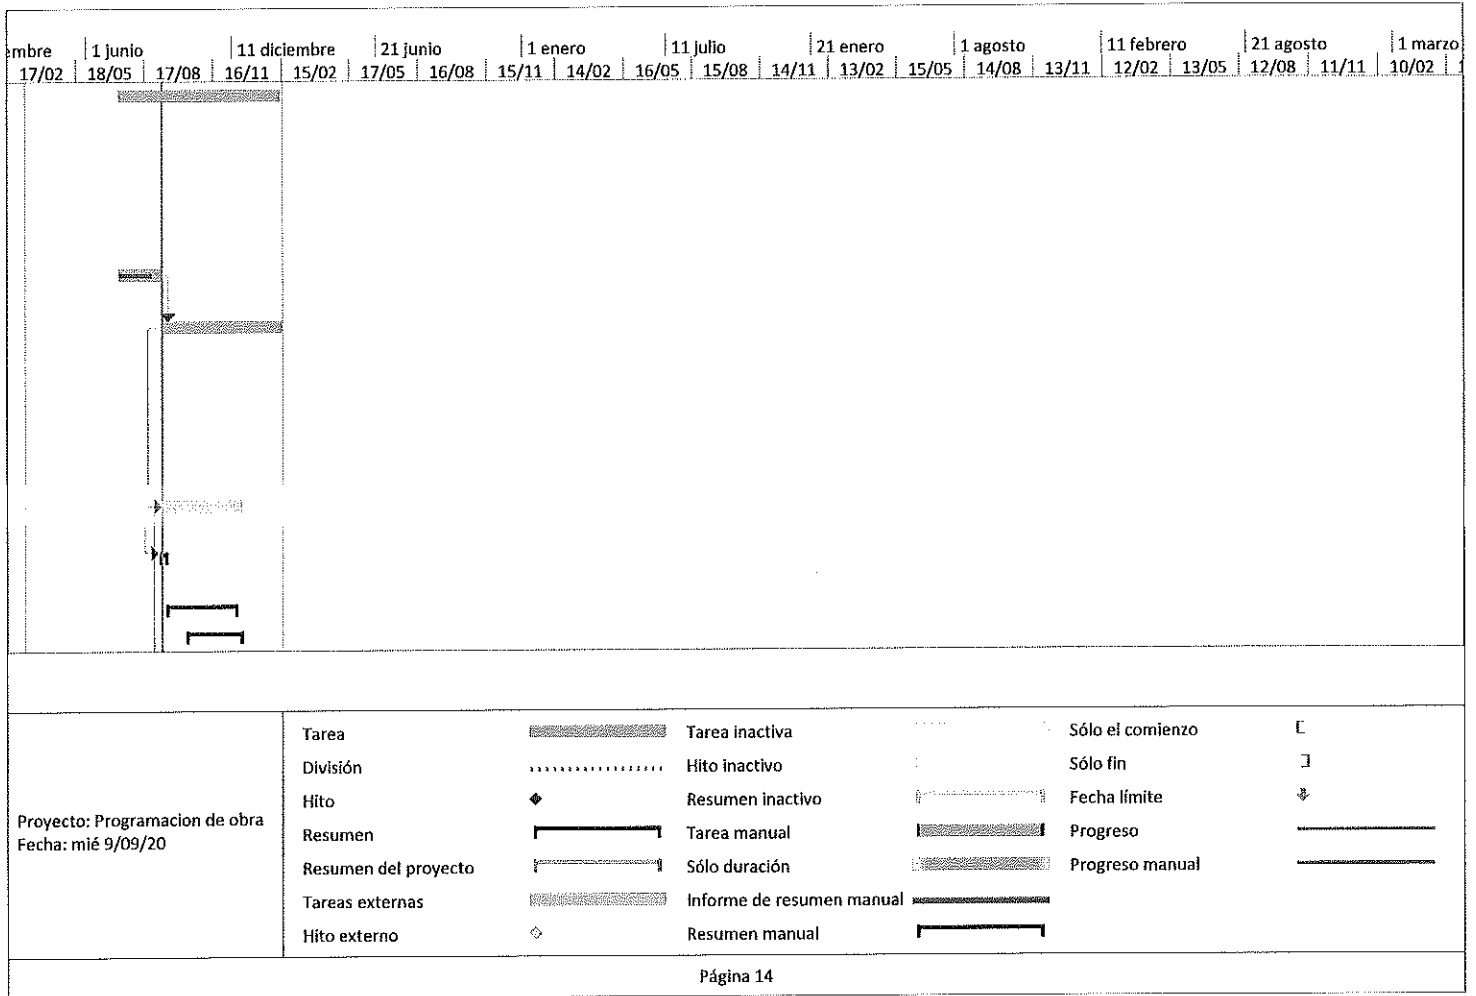


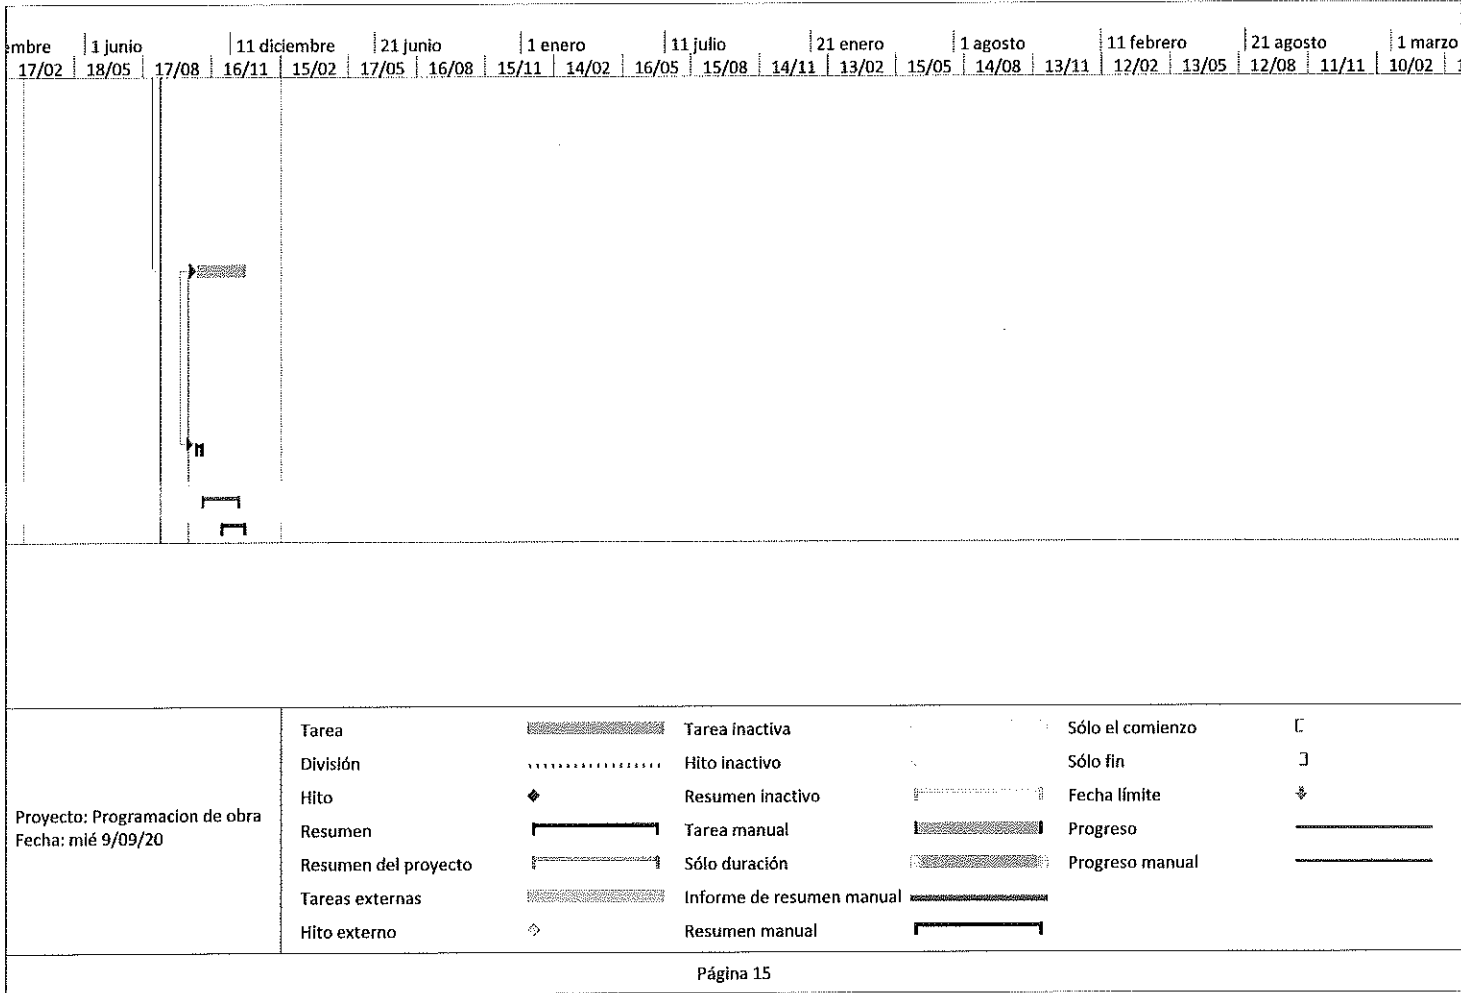

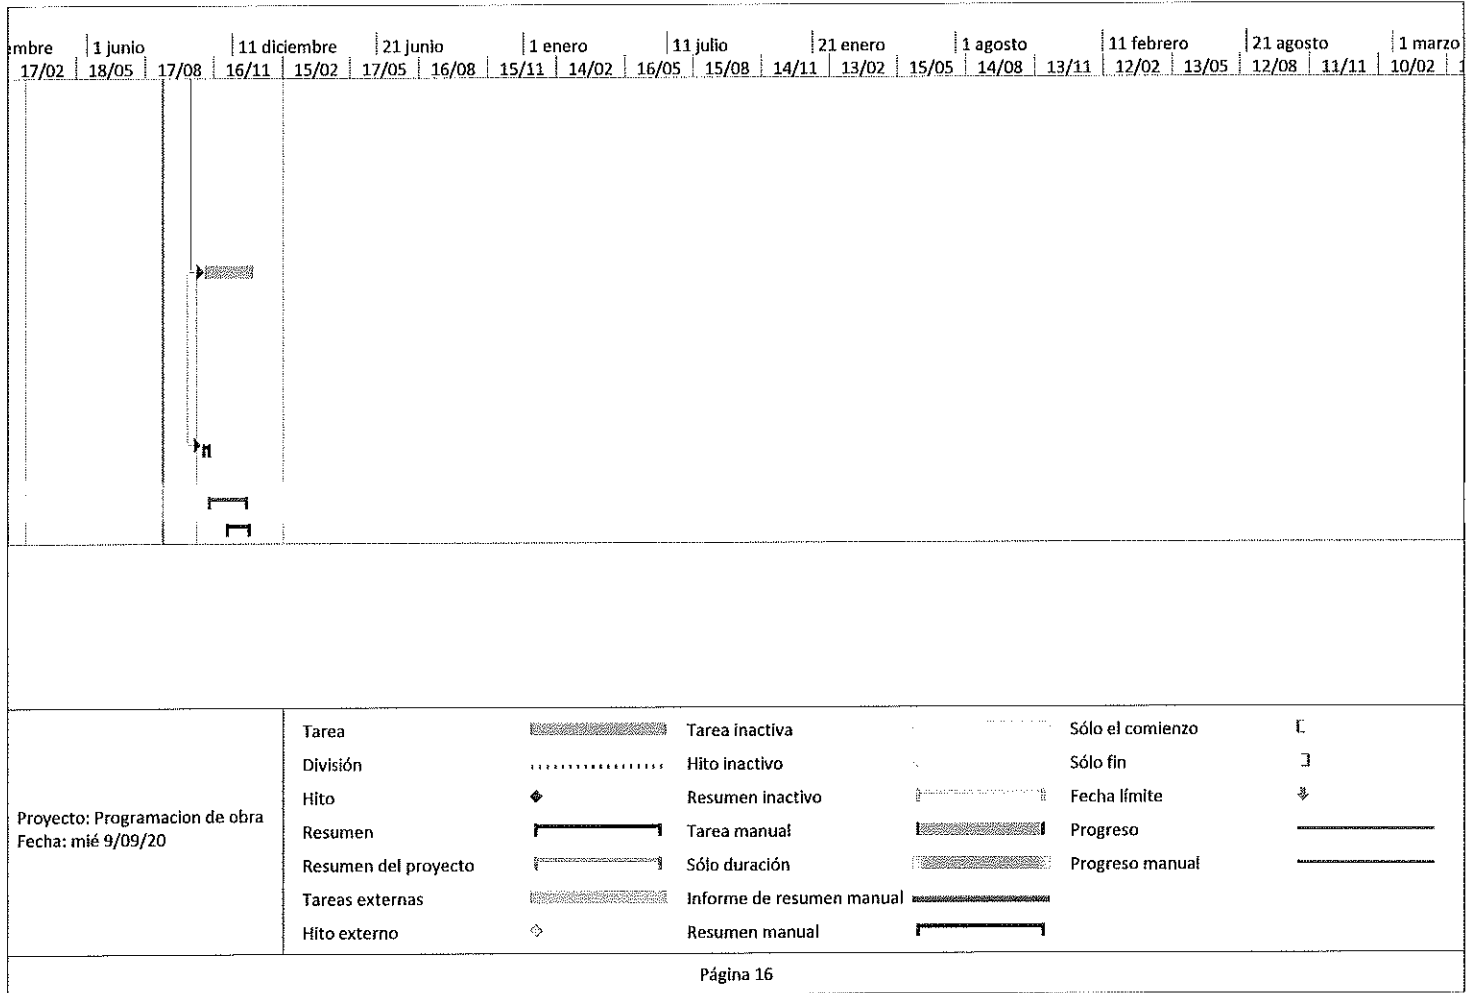


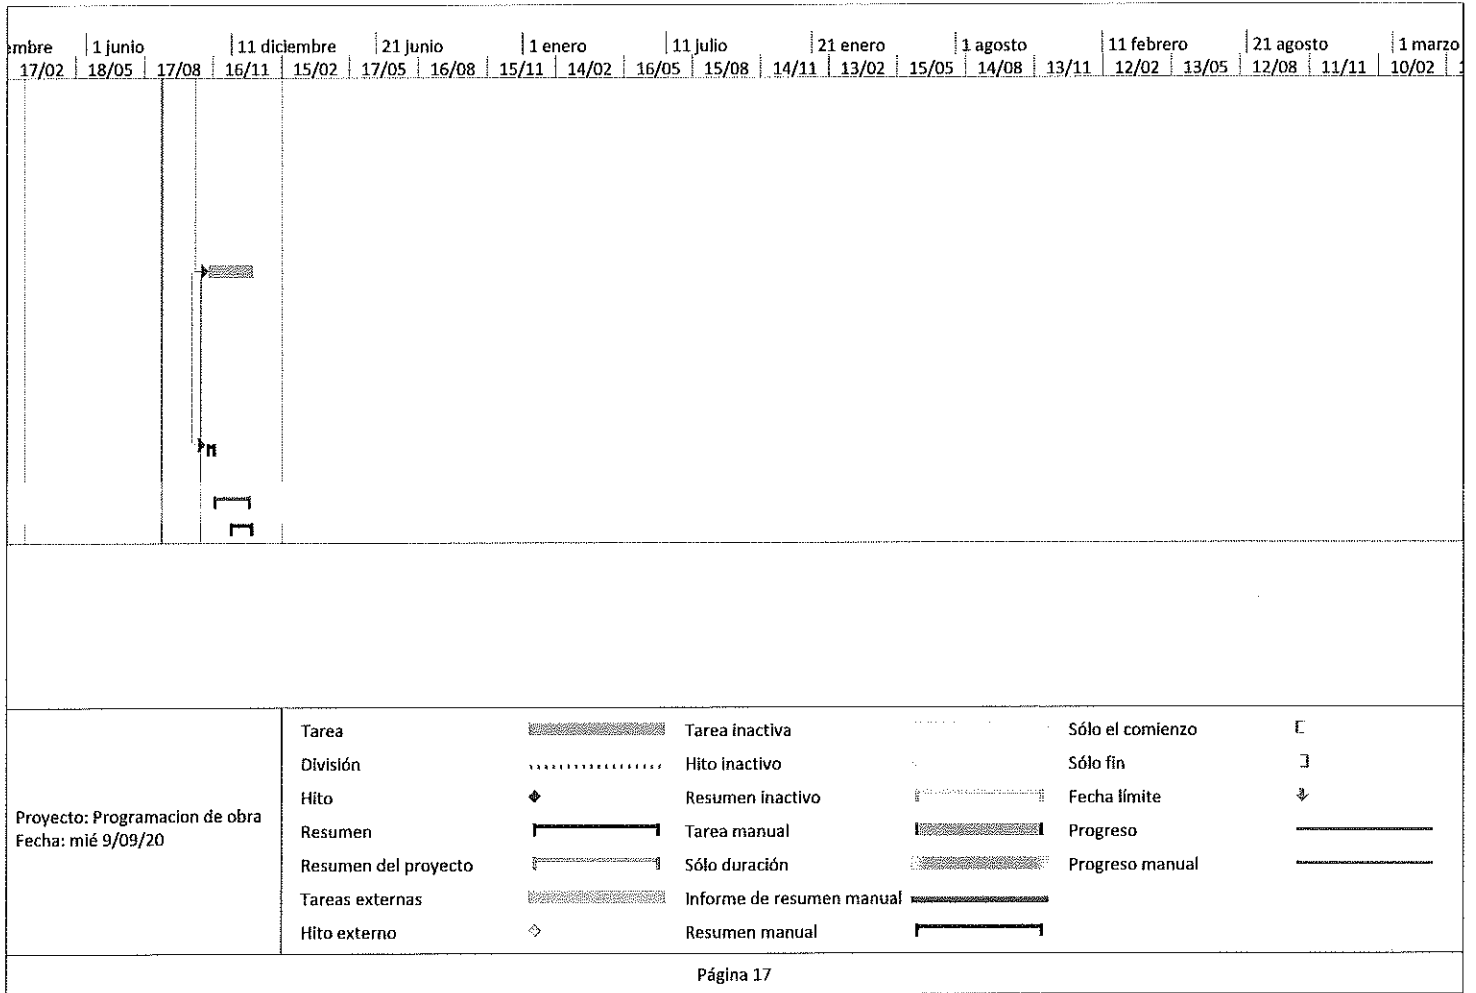

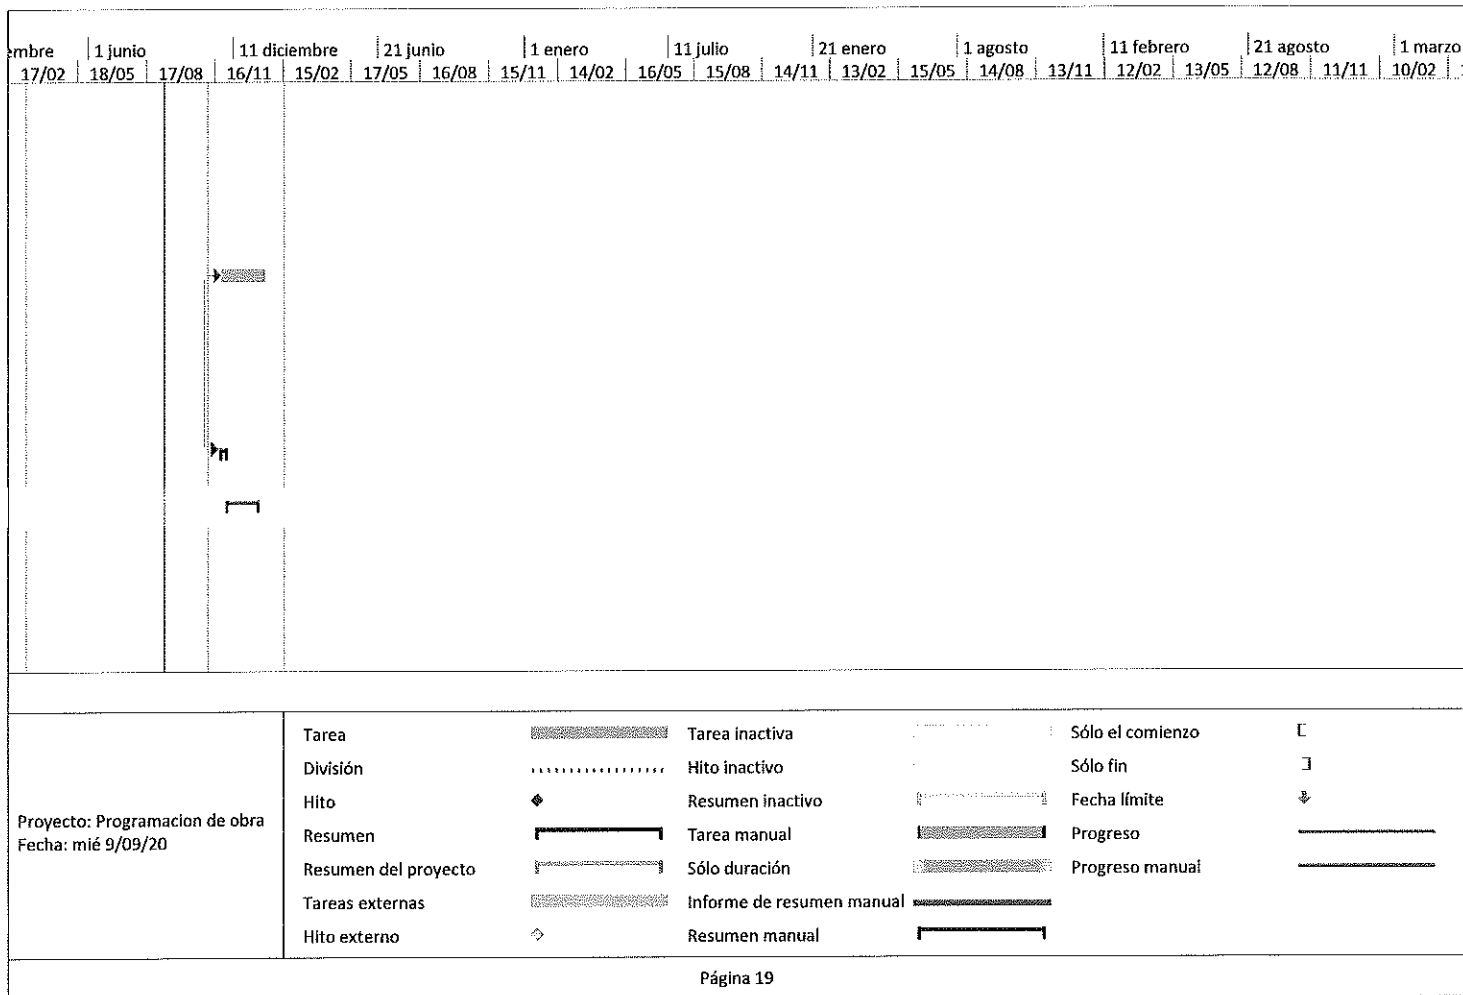

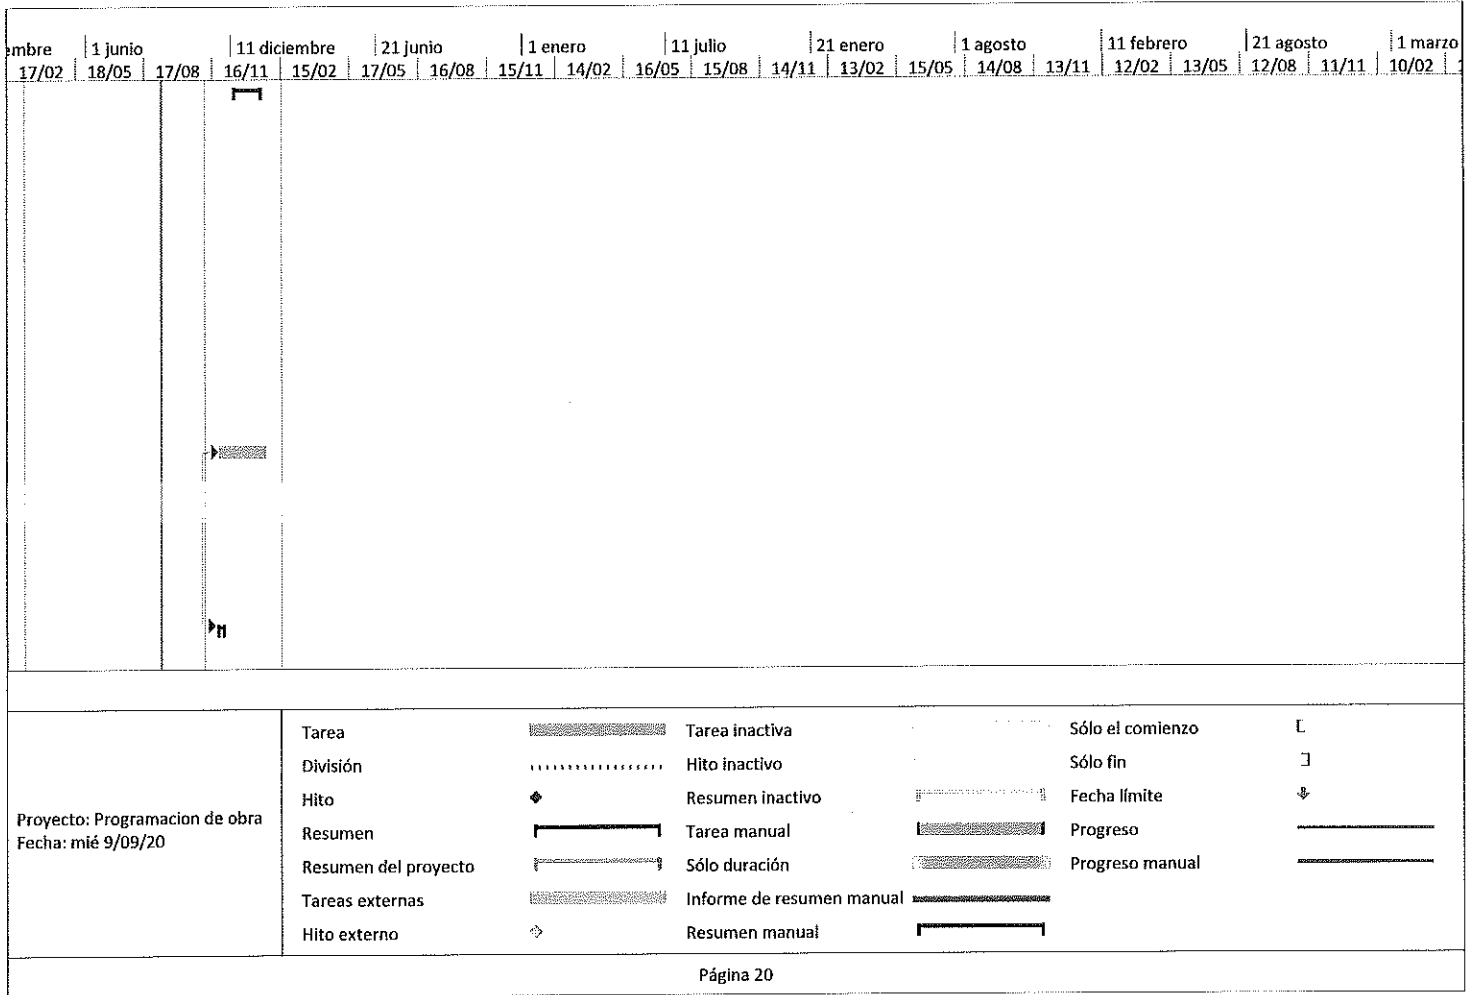


[illegible]

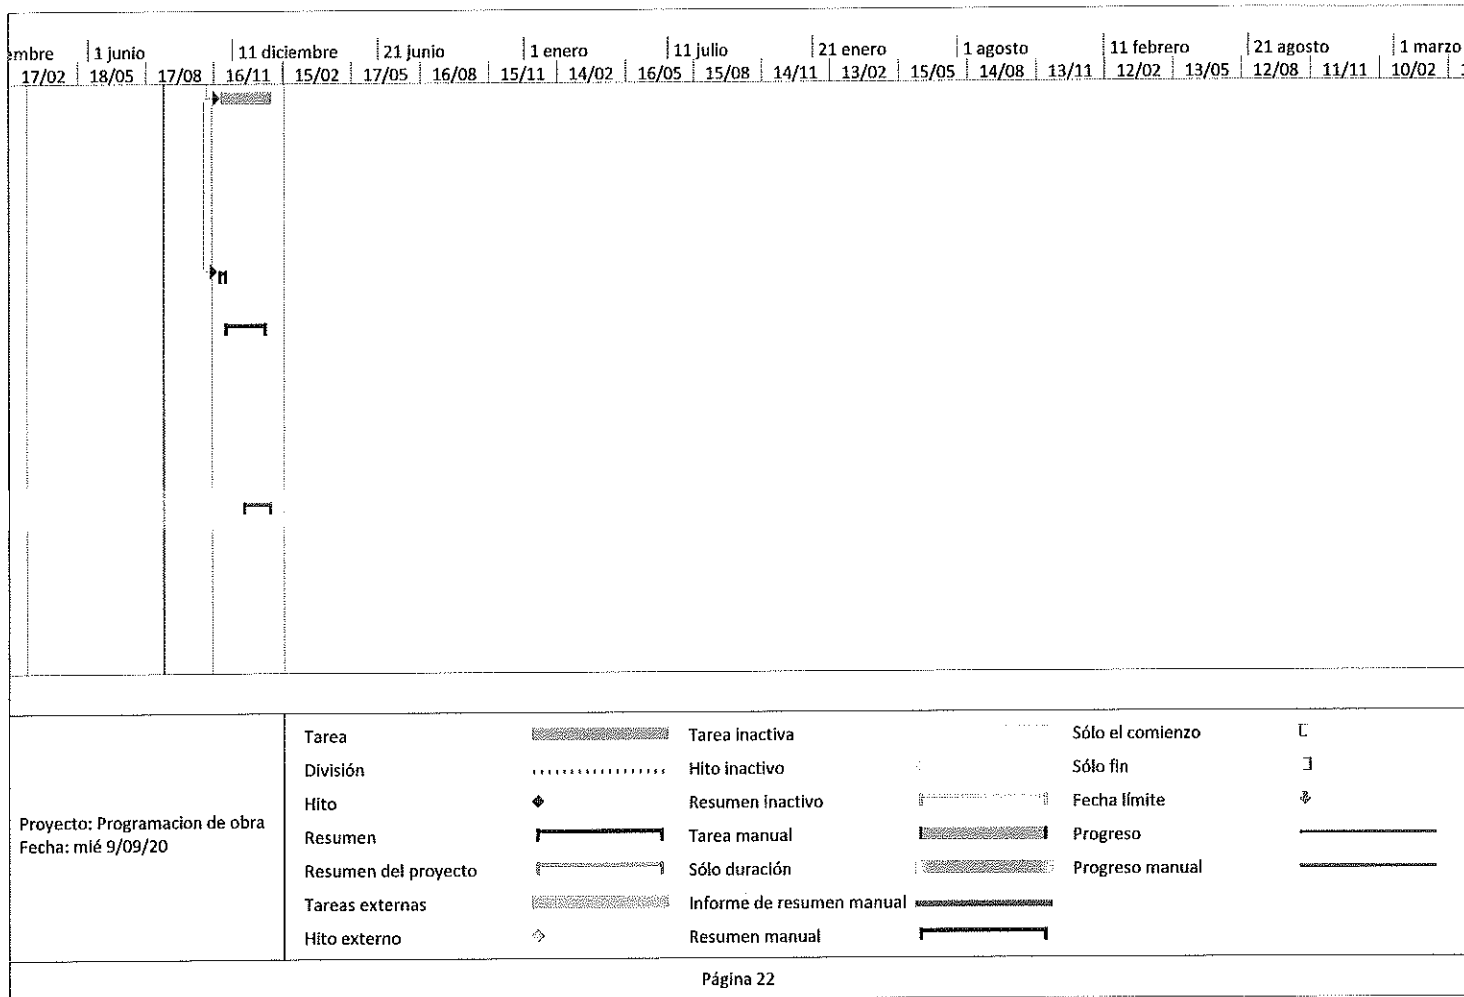

[illegible]

Diagrama de Gantt para el Proyecto: Programación de obra. El diagrama muestra una línea de tiempo horizontal con una escala de fechas desde el 17/02 hasta el 10/02. Se visualizan tres tareas: 'Tarea inactiva' (línea discontinua), 'Hito inactivo' (punto) y 'Resumen inactivo' (rectángulo con puntos). Las tareas están representadas por líneas de diferentes patrones y colores (gris, verde, rojo) que se extienden a lo largo del tiempo.

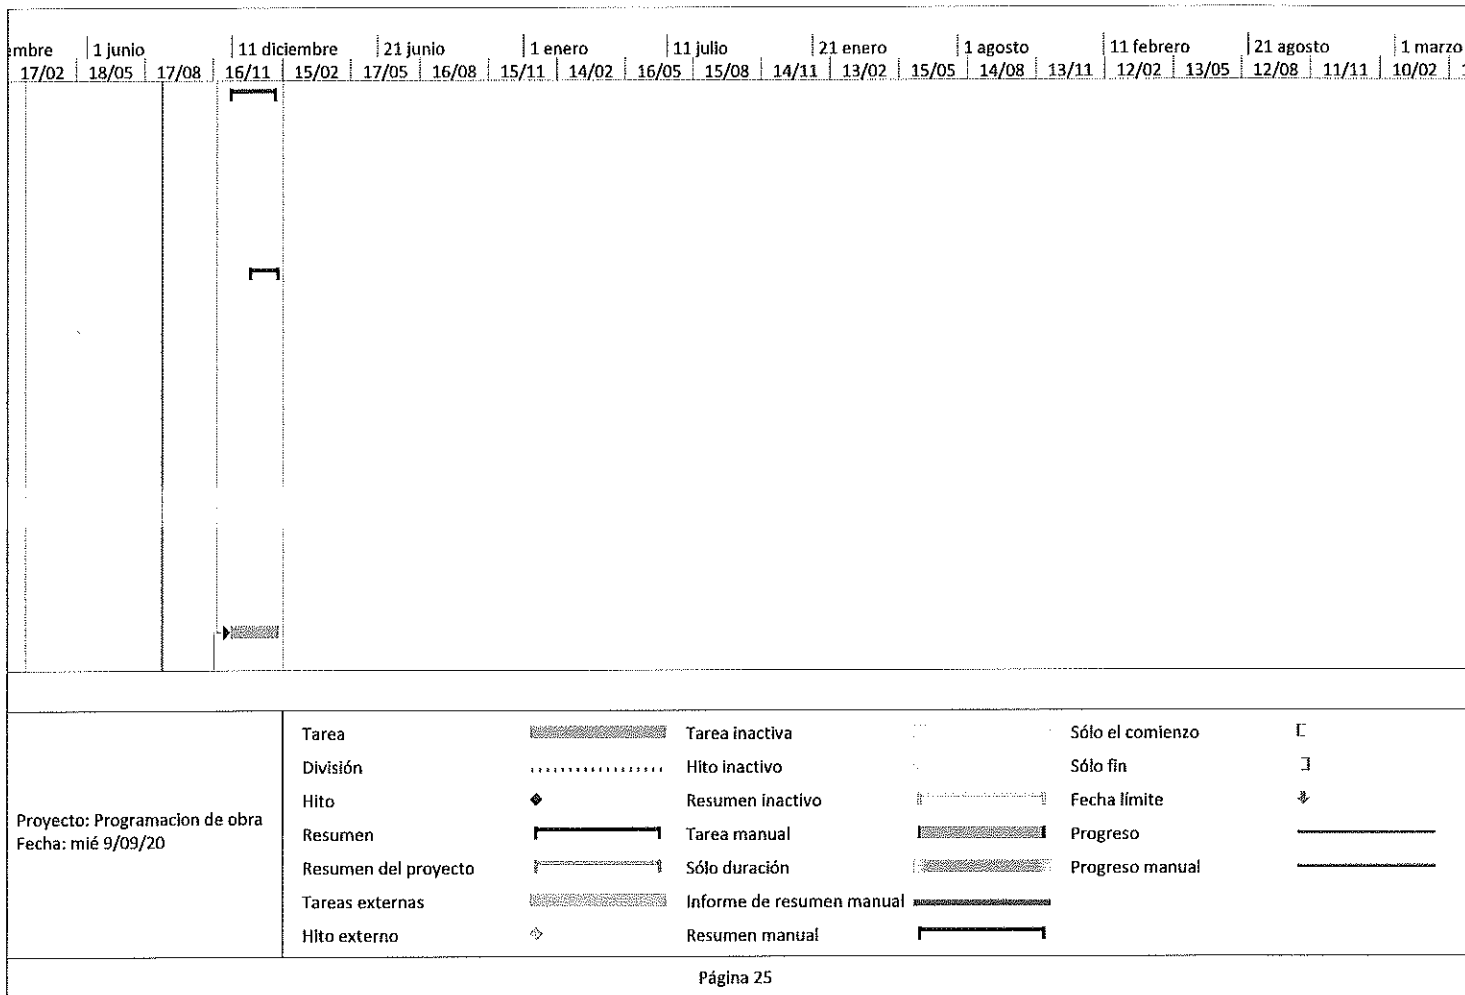

[illegible]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
---	--	--	---

ANEXO 4. CRONOGRAMA DE INTERVENTORIA

[illegible]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
---	--	--	---

ANEXO 5. ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL
Secretaría de Gobierno

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FOLC
FECHA: 05/08/2020 LUGAR: 08A
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión CTO 318-362
HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO	AUXILIAR				
Edwin Barajas			X			Hirs latinoamericana	contacto362@gmail.com	—	
Jabio Merik			X			Hirs latinoamericana	contacto362@gmail.com	3167541174	
Jura Kariele Rodriguez			X			"	"	3124637251	
Sandra Fajardo						FOLSC	sandra.fajardo@folsc.gov.co		
Miguel Bejarano						FOLSC	miguel.bejarano@folsc.gov.co		
Oscar D. Vargas	X					TREMUN	oscardvargas@tremun.gov.co	3102239581	
David Julián Vega	X					Tremun	david.vega@tremun.gov.co	3175743760	
Ara Carolina Vargas	X					C. TREMUN	dunquere308@gmail.com		
OSCAR GRI TENCOR	X					C. TREMUN	CONSORCIO TREMUN 3105115144		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido de con el fin de reconocer en conjunto los CIV a intervenir, a dicho recorrido ante el FOLSC, el consorcio Tremen y Hirs lahnoamona sas, además se realiza una reunión y debate, con los siguientes momentos:

Componente Social:

- Entrega Plan Gestión Social definitiva con su respectivo anexo de COP-19. (Pendiente)
- Planes de divulgación. (Pendientes) incluir diseño de cartel.
- Informe ~~Técnica~~ Planificación social para el 13 a 12 de cada mes por lo que el primer informe va de 13 de julio a 12 de Agosto de 2020, el cual deberá ser entregado dentro de los primeros ~~10~~ días hábiles posteriores a fecha de corte; este informe será un anexo al Informe Técnico, y será entregado los 18 de cada mes.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se debe diligenciar formato solicitado por la entidad, posterior a esto enviar todo el documento del plan firmado.

COMPONENTE SST

- No se ha radicado el Plan de seg. salud en el trabajo, el cual sería entregado el día 07 de agosto 2020.
- Inf. Semanal.

COVID - 19

- Se debe hacer informe semanal respecto a este componente.

COMPONENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

- Los ajustes a los elementos propuestos están en revisión de la interventoría, hace falta el soporte aduado respecto a el WU de PD-12 o GCR.
- Programación obra, se envía para revisión de la interventoría
- Plan de Calidad.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	P6S definitivo	Tiemun	05/08/2020
	Actas divulgación	Tiemun	05/08/2020
	Plan de gestión ambiental con anexos	Tiemun	05/08/2020
	Plan de seg. y salud de trabajo	Tiemun	07/08/2020
	Programación obra.	Tiemun	
	Plan Calidad	Tiemun	26/08/2020

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPONENTE TÉCNICO

- El #DZSC manifiesta preocupación por el cambio tentativo del pavimento rígido al pavimento flexible, es importante incluir una opción o alternativas que contemplen el pavimento rígido

COMPONENTE DE TRÁNSITO

El FDZSC manifiesta preocupación respecto al tiempo justo que se tiene con el trámite de los PHT

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLSC
 FECHA: 24/07/2020 LUGAR: VIRTUAL
 OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO CONTRATO 358 Y 362
 HORA DE INICIO: 7 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8 AM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMI.				
EDWIN BARAJAS REINA			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
FABIO MERCK									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
LINA RODRIGUEZ									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
MARITZA IBÁÑEZ									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
GUIOVANNI SILVA									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
IVAN ARRELLANA									MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
ANA CAOLINA VARGAS				X					CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		
OSCAR GIL RINCON		X							CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		
OSCAR DAVID VARGAS	X								CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		
SANDRA FAJARDO								X	FDLSC	Sandra.fajardo@gobietno bogota.gov.co		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reúnen el FDLSC, MIRS LATINOAMERICA S.A.S (interventoría) y el CONSORCIO TREMUN (contratista de obra), con el fin de realizar seguimiento a los contratos 358 y 362 de 2019.

COMPONENTE SISOMA

La interventoría manifiesta que el programa de manejo ambiental y el plan de gestión de residuos de construcción y demolición, se encuentran en su etapa de revisión final, los cuales serán enviados a la supervisión, posterior al contacto con el referente ambiental de la Alcaldía.

COMPONENTE COVID 19- BIOSEGURIDAD

- La interventoría y el FDLSC, hacen relevancia en cuanto al cumplimiento estricto de las medidas de protección necesarias para combatir el coronavirus, requisito necesario para el inicio de las actividades de obra.
- La entidad contratante manifiesta que se deberá anexar un capítulo al informe mensual SST, referente a todo lo relacionado al COVID 19 y los respectivos protocolos de bioseguridad, así mismo se aclara que semanalmente también se deberá presentar un informe respecto a este tema.

COMPONENTE SOCIAL

Se manifiesta por parte de la interventoría que, en lo referente al plan de gestión social es necesario anexar un capítulo en donde se hayan adaptado y adoptado las medidas necesarias para el manejo de la pandemia, también se aclara que el plan de gestión en su versión inicial ya está revisado, a la espera del anexo en mención.

El FDLSC, aclara el proceso a seguir para realizar las respectivas actas de vecindad, las cuales constarán de un registro fotográfico por fachada por parte del contratista, y el propietario brindará un registro fotográfico interno, con el fin de no tener ningún contacto físico.

Es importante enviar a la supervisión toda aquella información necesaria para obtener el código de aprobación en esta área, ya que la entidad deberá hacer un proceso interno respecto a esto.

COMPONENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO

Todas las actividades preliminares necesarias antes del inicio de las actividades de obra, se encuentran en proceso de revisión y corrección, por lo cual se debe enviar una relación de las actividades hasta el momento realizadas,

La entidad contratante solicita se programe un recorrido de identificación de alcance del contrato, con el fin de encaminar el mismo en una sola línea, la fecha de este recorrido queda pendiente por definir

El FDLSC, por medio de la supervisión manifiesta que es importante tener los tiempos claros en cuanto a cada fase de los contratos y a cada actividad que se debe realizar, así mismo recalca que se deberá presentar informes mes a mes así no se realice ningún cobro parcial, y menciona que la fecha límite de radicación de cuentas es el día 10 de cada mes .

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	ENTREGA ANEXO PGS	C. TREMUN	30 JUL 2020
	PROGRAMAR RECORRIDO	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	28 JUL 2020

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____ FDLSC _____
 FECHA: _____ 31/07/2020 _____ LUGAR: _____ VIRTUAL _____
 OBJETO DE LA REUNIÓN: _____ SEGUIMIENTO CONTRATO 358 Y 362 _____
 HORA DE INICIO: _____ 8 AM _____ HORA DE FINALIZACIÓN: _____ 9 AM _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO IDGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMI.				
EDWIN BARAJAS REINA			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
FABIO MERCK			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
LINA RODRIGUEZ			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
MARITZA IBAÑEZ			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA		X							MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
GUIOVANNI SILVA			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
IVAN ARRELLANA			X						MIRS LATINOAMERICA SAS	contrato362@gmail.com		
SANDRA FAJARDO			X						FDLSC	Sandra.fajardo@gobiernobogota.gov.co		
MIGUEL BEJARANO			X						FDLSC			
ANA CAOLINA VARGAS				X					CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		
OSCAR GIL RINCON		X							CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		
OSCAR DAVID VARGAS	X								CONSORCIO TREMUN	Consortio.tremun@xie.com.co		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reúnen el FDLSC, MIRS LATINOAMERICA S.A.S (interventoría) y el CONSORCIO TREMUN (contratista de obra), con el fin de realizar seguimiento a los contratos 358 y 362 de 2019, adicional se presenta nuevo apoyo a la supervisión, el ingeniero Miguel Bejarano.

COMPONENTE SISOMA

La interventoría se contactará con el referente ambiental de la alcaldía, con el fin de dar apertura al PIN de obra, además se manifiesta que el día jueves 30 de julio de 2020 el contratista de obra radicó la documentación respectiva del componente ambiental y el componente SST, la cual será revisada por la interventoría; la información final completamente revisada y aprobada por la interventoría, será radicada el día miércoles 05 de agosto de 2020.

COMPONENTE COVID 19- BIOSEGURIDAD

La interventoría y el FDLSC, hacen relevancia en cuanto al cumplimiento estricto de las medidas de protección necesarias para combatir el coronavirus, requisito necesario para el inicio de las actividades de obra.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría manifiesta que, tras la revisión del plan de gestión social, es importante tener línea telefónica en el punto de atención al ciudadano, además de esto se indicaron las directrices a seguir para la realización de las piezas divulgativas, las cuales deberán ser enviadas a la supervisión con el fin de obtener el código de aprobación. El plan de gestión social en su versión final deberá ser radicado el día miércoles 05 de agosto de 2020.

COMPONENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO

- La supervisión y la interventoría, manifiestan que para el día miércoles 5 de agosto de 2020, se debe tener totalmente claro los ajustes a los diseños propuestos por el contratista de obra, así mismo su incidencia en el presupuesto oficial, esto posterior a la respectiva revisión por parte de la interventoría.
- A partir del 6 de agosto de 2020 se podrá programar recorrido con el acueducto, con el fin identificar las redes que podrían necesitar mantenimiento, o por el contrario definir aquellas que no lo necesitan.
- La supervisión de los contratos en mención, manifiesta la importancia de realizar el trámite de los PMT a tiempo, con el fin de no tener inconvenientes en el inicio de obra.
- El anticipo de obra ya fue tramitado por la supervisión al área correspondiente, por lo cual se manifiesta por parte del FDLSC, que, si se puede demostrar que se iniciará obra antes de lo previsto, este anticipo se podría agilizar.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	RADICAR LOS RESPECTIVOS PLANES DE GESTION, EN SUS COMPONENTES SOCIAL Y SISOMA	CONSORCIO TREMUN	05 AGOSTO 2020
	ADQUIRIR E INSTALAR LINEA TELEFONICA DEL PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	CONSORCIO TREMUN	05 AGOSTO 2020
	ENTREGAR LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y SUS RESPECTIVOS INFORMES DE SOPORTE A LA INTERVENTORIA, DONDE SE IDENTIFIQUE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO	CONSORCIO TREMUN	05 AGOSTO 2020
	ENTREGAR PLAN DE CALIDAD DE OBRA	CONSORCIO TREMUN	05 AGOSTO 2020
	ENTREGAR PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	CONSORCIO TREMUN	06 AGOSTO 2020
	AJUSTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES A UN MENOR TIEMPO	CONSORCIO TREMUN	05 AGOSTO 2020
	ENTREGAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	CONSORCIO TREMUN	06 AGOSTO 2020

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2</p>	
---	--	--	---

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

LAURELES
CIV 50000953-40008175



LAURELES
CIV 50000910-4008462



LAURELES
CIV 50000943-4008476



LAURELES
CIV 50000944



LAURELES
CIV 50000945-4008477



LAURELES
CIV 50000946-4008241



LAURELES
CIV 50000947-4008240



LAURELES
CIV 4008238-4008239-50000948-929



