

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: CP-I-000
		VERSION: 001
		PÁGINA:1

Betania, marzo 02 de 2021

SEÑORES
MINISTERIO DE DEPORTES
ESM

Referencia: **CONVENIO 875 DE 2019** “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA”

Asunto: Solicitud e intención de prórroga No. 1 al contrato de obra

Cordial saludo:

En nuestra firme intención de dar cumplimiento al objeto del convenio marco de la referencia, teniendo en cuenta el estado actual de las actividades, que en camerinos ya superan el 50%, así mismo en la construcción de la cancha es superior al 84%, y que a pesar de estar ejecutando las obras a un ritmo acelerado, esta se ha visto afectada por varios factores que no han permitido estar acorde con los planes de contingencia propuestos por el contratista, nos permitimos solicitar avalar un plazo adicional al contractual por un (1) mes, a partir del 22 de marzo de 2021, basados en las siguientes justificaciones:

- Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra.
- El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra
- La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

Lo anterior en aras de dar entrega a la cancha sintética considerando que las actividades faltantes están centradas en:


“Betania tiene Futuro”
CARLOS MARIO VILLADA URIBE
ALCALDE: 2020 – 2023
 Calle 19 # 19 – 67 - Tel: 843 5127- 8435180
 Correo: contactenos@betania-antioquia.gov.co
 Código Postal: 056070

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: CP-I-000
		VERSION: 001
		PÁGINA:2

1. La instalación de grama sintética, Que se iniciara el próximo 05 de marzo de 2021
2. La instalación de tubería hidrosanitaria, cubierta en camerinos y unidades sanitarias, las cuales iniciarán el día 08 de marzo de 2021.

Por lo expuesto también es necesario solicitarle, consideren la posibilidad, de adicionar en plazo y valor el contrato correspondiente a la interventoría externa, aspecto necesario y fundamental para la vigilancia al desarrollo y terminación de la obra y logro de objetivos del convenio 875 de 2019.

Agradezco la atención que pueda brindar a esta solicitud, pues el único propósito es garantizar la terminación efectiva de la obra y generar, por ende, el beneficio social que requiere la comunidad.



CARLOS MAURICIO LOPEZ CASTAÑO
Secretario de Planeación
Supervisor

CC DR. DIEGO IGNACIO ARENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Consultores DONOVAN SAS

DON-MINDEP-963-050

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2021

INGENIERO

JOSE ALBEIRO GRISALES

Supervisor del Convenio

MINISTERIO DEL DEPORTE

Av. CRA. 68 N°55-65 BOGOTÁ

Referencia: CCS-963-2020 "interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el municipio de Betania, departamento de Antioquia derivado del convenio interadministrativo 875 de 2019".

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CCS-963-2020

Respetado Ingeniero,

El presente oficio tiene como propósito presentar formalmente la solicitud de prórroga y adición No.1, para el contrato de interventoría de la referencia, en base a las siguientes solicitudes:

- 1- El Municipio de Betania mediante oficio dirigido a Ministerio del Deporte de fecha 02 de marzo de 2021, realizó la Solicitud e intención de prórroga No. 1 al contrato de obra pública N° 230-09-04-97-2020 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA".
- 2- El Contratista de obra INGEMAT COLOMBIA S.A.S, mediante oficios INGMT-CHLBA -032 de fecha 5 de marzo del 2021, realizo la solicitud de ampliación del plazo de ejecución por un (1) mes, a partir del 22 de marzo de 2021 y con fecha de culminación el día 22 de abril 2021, basados en las siguientes justificaciones:
 - Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra.
 - El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra.
 - La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

Lo anterior en aras de dar entrega a la cancha sintética considerando que las actividades faltantes están centradas en:

- a- La instalación de grama sintética: Que se iniciara el lunes 08 de marzo del 2021.
 - b- La instalación de la cubierta el miércoles 10 de marzo en batería sanitaria.
 - c- Construcción del cerramiento de la batería sanitaria iniciaría el 10 de marzo.
 - d- La instalación de concreto para el sobre piso de la batería sanitaria se iniciaría el miércoles 10 de marzo del presente año.
 - e- La instalación de la tubería hidráulica se iniciaría el jueves 11 de marzo de 2021.
 - f- La instalación del mesón de para lavamanos se iniciaría el viernes 12 de marzo del presente año.
 - g- La instalación de baldosa ara piso se iniciaría de 13 de marzo del presente año.
 - h- La instalación de enchape en pared se iniciaría el martes 16 de marzo del 2021.
 - i- Las instalaciones de lavamanos institucional se iniciarían el lunes 15 de marzo.
 - j- La instalación de pintura en vinilo se iniciará el miércoles 17 de marzo.
 - k- La instalación de pintura tipo Koraza para exteriores se iniciaría el sábado 20 de marzo.
 - l- La instalación de orinales y baños fluxómetros se iniciarían en el lunes 22 de marzo.
 - m- Las instalaciones de duchas se iniciarían el martes 23 de marzo.
 - n- La instalación de puertas y ventanas se iniciarían en el da jueves 25 de marzo.
 - o- La instalación de las tapas para el cárcamo y caja de inspección se iniciaría el día sábado 27 de marzo.
 - p- La instalación del lleno con material de préstamo se iniciaría el miércoles 8 de abril.
 - q- Detalles se iniciarían el jueves 09 de abril.
 - r- La instalación de la grama macana se iniciaría el sábado 11 de abril.
 - s- La limpieza y aseo se iniciarían el lunes 13 de abril.
 - t- El retiro de material sobrante se iniciaría el martes 14 de abril.
 - u- Entrega de obra se iniciaría jueves 16 de abril.
 - v- Proceso de liquidación se iniciaría el viernes 17 de abril.
- 3- Mediante oficio INGMT- CHLBA -033 de fecha 11 de marzo del 2021, se remiten los documentos complementarios a la Solicitud de prórroga No. 1, donde se anexa:
- Registros de datos hidrometeorológicos de la estación 26190090 BETANIA- LAS GUACAS.
 - Reprogramación de obra, con fecha de terminación el 22 de abril de 2021.
 - Flujo de inversiones acorde con las actividades programadas para la entrega del objeto del contrato.

Ante dicha solicitud, esta interventoría ve viable las justificaciones anteriormente señaladas por el Municipio - contratista, y que exponemos las siguientes consideraciones:

- Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra y Registros de datos hidrometeorológicos de la estación 26190090 BETANIA LAS GUACAS.

- El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra.
- La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

Por lo anterior, y en aras de ir adelantando el trámite de la adición y prórroga de interventoría, ponemos a su consideración la propuesta económica para el contrato de interventoría CCS-963-2020, toda vez que el contrato de interventoría vence el día 31 de marzo del 2021.

Para la presente solicitud, se está considerando un plazo de veinte (20) días posterior a la culminación del plazo de ejecución de obra, y que se encuentra estipulado dentro del ANEXO TECNICO SEPARABLE, numeral 6.2.1.3 Fase 3: liquidación: *"Para el cumplimiento de esta fase la interventoría contará con un plazo de Veinte (20) días calendario y consistirá en el cierre y liquidación del contrato de obra objeto de interventoría."* De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra iría hasta el 22 de abril de 2021 y el contrato de interventoría hasta el 12 de mayo de 2021.

Cordialmente,



DIEGO IGNACIO ARENAS
Director de Interventoría
Consultores Donovan SAS

Anexos: Acta modificatoria Interventoría
Oficio Municipio Solicitud e intención de prórroga No. 1 al contrato de obra
INGMT- CHLBA -032
INGMT- CHLBA -033
Reprogramación y Flujo de Inversiones firmado por el Municipio de Betania

CC. MINISTERIO DE DEPORTE- Arq. Catherine Calderón Aguilar

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: CP-I-000
		VERSION: 001
		PÁGINA:1

Betania, marzo 02 de 2021

SEÑORES
MINISTERIO DE DEPORTES
ESM

Referencia: **CONVENIO 875 DE 2019** “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA”

Asunto: Solicitud e intención de prórroga No. 1 al contrato de obra

Cordial saludo:

En nuestra firme intención de dar cumplimiento al objeto del convenio marco de la referencia, teniendo en cuenta el estado actual de las actividades, que en camerinos ya superan el 50%, así mismo en la construcción de la cancha es superior al 84%, y que a pesar de estar ejecutando las obras a un ritmo acelerado, esta se ha visto afectada por varios factores que no han permitido estar acorde con los planes de contingencia propuestos por el contratista, nos permitimos solicitar avalar un plazo adicional al contractual por un (1) mes, a partir del 22 de marzo de 2021, basados en las siguientes justificaciones:

- Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra.
- El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra
- La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

Lo anterior en aras de dar entrega a la cancha sintética considerando que las actividades faltantes están centradas en:


“Betania tiene Futuro”
CARLOS MARIO VILLADA URIBE
ALCALDE: 2020 – 2023
 Calle 19 # 19 – 67 - Tel: 843 5127- 8435180
 Correo: contactenos@betania-antioquia.gov.co
 Código Postal: 056070

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: CP-I-000
		VERSION: 001
		PÁGINA:2

1. La instalación de grama sintética, Que se iniciara el próximo 05 de marzo de 2021
2. La instalación de tubería hidrosanitaria, cubierta en camerinos y unidades sanitarias, las cuales iniciarán el día 08 de marzo de 2021.

Por lo expuesto también es necesario solicitarle, consideren la posibilidad, de adicionar en plazo y valor el contrato correspondiente a la interventoría externa, aspecto necesario y fundamental para la vigilancia al desarrollo y terminación de la obra y logro de objetivos del convenio 875 de 2019.

Agradezco la atención que pueda brindar a esta solicitud, pues el único propósito es garantizar la terminación efectiva de la obra y generar, por ende, el beneficio social que requiere la comunidad.



CARLOS MAURICIO LOPEZ CASTAÑO
Secretario de Planeación
Supervisor

CC DR. DIEGO IGNACIO ARENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Consultores DONOVAN SAS

Carmen de Viboral, marzo 05 de 2021

INGMT- CHLBA -032

Señor:

DIEGO IGNACIO ARENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Consultores Donovan SAS

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 230-09-04-97-2020**
"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA
DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL
CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA"

Asunto: Solicitud de prórroga No. 1

Cordial saludo:

En nuestra firme intención de dar cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el estado actual de las actividades, que en camerinos ya superan el 46,75%, así mismo en la construcción de la cancha es superior al 80%, y que a pesar de estar ejecutando las obras a un ritmo acelerado, nos hemos visto afectados por varios factores que no nos permiten estar acorde con los planes de contingencia propuestos, nos permitimos solicitar un plazo adicional al contractual por un (1) mes, a partir del 22 de marzo de 2021, basados en las siguientes justificaciones:

- Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra.
- El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra
- La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

Lo anterior en aras de dar entrega a la cancha sintética considerando que las actividades faltantes están centradas en:

1. La instalación de grama sintética: Que se iniciara el lunes 08 de marzo del 2021.
2. La instalación de la cubierta el miércoles 10 de marzo en batería sanitaria.
3. Construcción del cerramiento de la batería sanitaria iniciaría el 10 de marzo.

4. La instalación de concreto para el sobre piso de la batería sanitaria se iniciaría el miércoles 10 de marzo del presente año.
5. La instalación de la tubería hidráulica se iniciaría el jueves 11 de marzo de 2021.
6. La instalación del mesón de para lavamanos se iniciaría el viernes 12 de marzo del presente año.
7. La instalación de baldosa ara piso se iniciaría de 13 de marzo del presente año
8. La instalación de enchape en pared se iniciaría el martes 16 de marzo del 2021.
9. Las instalaciones de lavamanos institucional se iniciarían el lunes 15 de marzo.
10. La instalación de pintura en vinilo se iniciará el miércoles 17 de marzo.
11. La instalación de pintura tipo Koraza para exteriores se iniciaría el sábado 20 de marzo.
12. La instalación de orinales y baños fluxómetros se iniciarían en el lunes 22 de marzo.
13. Las instalaciones de duchas se iniciarían el martes 23 de marzo.
14. La instalación de puertas y ventanas se iniciarían en el da jueves 25 de marzo.
15. La instalación de las tapas para el cárcamo y caja de inspección se iniciaría el día sábado 27 de marzo.
16. La instalación del lleno con material de préstamo se iniciaría el miércoles 8 de abril.
17. Detalles se iniciarían el jueves 09 de abril.
18. La instalación de la grama macana se iniciaría el sábado 11 de abril.
19. La limpieza y aseo se iniciarían el lunes 13 de abril.
20. El retiro de material sobrante se iniciaría el martes 14 de abril.
21. Entrega de obra se iniciaría jueves 16 de abril.
22. Proceso de liquidación se iniciaría el viernes 17 de abril.

Agradezco su atención y ayuda con este asunto.


JHON JAIME RAMIREZ ZULUAGA
Representante Legal
INGEMAT COLOMBIA S.A.S
NIT.811.030.916-1

CC. CC. Secretaria de planeación y obras públicas - Municipio de Betania Antioquia
CC. Ing. Bibiana Barreras Casallas – Residente de interventoría - Consultores Donovan S.A.S

Carmen de Viboral, marzo 10 de 2021

INGMT- CHLBA -033

Señor:

DIEGO IGNACIO ARENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Consultores Donovan SAS

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 230-09-04-97-2020**
"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA
DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL
CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA"

Asunto: Entrega documentos complementarios al Solicitud de prórroga No. 1

Cordial saludo:

Dando respuesta a su oficio DON-MINDEP-963-048, nos permitimos hacer entrega de:

- Registros de datos hidrometeorológicos de la estación 26190090 BETANIA-LAS GUACAS.
- Reprogramación de obra, con fecha de terminación el 22 de Abril de 2021.
- Flujo de inversiones acorde con las actividades programadas para la entrega del objeto del contrato.

La documentación es el complemento a la solicitud de prórroga al contrato de obra de la referencia por un plazo de un (1) mes a partir de la fecha de terminación del 22 de marzo de 2021.

Agradecemos la atención.



JHON JAIME RAMIREZ ZULUAGA
Representante Legal
INGEMAT COLOMBIA S.A.S
NIT.811.030.916-1

CC. CC. Secretaria de planeación y obras públicas - Municipio de Betania Antioquia
CC. Ing. Bibiana Barreras Casallas – Residente de interventoría - Consultores Donovan S.A.S



REGISTROS DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS

(BETANIA-LAS GUACAS [26190090])

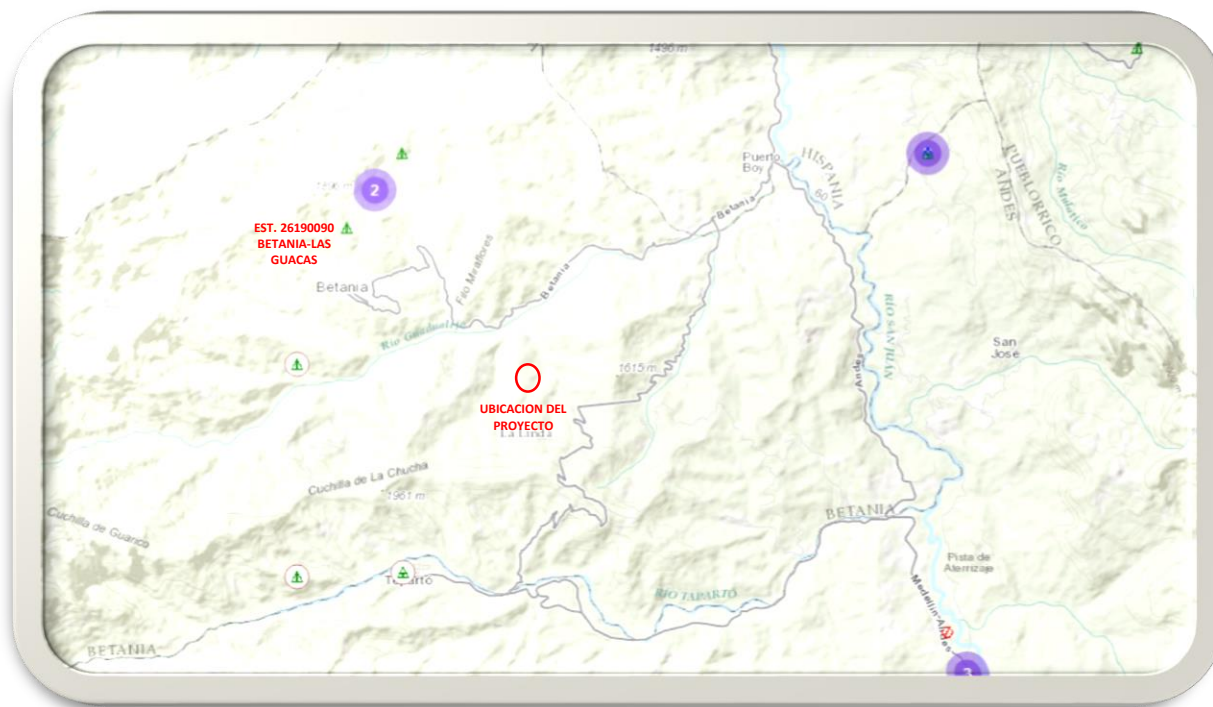

Código	26190090
Nombre	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]
Categoría	Pluviométrica
Longitud	-75,98
Latitud	5,75
Altitud	1.600,00
Departamento	Antioquia
Municipio	Betania
Estado	Activa
Tecnología	Convencional
Fecha de Instalación	Octubre 15, 1970
Fecha de Suspensión	
Acercar a	

UBICACIÓN DE LAS ESTACION MAS CERCANA AL PROYECTO



REGISTRO HIDROMETEREOLÓGICA (PRECIPITACION)

MES NOVIEMBRE DE 2020



EST. 26190090 BETANIA-LAS GUACAS

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Entidad	Departamen	Municipio	IdParametro	Etiqueta	Frecue	Fecha	Valor
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	1/11/2020 0:00	2
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	2/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	3/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	4/11/2020 0:00	3
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	5/11/2020 0:00	16
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	6/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	7/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	8/11/2020 0:00	11
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	9/11/2020 0:00	13
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	10/11/2020 0:00	10
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	11/11/2020 0:00	2
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	12/11/2020 0:00	9
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	13/11/2020 0:00	32
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	14/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	15/11/2020 0:00	4
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	16/11/2020 0:00	18
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	17/11/2020 0:00	3
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	18/11/2020 0:00	47
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	19/11/2020 0:00	12
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	20/11/2020 0:00	14
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	21/11/2020 0:00	3
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	22/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	23/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	24/11/2020 0:00	15
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	25/11/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	26/11/2020 0:00	7
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	27/11/2020 0:00	35
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	28/11/2020 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	29/11/2020 0:00	16
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	30/11/2020 0:00	0
VALOR TOTAL MES NOVIEMBRE 2020												277

(1) Día de noviembre de 2020, con precipitaciones mayores a 20 mm o lluvias fuertes, después del 24 noviembre de 2020 fecha de ajustes a los diseños.



REGISTRO HIDROMETEREOLOGICA (PRECIPITACION)

MES DICIEMBRE DE 2020



EST. 26190090 BETANIA-LAS GUACAS

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Entidad	Departamen	Municipio	IdParametro	Etiqueta	Frecue	Fecha	Valor
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	1/12/2020 0:00	12
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	2/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	3/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	4/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	5/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	6/12/2020 0:00	4
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	7/12/2020 0:00	18
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	8/12/2020 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	9/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	10/12/2020 0:00	7
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	11/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	12/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	13/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	14/12/2020 0:00	45
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	15/12/2020 0:00	15
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	16/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	17/12/2020 0:00	18
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	18/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	19/12/2020 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	20/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	21/12/2020 0:00	3
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	22/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	23/12/2020 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	24/12/2020 0:00	35
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	25/12/2020 0:00	15
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	26/12/2020 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	27/12/2020 0:00	17
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	28/12/2020 0:00	12
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	29/12/2020 0:00	30
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	30/12/2020 0:00	25
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	31/12/2020 0:00	0
VALOR TOTAL MES DICIEMBRE 2020												271

(4) Cuatro días para el mes de diciembre de 2020, con precipitaciones mayores a 20 mm o lluvias fuertes.

(2) Dos días para el mes de enero de 2021, con precipitaciones mayores a 20 mm o lluvias fuertes.



REGISTRO HIDROMETEREOLOGICA (PRECIPITACION)

MES FEBRERO DE 2021



EST. 26190090 BETANIA-LAS GUACAS

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Entidad	Departamen	Municipio	IdParametro	Etiqueta	Frecue	Fecha	Valor
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	1/02/2021 0:00	8
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	2/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	3/02/2021 0:00	3
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	4/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	5/02/2021 0:00	35
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	6/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	7/02/2021 0:00	35
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	8/02/2021 0:00	15
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	9/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	10/02/2021 0:00	7
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	11/02/2021 0:00	42
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	12/02/2021 0:00	6
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	13/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	14/02/2021 0:00	6
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	15/02/2021 0:00	2
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	16/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	17/02/2021 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	18/02/2021 0:00	55
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	19/02/2021 0:00	68
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	20/02/2021 0:00	16
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	21/02/2021 0:00	33
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	22/02/2021 0:00	30
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	23/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	24/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	25/02/2021 0:00	5
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	26/02/2021 0:00	22
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	27/02/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	28/02/2021 0:00	4
VALOR TOTAL MES FEBRERO 2021												397

(8) Ocho días para el mes de febrero de 2021, con precipitaciones mayores a 20 mm o lluvias fuertes.



REGISTRO HIDROMETEREOLOGICA (PRECIPITACION)

MES MARZO DE 2021

EST. 26190090 BETANIA-LAS GUACAS



CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Entidad	Departamen	Municipio	IdParametro	Etiqueta	Frecue	Fecha	Valor
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	1/03/2021 0:00	16
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	2/03/2021 0:00	7
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	3/03/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	4/03/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	5/03/2021 0:00	0
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	6/03/2021 0:00	12
26190090	BETANIA-LAS GUACAS [26190090]	5.755	-75.9755	1600	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	Antioquia	Betania	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	7/03/2021 0:00	35
VALOR PARCIAL MES MARZO 2021												70

(1) Un Dia parcialmente para el mes de marzo de 2021, con precipitaciones mayores a 20 mm o lluvias fuertes.

Nº	Modo de Nombre de obra	Duración	Comenzó	Fin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
43	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para construcción de gradierías y escaleras, fundaciones, columnas, viga de anclaje y losa de contrapiso.	100 días	jun 14/12/20	vie 2/04/21																															
44	Suministro, transporte, corte, fijación y colocación de acero de refuerzo de $F_y=420$ Mpa para construcción de gradierías y escaleras.	100 días	mar 8/12/20	jun 29/03/21																															
45	Construcción de andén y rampa de acceso en concreto de 21 Mpa con acabado tipo meiro.	7 días	jun 22/03/21	jun 29/03/21																															
46	Suministro, transporte y colocación de ladrillo barrea recto en concreto de 15x45x60cm, referencia MEP-U 10-BOBAR 450-800.	5 días	vie 23/10/20	mie 28/10/20																															
47	Suministro, transporte y colocación de grama tipo Mecana. Incluye todo lo necesario para su correcta siembra y mantenimiento.	5 días	vie 9/04/21	mie 14/04/21																															
48	CUBIERTA Suministro, transporte y colocación de cubierta metálica con perfiles longitudinales PHRC 180X60X2mm, perfiles transversales PHRC 220X80X2mm, leja metálica plana tipo standing seam, anclajes y uniones según diseño estructural.	4 días	vie 23/10/20	mie 28/10/20																															
49	ACTIVIDADES VARIAS CAMERINOS Suministro transporte e instalación de mamostera en bloque E-0 15 impermeabilizado.	157 días	vie 23/10/20	mie 14/04/21																															
50	Suministro transporte e instalación de mesón en concreto para lavamanos	55 días	sáb 16/01/21	jue 18/03/21																															
51	Suministro transporte e instalación de revoco.	5 días	jue 18/03/21	jue 24/03/21																															
52	Suministro transporte e instalación de pintura en vinilo	25 días	jun 22/02/21	jun 22/03/21																															
53	Suministro transporte e instalación de pintura tipo Korza para exteriores	6 días	vie 2/04/21	vie 9/04/21																															
54	Suministro transporte e instalación de enchufe en pared	6 días	jun 22/03/21	jun 29/03/21																															
55	Suministro transporte e instalación de cerámica de enlape de piso tráfico 5. Incluye mortero de nivelación, vanilla de dilatación, pulida y brillante.	6 días	vie 26/03/21	vie 2/04/21																															
56	Suministro transporte e instalación de lavamanos institucional	3 días	vie 26/03/21	jun 29/03/21																															
57	Suministro, transporte e instalación de ornates	2 días	vie 23/10/20	jun 26/10/20																															
58	Suministro, transporte e instalación de duchas	3 días	mar 30/03/21	jue 1/04/21																															
59	Suministro, transporte e instalación de puertas y ventanas en aluminio anodizado	4 días	mar 30/03/21	jue 1/04/21																															
60	Suministro, transporte e instalación de cables en "U" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.6m, con soldadura autógena. Incluye soportes, tornillos auto perforantes, wash primer, anticorrosivo por areas caras, y todos los elementos necesarios para s	5 días	vie 9/04/21	sáb 13/03/21																															
61	INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	8 días	mie 14/04/21	jue 22/04/21																															
62	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	8 días	mie 14/04/21	jue 22/04/21																															
63	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	8 días	mie 14/04/21	jue 22/04/21																															
64	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	2 días	mie 14/04/21	jue 15/04/21																															
65	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
66	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
67	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
68	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
69	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
70	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
71	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
72	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
73	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
74	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
75	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
76	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
77	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
78	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
79	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
80	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
81	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
82	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
83	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
84	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
85	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
86	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
87	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
88	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
89	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
90	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
91	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
92	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue 16/04/21																															
93	Suministro e instalación de tubería de 5 circuitos, modificación para RED NORMAL CAMERINOS. 4x150 Arpaños, 240 22 cables, lamina 30x100 cables calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, barniz en color electrolítico 5	3 días	mie 14/04/21	jue																															

Id	Modo de obra	Nombre de obra	Duración	Comienzo	Fin
77	🔧	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático binaur enchufable (Breaker) de 2x20 a 2x50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente IEC=10 KA, no reparable, sellado y contrafireado.	2 días	mié 14/04/21	jue 15/04/21
78	🔧	ITEMS NO PREVISTOS Excavación mecanizada prestacurcas-mater comur/congrom 0 a 6,0 m.	131 días	jue 26/11/20	lun 19/04/21
79	🔧	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC para alcantarillado Ø=2"	4 días	jue 26/11/20	mar 11/12/20
80	🔧	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-ALL para aguas lluvias Ø=4"	20 días	mar 21/01/21	mar 23/01/21
81	🔧	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-ALL para aguas lluvias Ø=4"	38 días	lun 1/02/21	sáb 13/03/21
82	🔧	Construcción de muro para soportar cerramiento en malla eslabonada. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto de 21 Mpa para vigas de cerramiento de 10x15cm, bloque de concreto de 15x20x80cm cada 3 metros, pilotes c	57 días	mié 27/01/21	mar 30/03/21
83	🔧	Relevo en material seleccionado proveniente de la excavación (apisonado)	80 días	lun 28/12/20	jue 25/03/21
84	🔧	Cubierta metálica con perfiles longitudinales PHRC 120X60X2mm, perfiles transversales PHRC 220X80X2mm, lisa termoacústica 5.5mm incluye tornillos autopercutorantes, cabalotes según diseño estructural	14 días	mié 3/03/21	jue 18/03/21
85	🔧	Fluorímetros y otros No previstos	5 días	mié 14/04/21	lun 19/04/21
86	🔧	Fin de proyecto	0 días	jue 22/04/21	jue 22/04/21


Fluviso: Juliana Paula Gomes.
Presidente de Intervenção.
Consultores: Demouren.

sec pluricentric

Resumen del proyecto		Resumen manual		Resumen manual	
Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	sub el contenido	Fecha limite	Proyecto manual
.....	Tarea manual	solo direccion	solo fin	Tareas critica	
.....	Info manual	Informe de resumen manual	Tareas estimas	Duracion critica	
.....	Info manual	Resumen manual	Info estimo	Proyecto	

Página 3

Revisé: *Armando Pardo Pardo*
 Residente de Intendencia.
 Consultores Donoson.

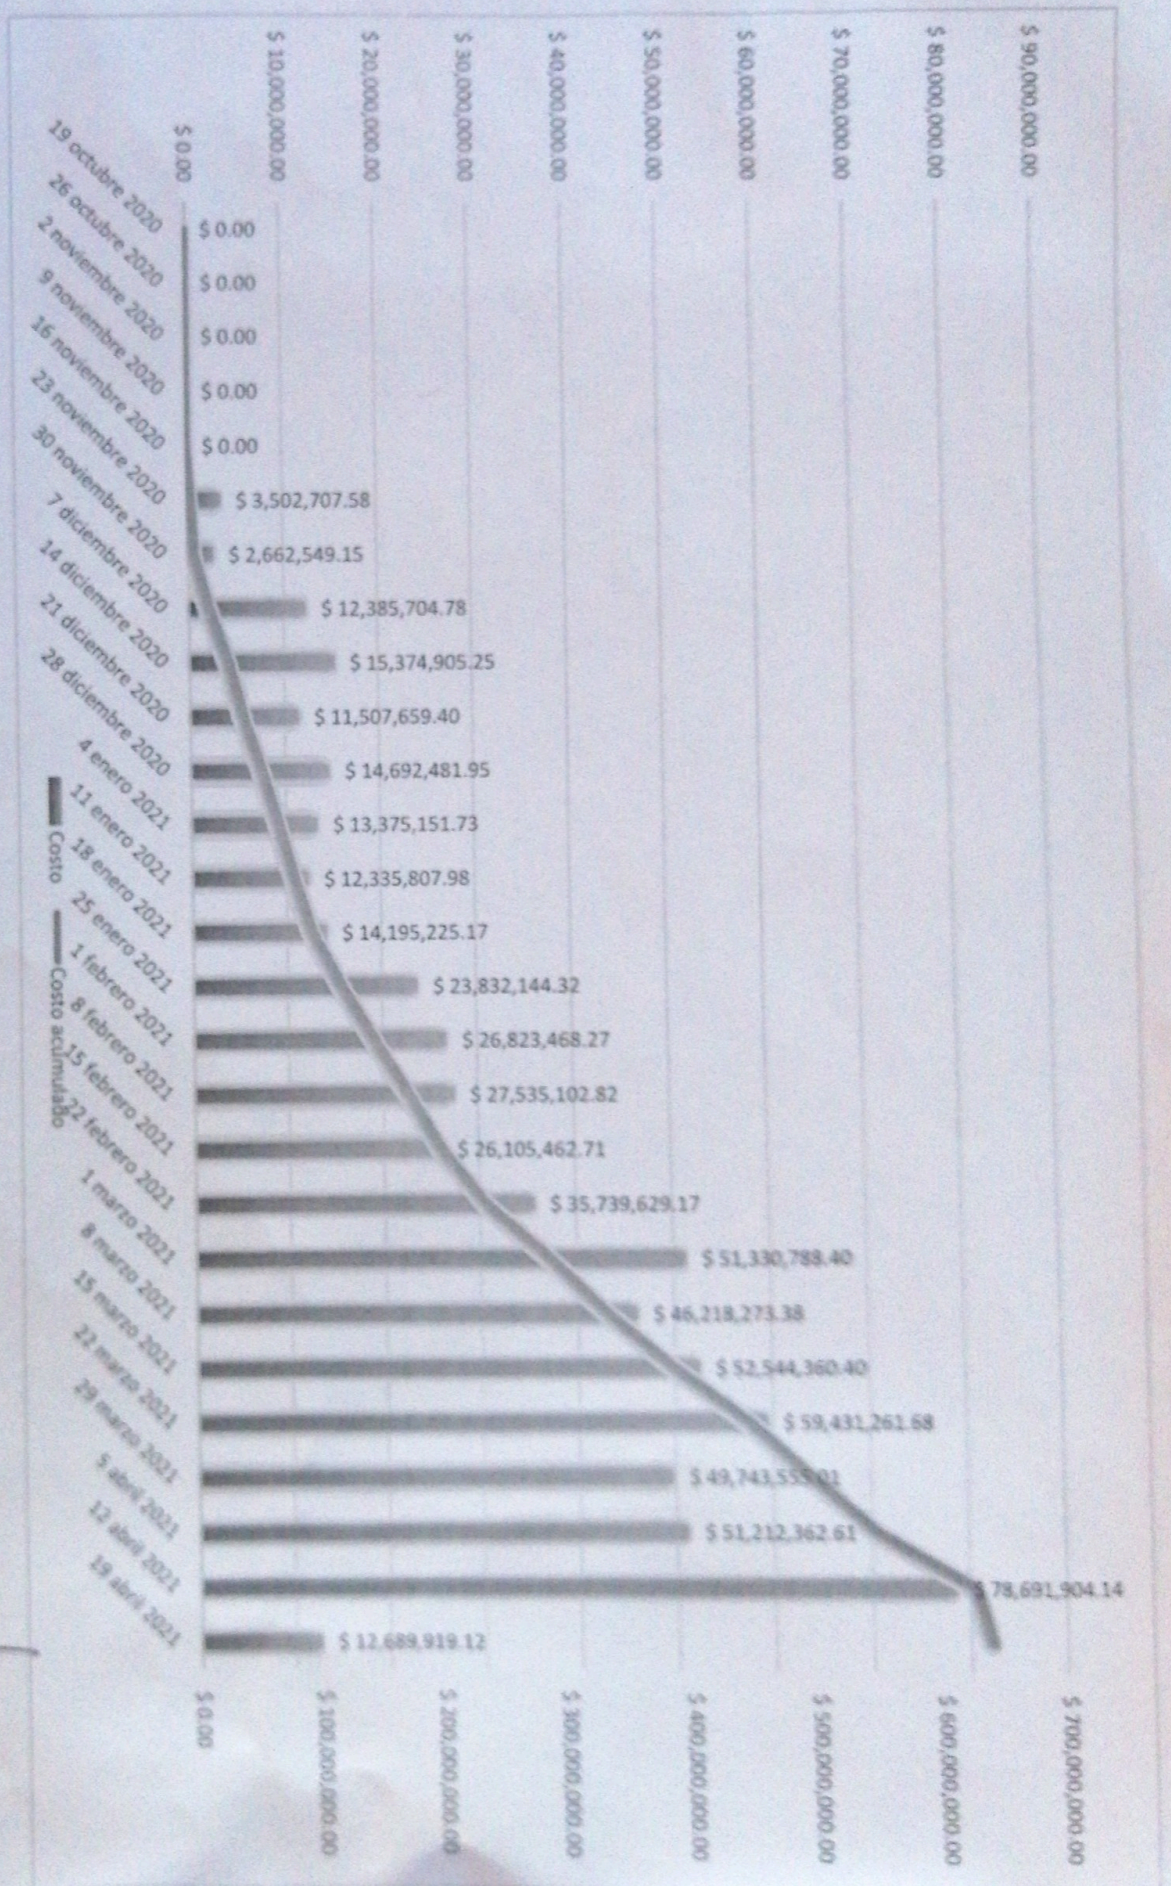

Elaboró:

VP: MM

0.50

Elaborado por: *Armando Pardo Pardo*
 Residente de Intendencia.
 Ingeniero Celso S.A.S

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 5

Bogotá, D.C., 19 de marzo de 2021.

DE: JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA – Supervisor del Contrato CCS-963-2020.

PARA: FABIAN DARIO ROMERO MORENO – Coordinador del Área de Contratación.

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud de Prórroga del Contrato CCS-963-2020

No. DEL CONTRATO		963-2020
FECHA DE SUSCRIPCION		09 de septiembre de 2020
OBJETO		Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el Municipio de Betania, Departamento de Antioquia derivado del Convenio Interadministrativo 875 de 2019. Objetivo: El objetivo principal de la labor de interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra pública financiado mediante el Convenio Interadministrativo 875 de 2019.
CONTRATISTA/ENTE EJECUTOR		CONSULTORES DONOVAN SAS.
VALOR INICIAL		\$109.359.921.00 MC/CTE
ADICIÓN No. 1		SI ☐ N/A ☒
ADICIÓN No. 2		SI ☐ N/A ☒
PLAZO INICIAL		HASTA EL 31/12/2020
FECHA DE INICIO		06/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN		31/12/2020
PRÓRROGA No. 1	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 31/03/2021
PRÓRROGA No. 2	SI ☐ N/A ☒	N/A
PRÓRROGA No. 3	SI ☐ N/A ☒	N/A
PRÓRROGA No. 4	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 3	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 4	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 5	SI ☐ N/A ☒	N/A
SUSPENSIÓN No. 6	SI ☐ N/A ☒	N/A
CESIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	N/A
CESIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	N/A
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	☐	
PRÓRROGA	☒	30/03/2021 AL 12/05/2021

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 2 de 5

SUSPENSIÓN	☐	
CESIÓN	☐	NOMBRE DEL CESIONARIO N/A
		C.C. N/A
		DESDE EL O A PARTIR DEL N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	N/A
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	☒	CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor del contrato	\$ 109.359.921.00
	Valor facturado	\$10.935.992
	Saldo por ejecutar	\$ 98.423.929
AVANCE FISICO DEL CONTRATO OBRA OBJETO DEL CONTRATO		72 %

En mi condición de Supervisor del Convenio en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SOLICITUD DE PRÓRROGA

Mediante oficio DON-MINDEP-963-023 del 12 de marzo de 2021 el representante legal de CONSULTORES DONOVAN SAS - Ing. JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, le solicitó a esta supervisión, prórroga al contrato No. CCS-963-2020 argumentando entre otros lo siguiente:

“(...) El presente oficio tiene como propósito presentar formalmente la solicitud de prórroga No.1, para el contrato de interventoría de la referencia, en base a las siguientes solicitudes:

1. *El Municipio de Betania mediante oficio dirigido a Ministerio del Deporte de fecha 02 de marzo de 2021, realizó la Solicitud e intención de prórroga No. 1 al contrato de obra pública N° 230-09-04-97-2020 “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA LIBIA DEL MUNICIPIO DE BETANIA-ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD AL CONVENIO 000875 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BETANIA- ANTIOQUIA”.*

2. *El Contratista de obra INGEMAT COLOMBIA S.A.S, mediante oficios INGMT-CHLBA -032 de fecha 5 de marzo del 2021, realizo la solicitud de ampliación del plazo*

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 3 de 5

de ejecución por un (1) mes, a partir del 22 de marzo de 2021 y con fecha de culminación el día 22 de abril 2021, basados en las siguientes justificaciones: - Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra. - El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra. - La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra. (...).

3. Para la presente solicitud, se está considerando un plazo de veinte (20) días posterior a la culminación del plazo de ejecución de obra, y que se encuentra estipulado dentro del ANEXO TECNICO SEPARABLE, numeral 6.2.1.3 Fase 3: liquidación: “Para el cumplimiento de esta fase la interventoría contará con un plazo de Veinte (20) días calendario y consistirá en el cierre y liquidación del contrato de obra objeto de interventoría.” De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra iría hasta el 22 de abril de 2021 y el contrato de interventoría hasta el 12 de mayo de 2021.

4. Mediante oficio INGMT- CHLBA -033 de fecha 11 de marzo del 2021, se remiten los documentos complementarios a la Solicitud de prórroga No. 1, donde se anexa: - Registros de datos hidrometeorológicos de la estación 26190090 BETANIA- LAS GUACAS. - Reprogramación de obra, con fecha de terminación el 22 de abril de 2021. - Flujo de inversiones acorde con las actividades programadas para la entrega del objeto del contrato.

5. Ante dicha solicitud, esta interventoría ve viable las justificaciones anteriormente señaladas por el Municipio - contratista, y que exponemos las siguientes consideraciones:

- Las épocas de lluvias que afectan el inicio diario de las labores, que se pueden evidenciar en los registros de días de lluvias asentados en la bitácora de obra y Registros de datos hidrometeorológicos de la estación 26190090 BETANIA LAS GUACAS.
- El difícil acceso al lugar de los trabajos, más aún si los caminos se afectan por las épocas de lluvia que en ocasiones no permiten el ingreso de materiales, equipos y personal de obra.
- La difícil consecución de mano de obra no calificada de la región en virtud de la temporada cafetera que ocupa a la gran mayoría de trabajadores, dificultando la incorporación de personal a la obra.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión manifiesta el ordenador del gasto que es de suma importancia que el proyecto acordado mediante el CONTRATO objeto de interventoría cumpla su finalidad y con el derecho constitucional al deporte y en atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 4 de 5

De igual manera, los recursos aportados al proyecto a través de MINDEPORTE, hacen parte del gasto público social, definido en la Ley 152 de 1994 que en su artículo 3 establece como principios generales entre otros el de Prioridad del gasto público social. Continuidad. Eficiencia y Concurrencia.

Que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 85 prevé la continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Que de conformidad con la Ley 80 de 1993 artículo 4 No.8 es obligación de las entidades estatales adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado entre otros el concurso, así como el numeral 9º las entidades actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Que de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, así como el contrato surge de acuerdo de voluntades, los mismos contratantes pueden mediante mutuo acuerdo hacer variaciones a lo pactado inicialmente.

Que la firma interventora aporta la correspondiente justificación de la prórroga.

Esta supervisión indica que a la fecha el contrato se encuentra en vigencia hasta el 31 de marzo, por lo tanto, se requiere de la prórroga del contrato de interventoría para garantizar la labor de supervisión de ejecución de la obra derivada del **convenio 000875 de 2019**. Lo anterior teniendo en cuenta que según oficio DON-MINDEP-963-050, la interventoría recomienda al Municipio la prórroga del contrato de Obra N° 230-09-04-97-2020 por 30 días, dado en el oficio DON-MINDEP-963-050 y en las cuales se encuentra el acta de modificación y reprogramación de las inversiones.

Lo que permite concluir que, la solicitud del contratista resulta pertinente y acorde con lo pactado en el Contrato, por lo cual esta supervisión, corroboro la información mencionada por la firma interventora y que los documentos entregados en la solicitud hacen parte de la solicitud de prórroga del contrato de consultoría.

Que la firma interventora es consciente de su rol y sus responsabilidades, que igualmente conoce las obligaciones que ha pactado con MINDEPORTE en el contrato, por consiguiente, desplegará lo necesario para apoyar, monitorear, inspeccionar, requerir, conminar, solicitar el incumplimiento si a ello hubiere lugar, denunciar, y todo lo que sea necesario en pro de la terminación del proyecto.

Las modificaciones quedaran así:

CLAUSULA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Prorrogar el plazo del CONTRATO en **42** días calendario contados a partir de **31 de marzo de 2021 hasta el 12 de mayo de**

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 5 de 5


2021. La presente ampliación de plazo se concede por solicitud del contratista y visto bueno del supervisor del contrato.

El contratista se obliga a modificar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al plazo que se prorroga dentro de este documento dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento.

Cordialmente,



JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
Supervisor del contrato CCS963-2020



Vo.Bo. DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Director de Recursos y Herramientas Del SND.

Anexos.

- Solicitud de prórroga por parte de la interventoría
- Solicitud de prórroga del contrato de interventoría por parte del Municipio
- Solicitud y aprobación prórroga del contrato de obra

Elaboró: Ing. José Albeiro Grisales Valencia - Supervisor del contrato CCS-963 de 2020

Revisó. – Quintero y Quintero Abogados – Luis Alejandro Quintero Sáenz

Revisó. – Ing. Alberto Franco Soto- Gestor Región Andina.
