

CONSORCIO INAR INGENIEROS

Bogotá D.C. 4 de Mayo de 2021
CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-059-2021

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Atn. Ing. JULIETA MERCADO ORTEGA
Supervisor


Referencia: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1680516 QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Asunto: **"INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 7"**

Cordial Saludo. Adjunto a la presente remitimos el Informe Mensual de Interventoría No 7 con sus anexos.

Cualquier aclaración con gusto le atenderé.

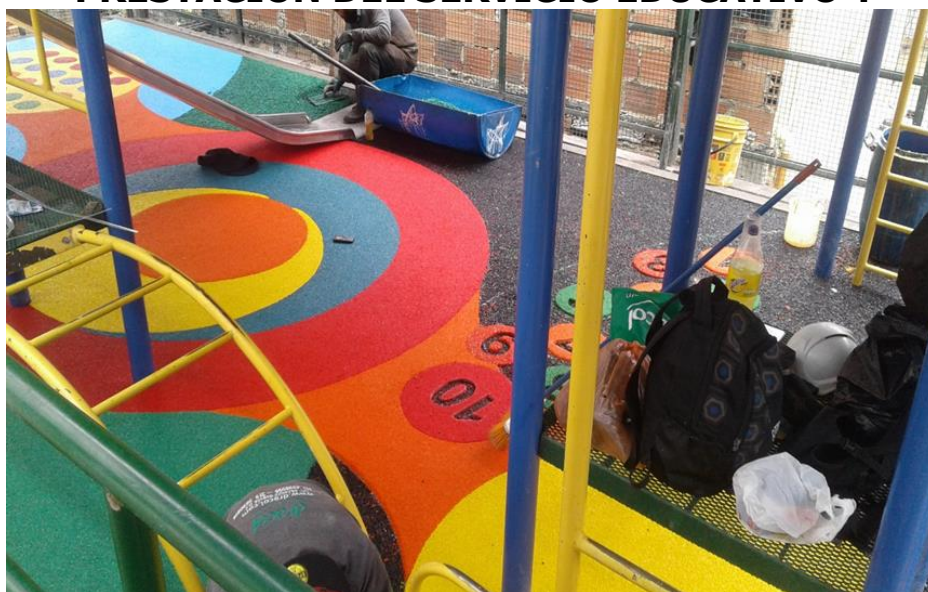
Cordialmente,



LILIANA CUADROS GARCÍA
CONSORCIO INAR INGENIEROS

CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-059-2021
ANEXO: 216 FOLIOS.
CC. ARCHIVO

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516 - GRUPO 10.
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".**



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 7
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2021.**

CONSORCIO INAR INGENIEROS

ABRIL 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
2. CONTRATO DE OBRA	7
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	7
2.2 CONTROL DE OBRA	8
▪ Semana 27. Del 1 al 7 de Marzo de 2021.....	8
▪ Semana 28. Del 8 al 14 de Marzo de 2021.....	8
▪ Semana 29. Del 15 al 21 de Marzo de 2021.	9
▪ Semana 30. Del 22 al 28 de Marzo de 2021.	9
2.3 DESCRIPCION GENERAL.	12
2.3.1 Control financiero.....	12
3. CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	14
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	14
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA	15
3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	15
3.3.1 Actividades administrativas	15
3.3.2 Actividades técnicas	16
3.3.3 Informe financiero de Interventoría	16
3.3.4 Seguimiento al plan de Bioseguridad.....	17
3.3.5 Comités de Seguimiento	17
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	18
5. ANEXOS.....	18
Anexo No 1. Control de personal.	18
Anexo No 2. Control de Equipos.	18

Anexo No 3. Control de Seguridad Industrial.....	18
Anexo No 4. Estado del Tiempo.	18
Anexo No 5. Registro Fotográfico.....	18
Anexo No 6. Libro o Bitácora de Obra.....	18
Anexo No 7. Informes Semanales del Periodo.	18
Anexo No 8. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida.	18
Anexo No 9. Copia Actas de Comité No 24 y 27.	18

INTRODUCCION

La ejecución del contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1577474 del 28 de Mayo de 2020, cuyo objetivo es la "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", a realizar en un plazo de 5 meses, se adelanta en predios localizado dentro las diferentes instituciones educativas a intervenir en la localidad No 4 San Cristóbal.

El acta de inicio para el contrato de Interventoría se firmó el 13 de agosto de 2020 dando inicio a su contrato, el acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2020 dando apertura a las actividades físicas de obra en Juana Escobar - Sede B, Juana Escobar Sede C – Republica de Canadá II, posteriormente se dio inicio en Juan Evangelista Gómez - Sede A y Atenas, durante este periodo se dio inicio a los tres frentes restantes Gran Colombia sede A, San Isidro Sede B y Los Alpes sede A.

El presente documento corresponde al Informe de Interventoría No 7 del periodo comprendido del 1 al 28 de marzo de 2021, en este informe se evidencia el porcentaje ejecutado, las actividades ejecutadas semana a semana y el estado del contrato.

De acuerdo a la adición y prorroga a los contratos de Obra e Interventoría por 3 meses para la intervención y mantenimiento a otras Instituciones Educativas en la misma localidad 4 de San Cristóbal, en este periodo debieron de iniciar actividades en los tres frentes adicionados, sin embargo solo se realizó inicio a dos de ellos.

La firma contratista desarrollo durante este periodo de tiempo las siguientes labores del contrato de obra: instalación de estructura metálica, instalación de cubierta, enchapes de piso y pared, pintura, demoliciones, excavaciones, rellenos. En este periodo se realizaron además labores de control técnico, administrativo y financiero por parte de esta Interventoría.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto como ya se mencionó se adelanta en predios urbanos (instituciones educativas del distrito), sobre una topografía inclinada y con unos niveles freáticos medios.

El planteamiento arquitectónico básicamente hace alusión a obras de adecuación y mantenimiento dentro de las I.E.D y algunas exteriores a las edificaciones como zonas verdes, andenes y patio. El total del proyecto son siete (07) instituciones educativas entre las cuales tenemos:

1. Atenas – Sede A.
2. Juan Evangelista Gómez - Sede A.
3. Rural Gran Colombia - Sede A.
4. San Isidro sur Oriental - Sede B - Omar Torrijos.
5. Los Alpes - Sede A.
6. Juana Escobar - Sede B - San Luis.
7. Juana Escobar Sede C - Republica de Canadá II.

El proyecto Plantea en su parte inicial la ejecución de actividades preliminares como desmontes y demoliciones. La segunda parte de la obra contempla la ejecución de las cimentaciones, la tercera parte desagües e instalaciones subterráneas, sanitarias e hidráulicas, la cuarta contempla el tema de instalaciones eléctricas, la quinta parte contempla mamposterías, pañetes y pisos, la sexta cubiertas e impermeabilizaciones, la séptima los capítulos de carpintería en general, la octava los enchapes y pinturas, siguiendo con instalaciones de aparatos sanitarios y por ultimo aseo y obras exteriores.

Las actividades macro que resumen técnicamente la ejecución de los frentes a intervenir son las siguientes:

- ❖ PRELIMINARES
- ❖ CIMENTACIÓN
- ❖ DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
- ❖ ESTRUCTURA
- ❖ MAMPOSTERÍA
- ❖ PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
- ❖ INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
- ❖ INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
- ❖ PAÑETES
- ❖ PISOS

- ❖ CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
- ❖ CARPINTERÍA METÁLICA
- ❖ ENCHAPES
- ❖ ILUMINACIÓN
- ❖ PINTURA
- ❖ CERRADURAS Y VIDRIOS
- ❖ OBRAS EXTERIORES
- ❖ ASEO Y VARIOS
- ❖ OBRAS ADICIONALES

La adición realizada es para el mejoramiento de espacios, ventilación y saneamiento respecto a planificar los espacios con el fin de mitigar el contagio por el COVIC 19 de las siguientes instituciones educativas:

1. Colegio José Félix Restrepo.
2. Colegio José Joaquín Castro.
3. Colegio La Belleza.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.1577474
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD (4) SAN CRISTOBAL.
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PLAZO:	5 MESES
PRORROGA No 1:	25 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 1.023.694.436,00
ADICIÓN:	\$ 491.373.316,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.515.067.752,00
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO
DIRECCIÓN:	CALLE 125 No 53 - 17
TELEFONO:	2 536224
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS

2.2 CONTROL DE OBRA

Durante el periodo se realizaron los respectivos informes de control de obra, los cuales reflejan las actividades programadas a ejecutar semana a semana, la cantidad o porcentaje realizado de dichas actividades y el estado del avance financiero del proyecto, el cual está directamente relacionado con la ejecución real en obra.

En este sentido, se documenta la ejecución de las actividades así:

- **Semana 27. Del 1 al 7 de Marzo de 2021.**

En esta semana se realizaron las siguientes actividades por institución:

LOS ALPES

Se realiza mantenimiento de rejillas cárcamo, se culmina la pulida y brillada de pisos, se continua con emboquillada de enchape de pared.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se hace revisión de cantidades de obra en compañía del contratista y se ajusta el presupuesto oficial del este frente.

Se hace escarificado en tramo de fachada, se realiza pañete, ajuste de filos en fachada y se inicia actividad de limpieza de fachada.

Se recomienda al contratista incorporar más personal al frente de obra para no generar retrasos, se reitera solicitud al contratista para que se programe recolección de escombros ubicados en vía pública.

Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

SAN ISIDRO

Se realiza la demolición de placa y excavación para cárcamo costado dela cancha, se realizan correcciones en soldadura y pintura estructura cubierta

- **Semana 28. Del 8 al 14 de Marzo de 2021.**

LOS ALPES

Se continúa con mantenimiento de rejillas cárcamo.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se realiza instalación de tramo de baranda en zona de juegos, se reitera solicitud al contratista para que se programe recolección de escombros ubicados en vía pública.

SAN ISIDRO

No se realizan actividades durante esta semana.

JOSÉ JOAQUIN CASTRO

Se ejecutan actividades de demolición de enchape de pared, desmonte de puertas, demolición de lavamos corrido, desmontes de aparatos sanitarios, demolición de piso en baldosín en baño de niñas.

Se recomienda la implementación del protocolo de bioseguridad.

- **Semana 29. Del 15 al 21 de Marzo de 2021.**

LOS ALPES

Se continúa con mantenimiento de rejillas cárcamo.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se ejecuta actividad de suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos.

SAN ISIDRO

No se realizan actividades durante esta semana.

JOSÉ JOAQUIN CASTRO

Se realiza la demolición de lavamos y orinal corrido, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de enchape de pared en baño de niños, desmonte de puertas en baño de niños.

Se recomienda la implementación del protocolo de bioseguridad.

- **Semana 30. Del 22 al 28 de Marzo de 2021.**

LOS ALPES

Se realiza ajuste de cantidades respecto a la parte eléctrica.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se ejecuta actividades de escarificación pañete, resanes generales en fachada.

Instalación de tramo de baranda en zona de juegos, se continúa la actividad de limpieza e impermeabilización de fachada.

Se realiza limpieza a cajas de inspección.

Se realiza recolección de escombros ubicados en vía pública.

ISIDRO SUR ORIENTAL

No se realizan actividades durante esta semana.

JOSÉ JOAQUIN CASTRO

Se continua con demolición de lavamos y orinal corrido, desmontes de aparatos sanitarios, demolición de enchape de pared en baño de niños.
Se realiza limpieza a cajas de inspección.

JOSE FELIX RESTREPO

Se da inicio a las actividades el 25-03-2021.
Se inicia con demolición de enchapes, orinales, desmonte de aparatos sanitarios y puertas. Continuo a esto se realiza la escarificación y pañete en muros de las baterías sanitarias, seguido del pañete se inicia el enchape.

Avance del proyecto durante el Séptimo mes 1.48 %

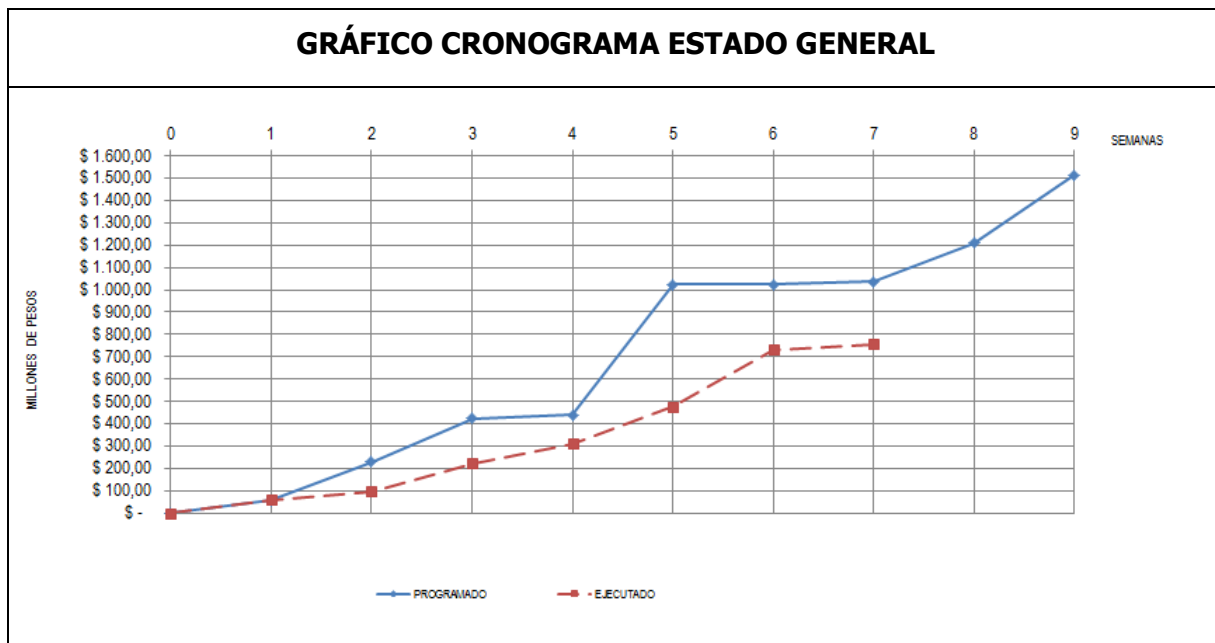
Avance del proyecto hasta la fecha 49.87 %, se aclara que de acuerdo a la adición el % ejecutado vario.

Nota: hasta la fecha del presente informe no se registró ningún accidente en el proyecto.

Se realiza el siguiente análisis incluyendo los 3 frentes adicionados:

ESTADO DEL PLAZO GENERAL	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	204	77,27%
	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	\$ 1.037.705.581,15	68,49%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	\$ 755.553.648,92	49,87%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	-\$ 282.151.932,23	-18,62%
Se presenta un atraso en la Obra	-\$ 282.151.932,23	-18,62%
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		(37,98)

Respecto al estado general del proyecto tenemos un atraso del proyecto con relación a la programación presentada por la firma contratista, el porcentaje de avance alcanzado por la firma contratista es de 49.87 % con relación a 68,49 % programado lo que refleja un desfase por debajo de lo programado en 18.62 %, es claro que los avances mensuales son mínimos y a la fecha falta por entregar tres frentes del contrato inicial los cuales debieron haber culminado el 28 de febrero de 2021, sin embargo el incumplimiento en compromisos adquiridos en comités para sus entrega y a oficios remitidos por la Interventoría no han sido atendidos.



ESTADO DEL PLAZO EN EL PERIODO SEPTIMO MES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	30	11,36%
	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	\$ 279.713.943,22	18,46%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	\$ 22.354.307,91	1,48%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	-\$ 257.359.635,31	-16,98%
Se presenta un atraso en la Obra	-\$ 257.359.635,31	-16,98%
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		(5,09)

Aunque se realizó la entrega de 3 frentes, se continúa con el atraso en la ejecución de actividades en los frentes tres frentes restantes.

De acuerdo a los avances presentados es claro que se presenta un incumplimiento por parte del contratista de obra.

2.3 DESCRIPCION GENERAL.

Las labores ejecutadas durante el lapso comprendido entre el 1 y el 28 de marzo de 2021 , para el mejoramiento y adecuación de las I.E. de la localidad No 4 de San Cristóbal fueron:

2.3.1 Control financiero

Dentro de las actividades de control en el aspecto financiero, esta Interventoría en conjunto con el contratista adelantamos la revisión de las cantidades de obra para las Institución educativa adicionadas. De acuerdo a esto se tienen establecidos los presupuestos finales de las 7 Instituciones iniciales y esta n revisión los presupuestos de las 3 Instituciones adicionadas.

Durante este periodo se radico el Acta Parcial de Obra No 4 a la Entidad.

BALANCE FINANCIERO	
VALORTOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	\$ 1.515.067.752,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 1:	\$ 60.327.879,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 2:	\$ 36.502.706,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 3:	\$ 420.298.592,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 4:	\$ 358.938.362,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	\$ 639.000.213,00

2.3.2 Control Técnico

El control técnico que adelanta esta interventoría pretende garantizar la correcta ejecución de las obras en todos los aspectos, entre ellos, verificar que el contratista aplique adecuadamente sus capacidades y recursos, empleando procedimientos de control con los cuales pueda asegurar que la calidad de los resultados será la especificada en los documentos técnicos del contrato.

Para ello se adelanta conjuntamente programas de organización y control de insumos y materiales, con el objeto de garantizar que estos sean de primera calidad. A la fecha se han realizado varias compras de materiales de los cuales se inspecciona que sean de primera calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas, sin embargo durante este periodo la compra de materiales y ejecución de actividades fue mínima.

Se adelanta el control del proceso en el sentido de garantizar que se realicen las actividades de manera secuencial y concatenada para garantizar que no se presenten interrupciones en la producción e interrelación de los procesos constructivos. En este sentido, ha sido consecuente la realización de las actividades preliminares, garantizando que las obras tenga un orden cronológico y adecuado de acometer dentro de cada frente que garantice la continuidad de las obras, sin embargo se presenta abandono de frentes por más de 3 semanas y aunque se solicita al contratista la consecución de actividades no se atienden estos requerimientos.

La Interventoría ha elaborado los informes semanales correspondientes a las semanas 27, 28, 29 y 30 período que corresponde a los días en donde se han venido ejecutando las obras previstas en el contrato de obra.

2.3.3 Control Administrativo

Hasta la fecha de elaboración de este informe, la Interventoría ha podido evidenciar varios aspectos importantes para revisar y tomar medidas correctivas o de actualización a saber:

- **Personal disponible:** dentro del equipo de personal se cuenta con un personal de administración y un personal operativo.

INTERVENTORÍA	CARGO	CANT
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTORES DE INTERVENTORÍA	2
CONTRATISTA	CARGO	CANT
	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTES DE OBRA	1
	MAESTRO DE OBRA	1
	OFICIALES	2
	AYUDANTES	10
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		19

- **Personal por incluir:** Se realizó la vinculación de personal para los 3 frentes adicionales, en los frentes actuales el personal es mínimo y en algunos no se cuenta con personal.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO INAR INGENIERIA
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD (4) SAN CRISTOBAL.
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
PLAZO:	6 MESES
PRORROGA:	3 MESES
PLAZO TOTAL:	9 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 160.550.040,00
ADICIÓN:	\$ 80.275.020,00
VALOR TOTAL:	\$ 240.825.060,00
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 22-64 OFI 603 – EDIFICIO CALLE 100 – BOGOTÁ D.C.
TELEFONO:	2113822 / 312 5850939
CORREO ELECTRONICO:	argsastecnica@gmail.com
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:	ING. JULIETA MERCADO

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría cuenta para el desarrollo de las actividades, con los siguientes recursos:

- **Personal:**
 - Director de Interventoría.
 - Residente Interventoría.
 - Inspectores.
 - Especialistas.
- **Equipo:** Los equipos disponibles para atender el contrato de Interventoría comprenden:
 - Computadores.
 - Impresoras.
 - Cámaras Digitales.

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo de trabajo, la Interventoría desarrollo las siguientes actividades:

3.3.1 Actividades administrativas

- Revisión, acompañamiento y aprobación de los documentos del contrato, programaciones, presupuestos, planes, flujos entre otros, oficios de seguimiento y control a la seguridad industrial del personal operativo.
- Seguimiento en la vinculación y control del personal operativo de obra.
- Permanencia en los frentes donde se realizan actividades. (Localidad No 4 San Cristóbal)
- Atención de las diferentes reuniones de coordinación, seguimiento y aclaraciones a las inquietudes del Contratista.
- Atención de la correspondencia solicitada por el Cliente.
- Informes semanales de seguimiento y control presupuestal.
- Balance de cantidades y control presupuestal.
- Registro diario en bitácora de obra.
- Registro fotográfico.

3.3.2 Actividades técnicas

- Revisión de los planos del Proyecto, definición de los parámetros mínimos de diseños a tener en cuenta para el inicio de las actividades en los frentes adicionados.
- Atención de reuniones solicitadas por el Cliente.
- Revisión de actividades por ejecutar, durante la ejecución y del resultado del producto.
- Seguimiento y control a la ejecución de las actividades por realizar en obra.

3.3.3 Informe financiero de Interventoría

A la fecha esta interventoría ha realizado la radicación de 6 Actas de costo fijo de Interventoría y 4 Actas de costo variable, durante este periodo se radicaron las Actas No 9 de Costo Variable y 10 de costo fijo.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$	240.825.060,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 1- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 2- COSTO VARIABLE:	\$	3.788.980,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 3- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 4- COSTO VARIABLE:	\$	2.286.232,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 5- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 6- COSTO VARIABLE:	\$	26.368.738,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 7- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 8- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 9- COSTO VARIABLE:	\$	22.515.537,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 10- COSTO FIJO:	\$	13.379.170,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$	105.590.553,00

3.3.4 Seguimiento al plan de Bioseguridad

Plan de Bioseguridad		Cumple
1.	Entrega de elementos de protección personal para la prevención del Covid 19	Si
2.	Limpieza y desinfección de áreas de trabajo, maquinas, herramientas, vehículos, epp, etc. FOR-SST-040	No
3.	Instalación de afiches prevención Covid-19	No
4.	Toma de temperatura a las personas que ingresan a obra.	No
5.	Cuestionario diario de signos de alarma frente al covid -19 y seguimiento a ausentismo a causa de enfermedad por COVID-19	No
6.	Lavado de manos cada 3 horas.	Si
7.	Distanciamiento Físico	Si
8.	Uso de Tapabocas	Si

3.3.5 Comités de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron los siguientes comités virtuales mediante la plataforma zoom:

COMITÉ No	FECHA
24	1 de marzo de 2021
25	9 de marzo de 2021
26	18 de marzo de 2021
27	31 de marzo de 2021

Se adjuntan actas de comité No 24 del 9 de marzo de 2021 y No 27 del 31 de marzo de 2021.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se siguen presentando atrasos en la entrega de frentes a la fecha se deberían tener los 7 frentes iniciales entregados, sin embargo el atraso no tiende a minimizar sino que aumenta y más teniendo en cuenta que se tienen tres frentes más por ejecutar.

Las actividades a ejecutar en los frentes adicionales debieron de haberse iniciado el primer día del presente mes, sin embargo empezaron en la segunda semana, en la última y un frente aún no se ha iniciado.

Es preocupante el avance ya que en los frentes iniciales predomina el abandono constantemente y se deja de laborar en ellos por semanas, debido a esto no se ha podido terminar y entregar las 3 instituciones pendiente.

Se ha reiterado la solicitud de un Plan de Contingencia para la terminación de los frentes iniciales pero a la fecha no ha sido entregado.

La bitácora de obra se diligencia diariamente consignando todos los aspectos técnicos de la obra, el estado del clima y los imprevistos detectados luego de las actividades constructivas.

5. ANEXOS

Anexo No 1. Control de personal.

Anexo No 2. Control de Equipos.

Anexo No 3. Control de Seguridad Industrial.

Anexo No 4. Estado del Tiempo.

Anexo No 5. Registro Fotográfico.

Anexo No 6. Libro o Bitácora de Obra.

Anexo No 7. Informes Semanales del Periodo.

Anexo No 8. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida.

Anexo No 9. Copia Actas de Comité No 24 y 27.

ANEXO 1.

CONTROL DE PERSONAL.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO LOS ALPES

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 DE MARZO DE 2021** Y EL **28 DE MARZO DE 2021** PLAZO: **5 MESES**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	MARZO																												OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
CARGO																															
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0				
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0				
OFICIALES	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0				
AYUDANTES HOMBRES	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0				
PERSONAL CONTRATISTA	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			0	0	0	0	0		TOTAL PERIODO	72	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																												SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	18	25,00%		
De la región	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	18	25,00%		
De fuera de la región																											0	0,00%			
MANO OBRA CALIFICADA	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			0	0	0	0	0	36	50,00%		
De la región	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			0	0	0	0	0	36	50,00%		
De fuera de la región																											0	0,00%			
PROFESIONALES - TÉCNICOS	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	18	25,00%		
De la región	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	18	25,00%		
De fuera de la región																											0	0,00%			
POBLACIÓN VULNERABLE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		
En condición de desplazamiento																											0	0,00%			
MUJERES	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		
Mano de Obra Calificada																											0	0,00%			
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		
PROVEEDORES																															
Local																															
Nacional																															
Internacional																															

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO GRAN COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1 DE MARZO DE 2021

Y EL

28 DE MARZO DE 2021

CONTRATISTA:

MUÑOZ Y HERRERA S.A

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.1577474

INTERVENTOR:

CONSORCIO INAR INGENIEROS

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.1680516

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA		MARZO																												OBSERVACIONES		
CARGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																														Se recomienda al contratista hacer incremento de personal en este frente de obra para no generar retrasos		
RESIDENTE DE OBRA																																
PROFESIONAL SISO																																
MAESTRO DE OBRA																																
OFICIALES		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2		2	2	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1				
AYUDANTES HOMBRES		2	1	2	1	1	1			1	1	1	1	2		2	2	1	1	1	2		2	1	1	1	1	1				
ELECTRICOS																																
PERSONAL CONTRATISTA		3	2	3	2	2	2		1	2	2	2	2	4		4	4	3	2	3	4		4	2	2	2	2	2		TOTAL PERIODO	156	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																												SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		2	1	2	1	1	1		0	1	1	1	1	2		2	2	1	1	1	2		2	1	1	1	1	1		59	37,82%	
De la región		2	1	2	1	1	1		0	1	1	1	1	2		2	2	1	1	1	2		2	1	1	1	1	1		59	37,82%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2		2	2	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1		65	41,67%	
De la región		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2		2	2	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1		65	41,67%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		30	19,23%	
De la región		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		30	19,23%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
En proceso de reinserción social		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se recomienda al contratista aumentar personal en este frente de obra para no generar retrasos.

CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021
 CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A.
 INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS
 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474
 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

PERSONAL DEL CONTRATISTA COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B

FECHA		MARZO																												OBSERVACIONES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
CARGO																																
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																														Se recomienda al contratista hacer incremento de personal en este frente de obra para no generar retrasos		
RESIDENTE DE OBRA									1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				
PROFESIONAL SISO																																
MAESTRO DE OBRA									1																							
OFICIALES																																
AYUDANTES HOMBRES									1	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	3	3	3	2	2				
ELECTRICOS																																
PERSONAL CONTRATISTA									3	2	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	4	4	4	3	3		TOTAL PERIODO	151	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																												SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA									1	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	3	3	3	1	2		65	43,05%	
De la región									1	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	3	3	3	1	2		65	43,05%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA									1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		35	23,18%	
De la región									1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		35	23,18%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS									1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		48	31,79%	
De la región									1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		48	31,79%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
En proceso de reinserción social									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Fecha de inicio de actividades en este frente 08 de marzo de 2021.

Se recomienda al contratista aumentar personal en este frente de obra para no generar retrasos.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO JOSE FELIX

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474

INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	MARZO																												OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
CARGO																														
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																														
RESIDENTE DE OBRA																														
MAESTRO DE OBRA																										1	1	1		
HORNAMENTADORES																										1	1	1		
AYUDANTES HOMBRES																										2	2	2		
																										6	6	6		
PERSONAL CONTRATISTA																										10	10	10		

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO SAN ISIDRO

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 DE MARZO DE 2021** Y EL **28 DE MARZO DE 2021** PLAZO: **5 MESES**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	PERSONAL DE CONTRATISTA																												OBSERVACIONES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
CARGO																																	
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																	
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0						
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0						
OFICIALES	2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0						
AYUDANTES HOMBRES	5	5	5	5	5	5		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0						
HORNAMENTADOR	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0						
PERSONAL CONTRATISTA	9	9	9	9	9	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0					
																														TOTAL PERIODO		54	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																												SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N		
MANO OBRA NO CALIFICADA	5	5	5	5	5	5		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	30	55,56%			
De la región	5	5	5	5	5	5		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	30	55,56%			
De fuera de la región																												0	0,00%				
MANO OBRA CALIFICADA	3	3	3	3	3	3		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	18	33,33%			
De la región	3	3	3	3	3	3		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	18	33,33%			
De fuera de la región																												0	0,00%				
PROFESIONALES - TÉCNICOS	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	6	11,11%			
De la región	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	6	11,11%			
De fuera de la región																												0	0,00%				
POBLACIÓN VULNERABLE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
En condición de desplazamiento																												0	0,00%				
MUJERES	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
Mano de Obra Calificada																												0	0,00%				
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ANEXO 2.

CONTROL DE EQUIPOS.

	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO ALPES						
INFORMACIÓN GENERAL							
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021 FECHA INICIO 18 DE AGOSTO DE 2020							
CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474							
INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516							
EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		CANCHA , CARCAMO	MANTENIMIENTO CANCHA Y CARCAMO	
COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: _____							

		CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO GRAN COLOMBIA					
INFORMACIÓN GENERAL							
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL		1 DE MARZO DE 2021		Y EL		28 DE MARZO DE 2021	
FECHA INICIO		19 DE AGOSTO DE 2020		CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.1577474	
CONTRATISTA:		MÚÑOZ Y HERRERA S.A		CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.1680516	
INTERVENTOR:		CONSORCIO INAR INGENIEROS		CONTRATO No.			
EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO DE SOLDADURA	SI	SI	X		ZONA DE JUEGOS	EQUIPO UTILIZADO PARA ARMADO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	SE VERIFICAN LAS CONEXIONES DE ENERGIA Y PROTECCIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
COMPRESOR	SI	SI	X		PARTE EXTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ZONA DE JUEGOS	EQUIPO UTILIZADO PARA APLICAR PINTURA EN BARANDAS INTERNAS, EXTERNA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA	SE VERIFICAN LAS CONEXIONES DE ENERGIA Y PROTECCIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
PULIDORAS Y CORTADORAS	SI	SI	X		ZONA DE JUEGOS	CORTE DE CARPINTERIA METALICA	SE VERIFICAN LAS CONEXIONES DE ENERGIA Y PROTECCIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		ZONA DE JUEGOS - PARTE TRASERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - PARTE EXTERIOR	ARMDO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, BARANDAS, LIMPIEZA DE FACHADA	SE VERIFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:				SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.			

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021 FECHA INICIO 19 DE AGOSTO DE 2020
 CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474
 INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS	DESMOTES DE SANITARIOS, VENTANA, PUERTAS Y DEMOLICIONES DE ENCHAPE Y PAÑETE	SE VERIFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021 FECHA INICIO 18 DE AGOSTO DE 2020
 CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474
 INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		DEMOLICION ENCHAPE	DEMOLICION ENCHAPE Y ORINAL CORRIDO BAÑOS NIÑOS	
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		CERCHAS	CONSTRUCCION DE CERCHAS PARA CUBIERTA BAÑOS	

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28 DE MARZO DE 2021 FECHA INICIO

CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474

INTERVENIOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		EXCABACION CARCAMO	EXCAVACION PARA CARCAMO COSTADO DE LA CANCHA	

COMENTARIOS DEL INTERVENIOR:

ANEXO 3. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28/03/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODOS EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

		CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLEGIO GRAN COLOMBIA			
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO					
NÚMERO DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.1577474		PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2021 Y EL 28/03/2021	
CONTRATISTA:		MUÑOZ Y HERRERA S.A			
INTERVENTOR:		CONSORCIO INAR INGENIEROS			
DESCRIPCIÓN		ESTADO		OBSERVACIONES	
		Bueno	Deficiente		
MAQUINARIA - EQUIPO					
- Estado del equipo		X		TODOS LOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTAN ESTAN EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS.	
- Regularidad del mantenimiento		X			
- Vibraciones /Ruidos		X			
- Protecciones / Guardas / Frenos		X			
- Idoneidad operarios		X			
DOTACIÓN CAMPAMENTO					
- Dotación completa					
- Buen estado					
- Fácil acceso y operación		X			
DOTACIÓN DEL PERSONAL					
- Dotación completa		X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.	
- Buen estado		X			
- Uso según zona de trabajo		X			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN					
- Uso permanente		X			
- Uso según zona de trabajo		X			
VIGILANCIA					
- Personal suficiente					
- Diurna		X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA	
- Nocturna		X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA	
EMERGENCIAS					
- Convenio centro de asistencia				N.A.	
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP			X	TODOS EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA.	
Comentario del interventor: DURANTE EL PERIODO SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.					

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01/03/2021	Y EL 28/03/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		TODOS LOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTAN ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES MECÁNICAS.
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa			
- Buen estado			
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
- Nocturna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP		X	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGÚN SOPORTES ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor: DURANTE EL PERÍODO SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, EL CONTRATISTA ATIENDE LAS OBSERVACIONES DE MANERA OPORTUNA.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28/03/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODOS EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 DE MARZO DE 2021 Y EL 28/03/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODOS EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

ANEXO 4.

ESTADO DEL TIEMPO.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 07
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO LOS ALPES

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
1 de marzo de 2021	X						
2 de marzo de 2021	X						
3 de marzo de 2021	X						
4 de marzo de 2021	X						
5 de marzo de 2021	X						
6 de marzo de 2021	X						
7 de marzo de 2021							
8 de marzo de 2021	X						
9 de marzo de 2021	X						
10 de marzo de 2021	X						
11 de marzo de 2021	X						
12 de marzo de 2021	X						
13 de marzo de 2021	X						
14 de marzo de 2021							
15 de marzo de 2021	X						
16 de marzo de 2021	X						
17 de marzo de 2021	X						
18 de marzo de 2021	X						
19 de marzo de 2021	X						
20 de marzo de 2021	X						
23 de marzo de 2021	X						
24 de marzo de 2021	X						
25 de marzo de 2021	X						
26 de marzo de 2021	X						
27 de marzo de 2021	X						
28 de marzo de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 07
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO GRAN COLOMBIA

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
1 de marzo de 2021	x						
2 de marzo de 2021	x						
3 de marzo de 2021	x						
4 de marzo de 2021	x						
5 de marzo de 2021	x						
6 de marzo de 2021	x						
7 de marzo de 2021							
8 de marzo de 2021	x						
9 de marzo de 2021		x					
10 de marzo de 2021		x					
11 de marzo de 2021		x		2:30 pm - 3:10 pm		si	
12 de marzo de 2021		x					
13 de marzo de 2021		x					
14 de marzo de 2021							
15 de marzo de 2021		x					
16 de marzo de 2021		x					
17 de marzo de 2021		x					
18 de marzo de 2021		x					
19 de marzo de 2021		x					
20 de marzo de 2021		x					
21 de marzo de 2021							
22 de marzo de 2021							
23 de marzo de 2021	x						
24 de marzo de 2021	x						
25 de marzo de 2021		x					
26 de marzo de 2021		x					
27 de marzo de 2021		x					
28 de marzo de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 07
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA CLOEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
1 de marzo de 2021							
2 de marzo de 2021							
3 de marzo de 2021							
4 de marzo de 2021							
5 de marzo de 2021							
6 de marzo de 2021							
7 de marzo de 2021							
8 de marzo de 2021		X					
9 de marzo de 2021		x					
10 de marzo de 2021		x					
11 de marzo de 2021		x					
12 de marzo de 2021		x					
13 de marzo de 2021		x					
14 de marzo de 2021							
15 de marzo de 2021		x					
16 de marzo de 2021		x					
17 de marzo de 2021		x					
18 de marzo de 2021		x					
19 de marzo de 2021		x					
20 de marzo de 2021		x					
21 de marzo de 2021							
22 de marzo de 2021		x					
23 de marzo de 2021		X					
24 de marzo de 2021		X					
25 de marzo de 2021		x					
26 de marzo de 2021		x					
27 de marzo de 2021		x					
28 de marzo de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 07
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO JOSE FELIX

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
1 de marzo de 2021							
2 de marzo de 2021							
3 de marzo de 2021							
4 de marzo de 2021							
5 de marzo de 2021							
6 de marzo de 2021							
7 de marzo de 2021							
8 de marzo de 2021							
9 de marzo de 2021							
10 de marzo de 2021							
11 de marzo de 2021							
12 de marzo de 2021							
13 de marzo de 2021							
14 de marzo de 2021							
15 de marzo de 2021							
16 de marzo de 2021							
17 de marzo de 2021							
18 de marzo de 2021							
19 de marzo de 2021							
20 de marzo de 2021							
21 de marzo de 2021							
22 de marzo de 2021							
23 de marzo de 2021							
24 de marzo de 2021							
25 de marzo de 2021	X						
26 de marzo de 2021	X						
27 de marzo de 2021	X						
28 de marzo de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 07
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO SAN ISIDRO

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
1 de marzo de 2021	X						
2 de marzo de 2021	X						
3 de marzo de 2021	X						
4 de marzo de 2021	X						
5 de marzo de 2021	X						
6 de marzo de 2021	X						
7 de marzo de 2021							
8 de marzo de 2021	X						
9 de marzo de 2021	X						
10 de marzo de 2021	X						
11 de marzo de 2021	X						
12 de marzo de 2021	X						
13 de marzo de 2021	X						
14 de marzo de 2021							
15 de marzo de 2021	X						
16 de marzo de 2021	X						
17 de marzo de 2021	X						
18 de marzo de 2021	X						
19 de marzo de 2021	X						
20 de marzo de 2021	X						
21 de marzo de 2021							
22 de marzo de 2021							
23 de marzo de 2021	X						
24 de marzo de 2021	X						
25 de marzo de 2021	X						
26 de marzo de 2021	X						
27 de marzo de 2021	X						
28 de marzo de 2021							

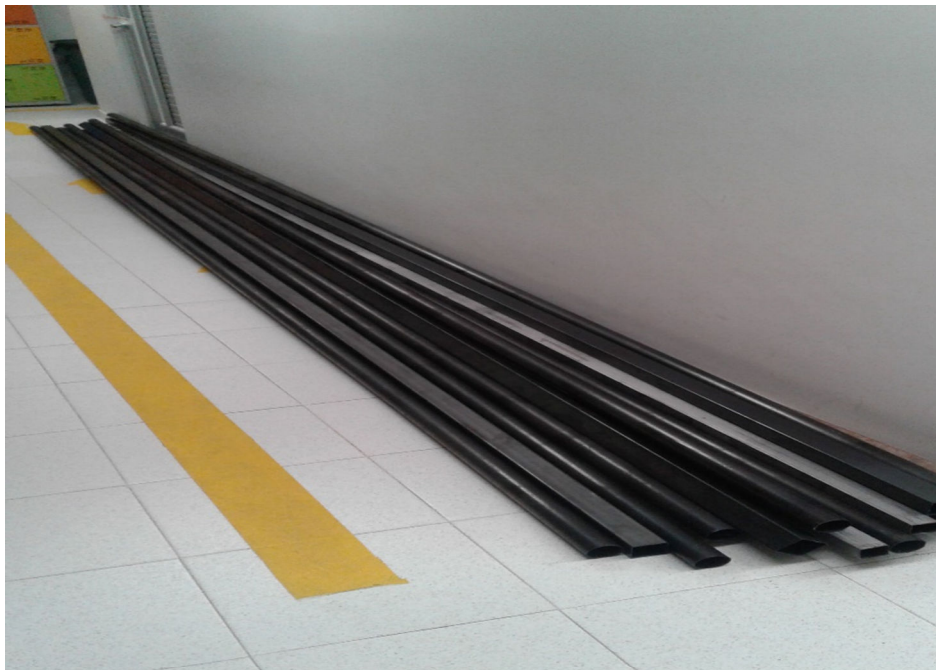
ANEXO 5.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



ACABADOS EN CARCAMO – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA EN ESMALTE SOBRE BARANDA – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA DE ESMALTE SOBRE REJILLAS DE CARCAMO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA DE ESMALTE SOBRE BARANDA INTERNA – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA DE ESMALTE SOBRE BARANDA EXTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



INSTALACION DE PISO CAUCHO BASE – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



FIGURADO E INSTALACION DE PISO CAUCHO DE COLORES – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



ACABADO FINAL PISO CAUCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



LIMPIEZA DE FACHADA PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



LIMPIEZA DE FACHADA PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



LIMPIEZA DE FACHADA PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA SOBRE FACHADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA SOBRE FACHADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA EN MUROS INTERNOS – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



PINTURA EN MUROS INTERNOS – ZONA DE JUEGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE LAVAMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE ENCHAPE Y DESMONTE DE VENTANA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7	
--	--	--

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DESMONTE DE PUERTA BAÑO DE NIÑAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE PAÑETE

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DESMONTE DE PUERTAS CABINAS SANITARIAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DESMONTE DE SANITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE ORINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



DEMOLICION DE PISOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B



LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

PUIDA DE MESONES



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO ALPES	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

PULIDA DE PISO



NOMBRE DEL PROYECTO:

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL

CONTRATISTA:

MUÑOZ Y HERRERA S.A

CONTRATO No.:

CO1.PCCNTR.1577474

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:

DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

MANTENIMIENTO REJAS CARACAMO



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO ALPES	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

MANTENIMIENTO REJAS CARACAMO



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO ALPES	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

MANTENIMIENTO CANCHAS



NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

MANTENIMIENTO CANCHAS



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO JOSE FELIX	
---	---	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DEMOLICION ENCHAPE ESCARIFICACION



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO JOSE FELIX	
---	---	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DEMOLICION ENCHAPE ESCARIFICACION



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO JOSE FELIX	
---	---	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DEMOLICION ORINAL CORRIDO



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO JOSE FELIX	
--	---	--

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DEMOLICION ORINAL CORRIDO



NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL No 7 COLEGIO JOSE FELIX	
---	---	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI' COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 25 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

EXCAVACION PARA CARCAMO



NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021.

RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO



ANEXO 6.

LIBRO O BITACORA DE OBRA.

LOS ALPES.

26 Febrero 2021.

Día Soleado

Personal 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Siso, 1 Interventor
1 Residente.

- pulida de mesones.
- embogullado de tronque y pulida de piso baño
- instalación aparatos sanitarios

27 Febrero 2021.

día Soleado.

Personal 2 Oficiales 5 Ayudantes 1 Siso 1 Interventor 1 Residente

- pulida de mesones
- embogullado de tronque y pulida de piso baño.
- instalación aparatos sanitarios.

1. Marzo 2021 al 06 Marzo 2021.

día Soleados

Personal = 1 Maestro 10 Fiscal 1 Ayudante
- 1 Interventor 1 Residente. intermitente.

Se realiza pulida de mesones y pisos en marmol.

8 Marzo 2021 al 13 Marzo 2021.

día soleados.

Personal = intermitente 1 Maestro 10 Fiscal 1 Ayudante
1 Interventora 1 residente

se realiza mantenimiento rejillas carcamo.

15 Marzo 2021. a 20 Marzo 2021.

día = soleados

Personal = intermitente 1 Maestro 10 Fiscal 1 Ayudante
1 Interventor 1 presidente.

se realizan Mantenimiento regillas del Carcamo
cancha.

22 Marzo. 2021. al 27 Marzo 2021.

día = soleados

no se realizan trabajos en Frente de
obra, reajuste de medidas

29 Marzo 2021. al. 3 Abril. 2021.

no se realizaron trabajos en Frente de
obra.

RURAL GRAN COLOMBIA.

26-02-21

DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 INSPECTOR, SE SOLICITA AL COMITADO ADICEL ASLO SOCIAL AL TRABAJO DE OBRAS, SE REALIZA SOLICITUD PARA QUE SE PROBORE LA RECONSTRUCCIÓN DE EXAMENOS USADOS EN VIDA PÚBLICA.

3^{ra}

2^{da}

Diego Petina

21-02-21

DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, SE SOLICITA AL COMITADO EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIENESTAR, SE HACE RECOMENDACIÓN PARA INCORPORAR MÁS PERSONAL AL TRABAJO DE OBRAS PARA NO GENERAR RETRASOS.

Diego Petina

3^{ra}

2^{da}

01-03-21

DIA DOMINGO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, SE HACE PASEO EN LOSA DE INSPECCIÓN VISUAL EN LA PARTE TRINIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE REALIZA AJUSTE A

FILDS EN POFETE INSTALADO EN LA TOLUENA PRINCIPAL

3^{ra}

3^{ra}

Diego Petina

02-03-21

DIA DOMINGO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE HACE REMATE DE CARPULAS QUE CORRIAN CON LA NUEVA LOSA DE INSPECCIÓN, SE SOLICITA AL COMITADO EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIENESTAR.

3^{ra}

Diego Petina

3^{ra}

03-03-21

DIA DOMINGO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, SE HACE INSTALACIÓN DE SEGUNDO TERMO DE TUBERIA SOUTASIA, SE FORMULAN PRIMER TERMO DE BOCILLO PERIMETRO EN ZONA DE JUEGOS, SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIENESTAR.

3^{ra}

3^{ra}

Diego Petina

04-03-21

DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE INICIA ACTIVIDAD
DE LIMPIEZA DE FOLIAJOS PRINCIPAL, SE INFORMA AL CONTRA-
LISTA QUE SE DESEA REMOVER LAS CORRAS DE PINTURA
DE LA FOLIAJOS PARA Quitar LA MAMPUESTA A LA VISTA
A VISO PRIMERO LA FOLIAJOS, SE SOLICITA EL CUMPLI-
MIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD.

Diego Cetina. F. J. -31-

05-03-21

DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE FUNDE PRIMER
TRAMO DE BORDADO PERIMETRAL EN ZONA DE JUEGOS,
SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
DE SEGURIDAD, AL BORDADO PERIMETRAL SE LE
INSTALAN HORMIGOS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS
LLUVIAS QUE CAERAN SOBRE LA PISA DE CONCRETO.

-31- Diego Cetina. F.

06-03-21

DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTI-
VIDAD DE LIMPIEZA DE FOLIAJOS, SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA LA LIMPIEZA DE LA RAMPA EXTERNA, SE HACE
SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGU-
RIDAD.

F. J. -31- Diego Cetina

08-03-21


DIA SÁBADO, PERSONAL EN OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, CON-
TINUA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE FOLIAJOS CON REMOVES
Y COSTA, SE FUNDE SEGUNDO TRAMO DE BORDADO PE-
RIMETRAL DE LA ZONA DE JUEGOS.

Diego Cetina. F. J. -31-

09-03-21




DIA DOMINGO, PERSONAL EN OBRAS, 1 OFICIAL, 1 RESIDENTE
DE OBRAS, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RES-
IDENTE DE INTERVENTORIA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA
TERMINACIÓN DE LA OBRAS DE INSPECCIÓN VISUAL EN

La parte trasera de la institución educativa, continúa
Actividad de Limpieza a Fachada.

 3^{ra}   2^{da}

10-03-21



Día lluvioso, Personal la obra, 1 Residente de
Interventoría, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Inspector de
Interventoría. Se Retira al Contratista la solicitud
de terminar la construcción de la casa de inspección,
esto para evitar el tapamiento de la nueva rampa
instalada por parte de los señores Luis San Martín
en este lugar.

  3^{ra}  Diego Celina

11-03-21



Día lluvioso, Personal la obra, 1 Residente de
Interventoría, Oficial, 1 Ayudante, se solicita al
Interventor Actar Guernando de Supervisión las
obras de la ampliación del colegio que por tener
no ser ampliada la zona para se en crecimiento
la obra civil del presente proyecto, la solicitud
es recibida por el señor Jairo Bermudez, se

Presentan lluvias desde las 2:30 P.M hasta las
3:30 P.M, Afectando la Actividad de Limpieza a Fachada.

 3^{ra}   Diego Celina



12-03-21

Día nublado, Personal la obra, 1 Residente de
Interventoría, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Inspector de
Interventoría, se hace Remate en caso de inspección,
se solicita al Contratista hacer Aseo General al
Frente de obra, Continúa Actividad de Limpieza a
Fachada.

   3^{ra}  Diego Celina

13-03-21

Día lluvioso, Personal la obra, 1 Residente de
Interventoría, 1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Pintores, se inicia
Actividad de Pintura de Baranda Exterior, se soli-
cita al Contratista el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad, Continúa Actividad de Limpieza a Fachada.

 3^{ra}   Diego Celina

15-03-21

Día Nublado, Personal 6 OSA, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Alcantaral, 2 Mantenimientos, 1 Asesoramiento de Trabajo para Ciudadano, Se inicia la localización de la casita y se inicia la construcción, se solicita el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

31

Diego Celis

21

16-03-21

Día Nublado, Personal 6 OSA, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Alcantaral, 2 Mantenimientos, Continúa la construcción de estructura de casita, se hacen los muros de concreto para estructura y se hace remate en concreto vidado la zona de juegos, se solicita al contratista la colocación de bombas vacuadas en vía pública por que el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

21

31

Diego Celis

17-03-21

Día Nublado, Personal 6 OSA, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Mantenimientos, 1 Inspector de Interventoria, Se inicia Actividad de Pintura en zona interior del colegio, continúa actividad de construcción de estructura de casita, se informa al contratista que la estructura que está siendo de 10x20 de la fachada principal hacia el lado de la casita los muros.

31

21

Diego Celis

19-03-21

Día Nublado, Personal 6 OSA, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Alcantaral, 1 Pintor, 1 Inspector de Interventoria, continúa actividad de pintura en interiores, se informa al contratista que se deberán ajustar muros en el piso donde se tiene contemplado exchange en la zona de juegos, por que los aguas lluvias no queden propensos a la lluvia.

21

Diego Celis

31

20-03-21

DIA MIERCOLES, PERSONAL (6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 2 INSTALADORES
DE PISO CRUCHO, SE PREPARA SUPERFICIE DE PISO DE
CONCRETO PARA APLICAR REGRUETO E INICIAR CON LA
INSTALACION DEL PISO CRUCHO, SE APLICA PRIMERA CAPA
DE IMPERMEABILIZANTE A FACHADA PARA INICIAR ACTIVIDAD
DE PINTURA KURPA, SE PRECORTAN FUEGOS Lluvias desde
las 10:00 P.M., HASTA LAS 3:00 P.M. PROTEGIENDO
LA INSTALACION DEL PISO CRUCHO.

Diego Peña

22-03-21

DIA VIERNES, PERSONAL (6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTER-
VENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 2 INSTALADORES DE
PISO CRUCHO, SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTADO DE FACHADA,
SE INSTALA LA PRIMERA CAPA DE PISO CRUCHO A ZONA
DE JUEGOS, SE APLICA CAPA DE EMPASTE LA CUBIERTA
DE CUBIERTA.

Diego Peña

Diego Peña

23-03-21

DIA SABADO, PERSONAL (6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE CONTINUA
PINTURA KURPA A FACHADA, SE PINTA BARRIDO DE
LA ZONA CURVA USANDO LA ZONA DE JUEGOS, SE
SOLICITA AL CONTRATISTA LA RECOLECCION DE EXCRETAS
USANDO LA VIA PUBLICA, YA QUE SE RECIBE QUEJA DE
PARTE DE LA JUNTA DE ASESOR COMUNITAL, SE SOLICITA
EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Peña

24-03-21




DIA DOMINGO, PERSONAL (6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA
ACTIVIDAD DE PINTURA DE FACHADA, SE SOLICITA AL
CONTRATISTA INCORPORAR MAS PERSONAL A ESTA FRONTE
DE OBRAS PARA MAS RAPIDAMENTE REPARAR, SE SOLICITA EL
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Peña

Diego Peña




26-03-21

DIA MIERCOLES, PERSONAL GOBIERNO, L RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, L DECIDIR, L APOYANTE, SE HACE LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS VARIOS EN VÍA PÚBLICA, SE PINTA MURO DE ALFARO D ZOO DE JUEGOS, SE RECUERDA AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE MANTENER LIMPIOS EN EL PISO D LA HORA QUE SE DESARROLAN ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN EN EL PATIO, SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

   Diego Estigarribia

27-03-21

DIA MIERCOLES, PERSONAL GOBIERNO, L RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, L DECIDIR, L APOYANTE, SE SOLICITA AL CONTRATISTA REMOVER PINTURA EN BARANDAS YA QUE FUERON SOLPICADAS CON PINTURA DE VINILO, SE SOLICITA AL LIMPIEZA DEL JUEGO INFANTIL QUE SE EXHIBIRÁ SOLPICAR CON LACERATO, SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

   Diego Estigarribia

SAN ISIDRO SEDE B.

1 Marzo 2021.

dia: Sábado

Personal: 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Maestro, 1 Siso
1 interventora, 1 residente.



- se realiza demolición de placa para carcamo lineal
- se realiza corrección de soldadura y pintura estructura metálica.
- pañete antepelchos perimetrales salones

2 Marzo 2021.

dia: Sábado

Personal: 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Maestro, 1 Siso.
1 interventora, 1 residente.



- se realiza demolición de placa para

Norma

Carcamo. lineal

- se realiza correcciones en soldadura y pintura. en estructura metalica.
- pañete antepechos perimetrales salones

3 Marzo 2021.

dia: soleado

Personal = 20 fijas 5 Ayudantes. 1 Maestro
1 ISO 1 interventora 1 residente




- se realiza demolicion placa carcamo lineal.
- se realiza excavacion para carcamo lineal.
- se realiza correcciones en soldadura y pintura. en estructura metalica.
- pañete antepechos perimetrales salones

4 Marzo 2021.

dia: soleado

Personal 20 fijas 5 Ayudantes 1 Maestro 1 ISO
1 interventora 1 residente.



se realiza demolicon de placa para
carcamo lineal

se realiza excavacion para carcamo
lineal.

se realiza correccion en soldadura y
pintura en estructura metalica

parte antepechos perimetrales salones

5 Marzo 2021.

dia.: Sábado

personal: 20 ficales 8 Ayudantes 1 Maestro 1 sub
1 interventora 1 presidente.

se realiza demolicon de placa para
carcamo lineal.

se realiza excavacion para carcamo lineal

se realiza correcciones en soldadura y

pintura en estructura metalica.

parte antepechos perimetrales salones

6 Marzo 2021.

dia.: Sábado

Norma

Personal. 20 Finales 5 Ayudantes 15 ISO 1 Maestro
1 interventora 1 residente.

se realiza excavación para carcasa lineal.
se realiza corrección de soldadura y puntos
en estructura metálica.

puente antepecho perimetrales salones
~~se realiza~~

8 marzo 2021 al 14 marzo 2021

no se realizan trabajos en obra

15 marzo 2021 al 21 marzo 2021

no se realizan trabajos en obra

22 marzo 2021 al 28 marzo 2021

no se realizan trabajos en obra

JOSÉ JOAQUIN CASTRO

08-03-21

DIA NUBADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, SE DA INICIO A ESTE FRENTES DE OBRA, SE HACE SOLICITOS AL COMITADO PARA HACER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SE INDICA AL COMITADO LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN A EN ESTE FRENTES DE OBRA, SE INICIA EN ACTIVIDADES DE DESMUNTE DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑOS.

Zs

Diana Cetina

Zst

09-03-21

DIA NUBADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDADES DE DESMUNTE DE SANITARIOS Y PUERTAS EN EL BAÑO DE NIÑOS, SE INDICA AL COMITADO QUE LOS APARATOS SANITARIOS Y PUERTAS QUE SEAN DESMUNTEADOS DEBERÁN ENTREGARSE AL PARRAL ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ, SE INDICA TAMBIÉN SE PUEDAN ACORDAR OTROS APARATOS Y PUERTAS,

Zst

Diana Cetina

Zs

10-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OZLA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OZLA, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, SE AVANZA CON LA ACTIVIDAD DE DESMONTAJE DE PUERTAS Y SE INICIA CON ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ECHAPÉ EN BAÑO DE NIÑOS.

21 -31 Diego Cetina

11-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OZLA, 1 RESIDENTE DE OZLA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, 2 AYUDANTES, SE AVANZA CON ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ECHAPÉ, SE HACE LA DEMOLICIÓN DE UN MURO DIVISOR DE LAS CASAS MONITORIZADAS DEL BAÑO DE NIÑOS.

Diego Cetina 21" -31

12-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OZLA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OZLA, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, CONTINUA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ECHAPÉ, SE HACE EL DESMONTAJE DE VENTANA DEL BAÑO DE NIÑOS

21" -31 Diego Cetina

13-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OZLA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OZLA, 2 AYUDANTES, SE RECOMIENDA AL CUSTODISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONITOREO, SE AVANZA CON LA DEMOLICIÓN DE ECHAPÉ EN BAÑO DE NIÑOS Y SE HACE LA DEMOLICIÓN DE LINDAMIENTOS LATERALES

-31 2" Diego Cetina

15-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OZLA, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OZLA, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, DURANTE LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DEL ECHAPÉ EN EL BAÑO DE NIÑOS SE HALLA HUMEDAD EN EL MURO QUE LINDA CON EL COLEGIO Fb y ADELIA SE HACE TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO, SE RECOMIENDA AL CUSTODISTA REVISAR LA UNIÓN ENTRE LOS MUROS PARA COMPROBAR LA INSTALACIÓN DE UN FRONTE PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA LUVIOS DENTRO DE LOS MUROS DE LOS COCHOS.

Diego Cetina -31 21"

16-03-21

DIA NUBARRO, PERSONAL 6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE OBRAS, 1 MOBILIZADO. SE INICIA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE LUCHA DE PISO EN EL BAÑO DE NIÑOS Y SE ENCUENTRA QUE LAS CAJAS INSPECCIÓN, SE PROCEDE HACER LA APERTURA ENCONTRANDO QUE LA TUBERÍA SANITARIA ES DE GRS, SE HACE LA APERTURA DE CUATRO CAJAS DE INSPECCIÓN, 2 DE ESTAS SON DE AGUAS NEGRAS Y LAS OTRAS 2 SON DE AGUAS LUVIAS, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA HACER LA LIMPIEZA DE ESTAS 4 CAJAS ENCONTRADAS.

Diego Cetina

17-03-21

DIA NUBARRO, PERSONAL 6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OBRAS, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, CONTINUA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE LUCHA DE PISO EN BAÑO DE NIÑOS, SE HACE RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO Y SE APOYA EN EL PATIO DEL COLEGIO, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA HACER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Cetina

18-03-21

DIA NUBARRO, PERSONAL 6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OBRAS, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LA DEMOLICIÓN DE PASETE DE LAS CASINAS SANITARIAS DE LOS NIÑOS YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN MUY PROXIMAS AL GASTRÓN, SE AUMENTA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE LUCHA DE PISO EN BAÑO DE NIÑOS.

Diego Cetina

19-03-21

DIA NUBARRO, PERSONAL 6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENCIÓN, CONTINUA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE PASETE EN CASINAS SANITARIAS DE NIÑOS SE HACE COMUNITA A LA PUERTA PRINCIPAL DEL BAÑO DE NIÑOS, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Cetina

20-03-21

DIA NUBARRO, PERSONAL 6 OBRAS, 1 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN, 1 RESIDENTE DE OBRAS, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR

DE INTERVENTOR, CONTINUO ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE
GUARDIA DE PISO EN BAÑO DE NIÑOS, SE HACE RECOLECCION
DE ESCOMBROS, HAYO SUMINISTRO DE ACCESORIOS SUMINISTROS.

Diego Retina. 2^o 3^o

22-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA,
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR
DE INTERVENTORIA, SE INICIA ACTIVIDADES DE REMONTE DE
PUERTAS EN EL BAÑO DE LOS NIÑOS, SE RECOMIENDAN AL
CONTRATISTA HACER EN IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

3^o 2^o Diego Retina.

23-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA,
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 3 AYUDANTES, 1 INSPECTOR
DE ^{INT.} ~~OBRA~~, SE INICIA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE GUICHAPPE
EN BAÑO DE NIÑOS, SE HACE EL DESMONTE DE LOS GOTEOS
SOMITIZADOS.

Diego Retina. 3^o 2^o

24-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 3 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE
INTERVENTORIA, SE HACE DEMOLICION DE LINDAMIENTOS Y GOTEOS
GUICHAPPE, CONTINUO ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE GUICHAPPE,
SE HACE RECOLECCION DE ESCOMBROS.

2^o Diego Retina. 3^o

25-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA,
1 RESIDENTE DE OBRA, 3 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTER-
VENTORIA, SE INICIA DEMOLICION DE PARED DE LAS
COCINAS SOMITIZADOS DE NIÑOS, SE AVANZA CON LA
DEMOLICION DE GUICHAPPE, DURANTE LA ACTIVIDAD DE
DEMOLICION DE GUICHAPPE DE MURO SE ENCUENTRA EL MISMO
PROBLEMA DE HUMEDAD DETECTADO EN EL BAÑO DE NIÑOS.

3^o 2^o Diego Retina.

26-03-21

DIA MUNDADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 2 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE
INTERVENTORIA, SE HACE DEMOLICION DE GUICHAPPE DE

Muros, se inicia con la demolición de fachada de piso.
Se recomienda al contratista el cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad.

Zaf. 2^o Diego Estina.

27-03-21

Día martes, Personal en obra, 1 residente de interven-
toria, 1 residente de obra, 2 ayudantes, 1 inspector de
interventoria, continua actividades de demolición de fachada
de piso, se ejecuta una lista de inspección, se
avanza en la actividad de demolición de fachada y murete
en el bajo de niños.

Diego Estina. Zaf. 2^o

29-03-21

Día miércoles, Personal en obra, 1 residente de obra,
1 residente de interventoria, 2 ayudantes, 1 inspector de
interventoria, continua actividades de demolición de muros
en casillas sanitarias de niños, se hace recolección de
escombros.

2^o Zaf. Diego Estina.

30-03-21

Día miércoles, Personal en obra, 1 residente de interventoria,
1 residente de obra, 2 ayudantes, 1 inspector de
interventoria, continua actividades de demolición de
fachada en bajo de niños de Hile demolición de
muro para instalar la puerta de acceso a los baños
de los niños, se hace recolección de escombros.

Zaf. Diego Estina. 2^o

JOSÉ FELIX RESTREPO


23-Marzo-2021.

dia - Soleado

Personal = 1 Maestro 2 Hornamentadores 6 Ayudantes.
1 Intenventoria, residente.

- se realiza la demolicion de enchape,
ornal corrido desmonte de marcos y
puertas Ventanas

Se realizara Escalificacion para nuevo
pavete.



26 Marzo 2021.

dia Soleado

Personal = 1 Maestro 2 Hornamentadores 6 Ayudantes.
1 residente 1 Intenventoria



- se realiza demolicion de enchape.
- demolicion de ornal corrido
desmonte de Marcos y puertas Ventanas
se realizara una escalificacion para
nuevo pavete.
- desmonte Aparatos sanitarios.

27 Marzo-2021.

dia soleado

Personal: 1 Maestro 2 Amamentadores 6 Ayudantes

1 Interventora 1 residente.

- se realiza demolicion de enchape
- demolicion de ornamental
- desmonte marcos y Puertas
- se realiza escalificacion para previo pañete, desmonte aparatos sanitarios

VCA

29 Marzo 2021.

dia soleado

Personal: 1 Maestro, 6 Ayudantes, 3 Amamentadores

- se realiza desmonte de cubierta canaletas
- se construye cercas en sitio.
- se realizan pañetes y enchapes.

VCA

30 Marzo 2021.

dia soleado

Personal: 1 Maestro 6 Ayudante 3 Amamentadores

1 Interventora, 1 residente.

- se realiza el desmonte de cubierta

VCA

ANEXO 7. INFORMES SEMANALES.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	16	DEL	1-Mar-21	AL	7-Mar-21
------------------	----	------------	----------	-----------	----------

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	Contrato No .	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	Fecha de Iniciación	19 de Agosto de 2020
Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021	Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021	Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de Terminación	12 de Febrero de 2021	Fecha de Terminación	18 de Enero de 2021
Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021	Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	5 meses
Valor inicial	\$ 160,550,040.00	Valor inicial	\$ 1,023,694,436.00
Adiciones	\$ 80,275,020.00	Adiciones	\$ 491,373,316.00
Prorroga	3 MESES	Prorroga	3 MESES Y 25 DIAS

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6					
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
20	OBRA EXTERIORES				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		0.00%	0.00%		

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				
SEMANA N°	16	DEL	1-Mar-21	AL	7-Mar-21

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 197,434,522		\$ 197,434,522			65.71%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO	1	PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	1
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA	1	RESIDENTE DE OBRA	1
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)





5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO DE REGILLAS CARCAMO

SE CULMINA LA PULIDA Y BRILLADA DE PISOS.

SE CONTINUA CON EMBOQUILLADA DE ENCHAPE DE PARED.

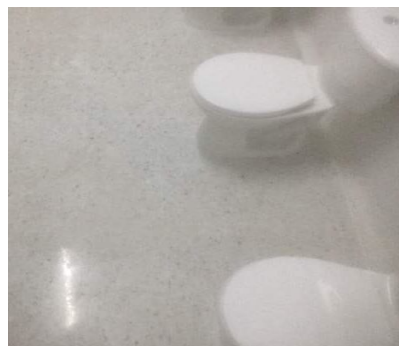

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA


LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 16



MANTENIMIENTO REJAS CARCAMO



PULIDA DE PISOS Y MESONES



EMBOQUILLADO DE ENCHAPE

INFORME SEMANAL # 16 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

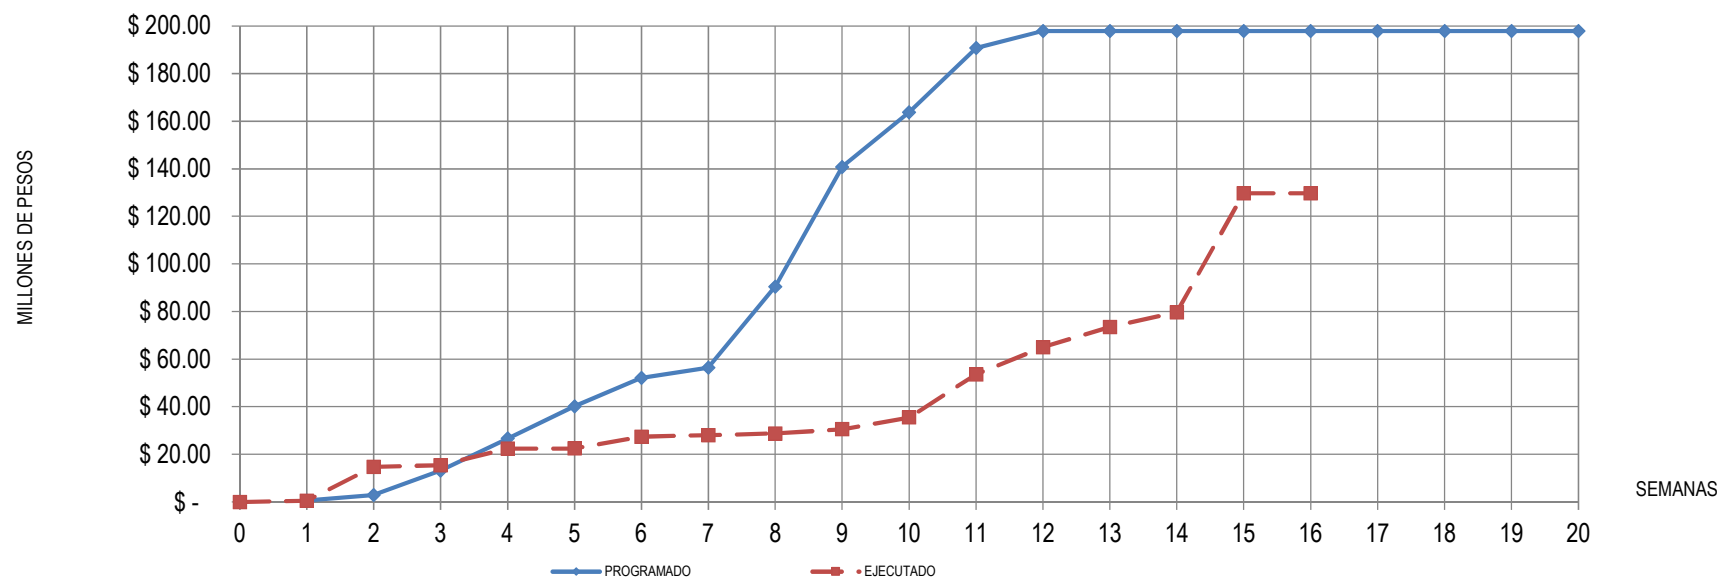
VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	16	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de marzo de 2021	Y EL	7 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"



OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	17	DEL	8-Mar-21	AL	14-Mar-21
------------------	----	------------	----------	-----------	-----------

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	Contrato No .	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	Fecha de Iniciación	19 de Agosto de 2020
Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021	Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021	Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de Terminación	12 de Febrero de 2021	Fecha de Terminación	18 de Enero de 2021
Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021	Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	5 meses
Valor inicial	\$ 160,550,040.00	Valor inicial	\$ 1,023,694,436.00
Adiciones	\$ 80,275,020.00	Adiciones	\$ 491,373,316.00
Prorroga	3 MESES	Prorroga	3 MESES Y 25 DIAS

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6					
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
20	OBRAS EXTERIORES				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		0.00%	0.00%		

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				
SEMANA N°	17	DEL	8-Mar-21	AL	14-Mar-21

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 197,434,522		\$ 197,434,522			65.71%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO	1	PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	1
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA	1	RESIDENTE DE OBRA	1
HIDRÁULICOS			


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO DE REJILLAS CARCAMO



KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA


LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 17



MANTENIMIENTO REJAS CARCAMO



MANTENIMIENTO REJAS CARCAMO

PROYECTO					
FECHA	VR. INVERSIÓN	VR. ACUMULADO	SEMANA	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1 de noviembre de 2020	\$ 576,541.74	\$ 576,541.74	1	0.29%	0.29%
8 de noviembre de 2020	\$ 2,301,047.39	\$ 2,877,589.13	2	1.16%	1.45%
15 de noviembre de 2020	\$ 10,215,294.74	\$ 13,092,883.88	3	5.16%	6.61%
22 de noviembre de 2020	\$ 13,560,363.40	\$ 26,653,247.27	4	6.85%	13.47%
29 de noviembre de 2020	\$ 13,556,340.71	\$ 40,209,587.99	5	6.85%	20.31%
6 de diciembre de 2020	\$ 11,880,323.65	\$ 52,089,911.64	6	6.00%	26.32%
13 de diciembre de 2020	\$ 4,406,764.60	\$ 56,496,676.23	7	2.23%	28.54%
20 de diciembre de 2020	\$ 34,007,795.85	\$ 90,504,472.08	8	17.18%	45.72%
27 de diciembre de 2020	\$ 50,223,450.47	\$ 140,727,922.55	9	25.37%	71.10%
3 de enero de 2021	\$ 23,048,461.45	\$ 163,776,384.00	10	11.64%	82.74%
10 de enero de 2021	\$ 27,054,881.37	\$ 190,831,265.37	11	13.67%	96.41%
17 de enero de 2021	\$ 7,109,924.78	\$ 197,941,190.15	12	3.59%	100.00%
TOTAL	\$ 197,941,190.15				

INFORME SEMANAL # 17 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

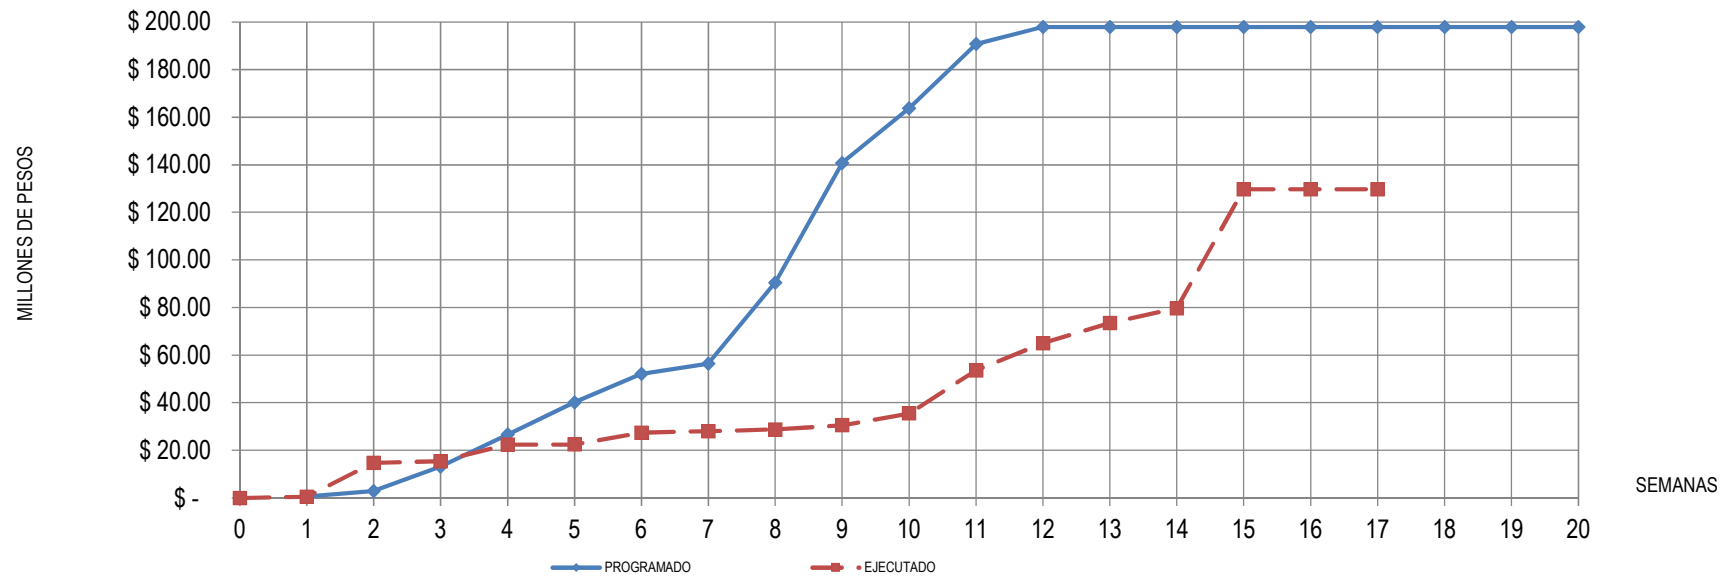
VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	17	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	8 de marzo de 2021	Y EL	14 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"



OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	18	DEL	15-Mar-21	AL	21-Mar-21
------------------	----	------------	-----------	-----------	-----------

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	Contrato No .	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	Fecha de Iniciación	19 de Agosto de 2020
Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021	Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021	Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de Terminación	12 de Febrero de 2021	Fecha de Terminación	18 de Enero de 2021
Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021	Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	5 meses
Valor inicial	\$ 160,550,040.00	Valor inicial	\$ 1,023,694,436.00
Adiciones	\$ 80,275,020.00	Adiciones	\$ 491,373,316.00
Prorroga	3 MESES	Prorroga	3 MESES Y 25 DIAS

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6					
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
20	OBRAS EXTERIORES				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		0.00%	0.00%		

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	18	DEL	15-Mar-21	AL	21-Mar-21
------------------	----	------------	-----------	-----------	-----------

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 197,434,522		\$ 197,434,522			65.71%

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO	1	PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	1
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA	1	RESIDENTE DE OBRA	1
HIDRÁULICOS			


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO DE REJILLAS CARCAMO

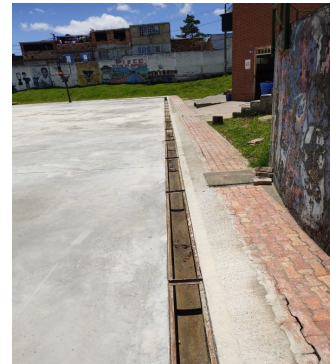

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA


LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 18



MANTENIMIENTO REJAS CARCAMO



MANTENIMIENTO REJAS CARCAMO

PROYECTO					
FECHA	VR. INVERSIÓN	VR. ACUMULADO	SEMANA	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1 de noviembre de 2020	\$ 576,541.74	\$ 576,541.74	1	0.29%	0.29%
8 de noviembre de 2020	\$ 2,301,047.39	\$ 2,877,589.13	2	1.16%	1.45%
15 de noviembre de 2020	\$ 10,215,294.74	\$ 13,092,883.88	3	5.16%	6.61%
22 de noviembre de 2020	\$ 13,560,363.40	\$ 26,653,247.27	4	6.85%	13.47%
29 de noviembre de 2020	\$ 13,556,340.71	\$ 40,209,587.99	5	6.85%	20.31%
6 de diciembre de 2020	\$ 11,880,323.65	\$ 52,089,911.64	6	6.00%	26.32%
13 de diciembre de 2020	\$ 4,406,764.60	\$ 56,496,676.23	7	2.23%	28.54%
20 de diciembre de 2020	\$ 34,007,795.85	\$ 90,504,472.08	8	17.18%	45.72%
27 de diciembre de 2020	\$ 50,223,450.47	\$ 140,727,922.55	9	25.37%	71.10%
3 de enero de 2021	\$ 23,048,461.45	\$ 163,776,384.00	10	11.64%	82.74%
10 de enero de 2021	\$ 27,054,881.37	\$ 190,831,265.37	11	13.67%	96.41%
17 de enero de 2021	\$ 7,109,924.78	\$ 197,941,190.15	12	3.59%	100.00%
TOTAL	\$ 197,941,190.15				

INFORME SEMANAL # 18 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

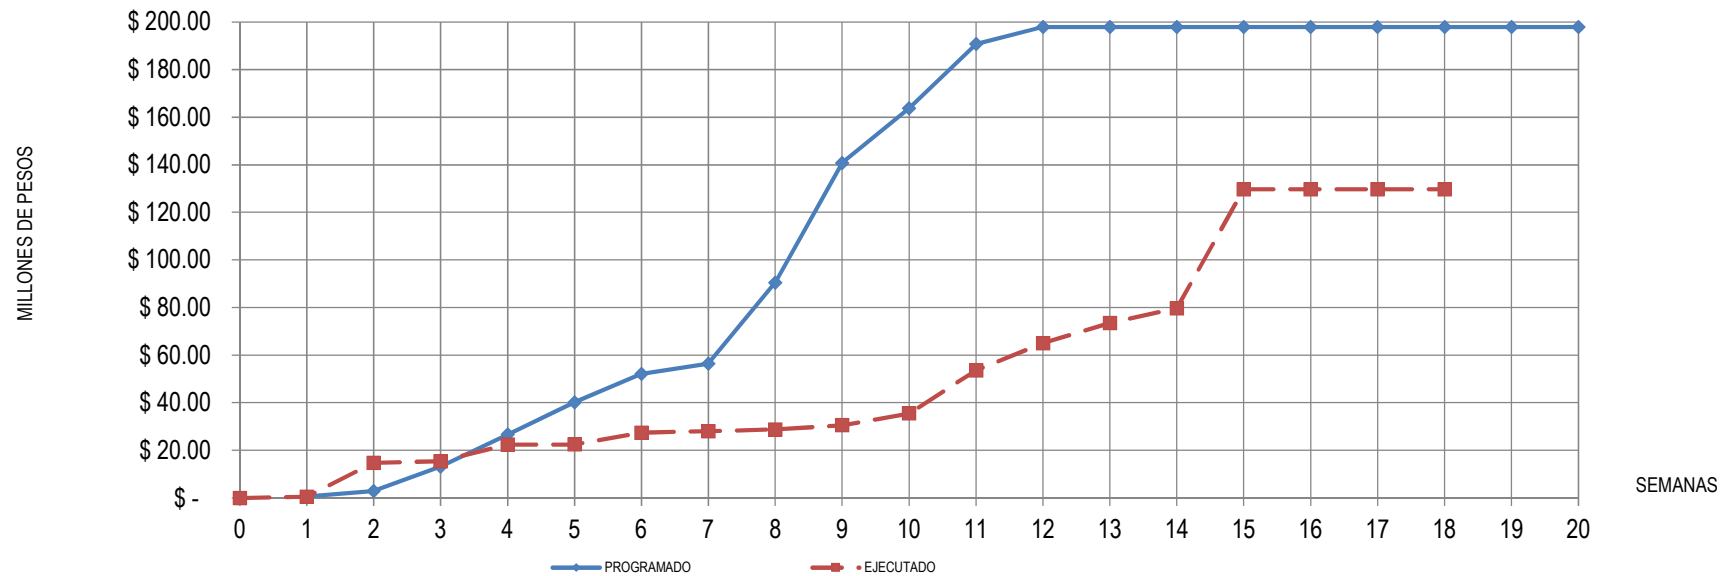
VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	18	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	15 de marzo de 2021	Y EL	21 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"



OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	19	DEL	22-Mar-21	AL	28-Mar-21
------------------	----	------------	-----------	-----------	-----------

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	Contrato No .	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	Fecha de Iniciación	19 de Agosto de 2020
Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021	Suspensión No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021	Fecha de reiniciación No. 1	26 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de Terminación	12 de Febrero de 2021	Fecha de Terminación	18 de Enero de 2021
Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021	Nueva fecha de Terminación	28 de mayo de 2021
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	5 meses
Valor inicial	\$ 160,550,040.00	Valor inicial	\$ 1,023,694,436.00
Adiciones	80275020	Adiciones	491373316
Prorroga	3 MESES	Prorroga	3 MESES Y 25 DIAS

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6					
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES		0.14%	AJUSTE DE CANTIDADES	AJUSTE DE CANTIDADES
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
20	OBRAS EXTERIORES				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		0.00%	0.14%		

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				
SEMANA N°	19	DEL	22-Mar-21	AL	28-Mar-21

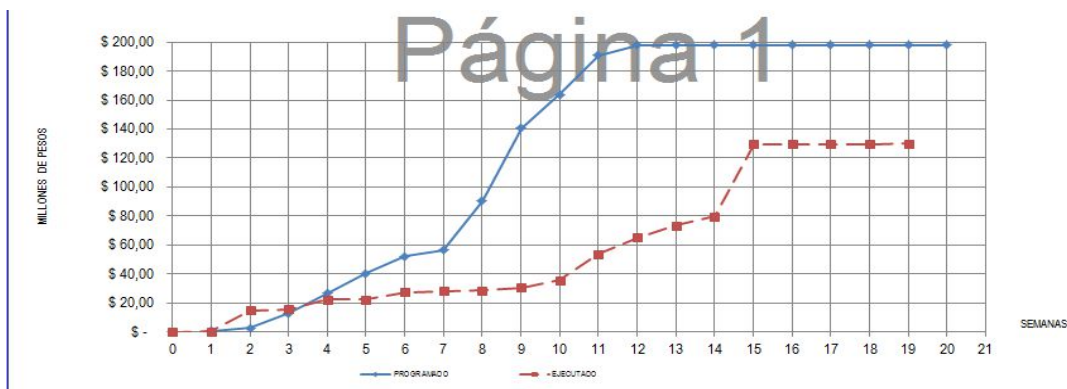
3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 197,434,522	\$ 130,010,079	\$ 67,424,444		0.14%	65.85%

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO		PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA		RESIDENTE DE OBRA	
HIDRÁULICOS			


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE REALIZAN AJUSTE DE CANTIDADES RESPECTO A LA PARTE ELECTRICA.


KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA


LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PROYECTO					
FECHA	VR. INVERSIÓN	VR. ACUMULADO	SEMANA	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1 de noviembre de 2020	\$ 576,541.74	\$ 576,541.74	1	0.29%	0.29%
8 de noviembre de 2020	\$ 2,301,047.39	\$ 2,877,589.13	2	1.16%	1.45%
15 de noviembre de 2020	\$ 10,215,294.74	\$ 13,092,883.88	3	5.16%	6.61%
22 de noviembre de 2020	\$ 13,560,363.40	\$ 26,653,247.27	4	6.85%	13.47%
29 de noviembre de 2020	\$ 13,556,340.71	\$ 40,209,587.99	5	6.85%	20.31%
6 de diciembre de 2020	\$ 11,880,323.65	\$ 52,089,911.64	6	6.00%	26.32%
13 de diciembre de 2020	\$ 4,406,764.60	\$ 56,496,676.23	7	2.23%	28.54%
20 de diciembre de 2020	\$ 34,007,795.85	\$ 90,504,472.08	8	17.18%	45.72%
27 de diciembre de 2020	\$ 50,223,450.47	\$ 140,727,922.55	9	25.37%	71.10%
3 de enero de 2021	\$ 23,048,461.45	\$ 163,776,384.00	10	11.64%	82.74%
10 de enero de 2021	\$ 27,054,881.37	\$ 190,831,265.37	11	13.67%	96.41%
17 de enero de 2021	\$ 7,109,924.78	\$ 197,941,190.15	12	3.59%	100.00%
TOTAL	\$ 197,941,190.15				

INFORME SEMANAL # 19 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

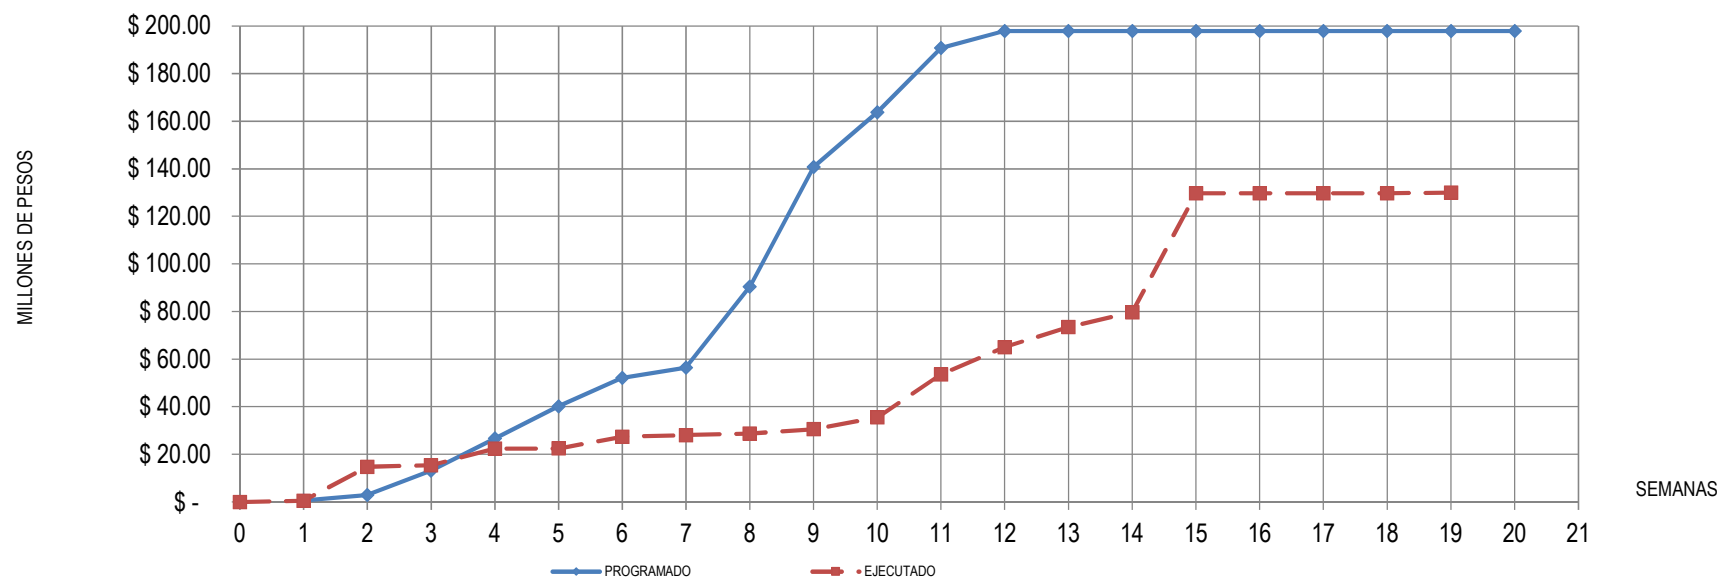
VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	19	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22 de marzo de 2021	Y EL	28 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"



		INFORME SEMANAL # 16				VERSIÓN 01	
						Pág. 1 De 4	
OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.							
INTERVENTOR CONSORCIO INAR INGENIEROS							
CONTRATISTA MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A		C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.		
CONTRATANTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)							
SEMANA N° 16		DEL	1-Mar-21		AL	7-Mar-21	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020		Contrato No .		CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020	
Fecha de Iniciación		12 de Agosto de 2020		Fecha de Iniciación		19 de Agosto de 2020	
Suspensión No. 1		10 DE FEBRERO DE 2021		Suspensión No. 1		10 DE FEBRERO DE 2021	
Fecha de reiniciación No. 1		26 DE FEBRERO DE 2021		Fecha de reiniciación No. 1		26 DE FEBRERO DE 2021	
Fecha de Terminación		12 DE FEBRERO DE 2021		Fecha de Terminación		18 de Enero de 2021	
Nueva fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021		Nueva fecha de Terminación		28 DE FEBRERO DE 2021	
Plazo Inicial		6 meses		Plazo Inicial		5 meses	
Valor inicial		\$ 160,550,040.00		Valor inicial		\$ 1,023,694,436.00	
Adiciones		\$ 80,275,020.00		Adiciones		\$ 491,373,316.00	
Valor Total		\$ 240,825,060.00		Valor Total		\$ 1,515,067,752.00	
Prorroga		3 MESES		Prorroga		3 MESES Y 25 DÍAS	
Fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021		Fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES			
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN		
1	PRELIMINARES		0.02%	ESCARIFICAR	ESCARIFICADO DE PAÑETE EN FACHADA PRINCIPAL		
2	CIMENTACIÓN -						
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
4	ESTRUCTURA						
5	MAMPOSTERÍA						
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS						
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
9	PAÑETES		0.25%	PAÑETES	PAÑETE Y AJUSTE DE FILOS EN FACHADA		
10	PISOS						
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						
12	CARPINTERIA METALICA						
14	ENCHAPES						
15	ILUMINACIÓN						
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
18	PINTURA						
20	OBRAS EXTERIORES						
21	ASEO Y VARIOS		0.07%	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE FACHADA PRINCIPAL		
25	GENERICOS Y OTROS						
TOTALES		0.00%	0.34%				

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				
SEMANA N°	16	DEL	1-Mar-21	AL	7-Mar-21

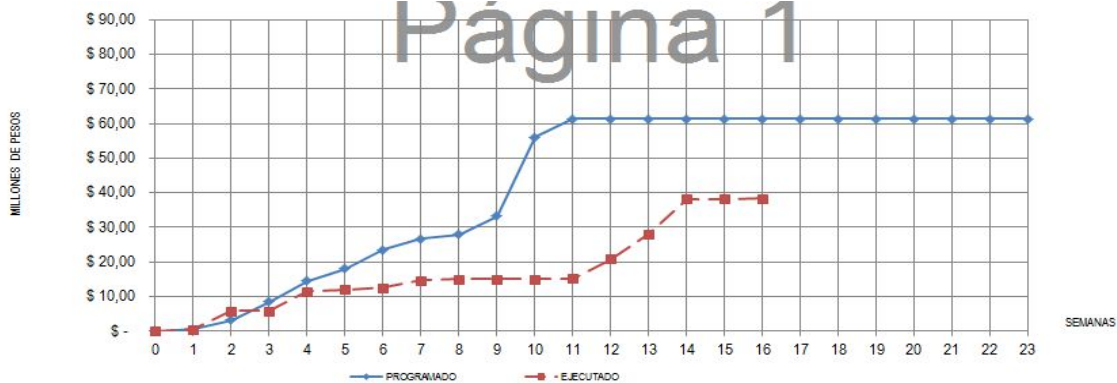
3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 61,254,036	\$ 38,426,678	\$ 22,827,358		0.34%	62.73%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO		PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	1
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA		RESIDENTE DE OBRA	
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se hace revision de cantidades de obra en compañía del contratista y se ajusta el presupuesto oficial del este frente.

Se hace escarificado en tramo de fachada.

Se ejecuta actividad de pañete y ajuste de filos en fachada.

Se inicia actividad de limpieza de fachada.

Se recomienda al contratista incorporar mas personal al frente de obra para no generar retrasos.

Se reitera solicitud al contratista para que se programe recoleccion de escombros ubicados en via publica.

Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

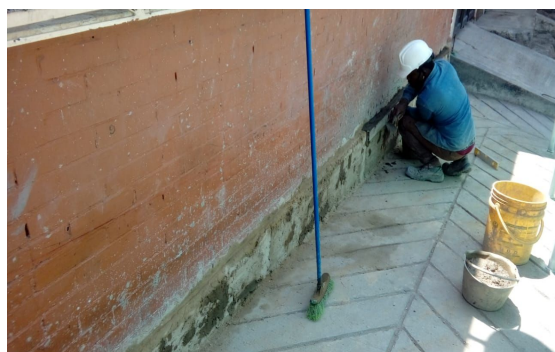
ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 16



ESCARIFICADO EN TRAMO DE FACHADA



SE AJUSTAN FILOS EN TRAMOS DE FACHADA



SE AJUSTAN FILOS EN TRAMOS DE FACHADA



SE INICIAN ACTIVIDADES DE PAÑETE EN TRAMOS DE FACHADA



LIMPIEZA DE FACHADA

PROYECTO					
FECHA	VR. INVERSIÓN	VR. ACUMULADO	SEMANA	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
8 de noviembre de 2020	\$ 496,250.46	\$ 496,250.46	1	0.56%	0.56%
15 de noviembre de 2020	\$ 2,682,125.32	\$ 3,178,375.77	2	3.05%	3.61%
22 de noviembre de 2020	\$ 5,207,069.95	\$ 8,385,445.72	3	5.92%	9.54%
29 de noviembre de 2020	\$ 6,146,741.41	\$ 14,532,187.13	4	6.99%	16.53%
6 de diciembre de 2020	\$ 3,497,999.91	\$ 18,030,187.04	5	3.98%	20.51%
13 de diciembre de 2020	\$ 5,408,467.54	\$ 23,438,654.58	6	6.15%	26.66%
20 de diciembre de 2020	\$ 3,309,406.05	\$ 26,748,060.64	7	3.76%	30.42%
27 de diciembre de 2020	\$ 1,206,150.47	\$ 27,954,211.11	8	1.37%	31.79%
3 de enero de 2021	\$ 5,250,004.24	\$ 33,204,215.35	9	5.97%	37.76%
10 de enero de 2021	\$ 22,888,423.90	\$ 56,092,639.25	10	26.03%	63.79%
17 de enero de 2021	\$ 31,836,538.61	\$ 87,929,177.86	11	36.21%	100.00%
TOTAL	\$ 87,929,177.86				

INFORME SEMANAL # 16 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

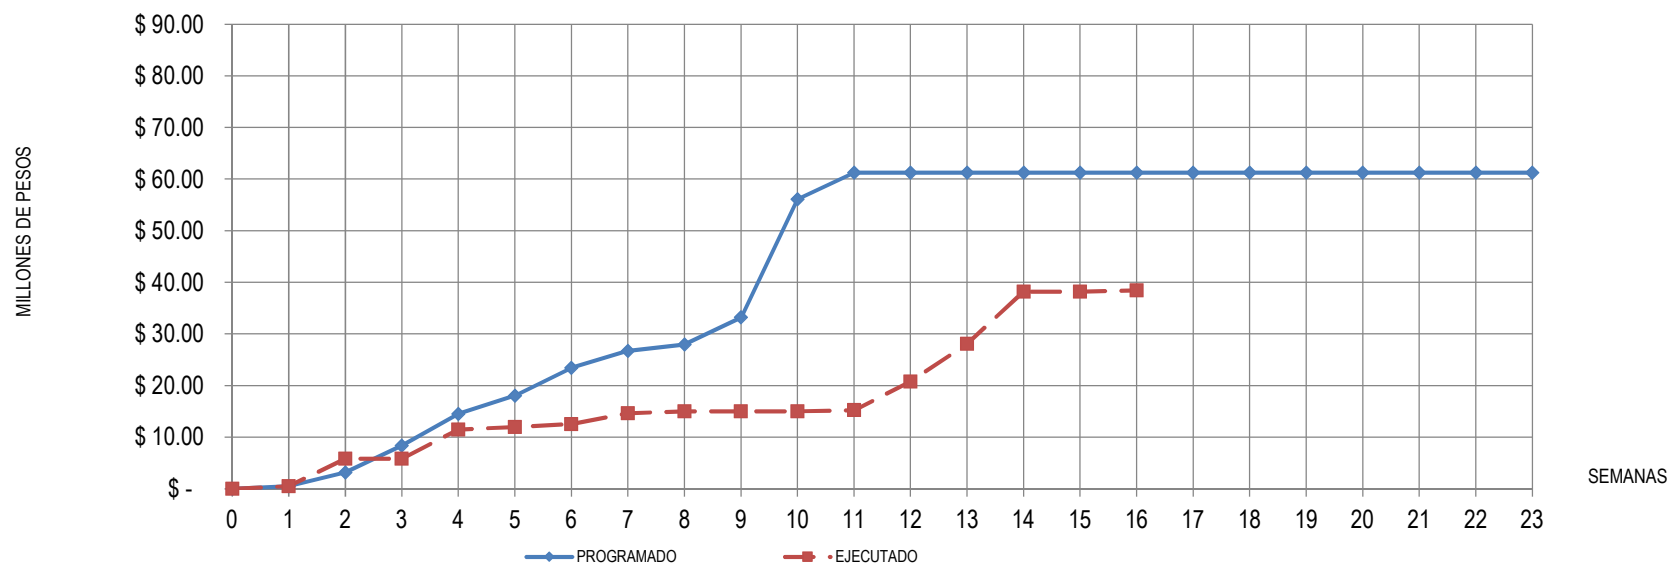
VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	16	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de marzo de 2021	Y EL	7 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"



		INFORME SEMANAL # 17				VERSIÓN 01	
						Pág. 1 De 4	
OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.							
INTERVENTOR CONSORCIO INAR INGENIEROS							
CONTRATISTA MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A		C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)		ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.	
CONTRATANTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)							
SEMANA N° 17		DEL	8-Mar-21		AL	14-Mar-21	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020		Contrato No .		CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020	
Fecha de Iniciación		12 de Agosto de 2020		Fecha de Iniciación		19 de Agosto de 2020	
Suspensión No. 1		10 DE FEBRERO DE 2021		Suspensión No. 1		10 DE FEBRERO DE 2021	
Fecha de reiniciación No. 1		26 DE FEBRERO DE 2021		Fecha de reiniciación No. 1		26 DE FEBRERO DE 2021	
Fecha de Terminación		12 DE FEBRERO DE 2021		Fecha de Terminación		18 de Enero de 2021	
Nueva fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021		Nueva fecha de Terminación		28 DE FEBRERO DE 2021	
Plazo Inicial		6 meses		Plazo Inicial		5 meses	
Valor inicial		\$ 160,550,040.00		Valor inicial		\$ 1,023,694,436.00	
Adiciones		\$ 80,275,020.00		Adiciones		\$ 491,373,316.00	
Valor Total		\$ 240,825,060.00		Valor Total		\$ 1,515,067,752.00	
Prorroga		3 MESES		Prorroga		3 MESES Y 25 DÍAS	
Fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021		Fecha de Terminación		28 DE MAYO DE 2021	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES			
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN		
1	PRELIMINARES						
2	CIMENTACIÓN -						
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
4	ESTRUCTURA						
5	MAMPOSTERÍA						
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS						
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
9	PAÑETES						
10	PISOS						
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						
12	CARPINTERIA METALICA		3.57%	INSTALACION	INSTALACION DE TRAMO DE BARANDA EN ZONA DE JUEGOS		
14	ENCHAPES						
15	ILUMINACIÓN						
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
18	PINTURA						
20	OBRAS EXTERIORES						
21	ASEO Y VARIOS						
25	GENERICOS Y OTROS						
TOTALES		0.00%	3.57%				

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA N°	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				
SEMANA N°	17	DEL	8-Mar-21	AL	14-Mar-21

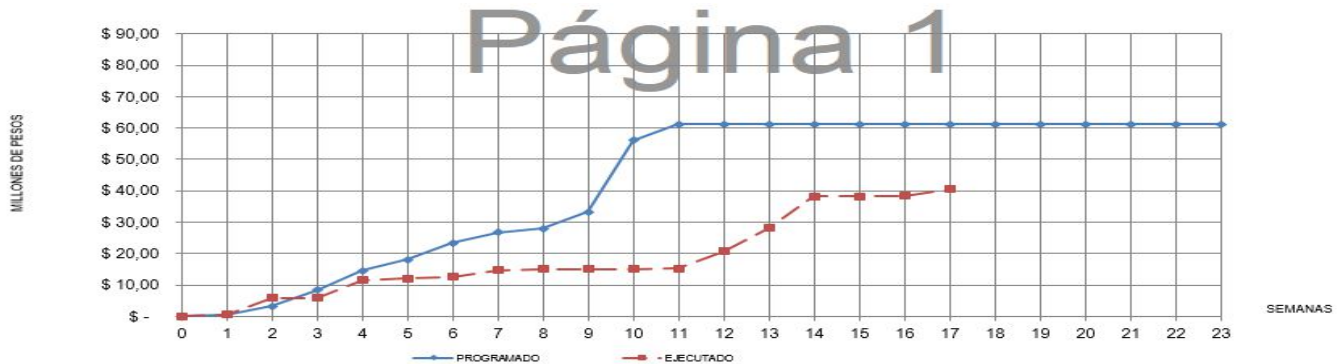
3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 61,254,036	\$ 40,611,595	\$ 20,642,441		3.57%	66.30%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO		PINTORES	
ELECTRICISTA		OFICIALES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		AYUDANTES	2
INSTALADORES DE PISO		ALMACENISTA	
SISOMA		RESIDENTE DE OBRA	
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Se realiza instalacion de tramo de baranda en zona de juegos.
- Se recomienda al contratista incorporar mas personal al frente de obra para no generar retrasos.
- Se reitera solicitud al contratista para que se programe recoleccion de escombros ubicados en via publica.
- Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.



ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA



LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 17



INSTALACION DE TRAMO DE BARANDA



INSTALACION DE TRAMO DE BARANDA



INSTALACION DE TRAMO DE BARANDA

PROYECTO					
FECHA	VR. INVERSIÓN	VR. ACUMULADO	SEMANA	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
8 de noviembre de 2020	\$ 496,250.46	\$ 496,250.46	1	0.56%	0.56%
15 de noviembre de 2020	\$ 2,682,125.32	\$ 3,178,375.77	2	3.05%	3.61%
22 de noviembre de 2020	\$ 5,207,069.95	\$ 8,385,445.72	3	5.92%	9.54%
29 de noviembre de 2020	\$ 6,146,741.41	\$ 14,532,187.13	4	6.99%	16.53%
6 de diciembre de 2020	\$ 3,497,999.91	\$ 18,030,187.04	5	3.98%	20.51%
13 de diciembre de 2020	\$ 5,408,467.54	\$ 23,438,654.58	6	6.15%	26.66%
20 de diciembre de 2020	\$ 3,309,406.05	\$ 26,748,060.64	7	3.76%	30.42%
27 de diciembre de 2020	\$ 1,206,150.47	\$ 27,954,211.11	8	1.37%	31.79%
3 de enero de 2021	\$ 5,250,004.24	\$ 33,204,215.35	9	5.97%	37.76%
10 de enero de 2021	\$ 22,888,423.90	\$ 56,092,639.25	10	26.03%	63.79%
17 de enero de 2021	\$ 31,836,538.61	\$ 87,929,177.86	11	36.21%	100.00%
TOTAL	\$ 87,929,177.86				

INFORME SEMANAL # 17 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL

VERSIÓN 01

Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	17	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	8 de marzo de 2021	Y EL	14 de marzo de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

