

INFORME FINAL SOCIAL DE OBRA

16 de enero de 2019 al 09 de agosto de 2019

CONTRATO DE OBRA No C01-PCCNTR630227

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO MARSELLA CPF 817,
MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL MODULO DE PRIMERA INFANCIA,
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MARSELLA

INTERVENTORIA CONSORCIO AMPLIACIONES P Y J
Arq. JAIRO GARCIA GARCIA

SUPERVISORA: T.S MARIA ELISA RODRIGUEZ

Elaboró T.S Alexandra Díaz 	Revisó y Aprobó	Fecha 12/08/2019
--	-----------------	---------------------

TABLA DE CONTENIDO

ANEXOS	3
INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO GENERAL.....	4
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	5
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	5
2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:	5
2.1.1 Reunión inicio de obra.....	6
2.1.2 Reunión avance de obra	6
2.1.3 Reunión Extraordinaria	7
2.1.4 Reunión de finalización.....	8
2.2 Subprograma de divulgación.....	9
2.3 Vallas Informativa punto de atención	11
2.4 Levantamiento de actas de vecindad de inicio.....	12
3. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO (Atención de quejas y reclamos):	
12	
4. PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12
5. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO	14
5.1 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	14
CONCLUSIONES	15

Anexos

Anexo 1: Plan de gestión social aprobado

Anexo 2: acta de reunión inicio de obra y registro de asistencia.

Anexo 3. Acta de Reunión avance de obra y listado de asistencia.

Anexo 4: acta de reunión Extraordinaria y registro de asistencia).

Anexo 5: acta de reunión de finalización y registro de asistencia

Anexo 6: Volantes diligenciados y entregados

Ver anexo 7: Actas de vecindad

Anexo 8: Consulta ciudadana y respuesta

Anexo 9: actas de reunión Grupo de participación ciudadana y registro de asistencia

Anexo 10: Listado de personal de obra

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades desarrolladas por el área de gestión social de la firma contratista, durante el periodo de ejecución del contrato de obra N°: C01-PCCNTR630227. Cuyo objetivo fue “ampliación de la estructura del colegio Marsella cpf-80017. Mediante la ejecución de obras del módulo de primera infancia ubicado en la localidad de Kennedy y de acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED.

Para ello en el presente informe tuvo en cuenta el desarrollo los programas y subprogramas que componen el plan de gestión social elaborado por la firma contratista Arq. José Ever Salgado Salgado. El cual fue presentado el día 07 de febrero de 2019 y aprobado por la Interventoría el día 11 de febrero de 2019, Este documento denominado PGS, será la base de la ejecución de las actividades sociales que se llevarán a cabo para la ejecución del presente contrato. *(Ver Anexo 1: Plan de gestión social aprobado)*

Entre los programas que se desarrollaron se encuentran:

1. Programa de información y divulgación a la comunidad.
2. Programa de atención al ciudadano
3. Programa de participación ciudadana
4. Programa de generación de empleo.
5. Programa de sostenibilidad.

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar el proceso de la gestión social llevado por la firma contratista, a través de la descripción cualitativa las actividades desarrolladas y basadas en el Plan de Gestión Social, las cuales estuvieron encaminadas a mitigar impactos sociales, técnicos y ambientales en los sectores aledaños al Colegio Marsella de la localidad de Kennedy.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Describir el proceso informativo llevado por parte del Contratista, por medio de las reuniones informativas de inicio, avance, extraordinarias y finalización de obra.
- Implementar y ejecutar los mecanismos y canales de comunicación con el fin de realizar la convocatoria a la comunidad, entes locales y diferentes actores institucionales y sociales, utilizando cartas, volantes y medios publicitarios establecidos.
- Realizar la atención brindada a la ciudadanía mediante el proceso de respuesta oportuna de todas las quejas, reclamos, solicitudes de información o sugerencias presentadas por la población residente del sector.
- Participar en los procesos comunitarios, mediante la promoción y construcción colectiva del grupo de participación ciudadana, por medio de encuentros pedagógicos de sostenibilidad.
- Verificar el proceso de vinculación de personal Mano de Obra No Calificada - MONC.

A continuación se describen las actividades realizadas por el área de gestión social de la firma contratista el cual permitió dar alcance al cumplimiento de los programas propuestos dentro del plan de Gestión Social.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El área de gestión social, realiza la correspondiente elaboración y ejecución al cumplimiento del PGS el cual es ejecutado por la firma contratista para el desarrollo de las actividades sociales antes, durante y posterior a la ejecución de obra objeto de intervención.

En cuanto a los programas inmersos en el plan de gestión social describo las siguientes actividades desarrolladas por el contratista,

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Mediante los programa de información y divulgación la firma contratista, mantuvo un proceso de comunicación asertiva con la comunidad lo que permitió transmitir información confiable y oportuna minimizando los impactos negativos y disminuyendo las falsas expectativas en cuanto al desarrollo de las obras.

Se llevó a cabo la ejecución de las reuniones de inicio, Avance, extraordinaria y finalización del contrato donde se trataron temas inherentes al desarrollo de la obra. La reunión de inicio (previo a iniciar ejecución de la obra), avance (al 50% de avance en la ejecución de la obra) y final (al 100% de ejecución de la obra).

2.1.1 Reunión inicio de obra

La reunión de inicio de obra tuvo como finalidad dar a conocer a la comunidad de manera clara y explícita las actividades a desarrollar en la continuidad de la obra del colegio Marsella. Esta se llevó a cabo el día 22 de febrero del presente año, en las instalaciones del mismo colegio. Se convocó y asistieron los representantes del colegio, la SED, Cadel, estudiantes, profesionales de interventoría, contratista y la comunidad en general. al terminar la reunión se realizó la conformación del grupo de participación ciudadana. *(Ver anexo 2: acta de reunión y registro de asistencia).*



Fotografía 1 Reunión de Socialización inicio de obra

2.1.2 Reunión avance de obra

La reunión de avance de obra y dando cumplimiento al 50% en su ejecución de acuerdo a los pliegos de licitación y lo establecido en el plan de gestión Social, se llevó a cabo el día 05 de junio de 2019. Sin embargo nuevamente se participa de la reunión general con los padres de familia y las directivas del colegio Marsella en día 04 de julio, con el fin de realizar la entrega parcial del bloque de aulas de primera infancia del colegio. Se convocó y asistieron los representantes del colegio, la SED, Cadel, estudiantes, profesionales del contratista y la comunidad en general. . *(Ver anexo 3. Acta de Reunión avance de obra y listado de asistencia).*



Fotografía 2 Reunión avance de obra 50%



Fotografía 3 Reunión de entrega de aulas primera infancia

2.1.3 Reunión Extraordinaria

Se realizó reunión con la supervisión social de la SED el día 06 de febrero de 2019, cuyo fin fue informar a las profesionales sociales tanto del contratista como a la interventoría los lineamientos sociales para la ejecución del contrato de obra.

Se realizó acompañamiento a la reunión extraordinaria programada por el colegio Marsella y el IDPAC, el día 04 de abril de 2019, cuyo fin fue informar sobre el proceso que se llevará a cabo para pintar el mural del colegio.



Fotografía 4 Reunión Extraordinaria Idpac

Se llevó a cabo reunión con la supervisión del contrato el día 04 de abril 23 de julio de 2019, cuyo fin fue informar las actividades pendientes para la culminación del contrato de obra *(Ver anexo 4: acta de reunión Extraordinaria y registro de asistencia)*.

2.1.4 Reunión de finalización

Para el presente contrato de obra se ejecutó la entrega de finalización de obra, el día 09 de agosto de 2019 quedando pendiente algunos detalles. *(Ver anexo 5: acta de reunión de finalización y registro de asistencia)*.





Fotografía 5. Reunión de entrega Zona Construida primera infancia

2.2 Subprograma de divulgación

El subprograma de divulgación se encuentra compuesto por las piezas informativas que describieron los aspectos específicos de las actividades sociales, técnicas y ambientales del proyecto y son muy representativas para la ejecución del contrato de obra, por tal motivo la firma contratista elaboró siguientes piezas informativas:

Objeto
Formato Actas de vecindad de inicio
Formato Volantes invitación a reunión
arte valla Fija aviso punto de atención
formato acta de reunión
Formato registro de asistencia
Formato registro de asistencia
Formatos Programa de atención al ciudadano - (Formato PQR)
Formato Programa conformación grupo de participación ciudadana.
Formato Programa generación de empleo

Por otro lado se realizó el correspondiente diligenciamiento de los formatos establecidos para tales fines como fueron: reuniones de inicio, avance, extraordinarias y finalización, Invitación a reuniones del grupo de participación ciudadana, levantamiento de actas de vecindad., consultas ciudadanas.

VOLANTES INFORMATIVOS	FECHA DE ELABORACION	VOLANTES APROBADOS Y DISTRIBUIDOS
-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Volante informativo
reunion inicio de obra

19 de febrero
de 2019




Invitación reunión 01
sostenibilidad

26 de marzo
de 2019



Invitación reunión 02
sostenibilidad

29 de abril de
2019



Invitación reunión Avance 31 de mayo de
De Obra 50% 2019



Invitación reunión
finalización de Obra
100%


05 de agosto
de 2019



(Ver anexo 6: Volantes diligenciados y entregados).

2.3 Vallas Informativa punto de atención

La firma contratista realizó la instalación de la valla informativa del Punto de atención al ciudadano (PAC), la cual fue retirada al momento de culminación de las actividades.



2.4 Levantamiento de actas de vecindad de inicio
3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (Atención de quejas y reclamos):

3.1.1 Instalación Punto de atención al Ciudadano- PAC

Este programa de la gestión social se fundamentó en brindar atención al ciudadano, recibiendo y dando solución oportuna a las inquietudes quejas, reclamos y solicitudes que presentó la comunidad en cuanto a la ejecución de las actividades constructivas del Contrato en todas sus áreas (Técnica, Social, Ambiental y Siso); con el fin de garantizar una atención personalizada, la firma contratista estableció el punto de atención al ciudadano el cual fue ubicado en el campamento donde se desarrolló la construcción, con un horario de atención los días lunes de 08:00 a.m. a 12:00m y miércoles de 02:00 p.m. a 04:30pm.; y con línea telefónica 3123468266 y correo electrónico aleadinu@gmail.com, lugar donde se recepcionó una solicitud de la comunidad por parte de la comunidad de manera verbal en cuanto al uso y manejo del espacio público, la profesional social dio respuesta oportuna a la solicitud de la comunidad quedando a paz y salvo por todo concepto. *(Ver anexo 8: Consulta ciudadana y respuesta)*

4. PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las actividades de sostenibilidad son entendidas tanto para el control social como para la conservación de la obra, en la medida en la que el ciudadano se identifique y entienda el concepto del proyecto y su entorno, la secuencia de las actividades de

obra y la responsabilidad que se debe tener con el nuevo espacio construido y/o rehabilitado.

Por ello la firma contratista desde el Área de gestión Social con apoyo de las áreas que conforman el proyecto y de acuerdo a cada caso se implementó la organización del grupo de participación ciudadana, el cual se conformó el día 22 de febrero durante la ejecución de la reunión de inicio, Representantes del colegio, estudiantes y líderes de la comunidad y/o ciudadanos residentes en el área de influencia directa, con el fin que se convirtieran en interlocutores formales entre la comunidad, el contratista y la interventoría.

El Área Social del contratista informó a la comunidad en temas relacionados en el avance y sostenibilidad de la obra.

Reunión grupo de participación ciudadana

Registro fotografico


Reunión 1:

26 de marzo de 2019



Reunión 2:

18 de abril de 2018

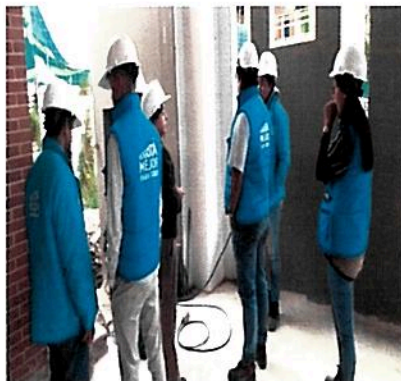

(Ver anexo 9: actas de reunión Grupo de participación ciudadana y registro de asistencia).

5. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Teniendo en cuenta que la generación de empleo es un impacto positivo importante dado que contribuye a la disminución de indicadores de desempleo en la zona de influencia directa de los proyectos, este programa buscó mejorar las condiciones de empleo de la población ubicada en el área de influencia de la obra ejecutada y estuvo orientada a establecer el procedimiento de contratación y selección del personal (Maestros, Oficiales de Obra y Ayudantes de Obra). *(Ver anexo 10: listado de personal de obra)*

La firma contratista cumplió con el 30% de personal vinculado residente del la localidad de Kennedy de acuerdo a los lineamientos establecidos en los pliegos de licitación.

El área social realizó el seguimiento a la contratación mes a mes de MONC.

MES	NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS	NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	% DE PERSONAL CONTRATADO
1	8	0	0%
2	29	6	20.6%
3	37	9	24.3%
4	20	6	30%
5	43	11	25.5%
6	20	6	30%

5.1 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Se hace entrega de los correspondientes documentos sociales y se realiza participación en el comité técnico llevados a cabo durante la ejecución del contrato de obra

CONCLUSIONES

La firma contratista dentro del área de gestión social cumplió satisfactoriamente con la labor informativa, comunicativa y participativa, se evidenció la participación activa de la comunidad, lo cual beneficio el desarrollo de las actividades constructivas del colegio Marsella.

De igual manera se obtuvo el acompañamiento de todas las áreas (técnica, administrativa, SST- Seguridad y salud en el Trabajo - y ambiental) del contratista para lo cual permitió garantizar de manera oportuna información de las actividades pactadas y desarrolladas dentro del plan de gestión social, dando respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad que se desarrollaron en un contexto social permitiendo mejorar la calidad de vida de la población en el área de influencia directa.

Mediante la construcción de obra en la ampliación de la Infraestructura educativa del Colegio Marsella - módulo de primera Infancia, ha mitigado las variables expuestas en el estudio de insuficiencia que viene construyendo la SED y actualizado permanentemente hasta la fecha, allí se expone las variables de mayor impacto para la localidad de Kennedy como son: Población no escolarizada e insuficiencia de establecimientos educativos en la localidad.

T.S: ALEXANDRA DIAZ NUVAN
RESIDENTE SOCIAL

Anexo 1:
Plan de gestión
social aprobado

	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA

CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227

OBJETO DEL CONTRATO:

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017.
 MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA
 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS,
 ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA
 DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

CONTRATISTA:

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

BOGOTÁ D.C
07 DE FEBRERO 2019

Elaboro: *Alexandra Diaz Navan*
Trabajadora Social

EDUCACIÓNBOGOTÁ
 Secretaría de Educación del Distrito



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
	PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	

PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA

CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227
CONTRATISTA:
 ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

OBJETO DEL CONTRATO:

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017.
 MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA
 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS,
 ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA
 DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Elaboro	Firma	Aprobó	Firma
T.S Alexandra Díaz Nuvan	<i>Alexandra Díaz</i> T.S.	T.S, Zairy Olaya	<i>Zairy Olaya</i> T.S. feb 2019

Elaboro: *Alexandra Díaz Nuvan*
Trabajadora Social

EDUCACIÓNBOGOTÁ
 Secretaría de Educación del Distrito



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
1 OBJETIVOS	5
1.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2 PRINCIPIOS.....	6
3 MARCO NORMATIVO.....	7
4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	9
4.1 METODOLOGÍA:.....	9
4.2 PROGRAMAS QUE COMPONEN EL PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA....	9
4.2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:	10
4.2.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	12
4.2.3 PROGRAMA CONFORMACIÓN GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14
4.2.4 PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	14
4.2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.	14
5. RECURSO HUMANO.....	15



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Formatos programa de información y divulgación
- Anexo 2. Formatos Programa de atención al ciudadano
- Anexo 3. Formato Programa de participación ciudadana
- Anexo 4. Formato Programa de generación de empleo



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

INTRODUCCION

El presente documento constituye el Plan de Gestión Social de Obra, en adelante PGS, el cual será implementado durante la ejecución del proyecto *“AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN”*.

El presente plan se enmarca dentro de los lineamientos establecidos por Secretaria Distrital de Educación y responde a las necesidades que se generan en torno a la ejecución de obras las de construcción establecidas para este contrato, el cual hace parte constitutiva del proceso de planeación y ejecución de los procesos de las obras de ampliación en las estructuras de los colegios de primera infancia los cuales aportan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad ubicada en la zona de influencia directa.

En materia de Gestión Social, a través de la ejecución del presente plan, están contenidas las actividades diseñadas para mitigar los impactos generados por la intervención de las obras y definir estrategias de tal manera que a través de ellas se logre el contacto permanente con los ciudadanos que se encuentran dentro del área de influencia directa, se busca alcanzar los más altos beneficios para la comunidad, en términos de seguridad, y por supuesto el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por parte del ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO, alineando aspectos de una ejecución de alta calidad, con las expectativas de la comunidad en general y las expectativas de la administración distrital.

En este orden de ideas, este documento expone los objetivos de cada uno de los programas de gestión social y muestra de manera concreta las actividades que se realizarán.



 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Bogotá, Colombia</small>	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los programas y actividades que desarrollará el contratista, bajo el contrato N° C01-PCCNTR630227, donde se pretende minimizar los impactos sociales que se generan con la realización del proyecto, fortaleciendo la comunicación entre los actores que inciden en el territorio, es decir, el acercamiento entre la ciudadanía, las instituciones (Entidad contratante), el contratista e interventoría, en un esquema de corresponsabilidad que pretende fortalecer las acciones frente a la generación de espacios de participación en las actividades que se llevarán a través de la ejecución del contrato.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar información clara, oportuna y confiable acerca del alcance del contrato a la población del área de influencia, a las autoridades locales, organizaciones sociales y demás población que sea influida por el proyecto.
- Definir los mecanismos y espacios para la gestión comunitaria e interinstitucional con ocasión de la ejecución del proyecto
- Crear canales de comunicación entre la comunidad en general, el Contratista, la interventoría y los diferentes actores institucionales y sociales que participen de forma directa o indirecta al contrato de obra, generando un ambiente adecuado para el buen desarrollo de la obra.
- Garantizar la atención a la comunidad de la apertura y cierre de las consultas ciudadanas presentadas de manera adecuada y oportuna.
- Generar la vinculación de la mano de obra no calificada como una oportunidad para la generación de ingresos, aportando desde ahí a la reducción de necesidades básicas.
- Involucrar a la comunidad en procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.
- Fomentar en la comunidad beneficiaria de la ejecución del proyecto la apropiación del espacio de tal forma, que se busque generar conciencia del beneficio de las obras.



 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.</small> <small>TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN</small>	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
--	---	--

2 PRINCIPIOS

- **Participación ciudadana:** La comunidad del área de influencia, será conocedora del proceso de ejecución del contrato.
- **Corresponsabilidad:** Entre los actores que intervienen en la obra comunidad, contratistas, administración local e interventoría.
- **Transparencia:** Este será uno de los principios transversales al proceso de ejecución del proyecto, el cual se materializará a través del proceso de comunicación directa y bilateral con la población.
- **Equidad:** En la compensación de los impactos generados a partir del desarrollo de las actividades que comprende la obra.
- **Cumplimiento de las disposiciones legales:** La normatividad será otro de los principios transversales a la ejecución del contrato, garantizando no solo el cumplimiento a cabalidad del desarrollo de la obra, sino la seguridad de las personas que trabajen en la obra.



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

3 MARCO NORMATIVO

La base fundamental en todo proceso de participación ciudadana en cuanto a la gestión de políticas públicas las cuales deben partir del principio de conocer la normatividad y su adecuada implementación.

- Constitución Política de Colombia, Artículos 20, 23, 79, 88, 103, 311, 318, 329, 334, 365, 366, 369, 370
- Ley 142 de 1994.
- Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana artículo 1, 100, 105.
- Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, artículo 1, 5, c. II – 37, 43, 56, 64.
- Decreto 1660 de 2003: Accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.
- Ley 140 de 1994, por el cual se reglamenta la Publicidad exterior Visual en el territorio nacional, artículo 1.
- Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo ley de Planeación Participativa.
- Ley 190 de 1995, Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la ley 190 de 1995.
- Ley 850 de 2003: Se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Ley 1474 de 2011, Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011. Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994.
- *Decreto 190 de 2004*, este compila las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.
- Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento.
- Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y de Grupos
- Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá D.C.
- Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela.



- Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa
- Decreto 3286 de 200, por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.
- Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Conpes Social 91 de 2005, metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio – 2015.
- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifica otras disposiciones.
- Decreto 3571 de 2011, por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Plan Nacional de Prosperidad Social
- El Decreto 2246 de 2013, en el Artículo 14 numerales 1, 2, 3, 4, 7, 19, 24 y 26.

	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social en obras, es un programa de planificación que busca garantizar la participación activa de la comunidad a través de estrategias de comunicaciones claras, precisas y oportunas con relación a la ejecución del contrato de obra N° C01-PCCNTR630227, que se desarrollara en la localidad de Kennedy, buscando mitigar los impactos desfavorables para la comunidad a través de la implementación de acciones que le permitan a la ciudadanía llevar a cabo su cotidianidad simultáneamente con el desarrollo de las intervenciones generando en lo posible y mientras las actividades de obra lo permitan la menor afectación e impacto con cada uno de los residentes.

De la misma manera se promoverá el empoderamiento, la apropiación y el cuidado de las obras realizadas, recordando la importancia de evitar realizar acciones que vayan en contra del adecuado uso del servicio de educación para la primera infancia.

4.1 METODOLOGÍA:

En el marco de referencia este plan contiene como base general los programas en materia de gestión social y con base en la política de responsabilidad social de la Secretaria Distrital de Educación, para una adecuada formulación y ejecución de las políticas públicas.

De esta manera el Plan de Gestión Social propone cinco programas que hacen parte integral del mismo, siendo las siguientes: 1. Programa de información y divulgación 2. Programa de atención al ciudadano. 3. Programa de participación ciudadana 4. Programa de generación de empleo. 5. Programa de sostenibilidad

4.2 PROGRAMAS QUE COMPONEN EL PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA

Los programas que hacen parte del plan de gestión social se enuncian a continuación y su aplicación obedece a las condiciones de los sectores y los impactos sociales potenciales que se pueden generar a partir de la realización de la obra “Ampliación de la estructura del colegio Marsella cpf-80017. Mediante la ejecución de obras del módulo de primera infancia ubicado en la localidad de Kennedy y de acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades de obra entregados por la secretaria distrital de educación”.



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

4.2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Para el cumplimiento del programa de información se llevará a cabo la elaboración de volantes y cartas que serán entregadas para la ejecución de las reuniones con la comunidad ubicada en la zona de influencia directa de la obra que enmarca el contrato, buscando transmitir información pertinente y veraz sobre el desarrollo de la misma.

Los espacios de reunión que se organizan, tienen como finalidad mantener informada a la comunidad sobre los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto durante el tiempo de ejecución de la obra, de igual manera atender a las inquietudes de la ciudadanía, implementando mecanismos participativos entre los actores sociales.

Para la ejecución de las actividades de este programa se llevará a cabo las siguientes reuniones de acuerdo a los pliegos contractuales:

La firma contratista preparará para cada una de las reuniones durante cada una de las etapas en la cual se encuentre (inicio, avance o finalización), el material audiovisual que será proyectado y que contendrá la información general del proyecto; antes del desarrollo de las reuniones las cuales deben estar previamente aprobadas por la interventoría; adicionalmente, durante las reuniones se distribuirán las piezas de divulgación a que haya lugar.

Reuniones inicio de obra:

Estas reuniones se llevarán a cabo al 10% de avance de obra, mediante convocatoria previa a través de piezas de divulgación (volantes) distribuidas estratégicamente en el área directa de la obra y/o mediante la comunicación directa con los líderes comunitarios, residentes del sector e instituciones y demás actores que tengan relación directa con el desarrollo del contrato.

Reuniones avance de obra:

Los espacios de reunión que se organizan al 50% de avance de obra, básicamente tienen como finalidad mantener informada a la comunidad sobre los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto durante el tiempo de ejecución de las obras, de igual manera atender a las inquietudes de la ciudadanía, implementar mecanismos participativos y brindar una atención oportuna a quien lo requiera.

Reuniones de Finalización de obra:

Para el desarrollo del presente contrato y teniendo en cuenta el área de influencia directa se realizará la entrega de las obras ejecutadas al 95% de la ejecución de la obra, mediante acta de finalización y entrega con los actores directamente involucrados en la ejecución del proyecto.

Reuniones extraordinarias de obra:

Este tipo de reuniones se lleva a cabo cuando se presenta una situación repentina que afecta a la comunidad y la cual es inherente al desarrollo de la obra. Por tanto esta solicitud se debe realizar mediante alguno de los actores que participan directamente en el contrato, la cual se realizará previamente

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.</small> <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</small>	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

Las convocatorias se realizarán mediante comunicación escrita a la población objetivo. En la convocatoria se hará especial énfasis en la importancia de propiciar la participación de los ciudadanos/nas, interventoría con la finalidad de generar claridad frente a la comunidad desde todas las instancias posibles.

Las actividades se desarrollarán en espacios cercanos a la zona de influencia directa de la obra, en busca de obtener respuestas positivas al proceso de convocatoria que se realicen para promover la participación de la ciudadanía, se tendrá en cuenta los siguientes momentos:

- Primera reunión: avance del 10% de la obra
- Segunda reunión: Avance del 50% de la obra.
- Tercera reunión: Al cumplir el 95% de la obra.
- Reunión de comité de participación ciudadana.

Con el fin de continuar ejecutando el programa de divulgación se llevara a cabo el diseño y publicación de piezas informativas con la información sobre la obra, con el fin de informar a la comunidad y esta pueda tener acceso a los puntos de atención y espacios de reunión referentes a la ejecución de la obra, dentro de las piezas que se contemplan se encuentran las siguientes:

1. **Valla Fija aviso punto de atención:** Contiene la información general del proyecto, horario de atención y números telefónicos.
2. **Acta de Vecindad de inicio:** Es el documento que se diligencia a través de un proceso de visita técnica y social a cada uno de los predios directamente afectados en los que se registra el estado total de la vivienda previo inicio de las obras.
3. **Acta de vecindad de cierre:** Documento que se diligencia una vez se finalizan las obras de construcción, con el fin de cerrar satisfactoriamente la verificación del estado de los predios
4. **Convocatorias:** Proceso que se realiza para informar a las personas sobre el desarrollo de las actividades programadas en el marco del Contrato.
5. **Información extraordinaria:** En este programa se deben considerar las actividades extraordinarias o adicionales que sea necesario realizar con el fin de implementar procesos o actividades adicionales y pertinentes con la comunidad en torno a la información y mecanismos de participación a implementar para dar solución o informar sobre las contingencias generadas por la obra.

Respecto de estos procesos, cabe resaltar que previo a la realización de las actividades, se llevará a cabo el respectivo trámite de revisión y aprobación por parte de la interventoría, se procederá con la sistematización de la información y a la documentación de las actividades de gestión social, se procederá a levantar registros de asistencia a la reunión, registro fotográfico y acta para lo cual se utilizarán los formatos aprobados por la interventoría.

Elaboro: *Alexandra Díaz Navas*
Trabajadora Social

EDUCACIÓNBOGOTÁ
 Secretaría de Educación del Distrito



 	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

Ver anexo 1: Formatos programa de información y divulgación a la comunidad

(Volante invitación a reunión, arte valla Fija aviso punto de atención, Acta de vecindad inicio y cierre, formato acta de reunión, registro de asistencia, formato soporte de entrega de volantes)

4.2.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La implementación de este programa se realiza, con el fin de mantener un canal de información con acceso permanente con los ciudadanos el cual quedará ubicado cerca o en el campamento de la obra. En el marco de este programa se realiza la implementación del Punto de atención al Ciudadano PAC.

PUNTO ATENCIÓN CIUDADANO- PAC

Este se constituye en el punto cercano a las obras de construcción al cual puede acercarse la persona que necesite solicitar información, manifestar quejas o inconformidades sobre la ejecución del contrato y de esta manera el contratista implementar las acciones necesarias y pertinentes para prevenir, mitigar o resolver los impactos.

Se implementan diversos mecanismos –físicos y virtuales- a través de los cuales se llevará a cabo la recepción de la información, así como la implementación del buzón de sugerencias para la obra.

Para su ubicación y observación en la parte exterior cuenta con un pendón de identificación, para la fácil identificación del mismo, por parte de los residentes y transeúntes del sector.

El punto de atención al ciudadano estará ubicado el campamento donde se desarrolla la construcción, con un horario de atención los días lunes de 08:00 a.m. a 12:00m y miércoles de 02:00 p.m. a 04:30pm.; y con línea telefónica 3123468266, donde se atenderá las inquietudes de Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.; y correo electrónico aleadinu@gmail.com

DEFINICIONES APLICABLES

- **Queja:** Es la expresión de los ciudadanos que permite manifestar la inconformidad o disgusto que se tiene contra una persona de la entidad, por actos relacionados con el cumplimiento de su misión y objetivos. Las conductas irregulares cometidas por empleados de la entidad contratante, los contratistas, subcontratistas etc.



	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

- **Reclamo:** Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la atención inadecuada, omisión, amenaza o menoscabo por la ejecución de una obra.
- **Solicitudes de Información:** Toda persona tiene derecho a consultar los documentos o solicitar información relacionada con la ejecución del proyecto.
- **Sugerencias:** Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o se presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso, cuyo objeto se encuentre relacionado con el cumplimiento de una función pública.
- **Derecho de Petición:** Es el derecho que tiene todas las personas de hacer peticiones respetuosas en interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante particulares que cumplan alguna función pública, con el fin de que sean resueltas pronto y de forma efectiva.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El proyecto de atención al ciudadano se fundamenta en recibir y dar solución a todas las inquietudes quejas, reclamos y solicitudes que presente la comunidad que estén relacionadas con la ejecución de las actividades de obra en la etapa de pre construcción y construcción del proyecto.

Este proyecto es liderado por la residente social, con el apoyo del área técnica, gestionando las acciones necesarias que garanticen la atención oportuna a la comunidad.

CIERRE DE QUEJAS.

Se entiende por cerrada una queja, reclamo, inquietud, sugerencia, solicitud de información, derecho de petición u otra cuando se da por solucionado el asunto y quedan registradas en el formato de atención al ciudadano, las firmas correspondientes del Ciudadano y las Residentes Sociales tanto de Interventoría como del Contratista.

Ver anexo 2: Formatos Programa de atención al ciudadano - (Formato PQR)

	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
---	---	--

4.2.3 PROGRAMA CONFORMACIÓN GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conformado por personas de la comunidad que estén interesados en participar del comité de participación ciudadana, a través del cual se realizan actividades como:

1. Divulgación de la información del proyecto a la comunidad.
2. Participar de las reuniones que se programen mensualmente.
3. Identificar y transmitir las problemáticas manifestadas por la comunidad.
4. Promover activamente la sostenibilidad de la obra.

Ver anexo 3: Formato Programa conformación grupo de participación ciudadana.

4.2.4 PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO

Con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento económico de la localidad de Kennedy en un porcentaje del 30%, así mismo generar un aporte respecto a la generación de ingresos a la población menos favorecida, el contrato de obra pública procederá a contratar al personal de mano de obra no calificada, para lo cual se realizara la respectiva verificación solicitando anexar la hoja de vida y fotocopia de un servicio público con el fin de constatar su lugar de residencia.

Ver anexo 3: Formato Programa generación de empleo

4.2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.

Con el ánimo de consolidar y sistematizar las actividades de gestión social que se realicen como producto de la ejecución del presente contrato, se adelantarán informes en los cuales se evidencian el desarrollo de la gestión social en las obras

1. Plan de gestión social

Hace referencia al presente documento el cual contiene todos los lineamientos y aspectos relacionados con las actividades de la gestión social a ejecutar.

2. Informes mensuales

	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
	PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	

5. RECURSO HUMANO

En la tabla No. 1 se relaciona el personal requerido para el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Social de Obra.

PERSONA L	NO.	DEDICACIÓN	PERFIL
Residente social	1	40% Durante todo el contrato de obra	Profesional de trabajo social, con experiencia profesional no menor de tres (3) años y específicas de un (1) año en trabajo social en obras civiles.

Elaboro: *Alexandra Diaz Naranjo*
Trabajadora Social

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito



Anexo 1.

Formatos programa de información y divulgación

*(Volante invitación a reunión, arte valla Fija aviso punto de atención, Acta de
vecindad inicio y cierre, formato acta de reunión, registro de asistencia, formato
soporte de entrega de volantes)*

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
ACTA DE VICINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA

OBRA:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia:	Propietario	Arrendatario	Poseedor	Otro Cual?
Nombre del Propietario				
Ubicación				
Teléfono				
Long. del frente (mts)				
Matrícula inmobiliaria No.				
Cédula catastral				

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	SI	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO	
1. Monumento Nacional	5. En construcción
2. Valor Arquitectónico	6. Sin edificar
3. Valor intermedio	7. Otro
4. Valor normal	Cual?

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	5. Recreacional	Garaje	SI NO
2. Comercial	6. Baldo	Cuantos	
3. Industrial	7. Otro	El garaje se usa como	
4. Institucional	Cual?	comercio	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Útilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	
GRIETAS Y FISURAS:	
MUROS:	
HUMEDADES:	
CUBIERTA:	
HUNDIMIENTO PISO:	
PISOS:	
DESPLAZAMIENTOS:	
FACHADA:	
OTRO: Cual?	

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo	
Nombre:	
C. C. O NIT	

Representante del Contratista	
Nombre:	

Vo Bo. Representante de la Interventoria	
Nombre	

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

OBRA:

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

			OBRA:
	DD	MM	AA
	ACTA No.:		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

[illegible]

Firma Responsable Centro educativo

Nombre: _____

C.C. O NIT _____

Representante del Contratista
Nombre:

<p>Vo.Bo. Representante de la Interventoría</p> <p>Nombre</p>

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

**FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD**

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	MM
ACTA No.:	AA
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 3 de	
FECHA	
DD	MM
ACTA No.:	AA

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

FIRMAS

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

Representante del Contratista
Nombre: _____

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: _____
C.C. O NIT _____



EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

INVITA

LA AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Queremos que conozca las actividades que se realizarán con el fin de hacer realidad este proyecto, el cual beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C

Le invitamos a participar de la reunión de inicio

Fecha:

Hora:

Lugar:

ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA O LA DE UN REPRESENTANTE DE SU FAMILIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE AL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Dirección: Kra 69 N° 7-90

Teléfono cel.: 3123468266

Contacto: Alexandra Díaz

Correo Electrónico:

Días de atención: Lunes y Miércoles de 8:00 am a 2:00 pm

Interventoría:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Contacto:

CONTRATISTA:
ARN INCÉ EVER SALGADO SALGADO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

Punto de atención en obras

CONTRATO N°: C01-PCCNTR630277

CONTRATISTA: ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

TELEFONO: 3123468266

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

HORARIO DE ATENCIÓN:

LUNES DE 8 AM A 12M Y MIERCOLES DE 2:00 A 4:30PM

Profesional Social: Alexandra Díaz

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA PYJ

CORREO ELECTRÓNICO: socialcolegiomarsella@gmail.com

ASUNTO _____

Fecha:	Hoja:	De:
Dirección:		
Hora de iniciación:	Hora de finalización:	

DESARROLLO:



CONTINUACIÓN DESARROLLO:

[illegible]

Aprobado por:

Aprobado por:		
Nombre y Apellido	Entidad	Firma
Total participantes _____		





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SAIGADO

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Tipo de evento: _____
Nombre Profesional Social: _____

En Constancia de lo Anterior:

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p>	<p>CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227</p> <p>PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA</p>	<p>ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO</p>
--	--	--

Anexo 2.

Formatos Programa de atención al ciudadano

- (Formato PQR)



FORMATO ATENCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS (SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES)

QUEJA ☐ RECLAMO ☐ SUGERENCIA ☐ FELICITACIÓN ☐ Consulta N°

Fecha: Lugar:

Medio de recepción Escrita ☐ ☐ Telefónica ☐ Presencial ☐

Datos de consultante

Nombre	Dirección	Teléfono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descripción de la consulta

Por cuál medio de contacto desea recibir respuesta:

ESCRITO ☐ Correo Electrónico ☐ Telefónico ☐

Seguimiento a la solicitud – Si es consulta de seguimiento-

Acciones a seguir	Fecha cumplimiento	Nombre responsable y cargo del responsable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cierre de la consulta

Fecha: Hora:

Nombre ciudadano: Firma a satisfacción:

Nombre del Residente social: Firma:

Nombre del Interventor social: Firma:

N° del contrato: C01-PCCNTR630227

	CONTRATO DE OBRA No. C01-PCCNTR630227 PLAN DE GESTION SOCIAL DE OBRA	ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO
--	---	--

Anexo 3. Formato Programa de participación ciudadana





GESTIÓN SOCIAL

DIRECTORIO GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OBRAS

Contratista: _____

Teléfono _____

255

de 2019

Nombre Profesional Social: _____

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

Anexo 4. Formato Programa de generación de empleo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

GESTIÓN SOCIAL

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Nº de Contrato _____ Contratista: _____

Responsable de la información: _____ Teléfono _____
Informe correspondiente al mes de _____ de 2019

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social _____ Firma de la interventor (a)

Anexo 2:
Acta de reunión
inicio de obra y
registro de
asistencia.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO REUNION INICIO DE OBRA

Fecha: 22 de febrero - 2019	Hoja: De:
Dirección: Kra. 69 # 7-90	
Hora de iniciación: 2:15 pm	Hora de finalización: 4:30 pm

DESARROLLO:

Se inicia la reunión siendo las 2:15pm, con los asistentes invitados a la reunión. La firma contratista, a través de la trabajadora social, Alexandra Díaz, inicia la presentación dando a conocer el objeto contractual, beneficios, datos generales del contrato, Participantes. Se avanza de obra. Se realiza a través del Arq. Jonny Górces, quien informa las actividades técnicas desarrolladas a la fecha.

Posteriormente T.S. Alexandra Díaz manifiesta las actividades del componente social que se desarrollarán durante el proceso constructivo y a lo cual la firma contratista se encuentra obligada. De igual manera se informa sobre el punto de atención y su horario de atención. Se realizan las recomendaciones finales para la ejecución del contrato. Se da paso a la intervención de la comunidad asistente y se conforma el grupo de participación ciudadana.

El señor Paul Betancour, manifiesta que es importante realizar una reunión previa con el contratista que realizará las actividades constructivas en el parque que se encuentra alrededor al colegio Marsella, con el fin de realizar bien las conexiones del colegio y del parque.

El señor Nelson Velazquez, manifiesta que de igual manera se debe coordinar con la EAAB zona 3 y las entidades competentes para la ejecución de las obras complementarias (agua, luz, gas etc).

La T.S. María Elisa Rodríguez realiza intervención manifestando que es importante implementar las actividades concernientes al proceso de sostenibilidad de las obras ya que esto genera un mejor mantenimiento de las mismas.





CONTINUACIÓN DESARROLLO:

El Arq. Juan Pablo (QSEDO). informa el valor presupuestal del proyecto a ejecutar, de igual manera manifiesta que tanto la firma contratista como la interventoría se encuentran comprometidos para culminar cada una de las actividades del contrato.

La Señora Socorro (Colegio Marsella) manifiesta que si es posible adaptar los espacios para realizar el traslado de los niños que actualmente se encuentran en Hogaramiento. A lo cual se le da respuesta que en este momento No es posible atender dicha petición ya que actualmente todavía se encuentra en obra.

El señor Nelson manifiesta que entregará los datos del contratista del parque para realizar la reunión respectiva.

Se anexa lista de asistencia, presentación en power point y lista de conformación grupo de participación ciudadana.

Aprobado por: se anexa registro de firmas.

Nombre y Apellido	Entidad	Firma

Total participantes 38





BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 22-02-2019 N° de Contrato CO1-PCCNTL630227 Contratista: Arq. José Ever Salgado
Tipo de evento: (Alex) Reunión inicio de obra - Socialización
Nombre Profesional Social: Alexandra Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Michel Tibayosa	Cra 69 N° 2-10 Sur	3118901461	Michel
2	Xiomara Charry Gonzalez	Calle 6C #60A-48	3108725696	Xiomara
3	Alejandra Patiño Ospina		3135593400	Alejandra P.
4	Laura Camila Perilla	3	3234709231	Laura P.
5	Ana María Galvis Ramirez	Trans 69B #9D85		Ana M
6	Yvy Alejandra Rodriguez Rojas		3004678717	Yvy
7	Ricardo Alexis Qicata C.		3274634735	Ricardo
8	Don David Pizarro Alfaro	Cra 69 F- N° 1-58	3013884446	Don David
9	Balduino Castro Sneyder		3144234570	Balduino
10	Shon Alexander Medina		3133082261	Shon
11	Rodriguez Saavedra Emmanuel		3107031385	Emmanuel

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)




GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 22-03-2019 N° de Contrato COL-PCENTE 636727 Contratista: Arq. José Ever Salgado
Tipo de evento: Reconstrucción de obra - Socialización
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz
En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
12	Alejandro Saez	Csa 76 # 6636	305 2644752	
13	Jonathan PENA GUTIERREZ	Cll 78 # 30-53	4760304	
14	David Leiva	Cll 129 # 71660	350 5923345	
15	JOHAN ALEXANDER RAMIREZ	Csa 728 # 51-50	3232450094	
16	Juan Pablo Moreno Navarro	Cll 84 Bis A # 80-63	3203258552	
17	JAIME ALEXANDER SANCHEZ VIVIO	CRA 68 # 15 A 80	313409620	
18	JOSELEIDY TCHIANA GUTIERREZ	Cra 200 # 7-09	3214919049	
19	Laura Sofia Castiblanco	Cra 69 C # 2018	3014017588	
20	Nicole F Gonzalez Sanchez	Cll 9 # 64 B 22	31159413033	
21	Julianna Sofia Lopez TAVARA	Cra 69 # 0-27	3058741600	
22	Diana Gabriela Aron Delgado	K1 78K 39-59 sur	3123707752	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha (COI-PCN) N° de Contrato COI-PCNTR-630227 Contratista: Arg. José Ever Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra - Socialización
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
23	Juan Pablo Pimilla Ospina	Calle 34 Bis Sur #93-38	305 724 4207	Juan Pablo Pimilla
24	Daniel Rivas Romero		321 259 0854	Daniel Rivas
25	Raul A. Betancourt-	Calle 8 #69 A 3 C	313 384 9073	Raul A. Betancourt
26	Fredy Arnulfo Ortiz	Calle 9A #69-60	316 670 8788	Fredy Arnulfo
27	Juan David Pimilla Henao	Calle 5B #68b-61	310 803 1522	Juan David Pimilla
28	Diana Gonzalez		310 223 2890	Diana Gonzalez
29	Andrés Páez Cruz	Kenedy (Estad)	301 234 5310	Andrés Páez
30	NESOR JOSE GOMEZ SAUCIFZ	" "	313 417 8380	Nesor Jose Gomez
31	Juan Pablo Rubio Sguera.		320 209 8175.	Juan Pablo Rubio
32	Maria Eliza Rodriguez	SED	- 3147.	Maria Eliza Rodriguez
33	Jorge Castañeda Velásquez	Interventoría	312 587 1261	Jorge Castañeda

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

REGISTRO DE ASISTENCIA
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 22-02-2019 N° de Contrato 001-DECNTR630227 Contratista: Arg. José Ever Salgado Salgado
 Tipo de evento: Reunión Inicio - Socialización
 Nombre Profesional Social: Alexandro Diaz

En Constanca de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
34	Manuel Ezer Moreno	Cue 84 A 128 B - 64	3137745060	
35	Nelson Blanco	Cl 39 bis #68437-50v	3123672244	
36	Jandra Moreno	Calte 57A # 800 4150v	3114660231	
37	ZAIRY DAPA	Diag 156 #7104-46	3502674144	
38	Carimen Garcia Pinalte	Ka 680N-9c-51. P1803 T.2.	3158461191	

Vo.Bo. Interventoría Social 
 Firma de la Interventor (a) _____

Anexo 3:
Acta de Reunión
avance de obra y
listado de
asistencia.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO Reunión Avance de obra 50%

Fecha: 05-Junio-2019	Hoja: De:
Dirección:	
Hora de iniciación: 10:00 Am	Hora de finalización: 11:00 Am

DESARROLLO: Se inicia la reunión con la comunidad en general, donde se informa que se esperaba la asistencia de más personas ya que se enviaron 1000 invitaciones, sin embargo, se informa que el colegio a la fecha tiene un avance significativo y que por compromiso realizado al inicio del contrato este será entregado solo el área de aulas el día 20 de junio. Se hará la invitación al grupo de participación ciudadana con el fin de evidenciar la entrega y su estado.

El área técnica informa que a la fecha ya (c) la zona del aula tiene instalado toda la ventanería incluyendo los vidrios, los techos ya están terminados con sus respectivas luminarias Baños de niños, niñas y profesores se encuentran con sus respectivos enchapes y juegos de Baños.

Se está construyendo los cajas de inspección y realizando las conexiones para el pesquero correspondiente. Pisos ya están instalados.

En cuanto a la zona de cocina, aún falta la instalación de ventanas y todo el juego de cocina. Se tiene pendiente la instalación de gas natural.

En cuanto a la construcción del tanque se está implementando los diseños que todo nuevamente realmar ya, que estos no fueron viables. Se iniciará durante el transcurso del mes la correspondiente elaboración cumpliendo con las normas establecidas.

Queda como compromiso realizar la entrega parcial de la zona de aulas para el día 20 de junio.

De igual manera se solicita a la comunidad asistente el cuidado y buen uso de las





BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

instalaciones del colegio, teniendo en cuenta que este es para el uso de los niños, niñas y sus familias.

El Señor Nelson Velozquez informa sobre la ejecución del parque alrededor al colegio el cual será entregado en su totalidad en el mes de noviembre.

Se como Manifiesta que es importante la entrega parcial del colegio ya que al momento de ingresar los niños de vacaciones serán ubicados en el espacio entregado por el contratista.

Se da cierre a la reunión siendo los 11:00 am.

Se anexa listado de asistencia en 2 folios.

Aprobado por:

Nombre y Apellido	Entidad	Firma
Total participantes 42		





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 65-06-2019 N° de Contrato 001-REC-INT-630227 Contratista: Arq. Cuesabé Salgado
Tipo de evento: Revisión Avance de obra
Nombre Profesional Social: Alexandro Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Constanza Fernández R.	Cra. 60 # 3-55	3162658790	Cafueta
2	Rosa Helena Hidalgo Rodriguez	Calle 90 690 80	3102616580	Rosa Hidalgo
3	Jenny Lopez	CRA 69 # 133	3133728943	Jenny Lopez
4	Diana Marcela Cortes	cra 69 # 1-33	3143767881	Diana Cortes
5	Rosa Patricia Reyes L.	cil 4 # 630225	4137081	Rosa Reyes
6	STEFANY AULA ORRICO	CIL-2468FO4	3195850451	deans Aula
7	Maria Amalia Lopez Jancbee	cil 8315 # 70-49	3103043224	Fernanda Silva
8	Sandra Florin	Cra 77 # 70-25	3214914408	Sandra Florin
9	Jolanda Cortes Castro	Cra 69 # 7-73 Int I	310291703	Jolanda Cortes
10	Raquel Sanchez	Cra 68 D 2-58	3184180644	Raquel
11	Argenis Bolivar	call 2 # 68D 11	3017333133	Argenis
12	Nidia Palencia H.	Calle 8A # 69346	3211117892	Nidia Palencia

Vo.Bo. Interventoría Social

[Firma]

Firma de la interventor (a)

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSE SALACABO SALCABO

AGRADECIMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
 LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 05.06.2019 N° de Contrato Contratista: Arg. Eversse Solgado
 Tipo de evento: Reunión de Avance. CPI Mavserca.
 Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constanancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
13	Viviana Patricia Crespo Ruiz	Cll 104 sur 68f 04	3112720390	Viviana Crespo R.
14	Juan Javier Torres Piñeros	Cll 68 n 315 # 1-50	3202476561	Juan Torres
15	IVON HEUDE	Cll 1168 B 43	3124857490	IVON HEUDE
16	Jessica Miranda.	Cll 1 # 69-12	3213786073	Jessica Miranda
17	Ciro Tovar Herrera	Csa 68 B. 0-52	3114976056	Ciro Tovar
18	Carlos Enrique Saba	Cia 69 B. 31-89 su	3194284587	Carlos Enrique Saba
19	Carolina Angos Jimenez	Calle 54 # 99-02	3204180000	Carolina Angos Jimenez
20	Heather Fluvio S	Calle 69 # 12 A-42	3195711283	Heather Fluvio S
21	Carmen Julia Bagueiro	Calle 78 # 61 C 12	3118653401	Carmen Julia Bagueiro
22	Jhm Solis Cortes	D.L.E. Kennedy	3012345310	Jhm Solis Cortes
23	Maria Elisa Rodriguez	SEO. DCAE	3147 / 3241000	Maria Elisa Rodriguez
24	Zaivy Olaveri	INTERVENCIÓN	3202674144	Zaivy Olaveri

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)

[Firma]



GESTIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 05-06-2019 N° de Contrato 001-PCCNTR630227 Contratista: ATC Tever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Avance de obra
Nombre Profesional Social: Alexandro Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
25	Diana Maritza Herrera Segura	CU 2A # 68 F 67	3196940750	
26	Glady's Esther Salgado D.	c112 # 68 P 20	3192838060	
27	Yolanda Sotelo Rodríguez	CIA DIA 15 A 29	3014662560	
28	Carolina Gabriela Ospina	Calle 6B # 30-48	3105384174	
29	José del Carmen Meza	Km 70B # 66-21	3172295000	
30	Shirley Goyan	Calle 9 EB + 68 S 19	3052209446	
31	María / Saldarriaga Ochoa	C 68 # 48-18	322-788-3776	
32	Monica Zolaque Núñez	Tc 71B # 7C-74	3172380124	
33	Angelica Sotelo	C 12 # 13B S 11D 3103184441		
34	Cristian Camilo Reyes Huelga	C 119D # 64D-8C	3133500399	
35	Kaisa Plazas Rulfo	C 1101D # 61D-81	3222518717	
36	Cristian Camilo Simancas	INTERVENCIÓN DIA-	3138840190	

Vo.Bo. Interventoría Social



Firma de la interventor (a)

AGRADECIMOS SU COLABORACION PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 05-06-2019 N° de Contrato _____
Contratista: Ara. Ever José Solgado

Tipo de evento: Reunión Once de Obispos
Nombre Profesional Social: Alexandro Oros

En Constanza de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	firma
37	Conrado Nustos Gutierrez		305 8185981	
38	Paul. A. Betancourt CH		313 3849073	
39	Rolsom Velasquez Camacho		316 3996964	
40	Alexandra Diaz	Profesora Social (ortografía)	322901345	
41	Gerardo López Izquierdo	As. Huelmo 1 E D	313 2266072	
42	Johnny Gavez	Hog. Residencial (contables)	313 3745060	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO Reunión Entrega parcial (aulas) a padres de familia

Fecha: 04 - 07 - 2019	Hoja: De:
Dirección:	
Hora de iniciación: 7:00am	Hora de finalización: 8:30am

DESARROLLO: Se inicia la reunión con los padres de familia de los estudiantes (niños y niñas) de primera infancia. La Señora Socorro (Rectora del colegio Marsella) da la bienvenida y explica a los padres que los estudiantes iniciarán actividades hasta el día miércoles 10 de julio, ya que a la fecha las instalaciones del colegio que fueron entregadas por el contratista aún falta culminar algunas actividades técnicas, ya que el compromiso de entrega fue incumplido. Este se realizó el día 03 de julio de 2019, teniendo en cuenta que los detalles se están subsanando.

La T.S. Alexandra Díaz, informa a la comunidad que el bloque de aulas se hace entrega como compromiso del contratista con el colegio, la fecha estimado fue el 20 de junio, fecha que no se cumple ya que aún faltan detalles técnicos que son pocos pero son demorados, por tal motivo se realizó la entrega hasta el día 03 de julio en horas de la noche sin embargo se recomienda a los padres hablar con los niños y niñas del cuidado y buen uso de los espacios, especialmente en las zonas de las barandas.

Aun falta la instalación del ascensor ya que el proveedor no ha echo la entrega, en el momento de la entrega se iniciará la instalación.

- En cuanto a los remates faltantes se realizarán antes de culminar las actividades generales y la culminación del contrato, el cual será el día 08 de agosto.
- El contratista continúa realizando las actividades de construcción del tanque y la cocina.

Socorro manifiesta que es importante mantener las instalaciones del Colegio en buen estado ya que los arreglos locativos a partir de la fecha son responsabilidad del colegio.





BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

CONTINUACIÓN DESARROLLO:

Se realiza la invitación a los padres a realizar el recorrido por las instalaciones del colegio realizar la firma de asistencia y actualización de datos por parte del colegio con el fin de culminar la reunión.

Se anexa listado de asistencia





BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 04-07-2019 N° de Contrato 001-PON-17-630227 Contratista: José Ever Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión Entrega Parcial Sede Aulas J.M
Nombre Profesional Social: Alexander Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Nayib Mercedes Salgado		3007337437	Nayib Mercedes Salgado
2	Vigilante Rodriguez Gonzalez	Calle 86 # 80 c 28	3115437205	
3	Esperanza Toranzo	Carretera 71 # 5A55	3126485659	Esperanza Toranzo
4	Yennifer Valtz	calle 7A # 69 c-10	3114536241	Yennifer Valtz
5	Juan Luis Pineda	Km 68 D-2-58	318441806	Juan Luis Pineda
6	ALEX POLO	C1126 # 69 c 20	3219775576	ALEX POLO
7	Ana Maria Alvarez Zapata	TRV 78 HW: 41667	3072059152	Ana Maria Alvarez Zapata
8	Noval Fwaid Vargas	OR 71 F # 12 B-51	3173802012	Noval Fwaid Vargas
9	VICTORIA OSORIO	CL 12A # 71B-61 m105-103	3142512341	VICTORIA OSORIO
10	Janny Lopez	CRA 69 # 1-33	3133718943	Janny Lopez
11				

Vo.Bo. Interventoría Social

[Signature]

Firma de la interventor (a)



MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCACION

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

AGRADECIMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Tipo de evento: _____

Nombre Profesional Social: _____

En Constanca de lo Anterior:

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA VAPOR
DE BÚZON

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 04-07-2019 N° de Contrato COI-PCNTR630227 Contratista: Fuer José Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión Entrega parcial Sede Aulas J.M
Nombre Profesional Social: Alexandra Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
11	Angelo Flores Salazar	Cra 80ª + 8ª B	3125937761	
12	Francis Joroso	Calle 25 #69449	3132475706	
13	Diana Cortés	Cra 69 # 1-33	3143757881	
14	VICTORIA OSCAR	Cll 12A #71B-61 int 5-103	3142512341	
15	Leidy Diaz Caballero	Cra 68 d 00 68	3143447449	
16	Rina Izabel Moreno	Cll 9C #69096	3203416921	
17	Evangeline Bastianeda	Calle 7a #69-19	3102215719	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)



GESTIÓN SOCIAL

SPECIAL ADVERTISING SECTION

AGRADECIMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Tipo de evento: _____
Nombre Profesional Social: _____

En Constanca de lo Anterior:

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



MEJOR
PARA TODOS

ALTERNATIVAS
DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 04-07-2019 N° de Contrato COI-PCNTR-630227 Contratista: Ever José Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión Entrega Parcial Sede Aulas J.M.
Nombre Profesional Social: Alexandro Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
18	Reunión foros	colle 12 B 71-260	4870920	
19	Manuel Hernández	Cm 7UBBIS #12-30	3132623589	
20	Edier Campos	Cm 61D #2B-21P1	3006401761	
21	Sandra Milena Rivera R.	Cm 68G N°9C-51A ^{INT3} 904	3107953037	
22	Rubén David Gómez Ochoa	Cm 68D U.5 U.2ª-50	3138352153	
23	José Felipe Varela	Cm 8A #69B-36	3008061117	
24	Miguel Ángel Espinosa	colle 5 #68B.61	394786345	
25	María Ramos	Cm 69 #2A-42	3195711288	
26	Moisés Montenegro	Cm 8 N°69A-52	3204755743	
27	Kelly Guzmán Carrillo	Cm 94A #6-40	3106058925	
28	Carolina Cabeza Ochoa	colle 63 #20-42	320492228	
29	Fernando Cordero (H)	Cm 62 603-55	3015238299	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECIMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
 LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 24-07-2019 N° de Contrato 601-PECENT2630227 Contratista: Fuer José Salgado Salgado
 Tipo de evento: Reunión Entrega Parcela Sede Aulas J. M.
 Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz
 En Consecuencia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
30	Carolina Cordero	Calle 20 - 60	3108629301	Carolina Cordero
31	Maria Paulina Rodriguez	Cera 698 N 2866	3123803039	Maria P. R.
32	José Germán	Cra 20 N 42-40	3065413336	J. G.
33	Lucas Valencia	Calle 84 N 69846	32111478912	Lucas Valencia
34	Felipe P. P. C.	Cera 65 N Calle 55	3133823802	Felipe P. P. C.
35	Jaime Molina Burbano	Calle # 70 - 05	3041747458	J. M. B.
36	Wendy Mercedes Cordero		3009337437	Wendy Mercedes Cordero
37	Fabrizio Pini en Ta	Calle. 8 # 706-08	3188677162	Fabrizio Pini en Ta
38	Sharon Moreno	Calle 31a Sur # 69 A 91	3197061245	Sharon Moreno
39	Andrés Gomec	Cra 81A N 130-56	3196194636	Andrés Gomec
40	Aliciana Carolina Chacundo	Cra 11A B15 # 5 A 93	3502516827	Aliciana Carolina Chacundo
41	Novel David Vargas	Cra 21F # 12B-51	3173802817	Novel David Vargas

Vo.Bo. Interventoria Social Yanuel
 Firma de la interventor (a)



MEJOR
PARA TODOS

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 04-07-2019 N° de Contrato COI-PQNTZ630227 Contratista: Ever Jose Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión de trabajo para la sede PUCAS
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
42	Oslando Ryo	Tv-682-#192	3132365608	
43	Yeimi Alvarez Belardo	CR 82A UGB-74	3108080182	
44	Sandra Rincón	CRS 930680	3209954946	
45	Yohana Povedo Rincón	Call 6A#88-20	3162232101	
46	Lida Alvarez L.	Cl. 9A # 67-59	3123353744	
47	Patricia Dorado	Call 8A #69A49	3132475706	
48	Rafael Antonio Silva	K69B 7A30	3114616996	
49	Megaly Chales B	A69C # 2A-41	3213070790	
50	Diana Maritza Herrera	Call 2A #68F67A203	3196940758	
51	Carmen Julia Baguero	Cl 7B #69C12	3118683401	
52	Amyra Perez M	ClA 702-7316	3118122493	
53	Ruthvany Cuzul	KRA 69 F2-37	3195602422	

Vo.Bo. Interventoría Social



Firma de la interventor (a)

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECIMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 04-07-2019 N° de Contrato 001-PACNTE63022 Contratista: Ezer Jose Salgado Salgado
Tipo de evento: 2° ronda entrega parcial sede Aulas
Nombre Profesional Social: Alexsandro Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
54	Alieska Escalona	Calle 12e #71e-60	3142948092	
55	Martha Patricia Romero Alfonso	Cle 12e N° 71c-60	3016363626	
56	Mia Fernanda Gueraa Jaraquillo	Trans. 6964 90-85	3165243604	
57	Francy Pilar Buitrago	Calle 9 #70-56	3104837573	
58	Bibiana Marcela Ospina P.	Calle 12A #71B-61	3144592197	
59	Marcelyn lyces	Calle 82A N° 68B	3197273708	
60	don Guillermo Jorner	Calle 12A #71b-60	3209541168	
61	Ana Alexandra Celis	Calle 5c #71A-68	30032114869	
62	Abraham Jaramillo	Calle 2B #69C07	3132799946	
63	Genia Viviana Patiño	Cle 12A 71B-60	3202651051	
64	Jeselin Osorio Cano	Calle 2H 69-70	3142871953	
05	Estelita Cortés R.	Calle 7B #12B-40	3103024582	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)



Anexo 4:
Acta de reunión
Extraordinaria y
registro de
asistencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNION

Área de Gestión Social

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Código	Fecha	23.07.19	Inicio	3:30	Fin	Lugar	SED. DCC EE.	
Proyecto	Asunto					Reunión. Prof Soc. Contratistas.		
Asistentes SED	Asistentes Externos							
Fecha de Elaboración	23.07.19	Elaborado por			Mg. Eliza Rodríguez			Próxima Reunión

✓ A la fecha el proyecto con Reunión del 50%

✓ " " No tenemos reuniones de comité de participación pendientes.

Pendientes Acciones.

✓ Cierre de Actas de vecindad: 15 $\frac{\text{colegio} - 13}{\text{vias} = 1}$ área externa parque. (1)

15 Actas.

✓ P.G.S. -> OK.

✓ Reunión de finalización. 90%

✓ Manual de sostenibilidad -> socialización.

✓ Informe N° 6.

✓ Informe Final.

-> El supervisor Juan Pablo Rubio sugiere: en espera de contratar nueva profesional social.

-> Enviar correo a interventoría para requerimiento profesional Social? conomplacionespyj@gmail.com.

-> Se acuerda que para el cierre de las actas de vecindad social se anexará información en cuadro, propuesto por contratista prof. Obra, en la misma acta de inicio de obra.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		FORMATO			
		Título: Lista de Asistencia			
Tema de la Reunión:		Dirección de Construcciones		Fecha:	23.07.19
Área Responsable:		Proceso:		Lugar:	SED. DCEE
Funcionario Responsable:		Hora:		3:30 pm.	

NO.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELEFONO/EXTENSION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mario Elisa Rodriguez	Prof soc.	DCEE	3147	mrodriguezr@educacion.gob.ec	Mario Rodriguez
2	Alexander Diaz	prof soc.	Obsequio	3229013543	aleandine@gmail.com	Alexander Diaz
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Anexo 5:
Acta de reunión de
finalización y
registro de
asistencia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO Reunión Finalización entrega de obra

Fecha:

Hoja:

De:

Dirección: Kra 69 # 7-90

Hora de iniciación: 2:00 pm

Hora de finalización: 4:00 pm

DESARROLLO: El día de hoy nos reunimos con los representantes del colegio Marsella, representantes del grupo de participación ciudadana, Supervisora Social de la SED, interventoria y contratista con el fin de hacer entrega de las instalaciones del aula de clases y comedor que fueron construidos bajo el contrato de obra N° 001-PCCNTR630227.

La residente Social Alexandra Díaz, informa a la comunidad que desde el área técnica faltan por culminar algunos detalles, los cuales serán finalizados en la siguiente semana, de igual manera agradece a las directivas por la colaboración que se obtuvo durante su ejecución. Por otro lado informa que a partir del momento de la entrega de obra, será el colegio y la SED los encargados de los arreglos a que den lugar, teniendo en cuenta que hay pólizas de garantía que se encuentran activas.

El área técnica de la firma contratista informa que los arreglos pendientes son:

1. Culminar la empujización de la zona verde.
2. Arreglo de las chapas que se desagastaron.
3. Instalación de puertas baños de niños y niñas zona del comedor.
4. Ajuste del ascensor.

Se realiza recorrido por las instalaciones con los padres que participaron, a quienes se les informa los arreglos pendientes.

Los padres y personas que participan agradecen la culminación de las actividades.

Se anexa registro de asistencia.





MEJOR
VECES

GESTIÓN SOCIAL

AGRADECIMOS SU COLABORACION PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha: _____ N° de Contrato: _____ Contratista: _____

Tipo de evento: _____
Nombre Profesor al Social: _____

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
	María Elisa Rodríguez R.	Secretaría de Educación	3241000	Elis R.
	José Ignacio Gortán	Comunidad	3197227106	J. Gortán
	Raul A. Betancourt CH	Colle 8 f 67 A 36	3133849073	R. Betancourt
	Diana Patricia Díaz García	Conty o Pater	3155245404	D. Díaz
	Camilo Adolfo Herrerera Bernal	Consejo de Padres	310 868 7538	C. Herrerera
	Diana Haniel Yepes	Comunidad	3107857087	Diana Yepes
	Estrella Manco	J.M. 502 Representante del curso	3219881940	Estrella Manco
	Nelson Blanco	Carta traza Representante		
	Andrea Valera Cruz	Dirección local de Educación	3012345350	A. Valera
	Néstor Gómez	Dirección local de Educación	3012345350	N. Gómez
	Adrian Davis	Curriculum 685 BIS # 31A-24	30118307	A. Davis
	Paola Andrea Rico Ospina	Curriculum 685 BIS # 31A-24 Acudiente	3045203659	P. Rico

No. Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

Anexo 6:
Volantes
diligenciados y
entregados.



EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

I.E.D. MARSELLA Y ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

OBJETO: "LA AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SDE"

Los queremos invitar a la entrega oficial del colegio Marsella, cuyo proyecto beneficiará a niños, niñas y las familias de la localidad de Kennedy. La reunión se llevara a cabo:

Fecha: Viernes 09 de agosto de 2019

Hora: 02:00 pm

Lugar: colegio Marsella (Kra 69 N° 7-90)

ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA O LA DE UN REPRESENTANTE DE SU

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

Bogotá D.C Septiembre 12 de 2019

Doctor
Ariel Tovar Gómez
Director Local
Localidad de Kennedy
Carrera 78 J con Calle 38 B Sur

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión de entrega de obra

Respetado señor:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de entrega obras del Colegio Marsella el cual fue ejecutado bajo el contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: lunes 16 de septiembre de 2019

Hora: 2:00 pm


Lugar: Colegio Distrital Marsella – (recorrido) Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUÑEZ
Profesional Social



CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

Bogotá D.C Septiembre 12 de 2019

Señor

Raúl A. Betancour
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Cll 8 # 69ª 36

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión de entrega de obra

Respetado señor:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de entrega obras del Colegio Marsella el cual fue ejecutado bajo el contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: lunes 16 de septiembre de 2019

Hora: 2:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (recorrido) Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

Bogotá D.C Septiembre 12 de 2019

Señor

Nelson Velázquez Camacho

Grupo de participación ciudadana

Colegio Marsella

Kra 69 # 8-28

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión de entrega de obra

Respetado señor:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de entrega obras del Colegio Marsella el cual fue ejecutado bajo el contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: lunes 16 de septiembre de 2019


Hora: 2:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (recorrido) Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUVAR
Profesional Social



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

LA AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Queremos que conozca las actividades que se están ejecutando con el fin de hacer realidad este proyecto. El cual beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C

Le invitamos a participar de la REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA

Fecha: 05 de junio de 2019

Hora: 10:00 am

Lugar: Colegio Marsella (Kra 69 N° 7-90)

ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA O LA DE UN REPRESENTANTE DE SU FAMILIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE AL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Dirección: Kra 69 N° 7-90

Teléfono cel.: 3123468266

Contacto: Alexandra Díaz

Correo Electrónico:

Días de atención: Lunes 8:30 am a 12:00 m y Miércoles de 2:30 a 4:30 pm

Interventoría:

CONSTRUCTORA PYJ

Correo Electrónico:

socialcolegiomarsella@gmail.com

CONTRATISTA:

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REGISTRÓ ENTREGA DE VOLANTES

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 31-Mayo-2019 N° de Contrato _____

Contratista: Arq. José Salgado Salgado

Tipo de evento: Reunión Avance de obra

Nombre Profesional Social: Alexandra Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
	Lina Ruz (se entregó 1000 volantes)	KR 69 7 90	420 23 99	
	Maña Camila Tujillo (code 2)	CPA 69# 7-73	232 99 37	Maña Tujillo
	Nelson Velazquez Camacho	Kra. 69# 8-28	316 39 76 69	clay Trespul
	Paul A. Betancourt C.	Call 8 169 A 36	313 38 49 07 3	Paul A. Betancourt
	Yenny Prieto	AV Americas 69.08	414 49 70	Yenny Prieto
	Adriana Cerandier	(169 DN15	314 26 76 86 9	Adriana Cerandier

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



 Radicado N° **E-2019-92681**
Fecha: 31/05/2019 15:50
Firma: [Firma] Anexos: 1
Radicador: YASMIN ANDREA CORTES
Destino: 2206-DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN KENNEDY
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación **SZ500**

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Mayo 31 de 2019

Doctor
Ariel Tovar Gómez
Director Local
Localidad de Kennedy
Carrera 78 J con Calle 38 B Sur

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión de avance de obra

Respetado señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión de avance de obra. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: Miércoles 05 de Junio de 2019

Hora; 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (recorrido) Kra 69 N° 7-90

Se solita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUÑEZ
Profesional Social



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señor:

Juan David Pinzón Aldana

Grupo de participación ciudadana

Colegio Marsella

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetada señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora: 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)

Kra 69 N° 7-90

Se solita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUVÁN
Profesional Social

*se deja en secretaría
del Colegio Marsella*

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señora
Socorro López Izquierdo
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Kra 69 # 7-90

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetada señora:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora; 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)

Kra 69 N° 7-90

Se solita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUÑEZ
Profesional Social

*Recibido
María Ruiz
29-4-2019.*



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señor
Fredis Arnulfo Cruz
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Cll 9ª # 69-60

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetado señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora; 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)
Kra 69 N° 7-90

Se solicita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente

Alexandra Díaz N. A.D.N.
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

se deja en buzón



MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señor
Raúl A. Betancour
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Cll 8 # 69ª 36

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetado señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora; 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)
Kra 69 N° 7-90

Se solicita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DÍAZ NUVAN
Profesional Social

Se deja bajo puerta

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señor
Nelson Velázquez Camacho
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Kra 69 # 8-28

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetado señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora: 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)
Kra 69 N° 7-90


Se solicita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUVAR
Profesional Social

J.A.C. BARRIO MARSELLA
RADICACIÓN CORRESPONDENCIA
Fecha: 02-05-19 Hora: 2:30 pm
No. Rad. _____
Firma: 

Doctor
Ariel Tovar Gómez
Director Local
Localidad de Kennedy
Carrera 78 J con Calle 38 B Sur

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN <u>8</u>
	CONTRATISTA: <u>E-2019-74791</u> Fecha Recibida: <u>9:16</u> Hora Recibida: <u>30 ABR 2019</u> Bogotá D.C Abril 29 de 2019
Anexos: _____	
Área Gestión: <u>D-1</u>	
Responsable Correo: _____	
<i>Juan C. Chiriz</i> Bogotá Positiva	

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetado señor:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora; 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)
Kra 69 N° 7-90

Se solita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Abril 29 de 2019

Señorita
Alejandra Ospina Patiño
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 2 de sostenibilidad

Respetada señorita:

De acuerdo a los compromisos realizados en la reunión N° 1 de sostenibilidad. Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de sostenibilidad de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 03 de mayo de 2019

Hora: 10:00 am

Lugar: Colegio Distrital Marsella – (puerta de ingreso a la obra)
Kra 69 N° 7-90

Se solita que para el recorrido de obra se cuente con casco y botas (opcional) de seguridad, ya que ingresaremos a la zona de obra del colegio.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUÑEZ
Profesional Social

Se deja en Secretario del Colegio




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C marzo 26 de 2019

Señora
Alejandra Ospina Patiño
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señorita:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019
Hora: 4:00 pm
Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

*Recibí
Alexandra P*

CONTRATISTA:

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Señor:

Juan David Pinzón Aldana

Grupo de participación ciudadana

Colegio Marsella

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señor:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019

Hora; 4:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca

Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente


ALEXANDRA DÍAZ NUVAR
Profesional Social

RECIBI

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C marzo 26 de 2019

Señor

Raúl A. Betancour
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Cll 8 # 69ª 36

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señor:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019

Hora: 4:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social



CONTRATISTA:

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C marzo 26 de 2019

Señor

Nelson Velázquez Camacho

Grupo de participación ciudadana

Colegio Marsella

Kra 69 # 8-28

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señor:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019

Hora; 4:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUÑAN
Profesional Social

*Se desea en
brazos
(A.D.)*

CONTRATISTA:

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C marzo 26 de 2019

Señora

Socorro López Izquierdo

Grupo de participación ciudadana

Colegio Marsella

Kra 69 # 7-90

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señora:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019

Hora: 4:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

*Reubi
García Lina
Marzo 27/2019.*

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C marzo 26 de 2019

Señor
Fredis Arnulfo Cruz
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Cll 9ª # 69-60

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señor:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019
Hora: 4:00 pm
Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Febrero 19 de 2019

Doctor
Ariel Tovar Gómez
Directora Local
Localidad de Kennedy
Carrera 78 J con Calle 38 B Sur

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Reunión N° 1 de sostenibilidad

Respetada señor:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de sostenibilidad de obra de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 29 de marzo de 2019
Hora: 4:00 pm
Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo:

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

Stamp: DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN
Stamp: E-2019-57321
Stamp: 127 MAR 2019
Stamp: Bogotá Positiva

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

Bogotá D.C Febrero 19 de 2019

Consac N. 001

Doctora

Flor María Díaz Rocha / *Anel Tovar Gómez*

Directora Local

Localidad de Kennedy

Carrera 78 J con Calle 38 B Sur

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: reunión Inicio de Obra

Respetada Doctora:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia que se llevara a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 22 de febrero de 2019

Hora; 2:00 pm

Lugar: Colegio Distrital Marsella – Biblioteca
Kra 69 N° 7-90

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de de 8:00 a 5:00pm.

Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Díaz
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

	
	E-2019-34430
Registrado	Fecha: 20-02-2019 - 07:37
Edición	Folios: 1 Anexos
Radicador: YASMIN ANDREA CIFUENTES	
Destino: Dire. Educación Local - Localidad de Kennedy	
Consulte el estado de su trámite en www.estrategia.org.co	
Código de Consulta: 11047114	
Fecha de generación: 2019-02-20	
GEOPD	



MEJOR
TALLERES

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Anexo 7:

Actas de vecindad


FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	2019
DD	MM
AA	OBRA:
ACTA No.:	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

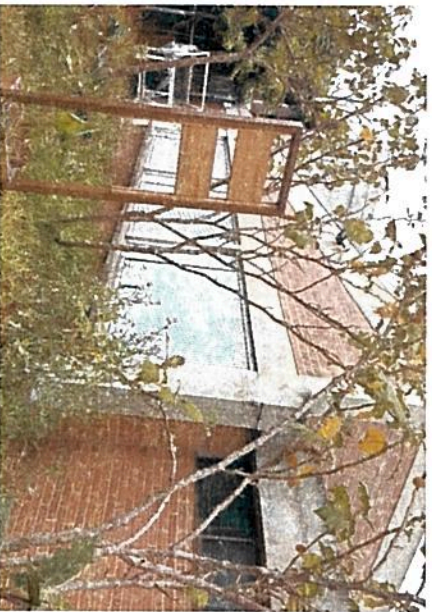

2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Secundario Poseedor Otro Cuál? Secundario
 Nombre del Propietario Secundario
 Ubicación Fachada oriente de bloque 2
 Teléfono Circo 91190
 Long. del frente (mts) 1 No. de pisos 1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☒
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	<u>Indefinido</u>
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☒	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐
Cuántos		
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Apoyo de cubierta en volas

MUROS: Platado pero con placa

CUBIERTA: 1

PISOS: 1

FACHADA: grietas al lado de la columna

GRIETAS Y FISURAS: finis en la base

HUMEDADES: UNO

HUNDIMIENTO PISO: pero al lado de finis

DESPLAZAMIENTOS: pero al lado de finis

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre: Guillermo
 C.C. O.NIT: 35.310.581

Representante del Contratista
 Nombre: Young Oliver

Vo Bo Representante de la Interventoría
 Nombre: Yury Castañeda

Original 1: para el propietario

Original 2: para la interventoría

Original 3: para el contratista

Original 4: para el propietario

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES


CONTRATO No.	COI-PCCONTI630227		
Hoja	1	de	
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
CONTRATO No.	COI-PCCONTI630227		
Hoja	3	de	
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO VIO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:

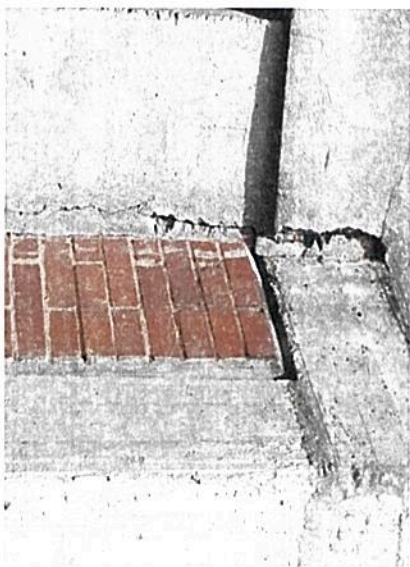


FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Sección 10112
C.C. O.N.T. 35-316

Representante del Contratista
Nombre: Henry Garcia

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoria
Copia: para el contratista



FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. 1	COI-PCONTRE30227
Hoja 1 de 1	
FECHA	17 de 01 de 2019
OD	MM AA
ACTA No.:	
CONTRATO No. 1	COI-PCONTRE30227
Hoja 2 de 2	
FECHA	
OD	MM AA
ACTA No.:	
OBRA:	
FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la informaci3n contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se encontro el Horno deschubido en el ante pecho Ave 3, Piso hundido en la parte de la cefura y detectado mas sobre placa Ave 3, y fecha de su enah se desplaya, fijos en fecha de bano VIPES

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Gerson Lopez
C.C. O.NIT: 35.316.381

Representante del Contratista
Nombre: Vicente Suarez

Vo. Bc. Representante de la interventoria
Nombre: [Firma]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Sochaco Oriente Bloque 2.

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: Se mejora el sendero peatonal con adoquín. Se realizó excavación para instalación de redes hidrosanitarias y construcción de pozos.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Goern Hily
FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☒ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE ☐ DE INTERVENTORIA ☐

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNTR630227
 Hoja 1 de 1
 FECHA 13 de 01 del 2019
 DD MM AA
 OBRA: ACTA No.:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia Propietario: Arrendatario
 Nombre del Propietario: Secretaria de Educación
 Ubicación: Bloque 3 1er nivel
 Teléfono: Cir 64-190
 Long del frente (mts): No de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS

1. Agua ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
 7. Otros ☐ SI ☐ NO

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
 2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☐
 3. Valor intermedio ☐ 7. Otro ☐
 4. Valor normal ☐ Cuál? Instalaciones

USO ACTUAL

1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐
 2. Comercial ☐ 6. Baldo ☐
 3. Industrial ☐ 7. Otro ☒
 4. Institucional ☒ Cuál? Comercio

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
 Cuantos ☐
 El garaje se usa como ☐
 comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Grietas y fisuras:

MUROS: fisuras en muros

CUBIERTA: /

PISOS: adoquinado y baldosa en baldas


FACHADA: /

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
 Nombre:
 C.C. O NIT:
 Representante del Contrata
 Nombre:
 Vo Bo Representante de la Interventoría
 Nombre:
 Original 1: para el propietario
 Original 2: para la Interventoría
 Copia: para el contratista

10/01/2019
 10/01/2019



FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES


CONTRATO No.:	C01-PCCONT630227	
Hoja 1 de		
FECHA	01/01/2019	
DD	MM	AA
ACTA No.:		
CONTRATO No.:	C01-PCCONT630227	
Hoja 3 de		
FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:		

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

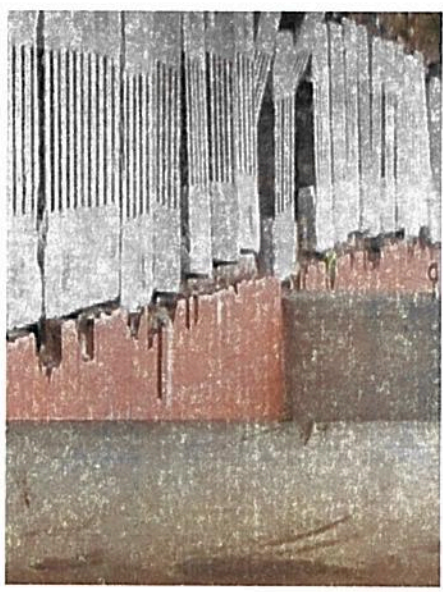

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
Nombre Bernardo Lopez
C.C.O.N.T. 31.310.571

Representante del Contratista
Nombre Stewart Govea

Vo Bo. Representante de la Interventoría
Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copias para el contratista

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCONTRE630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	09
AA	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	C01-PCCONTRE630227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
ACTA No.:	

OBRA:	
FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la informaci3n contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se encontro el adogin deportivo en bdo su estado longitudinal y delicias y frues en los muros de la fachada

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: 35-310-381
C.C. O.NIT: 30 de 1992

Representante del Contratista
Nombre: Wilmar Buita

Va Bo Representante de la Interventoria
Nombre:

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copias: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Bloque 3 1er Nivel

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: Se realiza instalación aometiada red contraincendio al ingreso principal del colegio.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Gomez Lopez J

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE ☐ DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNIR630227
Hoy 1 de

FECHA

DD MM AA

OBRA:

ACTA No.:

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario — Arrendatario — Poseedor X Otro Cuadrante
Nombre del Propietario: Secretario Educación
Ubicación: Bloque 3 - 2do nivel C-164 3 90 2
Teléfono: No de pisos 2
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

SI NO OBSERVACIONES
1. Agua ☒ ☐
2. Alcantarillado ☒ ☐
3. Energía ☒ ☐
4. Teléfonos ☒ ☐
5. Gas ☒ ☐
6. Televisión cable ☒ ☐
7. Otros ☐ Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☐
3. Valor Intermedio ☐ 7. Otro ☐
4. Valor normal ☐ Cuál? vehicular

USO ACTUAL

1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 6. Baldo ☐
3. Industrial ☐ 7. Otro ☐
4. Institucional ☒ Cuál? comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

GRIETAS Y FISURAS:

MUROS:

HUMEDADES:

CUBIERTA:

HUNDIMIENTO PISO:

PISOS:

DESPLAZAMIENTOS:

FACHADA:

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
Nombre: Gloria L. Pineda
C.C. O.N.T. 33.370.381

Representante del Contrata
Nombre: Shoumy Oues

VO Bo. Representante de la Interentencia
Nombre: Rosa Cecilia

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Original 3: para el propietario



Original 4: para el propietario

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCONTRE30227			
Hoja	1 de			
FECHA				
DD	01	MM	04	AA
ACTA No.:				
CONTRATO No.	C01-PCCONTRE30227			
Hoja	3 de			
FECHA				
DD		MM		AA
ACTA No.:				
OBRA:	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO			

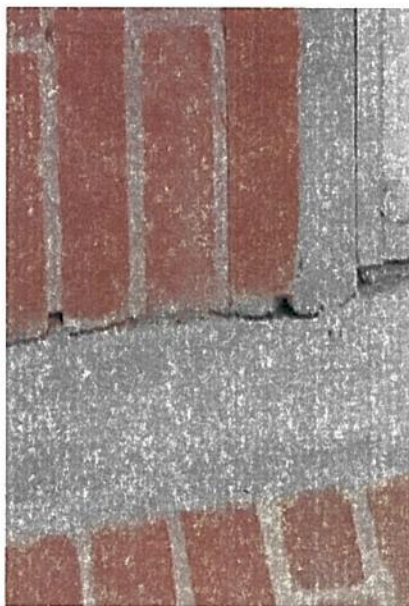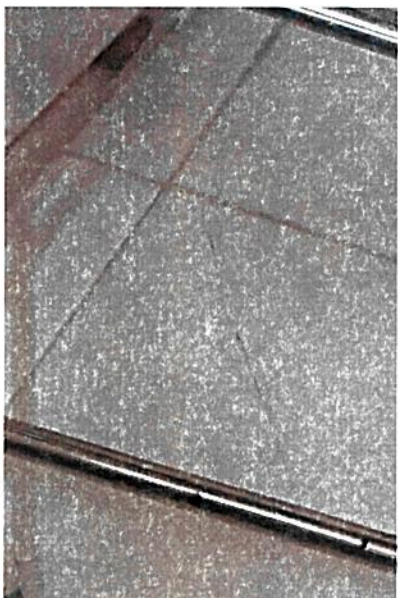

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre Sección I. P. C. I.
C.C. O. N. I. 38.320.181

[Signature]
Representante del Contratista
Nombre Wendy Guevara

Vo. Bo. Representante de la Interventoría
Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copias: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja 1 de	FECHA		
DD	MM	AA	OBRA:
13	01	2019	
ACTA No.:	C01-PCCNTR630227		
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja 2 de	FECHA		
DD	MM	AA	OBRA:
ACTA No.:	FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Único este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

En el contrato de seguridad se encuentran
 1500 el los muros en el laboratorio
 la cueva esta unida en el estado
 34-01-01-01

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre: Don R. P. 2
 C.C. O.N.T. 35.310.581

Representante del Contrata
 Nombre: Victor Hugo

Vo. Bo. Representante de la Interventoría
 Nombre: [Firma]

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Copia: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Bloque 3 2do nivel

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No presenta novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Germán Pizarro

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO NO.	C01-PCCNTR830227		
Hoja	1	de	
FECHA	27	de	2019
DD	MM	AA	
ACTA NO.:			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor ☒ Otro Cuán Secretaria
 Nombre del Propietario: Ysabella Carrero
 Ubicación: Fachada occidente de bloque 2
 Teléfono: _____ No. de pisos: 1
 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	☒	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒		
3. Energía	☒		
4. Teléfonos	☒		
5. Gas	☒		
6. Televisión cable	☒		
7. Otros	☐	Cuál?	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intelectual	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	<u>Indiferente</u>

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐	Cuántos		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☒	Cuál?		comercio	SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1

GRIETAS Y FISURAS: grietas en el fudo del

MUROS: Placado uno debajo

HUMEDADES: acceso a sala Richard

CUBIERTA: 1

HUNDIMIENTO PISO: Piso hundido en la cindela

PISOS: Placado piso ingreso


DESPLAZAMIENTOS: con múltiples grietas.

FACHADA: 1

OTRO: Cuál?

FIRMAS: Ysabella Carrero
 Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre: Ysabella Carrero
 C.C. O NIT: 90.312.81

VO Bo. Representante de la Inmuntoria
 Nombre: Ysabella Carrero
 Original 1: para el propietario
 Original 2: para la información
 Copia: para el contrato



FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNTR630227		Hoja 1 de	
FECHA		OBRA:	
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
CONTRATO No. C01-PCCNTR630227			
Hoja 3 de			
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
13		01	
2019		OBRA:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO			



FIRMAS

Soem by
 Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre Soem by
 C.C. O NIT 35.370.581

[Signature]
 Representante de Contrata
 Nombre Udaya Guez

VO Bo. Representante de la Interventoría
 Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Copia: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-POCONTB30227	Hoja 1 de 1	FECHA	OBRA:
DD 13	MM 01	AA 2019	
ACTA No.:	CONTRATO No. C01-POCONTB30227	Hoja 2 de 2	
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES			

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se encontro con grietas el acceso de
sala de profesores y hundimiento de
piso en la circulacion, fijos y grates
en la fachada, grietas en las fachada
debajo de ventanas.

FIRMAS
Firma Responsable Campo educativo
Nombre: *Beaira L. P. C.*
C.C. O NIT: *3.5.310.881*

Representante del Contratista
Nombre: *Shany carlos*

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: *[Signature]*

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copias: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Fachada occidente del bloque 2

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒.

Observaciones: No tiene observaciones

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Gom R. J.
FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE ' DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCONTIR630227
 Hoja 1 de 1
 FECHA 01/01/2019
 DD MM AA
 OBRA:

ACTA No.:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario
 Nombre del Propietario: Secretaria Educacion Poseedor: X Otro Cuarp: Secretaria de
 Ubicación: Cir 64 y 90
 Teléfono: 2
 Long del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

1. Agua ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
 7. Otros ☐ Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
 2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☒
 3. Valor intermedio ☐ 7. Otro ☒ Cuál? vs. vivienda

USO ACTUAL

1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐
 2. Comercial ☐ 6. Baño ☐
 3. Industrial ☐ 7. Otro ☐ Cuál?
 4. Institucional ☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
 Cuantos ☐
 El garaje se usa como ☐
 comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1 GRIETAS Y FISURAS: 1

MUROS: 1 HUMEDADES: 1

CUBIERTA: 1 HUNDIMIENTO PISO: 1

PISOS: 1 DESPLAZAMIENTOS: 1

FACHADA: 1 OTRO: Cuál? 1

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo: Secretaria de Educacion
 Nombre: Secretaria de Educacion
 C.C.O.N.T.: 35.370.381

Representante del Contratista: Manuel Garcia
 Nombre: Manuel Garcia

Vo Bo Representante de la Interventoria: Manuel Garcia
 Nombre: Manuel Garcia

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contratista
 Manu Garcia
 Interventoria

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS FUNDACIONES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.:	C01-PCCONTRE630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	01
AA	2019
OBRA:	
CONTRATO No.:	C01-PCCONTRE630227
Hoja 3 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
ACTA No.:	

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:



FIRMAS

Firma Responsable Centro de Trabajo
Nombre Sam B. J.
C.C.O.N.T. 35.320.381

Representante del Contratista
Nombre Aracely
de la Cruz

VO Bº Representante de la Interventoría
Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copiar: para el contratista

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja 1 de			
FECHA			
DD	01	MM	2019
AA			
ACTA No.:			
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja 2 de			
FECHA			
DD		MM	AA
ACTA No.:			

OBRA:	ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR) _____

finas a modo de sketch y dibujos p.d.d
en todos sus sentidos

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Becerra Lopez
C.C.O.NIT: 35.310.181

Representante del Contratista
Nombre: Vicunay Gomez

Vo Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copiar para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Biblioteca

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI _____ NO _____

Observaciones: No presenta novedad.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Joan Liza

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

ACTA DE VECINDAD

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: _____ Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor ☒ Otro ☐ Secretaria Ed. V.
 Nombre del Propietario _____ Secretaria de Educacion. Colegio Domingo Nolasco
 Ubicación _____ Fecha de acceso bloque 2 - 21/04/79
 Teléfono _____ No. de pisos 1
 Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

SI	NO	OBSERVACIONES

1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐
Cuál?		

TIPO DE PREDIC

1. Monumento Nacional	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	
3. Valor Intermedio	☐	
4. Valor normal	☐	
5. En construcción	☐	
6. Sin edificar	☐	
7. Otro	☒	
Cuál? <i>Infinitesimal</i>		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Búldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Garaje SI ☐ NO ☐	☐
		Cuántos El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	☐
		Cuál? ☐	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

23

MUROS:

34

CUBIERTA: 6x12-62 + 1 chd Acero Nov 3 y 4

HUNDIMIENTO PISO: -

PISOS: Señalado en Azules y Rojo

DESPLAZAMIENTOS:

FACHADA: Oleatado de Cillo Verde.

OTRO: _Cual? _

FIRMAS 22

Firma Responsable Centro educativo _____
Nombre: Shawn Leroy Richards
CC.OUIT 34.306.381

Representante del Contratista
Nombre: Thelma Leary

Vo. Bo. Representante de la Interventoría
Nombre *[Signature]*

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Yury Willy Perdomo
Gerente Social
Interventoría
RCS: Ident Social

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE 3 PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES


CONTRATO No. COI-PCCONT630227	
Hoja 1 de 1	FECHA
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	
CONTRATO No. COI-PCCONT630227	
Hoja 3 de 3	FECHA
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO VIO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:

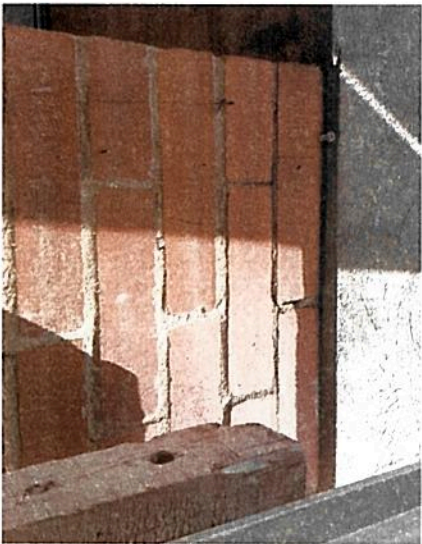


FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
Nombre: Sección de Vigilancia
C.C. O NIT: 35.320.581

Representante del Contratista
Nombre: Yenny Gutierrez

Vo Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista



FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCONT630227
Hoja 1 de	
FECHA	
BD	01/06/2019
MM	
AA	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	C01-PCCONT630227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	

OBRA:

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Único este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se encuentra ubicado en el terreno de Alcazar del Aula 3 y 4. de costado orient-occidente en las fachadas se encuentra el baulle del lado de Alcazar del Aula 3 y 4. de el Aula 4. piso en gusto y fueses en el adorno

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Edwin López Lizarondo
C.C. O NIT: 35.370.581

Representante del Contratista
Nombre: Victor Garcia

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: _____

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: fuerza acceso bloque 2

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: Se realizó arreglo de grieta en placa, se realizó mejoramiento de piso.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Germán Rojas

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOR ESTAD ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	COT-PCNTR630227		
Hoja 1 de	FECCHA		
DD	MM	AA	OBRA:
ACTA No.:			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario
 Nombre del Propietario: Sección de Educación
 Ubicación: Circulación de baños niños bloque 2
 Teléfono: No. de pasos 490
 Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

1. Agua ☒ SI ☐ NO
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
 7. Otros ☐ CUAL?

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional ☐
 2. Valor Arquitectónico ☐
 3. Valor Intermedio ☐
 4. Valor normal ☐
 5. En construcción ☐
 6. Sin edificar ☐
 7. Otro ☒ Instalación

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baido	☐
3. Industrial	☒	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	☐
		Garaje	SI ☐ NO ☐
		Cuantos	☐
		El garaje se usa como	☐
		comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Libre en el punto donde se
 GRIETAS Y FISURAS: Libre en el punto donde se


MUROS: Libre en el punto donde se
 HUMEDADES: Libre en el punto donde se

CUBIERTA: Libre en el punto donde se
 HUNDIMIENTO PISO: Libre en el punto donde se

PISOS: Libre en el punto donde se
 DESPLAZAMIENTOS: Libre en el punto donde se

FACHADA: Libre en el punto donde se
 OTRO: Cual?

FIRMAS: Sección de Educación
 Firma Responsable de la Intervención: Sección de Educación
 Nombre: Sección de Educación
 C.C. O.N.T. 35.310.581
 Nombre: Sección de Educación
 VO BO Representante de la Intervención: Sección de Educación
 Nombre: Sección de Educación
 Original 1: para el propietario
 Original 2: para la Intervención
 Copia para el contratista



FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.:	C01-PCONTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA
CONTRATO No.:	C01-PCONTR630227
Hoja 3 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:




FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
Nombre: Samir h
C.C. O.N.I. 35.326.981

Representante del Contrato
Nombre: Venerio Govea

Vo. Representante de la Interventora
Nombre: [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventora
Copias: para el contrato



FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.:	COT-PCONTR830227		
Hoja 1 de			
FECHA	DD	MM	AA
	04	01	2019
OBRA:			
ACTA No.:			
CONTRATO No.:	COT-PCONTR830227		
Hoja 2 de			
FECHA	DD	MM	AA
OBRA:			
FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES			

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la informaci3n contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR) _____

Se encuentran fisuras en la columna perit superior costado sur, la parte del aula y ista doblada, fisuras en el muro costado sur-occidental, fisuras en el dual este fisuras en el muro costado por-occidental

FIRMAS
Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Gein Leizy
C.C. O.NIT: 94.770.581

Representante del Contratista
Nombre: Sherry Guey

VO BO Representante de la Intervent3n
Nombre: [Firma]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la intervent3n
Copial: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Ciruelada Baños niños Bloquez

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI _____ NO X

Observaciones: No presento novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Gomez Riquelme

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE _____ DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:


ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227	
Hoja	1	de
FECHA		
DD	21	MM
AA	2019	AA
OBRA:		
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227	
Hoja	3	de
FECHA		
DD	MM	AA
OBRA:		
ACTA No.:		


ACTA DE VECINDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

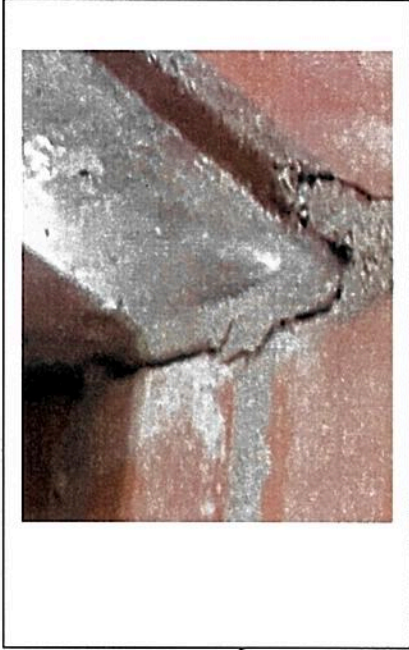

3/04

CONTRATO No. 1		C01-PCENTRS30227	
Hija 1 de		FECHA	
12	01	2014	OBRA:
01	MM	01	
ACTA No.:			

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD
FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

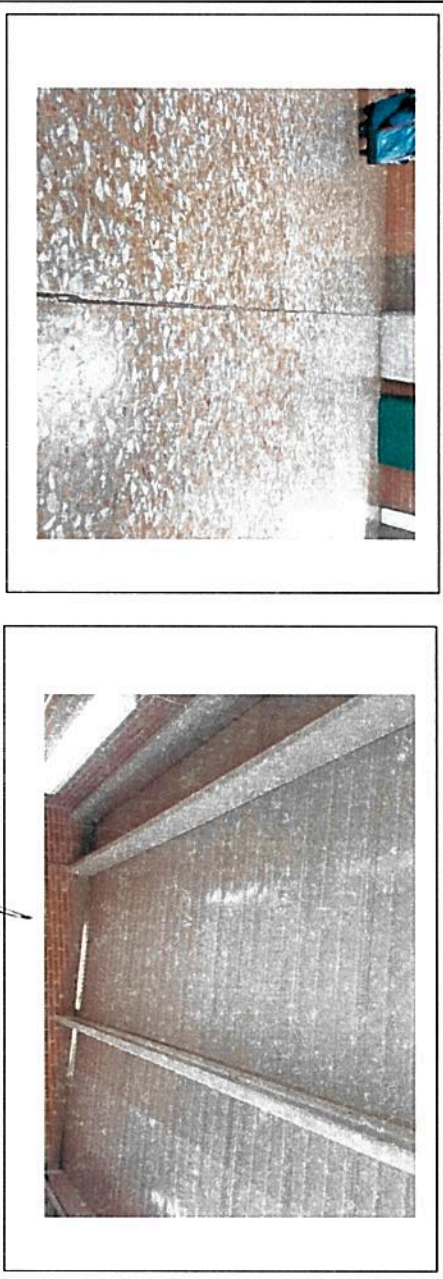


PRMAS
 Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre Secundaria Leticia Aguilar
 C.C.O.N.T. 35-370-181

[Signature]
 Representante del Colegio
 Nombre Victor Hugo

[Signature]
 Vo Bo Representante de la Intercomunal
 Nombre _____

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la Intercomunal
 Copia: para el colegio



FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PECNTR630227		
Hoja	1	de	1
FECHA			
DD	01	MM	01
AA	20	AA	08
ACTA No.:			
CONTRATO No.	C01-PECNTR630227		
Hoja	2	de	2
FECHA			
DD		MM	
AA		AA	
ACTA No.:			
OBRA:			

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Única este espacio para ampliar la información contenida en el numeral 3 ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR)

Se menciona Dicho el muro interno del
 Aula en el costado y también en el
 costado Norte y de que se encuentra
 Puntos en el muro costado Norte
 se encuentra en el costado Sur ya el
 ladrillo tiene huecos, el piso y la
 cubierta se encuentra en buen estado.

FIRMAS

Severo López Izquierdo
 Firma Responsable Centro Adicional
 Nombre: Severo López
 C.C. O.N.T. 31.310.151

Recepción para el Confianista
 Nombre: Shenay Becerra

Vº Bº Representante de la Interventoría
 Nombre: [Firma]

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la Interventoría
 Copias: para el Confianista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Aula 3 - Bloque 2

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO X.

Observaciones: No presenta novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE ☐ DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.


FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. CO1-PCONT-R330227
 HOJA 1 de 1
 FECHA 01/08/2019
 OBRA: DD MM AA
 ACTA No.:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

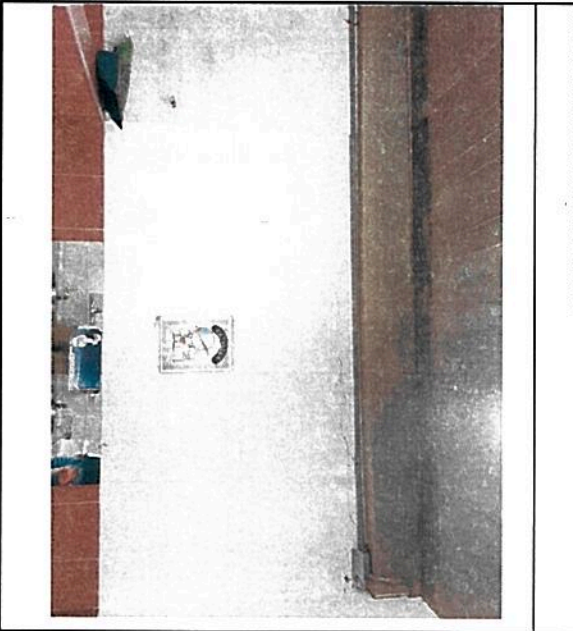

2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario
 Nombre del Propietario: Secretaría de Educación
 Ubicación: Baño niñas de bloque 2
 Teléfono: 69-3-90
 Long. del frente (mts): 1

SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☒
4. Valor normal	☐	Cual?	<u>Instaurar</u>

USO ACTUAL	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☒
5. Recreacional	☐
6. Baldo	☐
7. Otro	☐
Cual?	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

GRIETAS Y FISURAS:

MUROS: Hay muros por k y suf

HUMEDADES:

CUBIERTA: Hay muros en k y suf

HUNDIMIENTO PISO:

PISOS: Hay en el cochete

DESPLAZAMIENTOS:

FACHADA: Hay muros de saltadores

OTRO: Cual?

FIRMAS: Gum Ay
 Firma Responsable Centro educativo
 Nombre: Sección de Educación
 C.C. O NIT: 35-330-181

VO Bp Representante de la Interventoría
 Nombre: Sección de Educación
 Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Original 3: para el contrato




FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	1	de	—
FECHA	14	de	2019
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	3	de	—
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

OBRA: **ACTA DE VECINDAD**
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

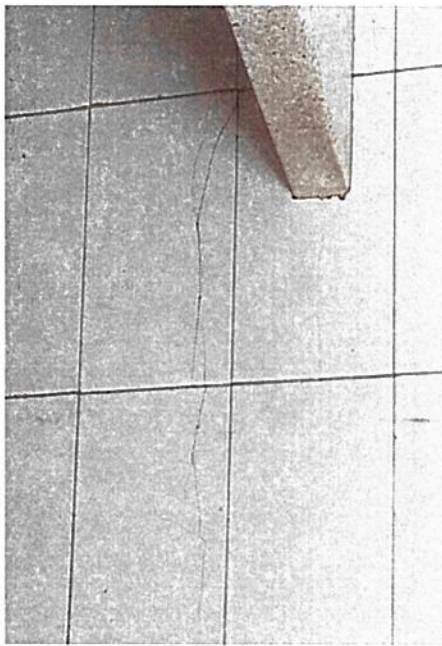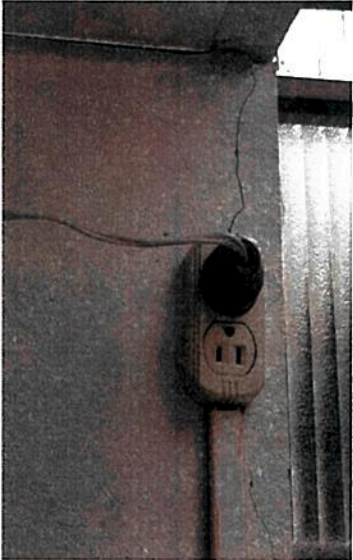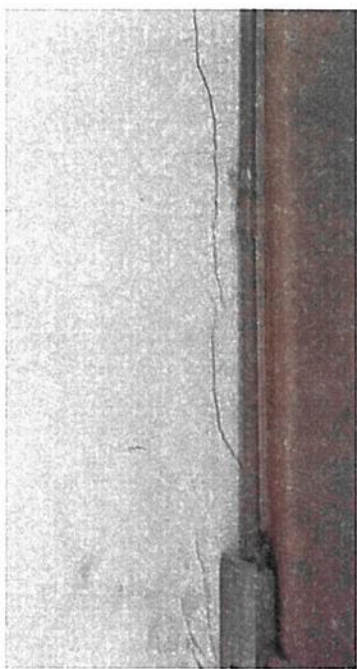

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: German Lopez
C.C. O NIT: 35-328-181

Representante del Contratista
Nombre: Victor

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: 35

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	12
AA	2009
OBRA:	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
OBRA:	
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	
ACTA No.:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR) _____

Se interfiere fisura en el muro norte
fisura en el muro sur, alrededor el muro
costado oriente y occidente, se interfiere
el enchape rolo y unido en el muro bajo
costados oriente y occidente, fisuras en el
muro norte dentro del baño, en el baño
donde está el techo afuera está
con gachas y fisuras, fisuras en el enchape
del costado sur-occidente,

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Sección de la Perla
C.C. ONIT: 31-312-181

Representante del Contratista
Nombre: Henry Arenas

Vo. Gr. Representante de la Interventoría
Nombre:

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copias: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Baño Niñas Bloque 2

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No presenta observación

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Serra Hipólito
FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]
FIRMA


Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.




FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNTR630227		Hoja 1 de	
FECHA		2018	
DD	MM	AA	OBRA:
ACTA No.:			
CONTRATO No. C01-PCCNTR630227			
Hoja 3 de			
FECHA			
DD	MM	AA	OBRA:
ACTA No.:			
REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO			

ACTA DE VECINDAD

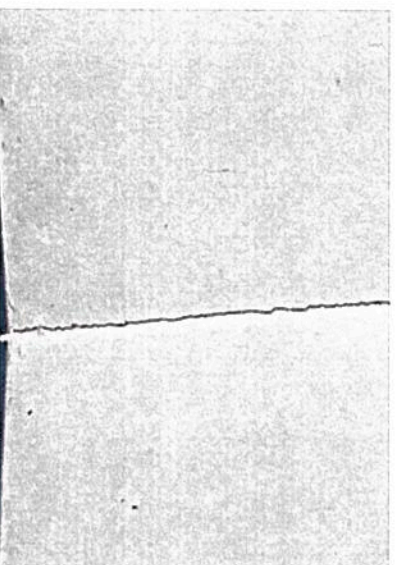


FICHA TECNICA SOR ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

CONTRATO No. 1		CONT-PCONTRES30227	
Hoja 1	de		
FECHA			
DD	MM	AA	OBRA:
07	03	2015	
ACTA No.:			

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

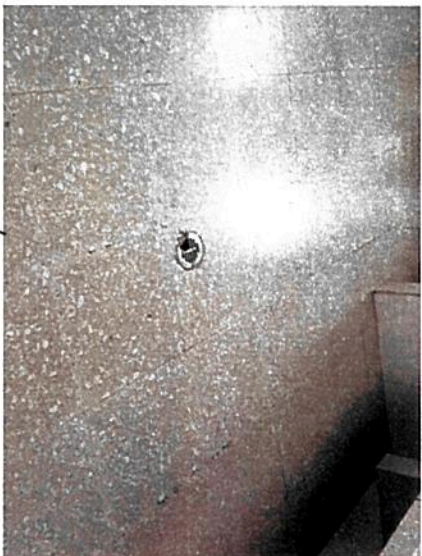

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre _____
C.C. O NIT _____

Representante del Contratista
Nombre: *Winston Girex*

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre _____

[Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoria
Copias: para el contratista

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.:	C01-POCINTRE30227		
Hoja 1 de			
FECHA			
DD	MM	AA	OBRA:
13	01	2019	
ACTA No.:	C01-POCINTRE30227		
Hoja 2 de			
FECHA			
DD	MM	AA	OBRA:
ACTA No.:			
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES			

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se encontro el muro entre la viga en el
costado sur con dilataciones, de igual manera
el muro costado norte presenta dilataciones
fisuras, dilataciones muro nor-occidental,
enchufe de muro nor-occidental unido y roto
enchufe debajo de los cuneos este unido y roto
el muro costado norte se encuentra doblado
y con grietas.

FIRMAS

Firma Responsable educativo
Nombre: Gerardo Lopez
C.C. O.N.T. 3.5.328.581

Representante del Contrata
Nombre: Victor Barrios

Vo. Bo. Representante de la Interventora
Nombre: _____

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventora
Copias: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Baño niños Bloque 2

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No presenta novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO No.	C01-PECNINR630227		
Hoja 1 de			
FECHA			
DD	01	MM	2019
AA			
ACTA No.:			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: _____ Arrendatario: _____ Poseedor: X Otro cual: SECRETARÍA
 Nombre del Propietario: SECRETARÍA EDUCACIÓN
 Ubicación: CALLE 109 A 90
 Sala de profesores: _____
 Teléfono: _____ No. de pisos: 1
 Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES _____

2. Alcantrillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐
¿Cuál?		

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☒
4. Valor normal	☐	Cual?	<u>Insuficiente</u>

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	☐	NO	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐	Cuantos	<input type="text"/>		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☒	Cual?		comercio	SI ☐	NO ☐	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

ESTRUCTURA:

GRIFTAS Y FISURAS: h. S. m. d. s. n. - drink

MUROS: Plataforma para el acceso

HUMEDADES: _____

1

HUNDIMIENTO PISO: _____

PIOS: 1.50 4300 CH + 200 130-200

DESPLAZAMIENTOS: _____

FACILITADA. _____

DIRCO:CUAIR

FIRMAS
Seen like).

2

Firma Responsable Centro educativo:
Nombre: Socari Lopez
C.C.O.NIT: 35-325.581

Vo Bo. Representante della Intim
Nome *George*

Vo Bo. Representante de la Int.
Nombre Jose C...

Código para el contrastista

20

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.:	C01-PCCNTR830227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	
CONTRATO No.:	C01-PCCNTR830227
Hoja 3 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:



FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
 Nombre Berni R. J
 C.C. O NIT 25.310.381

Representante del Contratista
 Nombre Yenny Gove

Vs. Bo. Representante de la Interventoria
 Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	24
AA	20
OBRA:	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
OBRA:	
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Única este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se encuentran m.c. fijados todos sur-orient.
 piso- delatado costado sur-orient, y nuevos
 delatados costados, sur-orient, sur-orient, y nuevos
 por-orient, y fisuras en U.d.a. sur, y fisuras

FIRMAS

Firma Responsable Centro Educativo
 Nombre: *Sección 10*
 C.C. O.N.T. *35.326*

Representante del Contratista
 Nombre: *Shengy Gons*

Va. Bo. Representante de la Interventoría
 Nombre: *[Firma]*

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Copie: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Sala de profesores

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No se presentó novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	CO1-PCCONTIR630227
Hoja 1 de	
FECHA	17 de 01 de 2019
DD	MM
AA	AA

OBRA: IED. MADRELLA

001

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor X Otro Cuadr Sección ed.
 Nombre del Propietario Sección ed.
 Ubicación Cancha de fútbol asfaltada
 Teléfono 0114-190
 Long. del frente (mts) 0 No. de pisos 0

SERVICIOS PUBLICOS

1. Agua	☒	SI	☐	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒				
3. Energía	☒				
4. Teléfonos	☒				
5. Gas	☒				
6. Televisión cable	☒				
7. Otros	☐				

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuadr? <u>Industria</u>	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI	NO
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐	Cuantos	☐	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☒	Cuadr?		comercio	SI	NO

ACCESOS VEHICULARES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

CRISTALES Y FISURAS:

MUROS: 1

HUMEDADES:

CUBIERTA: 1

HUNDIMIENTO PISO:

PISOS: Boque por la zona de la fachada

DESPLAZAMIENTOS: 1

FACHADA: 1

OTRO: Cuadr? 1

FIRMAS Gorano Lopez Inguiera
 Firma Responsable Centro encauado
 Nombre Goran Lopez
 C.C. O NIT 30.320.201

Representante del Contratista
 Nombre Yusany Suarez

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Copia para el contratista

Vo Bo. Representante de la Interventoría
 Nombre Yusany Suarez
Interventor
Residente Social

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNTR630227	
Hoja 1 de	
FECHA	17 de 01 2016
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	
CONTRATO No. C01-PCCNTR630227	
Hoja 3 de	
FECHA	
DD	MM
AA	AA
ACTA No.:	

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:




FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Edison Lopez Yaguiran
C.C. MIT: 35-320.581

Representante del Contratista
Nombre: Moises Suarez

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista



FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	COI-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	2019
AA	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	COI-PCCNTR630227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
OBRA:	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

OBRA:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se encontro fisuras en el
 Bad work de la cancha hundido poro 2m
 DE BANDERAS

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
 Nombre: Jose L. Lopez
 C.C.O.NIT: 31.320.421

Representante del Contratista
 Nombre: Stacy Guevara

Vo Bo. Representante de la Interventoria
 Nombre: [Signature]

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Cancha de Fútbol

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No presenta observaciones

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	01
AA	19
OBRA:	

ACTA No.:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Posesor X Otro Cuap Sectorial educ
 Nombre del Propietario: Secretaria de Educacion
 Ubicación: Aula 4 de bloque 2 C.R. 60-1-90
 Teléfono: No de pisos 1
 Long del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

SI	NO	OBSERVACIONES
☒	☐	1. Agua
☒	☐	2. Alcantarillado
☒	☐	3. Energía
☒	☐	4. Teléfonos
☒	☐	5. Gas
☒	☐	6. Televisión cable
☐	☐	7. Otros

TIPO DE PREDIO

☐ 1. Monumento Nacional	☐ 5. En construcción
☐ 2. Valor Arquitectónico	☐ 6. Sin edificar
☐ 3. Valor Intermundo	☐ 7. Otro
☐ 4. Valor normal	☒ Cuap, institucional

USO ACTUAL

☐ 1. Residencial	☐ 5. Recreacional
☐ 2. Comercial	☐ 6. Baño
☐ 3. Industrial	☐ 7. Otro
☒ 4. Institucional	☐ Cuap?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐ NO ☐
Cuantos	
El garaje se usa como	
comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS: SINTACTO por muros de concreto y de bloques de agua elevada

CUBIERTA:

PISOS: Placota guita en el centro

FACHADA:

FIRMAS:

Gerente P. J. Representante del Contratista
 Nombre: Gerente P. J. Representante del Contratista
 C.C. O.N.T. 357 312.581

Vo Bo Representante de la Interventoría
 Nombre: Representante de la Interventoría


Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227	
Hoja 1 de		
FECHA	17 01 2019	
DD	MM	AA
ACTA No.:		
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227	
Hoja 3 de		
FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:		
OBRAS:		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO		

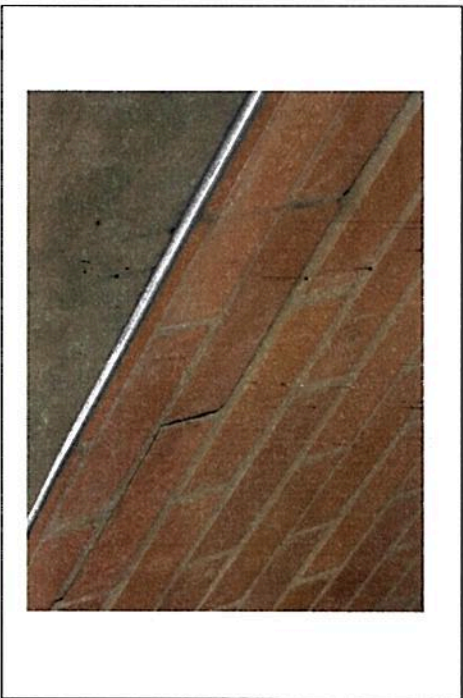

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES



Scam figs

Nombre: Jaen López Aguilar

C.C. ONIT 25.315, 581

Nom: Henry James

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCONT/RS30227
Hoja 1 de	
FECHA	
DD	01
MM	2016
AA	
ACTA No.:	
CONTRATO No.	C01-PCCONT/RS30227
Hoja 2 de	
FECHA	
DD	
MM	
AA	
ACTA No.:	

OBRA:	
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se intentó el piso con grutas en el
custo de Sur-avente, el muro del costado
bote enlame de la Uiga clavada y dibujo
pronta de lomas y fajas, la cubierta y demás
se ve a buen estado

FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo
Nombre: Germán P. J.
C.C. O NIT: 35.316.587

Representante del Contratista
Nombre: Yenny Torres

Va Bo Representante de la Interventoría
Nombre: SV

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copie: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Aola 4 Bloquez

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: No se presenta novedad

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

[Firma]

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCONTI630227
Hoja 1 de	
FECHA	01/04/2019
DD	01
MM	04
AA	2019
OBRA:	
ACTA No.:	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor X Otro Cuadr? Secretaria el
 Nombre del Propietario: Carrera 69
 Ubicación: Carrera 69
 Teléfono: No. de pesos 90
 Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	☒	SI	☐	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒				
3. Energía	☒				
4. Teléfonos	☒				
5. Gas	☒				
6. Televisión cable	☒				
7. Otros	☐				

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☒
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	
4. Valor normal	☐	Cuadr? Via Vehicular	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☒
4. Institucional	☐	Cuadr? Via Vehicular	
		Garaje	SI ☐ NO ☐
		Cuantos	☐
		El garaje se usa como	
		comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral 4. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1

MUROS: 1

CUBIERTA: 1

PISOS: 1

FACHADA: 1

GRUELAS Y FIGURAS: 1

HUMEDADES: 1

HUNDIMIENTO PISO: 1

DESPLAZAMIENTOS: 1


OTRO: Cuadr? 1

FIRMAS Don h. A.

Firma Responsable Centro educativo
 Nombre: Don h. A.

Representante del Contrata
 Nombre: Don h. A.

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoría
 Cédula para el contratista
 Original 3: para el propietario
 Original 4: para la interventoría
 Original 5: para el contratista




FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	1	de	
FECHA			
DD	14	MM	2015
AA			
ACTA No.:			
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	3	de	
FECHA			
DD		MM	
AA			
ACTA No.:			

OBRA: **ACTA DE VECINDAD**
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

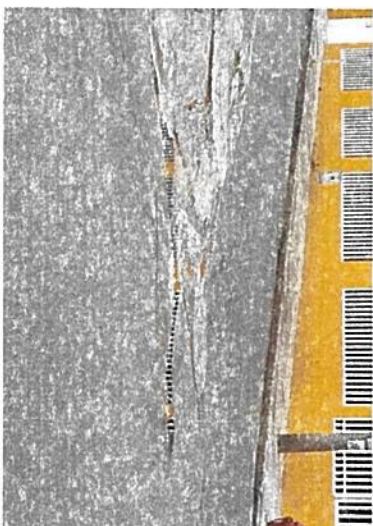


FIRMS

Firma Responsable Centro Educativo
Nombre Nelson Velasco
C.C. O.N.T. 1929032

Representante del Contratista
Nombre Manuel Gomez

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre [Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copias: para el contratista



FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

CONTRATO No. 1	C01-PCCNTR630227
Hoja 1 de	FECHA
DD	MM
01	2019
AA	AA

ACTA DE VICINIDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. 2	C01-PCCNTR630227
Hoja 2 de	FECHA
DD	MM
01	2019
AA	AA

ACTA DE VICINIDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

OBRA:

DD

MM

AA

OBRA:

DD

MM

AA

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Señal en la vía punta hundimiento y algunos bloques no están en las direcciones.
 6A-07; 6A-23, plantas grietas en ambos sentidos, 6A-39, curvatura sur-norte con grietas, Jordin 6A-59 con grietas se van hasta la 6A-83
 6A-89, reduccion de velocidad con grietas y hundimiento, Esquina 69-07 con hundimiento en ambos esquinas
 Esquina del colegio Colado Sur Suridul todo y maderas con grietas y sin ladrillos la rampa de acceso y gradas coches con grietas,
 Reductor de velocidad fura a el colegio en grietas
 PISO Pontonal en los metros esta hundido y con grietas
 grietas en direccion 7-57 en toda sur-sur
 grietas sentido hasta la esquina 7-95
 grietas de acceso al parquizado, esta hundido y con grietas en los tapas de entrelledos
 rampa de acceso parquizado en grietas 8-05
 grietas en la parte central, 8,15 con grietas

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contrato

FIRMAS	Yo Bo-Representante de la Interventoria
Firma Responsable Centro educativo	Nombre
Nombre: Nelson Vilasquez	Nombre: Sherry Buen
C.C. O.N.T. 1011111111	

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:

kg. 69

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☒ NO ☐

Observaciones: *No tuvo afectación, ya que el acceso vehicular de la obra fue mínimo.*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. 1 C01-PCCNTRB30227
 Hoja 1 de 1
 FECHA 17 de 01 de 2019
 OBRA: IED MARSELLA
 ACTA No. 1

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor X Otro Cual? _____
 Nombre del Propietario _____
 Ubicación calle 7 acceso a obra C17 64 x 46
 Teléfono _____ No de pisos _____
 Long del frente (mts) _____

SERVICIOS PUBLICOS

1. Agua ☐ SI ☒ NO OBSERVACIONES _____
 2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO _____
 3. Energía ☐ SI ☒ NO _____
 4. Teléfonos ☐ SI ☒ NO _____
 5. Gas ☐ SI ☒ NO _____
 6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO _____
 7. Otros ☐ SI ☒ NO _____

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
 2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☐
 3. Valor Intermedio ☐ 7. Otro ☒ Señalado
 4. Valor normal ☐ Cual? _____

USO ACTUAL

1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐
 2. Comercial ☐ 6. Badio ☐
 3. Industrial ☐ 7. Otro ☒ Señalado
 4. Institucional ☐ Cual? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☐ SI ☐ NO
 Cuartos ☐ SI ☐ NO
 El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO

GRIETAS Y FISURAS

ESTRUCTURA: _____
 MUROS: _____
 CUBIERTA: _____
 PISOS: _____
 FACHADA: _____


HUMEDADES

HUNDIMIENTO PISO: _____
 DESPLAZAMIENTOS: _____
 OTRO Cual? _____

FIRMAS

Nombre Sección 415
 Firma Responsable Centro educativo [Firma]
 Nombre Sección 415
 C.C.O.NIT 38.320.58
 Nombre Umarly Gueves
 Vo Bo Representante de la intervención [Firma]
 Nombre [Firma]
 Original 1: para el propietario
 Original 2: para la intervención
 Copia para el centro educativo

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la intervención
 Copia para el centro educativo



FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

CONTRATO No. C01-PCCNTR630227

Hoja 1 de

FECHA

DI

MM

AA

OBRA: IED MARSELLA

ACTA DE VECINDAD FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

ACTA No.: C01-PCCNTR630227

Hoja 3 de

FECHA

DI

MM

AA

OBRA:

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

ACTA No.: MM AA



FIRMAS
Firma Responsable dentro edificio
Nombre: Roberto
C.C.O.NIT: 19222002
Firma Representante del Contratista
Nombre: Wendy

V.O. Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copias: para el contratista

FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

OBRA: IED MARSELLA

CONTRATO No. 1	COI-PCONT-R330227	
Hoja 1 de		
FECHA		
ACTA No.:	2014	
CONTRATO No. 1	COI-PCONT-R330227	
Hoja 2 de		
FECHA		
DO	MM	AA
ACTA No.:		


ACTA DE VECINDAD

OBRA:

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (utilice este espacio para ampliar la informacion contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se encuentra metal ferozal Butado en la
 mitad de sendero y agua a la
 obra en metal de hierro

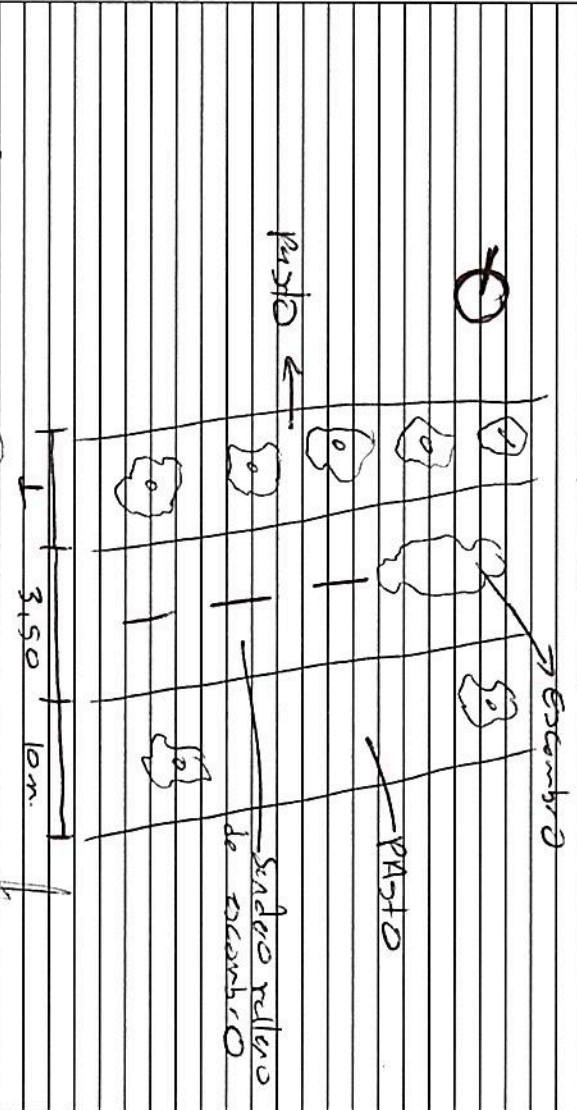

Firma
 Representante del Contratista
 Nombre: Manuel Velez
 C.C. O.NIT: 19324031
 Representante de la Interventoria
 Nombre: Henry Gueves

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:

Cll. 7 acceso obra

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones:

actualmente se encuentra en construcción la cancha de patinaje, esto no tuvo afectación

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

ACTA DE VECINDAD

OBRA: IED MARSELLA

2. DATOS DEL PREDIO

SERVICIOS PÚBLICOS

1000

•

ACIONALES" para ampliar esta información)

HUNDIMIENTO PISO: _____

1

10

Original 2, para la interventoria
Copia, para el contratista
Uruco
Resolución
Interventoria
Resident
Social

FICHA TECNICA SORRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	1	de	
FECHA			
16	01	01	2019
DD	MM	AA	
ACTA No.:			
CONTRATO No.	C01-PCCNTR630227		
Hoja	3	de	
FECHA			
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

OBRA: IED MARSELLA

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:



FIRMAS

Firma Responsable Centro educativo

Nombre

Melissa Villalaz

C.C. O.N.T.

19229037

Representante del Contratista


Nombre

Wenny Suarez

Vo Bo Representante de la Interventoría

Nombre

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copie: para el contratista



FICHA TECNICA SOR E ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO No. 1 C01-PCONTRE30227		Hojas 1 de 1	
FECHA		OBRA: IED MARSELLA	
16	01	2019	
DD	MM	AA	
CONTRATO No. 1 C01-PCONTRE30227		Hojas 2 de 2	
FECHA		FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES	
DD	MM	AA	
ACTA No.:		OBRA:	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

los techos no cubren totalmente nubes de
fuerza excesiva de viento y tambien
pasaron hundimiento, en su parte central
no tiene poder.

Firma del Representante del Contrata		Firma del Representante de la Interventoría	
Nombre: J. A. C. H.		Nombre: J. A. C. H.	

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copias: para el contratista

CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en: Cancha Fútbol Costado oriente!

Tuvo afectación durante la ejecución de la intervención SI ☐ NO ☒

Observaciones: actualment el IDRD, esta culminado actividades constructivas pista de patinaje

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

FIRMA

Nombre y apellido:

Propietario ☐ Arrendatario ☐

CC No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: Ingeniero(a) Residente de obra

Registro No.

Fecha:

FIRMA

Nombre y apellido:

Cargo: RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Registro No.

Fecha:

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN, PROYECTO O INTERVENCIÓN.

Anexo 8:
Consulta ciudadana
y respuesta



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

FORMATO ATENCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS (SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES)

QUEJA ☐ RECLAMO ☐ SUGERENCIA ☒ FELICITACIÓN ☐ Consulta N° 01

Fecha: 24-06-2019 Lugar:

Medio de recepción

Escrita ☐

Telefónica ☒

Presencial ☐

Datos de consultante

Nombre	Dirección	Teléfono
Nelson Velazquez		3163976964

Descripción de la consulta

Se solicita el retiro de vehículos de la zona peatonal del parque ya que se encuentran obstruyendo el acceso de maquinaria de las obras de la SED y IDRD. De igual manera se solicita hablar con los residentes de obra para subsanar el tema.

Por cuál medio de contacto desea recibir respuesta:

ESCRITO ☒ Correo Electrónico ☐ Telefónico ☐

Seguimiento a la solicitud - Si es consulta de seguimiento-

Acciones a seguir	Fecha cumplimiento	Nombre responsable y cargo del responsable
Se solicita al control de la SED realizar el retiro de vehículos con el fin de no obstruir el tránsito de maquinaria a las obras.	25-06-2019	Alexandra Díaz Residente social Equipo de trabajo

Cierre de la consulta

Fecha: 25-06-2019

Hora: 8:00 Am.

Nombre ciudadano:

Firma a satisfacción:

Nombre del Residente social:

Alexandra Díaz

Firma:

[Firma]

Nombre del Interventor social:

Zaira Olaya

Firma:

N° del contrato: C01-PCCNTR630227



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. EVER JOSÉ SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C, Julio 02 de 2019

Señor
Nelson Velázquez
Presidente JAC barrio Marsella

Apreciado señor Velásquez

El presente tiene como fin dar respuesta a la solicitud realizada por usted el día pasados ante el inconformismo del parqueo vehicular que se realizó frente a las obras de la SED y el IDRD, teniendo en cuenta que de acuerdo a los diseños es una zona netamente peatonal, la cual está siendo usada para el ingreso y salida de materiales por las dos obras que actualmente se desarrollan allí, Por otro lado también se informa que ninguna de las dos obras tienen establecido mediante el PMT la autorizado el parqueo vehicular en la zona, por tal motivo le solicitamos muy cordialmente se informe a la obra que desarrolla el IDR que no pueden dejar los vehículos en esta zona ya que solo está destinado para el ingreso y salida de vehículos de carga con material de obra.

En cuanto a la relación que se tiene con la residente técnica de la obra del IDRD, le informamos que se ha coordinado con ella los ingresos y se ha recuperado el material como poli sombras que fueron dañados por la obra nuestra por tal motivo no entendemos cual es la molestia de ellos en cuanto al desarrollo de las obras.

Sin otro particular

Cordialmente


Alexandra Díaz
Profesional Social

Se deja en
buzón
Julio 26-2019.
M.D.
Hora: 10:00 am.

Anexo 9:
Actas de reunión
Grupo de
participación
ciudadana y
registro de
asistencia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO Segunda Reunión: Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella

Fecha: 03-Mayo-2019	Hoja: 1	De: 1
Dirección: Kra. 69 + 7-90		
Hora de iniciación: 10:20 am	Hora de finalización: 11:00 am	

DESARROLLO: Se inicia la reunión con los participantes del grupo de participación ciudadana. La profesional Sosa informa al grupo participante que se realizará el correspondiente recorrido por las instalaciones del colegio objeto de intervención en compañía del área SISO de la obra, quien será la encargada de dirigir el recorrido teniendo en cuenta las recomendaciones correspondientes.

Se inicia el recorrido por el área de la cocina y comedor, donde el área Técnica realiza la explicación del avance como son instalación de Pisos, falta pulir y brillar el piso, Paredes de la cocina se encuentran con enchape en un porcentaje de avance de un 70%, falta la instalación de accesorios eléctricos y las plantas de la cocina de los cuartos fríos y zonas Calientes.

Se continúa con el recorrido informando sobre los accesos peatonales los cuales están en proceso de construcción ya que a la fecha se está instalando la tubería de aguas residuales y lluvias para el colegio.

Se realizó el recorrido por la zona de las aulas donde se informa el estado de los baños, luminarias, instalación de ventanería con sus correspondientes vidrios, pintura de paredes está pendiente la instalación de pisos ya que este es en tipo vinilo de 6mm aproximadamente y se debe instalar al momento de la entrega final.

Se informa que el tanque de reserva de agua se encuentra en proceso de aprobación por parte de la interventoría ya que los diseños fueron entregados por la firma contratista en días anteriores. Para la próxima semana será realizada la correspondiente aprobación para el inicio de la construcción.





BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL
REGISTRO DE ASISTENCIA

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 3 Mayo 2019 N° de Contrato Contratista: Aca Guen-José Salgado
Tipo de evento: Reunión No 2 Grupo de sostenibilidad
Nombre Profesional Social: Alexandre Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Socon: Ligez Inguarido	Calles 8 y 69 A 36	424 2501	Samy Diaz
2	Raul A. Betancourt	Calles 8 y 69 A 36	3133849033	Raúl A. Betancourt
3	John Silva Portes	DLE Kennedy	3057128591	John Silva Portes
4	Cristian Camilo Jimenez	Calles 27 y 34-93	3138840190	Cristian Camilo Jimenez
5	Samy Gomez	Colegio Marseille	40431547	Samy Gomez
6	Zany Olaver	Interventoria	3502674144	Zany Olaver
7	Johnny Gomez	Contratista	3133745060	Johnny Gomez
8	Alexandre Diaz	Contratista	3229613545	Alexandre Diaz
9	Jose Castañeda Velasquez	Interventoria	3125871261	Jose Castañeda Velasquez
10				
11				

Vo.Bo. Interventoría Social

[Firma]

Firma de la interventor (a)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ

Secretaría de Educación del Distrito

ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

ACTA DE REUNIÓN No.

ASUNTO Reunión N° 1. Grupo participación Ciudadana
Colegio Marsella

Fecha: <u>Marzo 29. 2019</u>	Hoja: <u>1</u>	De: <u>1</u>
Dirección: <u>Kra. 69 + 7-90</u>		
Hora de iniciación: <u>4:00 pm</u>	Hora de finalización: <u>5:00 pm</u>	

DESARROLLO: Se inicia la reunión con los participantes del Grupo de participación Ciudadana. La profesional social Alexandra Díaz, inicia la reunión dando la bienvenida al grupo e informando que es el proceso del inicio de Sostenibilidad que se realiza para el buen funcionamiento de las instalaciones y estructura del colegio, teniendo en cuenta que los representantes son quienes se quedan en la institución y se deben cuidar y mantener las estructuras. Se realiza posteriormente a través del área técnica y mediante prescripción el avance técnico a la fecha, donde se informa:

1. El enchape de los baños,
2. Cubierta de terraza con manto asfáltico
3. La Zona de cocina que ya se encuentra bien adelantada
4. Instalación de pisos en zona de comedor y baños, del segundo nivel
5. Instalación de Ventanerías con estructura metálica y vidrios.

De igual manera se informa que el tanque se está en el proceso de análisis de estructura, ya que está quedando afuera la interperie durante 1 1/2 medio año, por tanto aproximadamente en 15 días se iniciará su proceso constructivo.

La Señora Socorro Manizales:

1. Los vidrios tienen algún tipo de seguridad para los niños? Se pueden instalar rejas?
2. Las zonas peatonales quedan seguras ya que va a haber la circulación de ellos?
3. Que se realizara a la parte de atrás de la nueva estructura del colegio.

A lo que se da respuesta por parte del contratista e interventoría.

1. Los vidrios instalados cuentan con un espesor de 6mm y cuentan con una película de seguridad para la protección de los balcones y los niños especialmente. En cuanto a la instalación de rejas se revisará el presupuesto





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha Marzo 29/2019 N° de Contrato Contratista: Arq. Jose Ever Salgado Salgado
Tipo de evento: Reunión # 1. Grupo Participación Ciudadana - Col MARSELLA
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constanza de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Alejandra Patiño Ospina	Biblioteca	3134495900	Alejandra P.
2	San David Pinzon Albornoz	Biblioteca	3015884446	San David
3	Mica. Magdalena Obesera E.	Cra 69 N° 7-90	3102665679	Obesera
4	Jorge Castañeda Velasquez	Interventoría.	3125871261	Jorge
5	Johnny Garay	Arg. Residente constructor	3133745060	Johnny
6	Raul A. Bernavconet C14	calle 869 N36	3133849073	Raul Bernavconet
7	Nelson Velasquez	Cra 69 N° 8-28	3163976964	Nelson
8	Gerson Lopez Requena	Col. Marsella.	313226002	Gerson
9	MARIA EIRSA RODRIGUEZ	SED/DOCEE	3147/3122472201	Maria Eirsa
10	ZAIRY OLAYA	INTERVENTORIA	3502674144	Zairy Olaya
11	NÉSTOR JOSÉ GÓMEZ SANCHEZ	DILE KEELEDY	3134178380	Nestor Gomez

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



GESTIÓN SOCIAL

DIRECTORIO GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OBRAS

Contratista: Ara. José Ever Salgado Salgado

Responsible de la información: Alexandro Diaz

Fecha de constitución del grupo de participación ciudadana: 22-02-2019

Informe correspondiente al mes de Febrero- Marzo Abru de 2019 (Malla = 2019)

Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

N°	Nombre y apellido	Dirección	téléfono	Firma
1	Alejandra Patiño Ospina		3135893400	Alejandra P.
2	Juan David Pinzon Aldana	Cra 69 F N I-5B	3015884446	[Signature]
3	Fredin Arzueta Cruz	Calle 9A # 69-60	316 67087-88	[Signature]
4	Nelson Velazquez Camacho	Cra 69 8-28	3163976964	Nelson Velazquez
5	KHALA BETHANCOURT CIN	calle 8 LC9A36	3133849073	Bethancourt
6	ABEL DUAR GOMEZ	DILE KENIAHAY	3012345310	[Signature]
7	Gocome Lopez Izquierdo	Cra 69 N° 7-90	313 2266 002	Gocome L.P?
				/
				/
				/
				/
				/

Vo.Bo. Interventoría Social

Handed

Firma de la interventor (a)

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C Junio 12 de 2019

Señora
Socorro López Izquierdo
Grupo de participación ciudadana
Colegio Marsella
Kra 69 # 7-90

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”.

ASUNTO: SOLICITUD CUIDAO Y BUEN USO DELCERRAMIENTO

Respetada Doctora:


La presente tiene como fin solicitar nuevamente a usted y su equipo de trabajo (docentes), el cuidado y protección del cerramiento que delimita la obra con la zona de juego y descanso de los estudiantes del colegio Marsella, ya que en varias ocasiones los estudiantes han violentado la zona demarcada.

Nuevamente queremos recordar que los seguros y pólizas del contrato de la referencia no tienen cobertura al personal que ingrese a esta sin previa autorización. Por tal motivo solicitamos de su valiosa colaboración para llevar a cabo la ejecución del contrato sin ninguna novedad

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3123468266, el lunes y miércoles en horario de 8:00 a 5:00pm.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente


ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

*Recibido
Bogotá 12/2019*

CONTRATISTA:
ARQ. JOSÉ EVER SALAGADO SALGADO

Bogotá D.C. Marzo 06 de 2019

COMSOC.M-002

Doctora
Socorro López Izquierdo
Directora IED Colegio Marsella
Localidad de Kennedy
Kra 69 N° 7-90

REF: CONTRATO N°: C01-PCCNTR630227 "AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO MARSELLA CPF-80017. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

ASUNTO: Solicitud de cuidado cerramiento obra

Respetada Doctora:

La presente tiene como fin solicitar a usted y su equipo de trabajo, el cuidado y protección de la zona demarcada que limita la obra en ejecución, ya que los estudiantes de las dos jornadas la han violentado y usado como paso para rescatar los balones u otros objetos que envían a la zona de obra.

De igual manera queremos informar que los seguros y pólizas de cumplimiento no cubren los accidentes a personal no autorizado, por tal motivo es importante que nos colabore con el uso de estas zonas las cuales se encuentran demarcadas con polisombra y/o cinta peligro.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente


Arq. Johnny Garcés
Residente Técnico de obra.

Recibido
Rosa Ruiz
6. 3. 2019

Anexo 10:
Listado de personal
de obra



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° de Contrato C01-PCCNTR630227 Contratista: JOSÉ EVER SALGADO SALGADO
Responsable de la información: T. S: Alexandra Díaz Teléfono 3229013545
Informe correspondiente al mes de 16 de MAYO al 09 de JUNIO de 2019

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Localidad / barrio
1	JORGE DURANGO	Santa Cecilia	3114330154	SUBA
2	ANTONIO JOSÉ ROBAYO	Kra 78 A # 80-21 sur	3006682595	KENNEDY
3	KAROL MARIO MOICA BORJA	Trasv 68D # 44- 72	3143432846	DELICIAS - KENNEDY
4	NELSON BLANCO GRANADOS			
5	CRISTIAN AVILA	Calle 57 A # 80B- 41	3128950042	CLASS ROMA - KENNEDY
6	WILLIAM GIOVANY JIMENEZ	KRA 7ª ESTWE # 100b -12 SUR	3229400727	USME
7	ALFONSO QUEMBA	KRA 5 # 187-15	3184093504	USAQUEN
8	CARLOS ALFONSO CAMPOS TORRES	AVD, CUND, 14-02	3202613555	SOACHA
9	PABLO RAFAEL ARIAS MIENDOZA			
10	FRANCISCO JAVIER MORALES	Calle 97 # 84-21	3224045507	FONTIBÓN
11	JOSE ARGENIO RUIZ	CLL 94 # 93-28	3012698644	FONTIBON
12	LUIS CARLOS BURGOS		3124289356	RAFAEL URIBE URIBE
13	VICTOR HUGO GONZALEZ RIOS	TRASV. 48 b # 69 f-11 SUR	3213123211	KENNEDY
14	JUAN NOE MAECHA	CLL 47b # 84-21	3125035583	KENNEDY
15	LUIS ALFONSO NARVAEZ	Kra 81G # 66ª-14	3103793924	KENNEDY
16	MIGUEL ANGEL URREA ROBAYO	CLL 116 A sur # 8-79	3194980809	USME



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

17	DIEGO FERNANDO URREA	CLL 116 A SUR # 7-89		USME	
18	CIRO MARTINEZ		3144074867		
19	PEDRO QUIROJA CHACON	KRA 73 # 27-03	3115421605	KENNEDY	
20	RICHARD MANUEL PORTILLO		3214022258		
21	DEVISON LARA CAMPOS	DIAG, 64 #73-51 SUR	3114615297	KENNEDY	
22	ALDAR ALFONSO MONTALVO	KRA 160 # 134-11	3008108670	SUBA	
23	EDWAR OSWALDO GARCES MOLANO	KRA 3 A # 30ª-16 SUR	3213940409	PUEENTE ARANDA	
24	JAVIER NOSSA MONTALA	CLL 181c # 13-91 INT 40 APT. 303	3112591948	USAQUEN	
25	CESAR ALFREDO BOCANEGRA	KRA 5 D # 9ª -21	3194980809	SUBA	
26	LUIS ALFONSO NARVAEZ	KRA 81g # 66ª-14	3103793924	KENNEDY	
27	JUAN NOE MAECHA	Calle 47B # 84-21	3125035583	USME	
28	BALDEMIR RODRIGUEZ LOZADA	Cll 60 sur # 18-31	3163442843	USME	
29	JOSE GUSTAVO PULIDO GOMEZ	Kra 44 A- # 78- 66	3104374083	KENNEDY	
30	MICHAEL QUEMBA	Kra 5 # 187-15		USAQUEN	
31	MAXIMILIANO PORRAGA TORRES				
32	JORGE DURANGO		3114330154	SUBA	
33	ALFREDO BUITRAGO LOPEZ	CALLE 70 # 188-05	3133209751	FONTIBON	



ALCALÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

34	JOSE MARTIN BECERRA	KRA 88 c SUR # 7-49	3202878752	CHAPINERO
35	ELBER VARGAS TORRES	CLL 73 # 26d-07	3135729123	
36	AUDIEN JABID BOHORQUEZ	KRA 112 a # 19-46	3144535228	SUBA
37	PEDRO QUIROJA CHACON			
38	JAIR MANUEL HERRERA			
39	DAVID ALEJANDRO PATIÑO			
40	CRISTIAN MANUEL LLORENTE		3118423680	BOSA
41	NELSON JOSE ALARZA PEREZ			FONTIBON
42	RODRIGO PINEDA	Cll 114 A # 8B este	3144535228	USAQUEN
43	FREDDY ORLEY GUATACA LOZANO	Cll 27ª Bis # 73-64 sur	3112110091	FONTIBON

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° de Contrato C01-PCCNTR630227
Responsable de la información: T. S: Alexandra Díaz
Informe correspondiente al mes de 16 de abril al 15 de mayo de 2019
Contratista: JOSÉ EVER SALGADO SALGADO
Teléfono 3229013545

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Localidad / barrio
1	JOSE HUMBERTO MOTIGUAJA GONZALEZ	Kra 6 a # 2-63	772 8714	Chocotá
2	JUAN MAECHA	Calle 47B # 84-21	3125035583	Soacha
3	MIGUEL ANTONIO FORERO	Kra 58B BIS- # 131 A- 29	3158912437	Usaquén
4	FREDY DOMINGO MOICA BORJA	Conjunto residencial Olivo	3112501254	Soacha
5	KAROL MARIO MOICA BORJA	Trasv 68D # 44- 72	3143432846	Delicias - Kennedy
6	SEBASTIAN OSORIO ARENAS	CLL 74 # 17g-23	3162219029	Fontibón
7	CRISTIAN AVILA	Calle 57 A # 80B- 41	3128950042	Class Roma - Kennedy
8	CARLOS ALBERTO PRIETO VALBUENA	Trasv 48 B # 69F 11 sur	3213123211	Ciudad Bolívar
9	VICTOR HUGO GONZALEZ			
10	LUIS ALFONSO NARVAEZ	Kra 81G # 66a-14	3103793924	Kennedy
11	FRANCISCO JAVIER MORALES	Calle 97 # 84-21	3224045507	Fontibón
12	JOHAN HERRERA			
13	JOSE ARCENIO RUIZ	Calle 94 # 93-28	3208228420	Fontibón
14	MAURO ALEXANDER AVILA PULIDO	Kra 78 B bis A # 73B-23	3116295071	Kennedy
15	VIVIANA MAGALIY MUÑOZ	Kra 3 A # 163- 35	7735662	Usaquén / El Codito
16	JOSE GUSTAVO PULIDO GOMEZ	Kra 44 A- # 78- 66	3104374083	Kennedy
17	HASERT DAVID RODRIGUEZ	KRA 51 # 79 F- 14 SUR	3118568657	Kennedy



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

18	PABLO RAFAEL ARIAS MENDOZA	KRA 19 A # 16 A-10 ESTE	3106781092	Mártires
19	CESAR ALBERTO MARIÑO	CLL 165 " 54-45	3173727891	Suba
20	TITO CORDOBA	Kra 32C # 33 B-41	3213864378	Usme

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° de Contrato C01-PCCNTR630227 Contratista: ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO
 Responsable de la información: T. S. Alexandra Díaz Teléfono 3229013545
 Informe correspondiente al mes de 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL de 2019

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Localidad / barrio
1	JOSE HUMBERTO MOTIGUAJA GONZALEZ	Kra 6 a # 2-63	772 8714	Choconta
2	MAURO ALEXANDER AVILA PULIDO	Kra 78 B bis A # 73B-23	3116295071	Kennedy
3	KAROL MARIO MOICA BORJA	Trasv 68D # 44- 72	3143432846	Delicias - Kennedy
4	FREDY DOMINGO MOICA BORJA	Conjunto residencial Olivo	3112501254	Soacha-
5	MIGUEL ANTONIO FORERO	Kra 58B BIS- # 131 A- 29	3158912437	Usaquén
6	JOSE GUSTAVO PULIDO GOMEZ	Kra 44 A- # 78- 66	3104374083	Kennedy
7	VIVIANA MAGALI MUÑOZ RUIZ	Kra 3 A # 163- 35	7735662	Usaquén / El Codito
8	CRISTIAN AVILA	Cil 57 A # 80B- 41	3128950042	Class Roma - Kennedy
9	WEIMAR CORTES MONTIEL	Cil 156 # 8-61	3154003627	Usaquén
10	LUIS ALFONSO NARVAEZ	Kra 81G # 66a-14	3103793924	Kennedy
11	TITO CORDOBA	Kra 32C # 33 B-41	3213864378	Usme
12	JORGE DAVID DIAZ PALENCIA	Kra 15 # 6-032	3209775033	Soacha
13	MANUEL GUATEQUE	Kra 82B # 11 A-74	3222376364	Soacha
14	EFRAIN CONTRERAS BUITRAGO	Kra 58 B Bis # 131a -73	3158361695	Suba
15	REMINTON YESID QUEMBA MOTAVITA	Kra 5 C # 189-68	3022319378	Soacha
16	MICHAEL QUEMBA BENAVIDES	Kra 5 C # 187-65	3135823932	Soacha
17	IVAN CASTILLO	Kra 88 # 82- 27	3154003627	San Bernardino- Bosa
18	ALFONSO QUEMBA TIBASOSA	Kra 5 C # 187-15	3184093504	Soacha
19	JOSE GREGORIO CARMONA	Kra 104 # 22- 52	3224196414	Fontibón
20	CRISTIAN STEVEN QUEMBA MOTAVITA	Kra 5 c # 189-68	3043857645	Soacha
21	LUIS ENRIQUE PUENTES MIELES	Cil 132B 132- 17	3124739504	Fontibón
22	BRAYAN ANDRES PALOMINO	Kra 129 # 131 A - 21	320 210 8027	Fontibón
23	JEISON FABIAN SANCHEZ	Cil 42B Sur #71- 60	3023691058	Kennedy
24	LIBARDO BERNAL RUIZ	Cil 156 8-61	3154003627	Usaquén
25	OMAR GARCIA	Kra 129 # 131 a- 21	3202108027	Fontibón
26	CAMILO RODRIGUEZ	Cil 46 # 15- 66	3133320272	Teusaquillo



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN SOCIAL

ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

27	JORGE ALBERTO DURANGO MEJIA	Kra 144 # 132-55	3123110685	Fontibón
28	DIEGO FERNENDO MONTAÑA PICO	CLL 44 b SUR # 711- 60	3144253957	Kennedy
29	JUAN DAVID QUEMBA BENAVIDES	KRA 5 # 187-15	3006340381	Usaquén
30	EFRAIN CONTRERAS BUITRAGO	KRA 58B Bis # 131-a- 73	3158361695	Fontibón
31	JOSÉ ALIRO GOMEZ FLOREZ	Trsv. 128 # 147-49	3046375016	Fontibón
32	JUAN CARLOS FORRERO	CLL 80 sur # 16-30	3202738421	Kennedy
33	JORGE ENRIQUE PEDRAZA CRUZ	CLL 161 # 107 A-14	31057204	Fontibón
34	CESAR ALBERTO MARINO	CLL 165 " 54-45	3173727891	Suba
35	SEBASTIAN OSORIO ARENAS	CLL 74 # 17g-23 SUR	3162219029	Fontibón
36	HASERT DAVID RODRIGUEZ ROJAS	KRA 51 # 79 F- 14 SUR	3118568657	Kennedy
37	PABLO RAFAEL ARIAS	KRA 19 A # 16 A-10 ESTE	3106781092	Mártires

Vo. Bo. Interventoría Social

Firma del interventor (a)



ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

GESTIÓN SOCIAL

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Nº de Contrato C01-PCCNTR630227 Contratista: ARQ. JOSÉ EVER SALGADO SALGADO

Responsable de la información: T.S. Alexandra Díaz Teléfono 3229013545

Informe correspondiente al mes de 16 de enero al 15 de febrero de 2019

[illegible]

Vo.Bo. Interventoría Social

Handwritten:

Firma del interventor (a)
