

INFORME MENSUAL 3

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

GRUPO 1 - 2021



DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

Desarrollo	Camila Giraldo y Diana Mora	
Aprueba	Edgar E. Roa C.	

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

2. INTRODUCCIÓN

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

3.3 Relación estado programación de los MV al informe mensual No. 3

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.

4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES

6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

7. INFORME SISO

8. BIOSEGURIDAD

9. ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA
10. ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA
11. ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA
12. ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	INPLAYCO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 860.524.168- 8	
REPRESENTANTE LEGAL:	GONZALO LIÉVANO HOYOS	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	\$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	-----	
VALOR ADICIÓN No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	-----	
VALOR PRÓRROGA No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 615.594.670	

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

CONTRATANTE:		SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:		CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:		MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL		CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.		BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:		TV 21 Bis No 59-57 BOGOTÁ D.C	
TELÉFONOS:		3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consortiado No. 1.		SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT		900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL		MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.		1.082.774.968	
Consortiado No. 2.		ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT		822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.		93.123.714	
PARTICIPACIÓN			
SAFRID INGENIERÍA S.A.S		50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S		50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR		CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO		18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN		2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO		5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO		\$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1		-----	
VALOR ADICIÓN No. 1		\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1		-----	
VALOR PRÓRROGA No. 1		\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 5.130.409.981	


2. INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.

En el desarrollo de las actividades en el mes de OCTUBRE-NOVIEMBRE de 2021, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra.

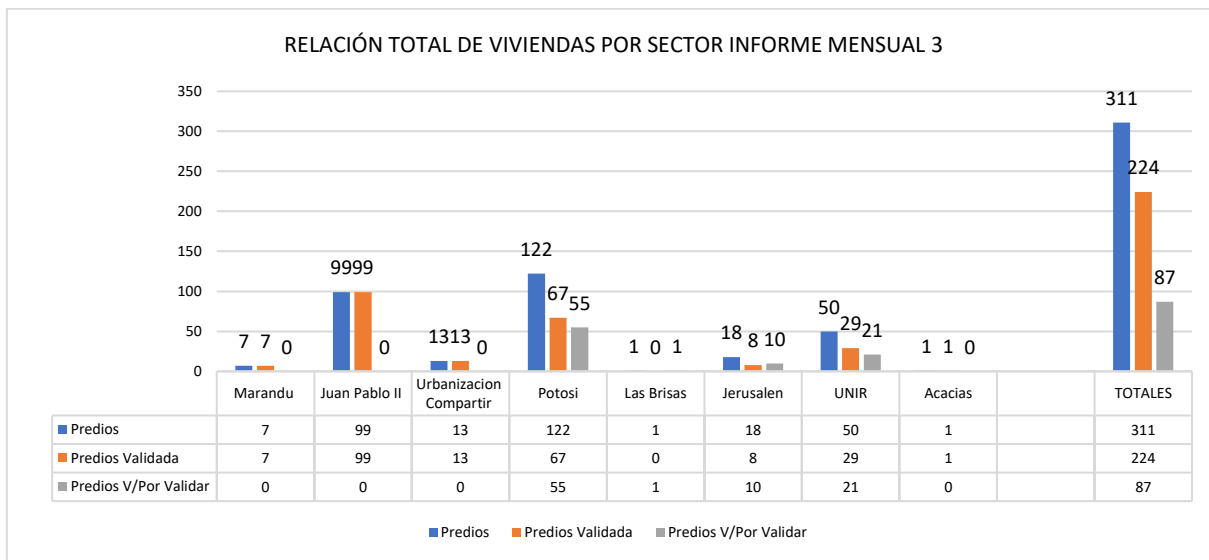

Para el informe mensual 03, el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020**, se encuentra en cumplimiento de las actividades de validación según la programación de obra; ya que presentan 224 validaciones ejecutadas frente a 169 relacionadas en la programación de obra al 29-11-2021.

A continuación, se muestran las viviendas según la programación de obra, aquí se exponen los siguientes resultados: De los 169 MV correspondientes a la programación de obra al 29 de NOVIEMBRE de 2021, 224 ya finalizaron su proceso de validación de manera satisfactoria.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia un adelanto de 55 validaciones respecto a la programación, esto implica la posibilidad de iniciar actividades de obra en una mayor cantidad de viviendas. Claro está que esta decisión es potestad del contratista.

RELACIÓN DE MV VALIDADOS AL INFORME 3

ÍTEM	COD. 1(V); (0)NV	MV	VALIDADA	OBSERVACIÓN
1	1	MVCB_3650	SI	VALIDADA
			NO	
2	1	MVCB_3669	SI	VALIDADA
			NO	
3	1	MVCB_3433	SI	VALIDADA
			NO	
4	1	MVCB_3410	SI	VALIDADA
			NO	
5	1	MVCB_3396	SI	VALIDADA
			NO	
6	1	MVCB_2621	SI	VALIDADA
			NO	
7	1	MVCB_2615	SI	VALIDADA
			NO	
8	1	MVCB_3425	SI	VALIDADA
			NO	
9	1	MVCB_3424	SI	VALIDADA
			NO	
10	1	MVCB_4498	SI	VALIDADA
			NO	
11	1	MVCB_4475	SI	VALIDADA
			NO	
12	1	MVCB_4351	SI	VALIDADA
			NO	
13	1	MVCB_4561	SI	VALIDADA
			NO	
14	1	MVCB_4438	SI	VALIDADA
			NO	
15	1	MVCB_4363	SI	VALIDADA
			NO	
16	1	MVCB_4365	SI	VALIDADA
			NO	
17	1	MVCB_4366	SI	VALIDADA
			NO	
18	1	MVCB_4900	SI	VALIDADA
			NO	
19	1	MVCB_3876	SI	VALIDADA
			NO	
20	1	MVCB_3888	SI	VALIDADA
			NO	
21	1	MVCB_3880	SI	VALIDADA
			NO	
22	1	MVCB_3885	SI	VALIDADA
			NO	
23	1	MVCB_4811	SI	VALIDADA
			NO	
24	1	MVCB_4801	SI	VALIDADA
			NO	
25	1	MVCB_4791	SI	VALIDADA
			NO	
26	1	MVCB_0005	SI	VALIDADA
			NO	
27	1	MVCB_0481	SI	VALIDADA
			NO	
28	1	MVCB_0474	SI	VALIDADA
			NO	
29	1	MVJE_1068	SI	VALIDADA
			NO	
30	1	MVJE_251	SI	VALIDADA
			NO	

31	1	MVJE_380	SI	VALIDADA
			NO	
32	1	MVJE_928	SI	VALIDADA
			NO	
33	1	MVJE_133	SI	VALIDADA
			NO	
34	1	MVJE_359	SI	VALIDADA
			NO	
35	1	MVJE_022	SI	VALIDADA
			NO	
36	1	MVJE_1042	SI	VALIDADA
			NO	
37	1	MVJE_174	SI	VALIDADA
			NO	
38	1	MVJE_941	SI	VALIDADA
			NO	
39	1	MVJE_457	SI	VALIDADA
			NO	
40	1	MVJE_942	SI	VALIDADA
			NO	
41	1	MVJE_077	SI	VALIDADA
			NO	
42	1	MVJE_1016	SI	VALIDADA
			NO	
43	1	MVJE_1017	SI	VALIDADA
			NO	
44	1	MVJE_907	SI	VALIDADA
			NO	
45	0	MVJE_1045	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
46	0	MVJE_079	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
47	0	MVJE_1028	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
48	0	MVJE_1063	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
49	0	MVJE_916	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
50	0	MVJE_920	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
51	0	MVJE_1056	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
52	0	MVJE_992	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
53	0	MVJE_179	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
54	0	MVJE_341	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
55	0	MVJE_1095	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
56	0	MVJE_346	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
57	0	MVJE_345	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
58	0	MVJE_991	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
59	0	MVJE_989	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
60	0	MVJE_1078	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
61	0	MVJE_1125	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
62	0	MVJE_946	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
63	0	MVJE_885	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
64	1	MVCB_4892	SI	VALIDADA

			NO	
65	1	MVCB_4644	SI	VALIDADA
			NO	
66	1	MVCB_4629	SI	VALIDADA
			NO	
67	1	MVCB_4628	SI	VALIDADA
			NO	
68	1	MVCB_4272	SI	VALIDADA
			NO	
69	1	MVCB_4152	SI	VALIDADA
			NO	
70	1	MVCB_4689	SI	VALIDADA
			NO	
71	1	MVCB_4694	SI	VALIDADA
			NO	
72	1	MVCB_4744	SI	VALIDADA
			NO	
73	1	MVCB_4732	SI	VALIDADA
			NO	
74	1	MVCB_4233	SI	VALIDADA
			NO	
75	1	MVCB_4219	SI	VALIDADA
			NO	
76	1	MVCB_4401	SI	VALIDADA
			NO	
77	1	MVCB_4407	SI	VALIDADA
			NO	
78	1	MVCB_4929	SI	VALIDADA
			NO	
79	1	MVCB_4843	SI	VALIDADA
			NO	
80	1	MVCB_4842	SI	VALIDADA
			NO	
81	1	MVCB_4838	SI	VALIDADA
			NO	
82	1	MVCB_2243	SI	VALIDADA
			NO	
83	1	MVCB_3839	SI	VALIDADA
			NO	
84	1	MVCB_3863	SI	VALIDADA
			NO	
85	1	MVCB_3809	SI	VALIDADA
			NO	
86	1	MVCB_3803	SI	VALIDADA
			NO	
87	1	MVCB_3798	SI	VALIDADA
			NO	
88	1	MVCB_3822	SI	VALIDADA
			NO	
89	1	MVCB_1072	SI	VALIDADA
			NO	
90	1	MVCB_0213	SI	VALIDADA
			NO	
91	1	MVCB_4968	SI	VALIDADA
			NO	
92	0	MVJE_065	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
93	0	MVJE_184	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
94	1	MVJE_545	SI	VALIDADA
			NO	
95	1	MVJE_110	SI	VALIDADA
			NO	
96	1	MVJE_247	SI	VALIDADA
			NO	
97	1	MVJE_233	SI	VALIDADA
			NO	

98	1	MVJE_889	SI	VALIDADA
			NO	
99	1	MVJE_402	SI	VALIDADA
			NO	
100	1	MVJE_892	SI	VALIDADA
			NO	
101	0	MVJE_136	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
102	1	MVJE_962	SI	VALIDADA
			NO	
103	1	MVJE_1148	SI	VALIDADA
			NO	
104	1	MVJE_985	SI	VALIDADA
			NO	
105	1	MVJE_295	SI	VALIDADA
			NO	
106	1	MVJE_1006	SI	VALIDADA
			NO	
107	1	MVJE_957	SI	VALIDADA
			NO	
108	0	MVJE_1043	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
109	0	MVJE_984	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
110	0	MVJE_959	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
111	0	MVJE_968	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
112	0	MVJE_923	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
113	0	MVJE_973	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
114	0	MVJE_950	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
115	0	MVJE_953	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
116	0	MVJE_948	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
117	0	MVJE_1015	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
118	0	MVJE_489	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
119	0	MVJE_440	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
120	0	MVJE_343	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
121	0	MVJE_204	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
122	0	MVJE_441	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
123	0	MVJE_546	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
124	1	MVJE_254	SI	VALIDADA
			NO	
125	1	MVJE_243	SI	VALIDADA
			NO	
126	0	MVJE_222	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
127	1	MVCB_4754	SI	VALIDADA
			NO	
128	1	MVCB_4751	SI	VALIDADA
			NO	
129	1	MVCB_3311	SI	VALIDADA
			NO	
130	1	MVCB_3353	SI	VALIDADA
			NO	
131	1	MVCB_3351	SI	VALIDADA

			NO	
132	1	MVCB_3327	SI	VALIDADA
			NO	
133	1	MVCB_3329	SI	VALIDADA
			NO	
134	1	MVCB_3191	SI	VALIDADA
			NO	
135	1	MVCB_3360	SI	VALIDADA
			NO	
136	0	MVUN_486	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
137	1	MVUN_484	SI	VALIDADA
			NO	
138	0	MVUN_480	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
139	1	MVUN_106	SI	VALIDADA
			NO	
140	1	MVUN_464	SI	VALIDADA
			NO	
141	1	MVUN_424	SI	VALIDADA
			NO	
142	1	MVUN_469	SI	VALIDADA
			NO	
143	1	MVUN_099	SI	VALIDADA
			NO	
144	1	MVUN_478	SI	VALIDADA
			NO	
145	1	MVUN_171	SI	VALIDADA
			NO	
146	1	MVUN_588	SI	VALIDADA
			NO	
147	1	MVUN_372	SI	VALIDADA
			NO	
148	0	MVUN_017	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
149	1	MVUN_241	SI	VALIDADA
			NO	
150	1	MVUN_115	SI	VALIDADA
			NO	
151	1	MVUN_128	SI	VALIDADA
			NO	
152	1	MVUN_238	SI	VALIDADA
			NO	
153	1	MVUN_182	SI	VALIDADA
			NO	
154	1	MVUN_299	SI	VALIDADA
			NO	
155	1	MVUN_295	SI	VALIDADA
			NO	
156	1	MVUN_290	SI	VALIDADA
			NO	
157	1	MVUN_173	SI	VALIDADA
			NO	
158	1	MVUN_174	SI	VALIDADA
			NO	
159	1	MVUN_132	SI	VALIDADA
			NO	
160	0	MVUN_276	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
161	1	MVUN_222	SI	VALIDADA
			NO	
162	1	MVUN_770	SI	VALIDADA
			NO	
163	1	MVUN_366	SI	VALIDADA
			NO	
164	1	MVUN_151	SI	VALIDADA
			NO	


165	0	MVUN_334	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
166	0	MVUN_332	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
167	0	MVUN_374	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
168	0	MVUN_398	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
169	0	MVUN_397	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
170	0	MVUN_492	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
171	0	MVUN_196	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
172	1	MVUN_379	SI	VALIDADA
			NO	
173	1	MVUN_146	SI	VALIDADA
			NO	
174	0	MVUN_218	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
175	0	MVUN_160	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
176	0	MVUN_187	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
177	0	MVUN_443	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
178	0	MVUN_405	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
179	0	MVUN_201	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
180	0	MVUN_186	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
181	0	MVUN_208	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
182	0	MVUN_205	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
183	0	MVUN_166	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
184	1	MVUN_416	SI	VALIDADA
			NO	
185	1	MVUN_391	SI	VALIDADA
			NO	
186	1	MVCB_2244	SI	VALIDADA
			NO	
187	1	MVCB_2242	SI	VALIDADA
			NO	
188	1	MVCB_2411	SI	VALIDADA
			NO	
189	1	MVCB_2413	SI	VALIDADA
			NO	
190	1	MVCB_2414	SI	VALIDADA
			NO	
191	1	MVCB_2376	SI	VALIDADA
			NO	
192	1	MVCB_2355	SI	VALIDADA
			NO	
193	1	MVCB_2278	SI	VALIDADA
			NO	
194	1	MVCB_2277	SI	VALIDADA
			NO	
195	1	MVCB_4175	SI	VALIDADA
			NO	
196	1	MVCB_4185	SI	VALIDADA
			NO	
197	1	MVCB_4188	SI	VALIDADA
			NO	
198	1	MV_42886-IDU	SI	VALIDADA

			NO	
199	1	MVCB_4198	SI	VALIDADA
			NO	
200	1	MVCB_4072	SI	VALIDADA
			NO	
201	1	MVCB_4085	SI	VALIDADA
			NO	
202	1	MVCB_4096	SI	VALIDADA
			NO	
203	1	MVCB_4867	SI	VALIDADA
			NO	
204	1	MVCB_3793	SI	VALIDADA
			NO	
205	1	MVCB_3752	SI	VALIDADA
			NO	
206	1	MVCB_3773	SI	VALIDADA
			NO	
207	1	MVCB_3771	SI	VALIDADA
			NO	
208	1	MVCB_3748	SI	VALIDADA
			NO	
209	1	MVCB_3721	SI	VALIDADA
			NO	
210	1	MVCB_3706	SI	VALIDADA
			NO	
211	1	MVCB_3703	SI	VALIDADA
			NO	
212	1	MVCB_0660	SI	VALIDADA
			NO	
213	1	MVCB_0666	SI	VALIDADA
			NO	
214	1	MVJE_572	SI	VALIDADA
			NO	
215	1	MVJE_358	SI	VALIDADA
			NO	
216	1	MVJE_604	SI	VALIDADA
			NO	
217	1	MVJE_429	SI	VALIDADA
			NO	
218	1	MVJE_574	SI	VALIDADA
			NO	
219	0	MVJE_319	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
220	0	MVJE_559	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
221	0	MVJE_557	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
222	0	MVJE_561	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
223	0	MVJE_162	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
224	0	MVJE_400	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
225	1	MVJE_453	SI	VALIDADA
			NO	
226	0	MVJE_581	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
227	1	MVJE_275	SI	VALIDADA
			NO	
228	1	MVJE_032	SI	VALIDADA
			NO	
229	1	MVJE_011	SI	VALIDADA
			NO	
230	0	MVJE_010	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
231	1	MVJE_050	SI	VALIDADA
			NO	


232	1	MVJE_351	SI	VALIDADA
			NO	
233	1	MVJE_356	SI	VALIDADA
			NO	
234	1	MVJE_573	SI	VALIDADA
			NO	
235	1	MVJE_452	SI	VALIDADA
			NO	
236	1	MVJE_405	SI	VALIDADA
			NO	
237	1	MVJE_149	SI	VALIDADA
			NO	
238	1	MVJE_624	SI	VALIDADA
			NO	
239	1	MVJE_293	SI	VALIDADA
			NO	
240	1	MVJE_241	SI	VALIDADA
			NO	
241	1	MVJE_164	SI	VALIDADA
			NO	
242	1	MVJE_009	SI	VALIDADA
			NO	
243	1	MVJE_360	SI	VALIDADA
			NO	
244	1	MVJE_434	SI	VALIDADA
			NO	
245	1	MVJE_435	SI	VALIDADA
			NO	
246	0	MVJE_1139	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
247	1	MVJE_321	SI	VALIDADA
			NO	
248	1	MVJE_868	SI	VALIDADA
			NO	
249	1	MVJE_030	SI	VALIDADA
			NO	
250	1	MVCB_2049	SI	VALIDADA
			NO	
251	1	MVCB_2053	SI	VALIDADA
			NO	
252	1	MVCB_2055	SI	VALIDADA
			NO	
253	1	MVCB_2034	SI	VALIDADA
			NO	
254	1	MVCB_2013	SI	VALIDADA
			NO	
255	1	MVCB_2019	SI	VALIDADA
			NO	
256	1	MVCB_2020	SI	VALIDADA
			NO	
257	1	MVCB_2252N	SI	VALIDADA
			NO	
258	1	MVCB_2252	SI	VALIDADA
			NO	
259	1	MVCB_4043	SI	VALIDADA
			NO	
260	1	MVCB_3998	SI	VALIDADA
			NO	
261	1	MVCB_4003	SI	VALIDADA
			NO	
262	1	MVCB_4009	SI	VALIDADA
			NO	
263	1	MVCB_4011	SI	VALIDADA
			NO	
264	1	MVCB_3982	SI	VALIDADA
			NO	
265	1	MVCB_3983	SI	VALIDADA

			NO	
266	1	MVCB_3984	SI	VALIDADA
			NO	
267	1	MVCB_3987	SI	VALIDADA
			NO	
268	1	MVCB_3991	SI	VALIDADA
			NO	
269	1	MVCB_3709	SI	VALIDADA
			NO	
270	1	MVCB_3710	SI	VALIDADA
			NO	
271	1	MVCB_0897	SI	VALIDADA
			NO	
272	1	MV_42838-IDU	SI	VALIDADA
			NO	
273	1	MVCB_1020	SI	VALIDADA
			NO	
274	1	MVCB_0838	SI	VALIDADA
			NO	
275	1	MVCB_0837	SI	VALIDADA
			NO	
276	1	MVCB_0828	SI	VALIDADA
			NO	
277	1	MVJE_058	SI	VALIDADA
			NO	
278	0	MVJE_1000	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
279	1	MVJE_326	SI	VALIDADA
			NO	
280	1	MVJE_1087	SI	VALIDADA
			NO	
281	1	MVJE_909	SI	VALIDADA
			NO	
282	1	MVJE_880	SI	VALIDADA
			NO	
283	1	MVJE_1007	SI	VALIDADA
			NO	
284	1	MVJE_244	SI	VALIDADA
			NO	
285	1	MVJE_224	SI	VALIDADA
			NO	
286	1	MVJE_1049	SI	VALIDADA
			NO	
287	1	MVJE_066	SI	VALIDADA
			NO	
288	1	MVJE_1058	SI	VALIDADA
			NO	
289	1	MVJE_323	SI	VALIDADA
			NO	
290	1	MVJE_882	SI	VALIDADA
			NO	
291	1	MVJE_431	SI	VALIDADA
			NO	
292	1	MVJE_062	SI	VALIDADA
			NO	
293	1	MVJE_264	SI	VALIDADA
			NO	
294	1	MVJE_180	SI	VALIDADA
			NO	
295	0	MVJE_1084	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
296	0	MVJE_938	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
297	0	MVJE_081	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
298	0	MVJE_1009	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	

299	0	MVJE_901	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
300	0	MVJE_1104	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
301	0	MVJE_1067	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
302	0	MVJE_881	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
303	0	MVJE_929	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
304	0	MVJE_593	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
305	0	MVJE_999	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
306	0	MVJE_937	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
307	0	MVJE_1024	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
308	0	MVJE_1035	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
309	0	MVJE_1118	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
310	0	MVJE_767	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	
311	0	MVJE_1137	SI	PENDIENTE VALIDACIÓN
			NO	

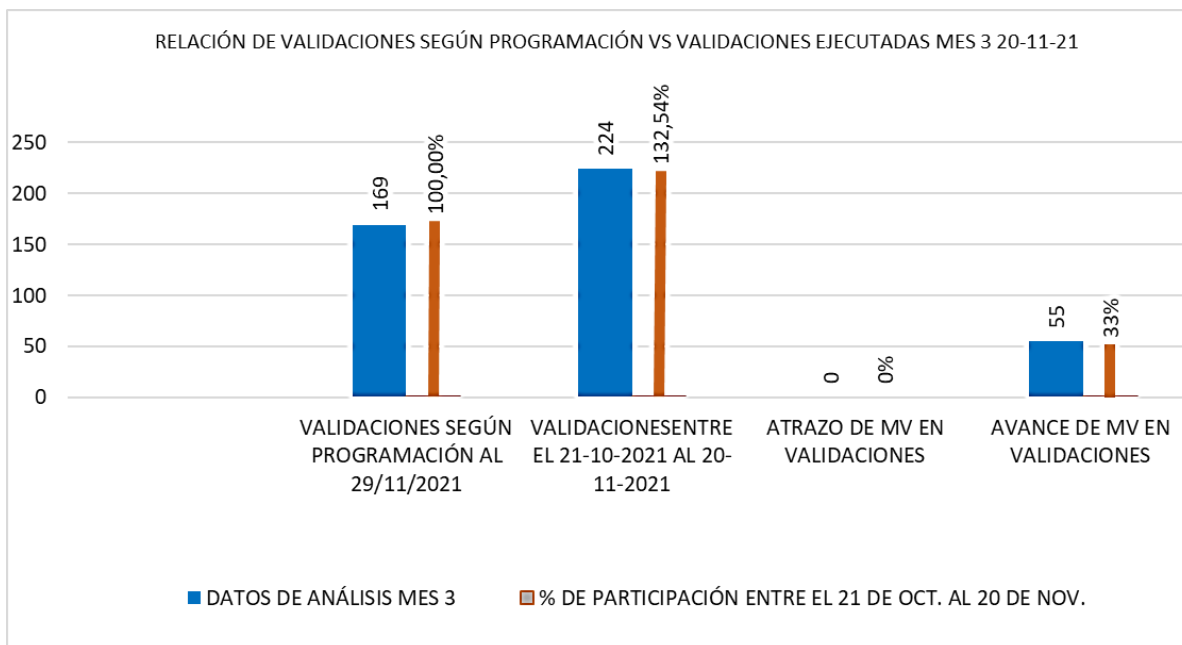

Para cada una de las viviendas durante los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE del presente informe, se registran los siguientes indicadores, estos datos muestran el avance por grupos porcentual de las viviendas.

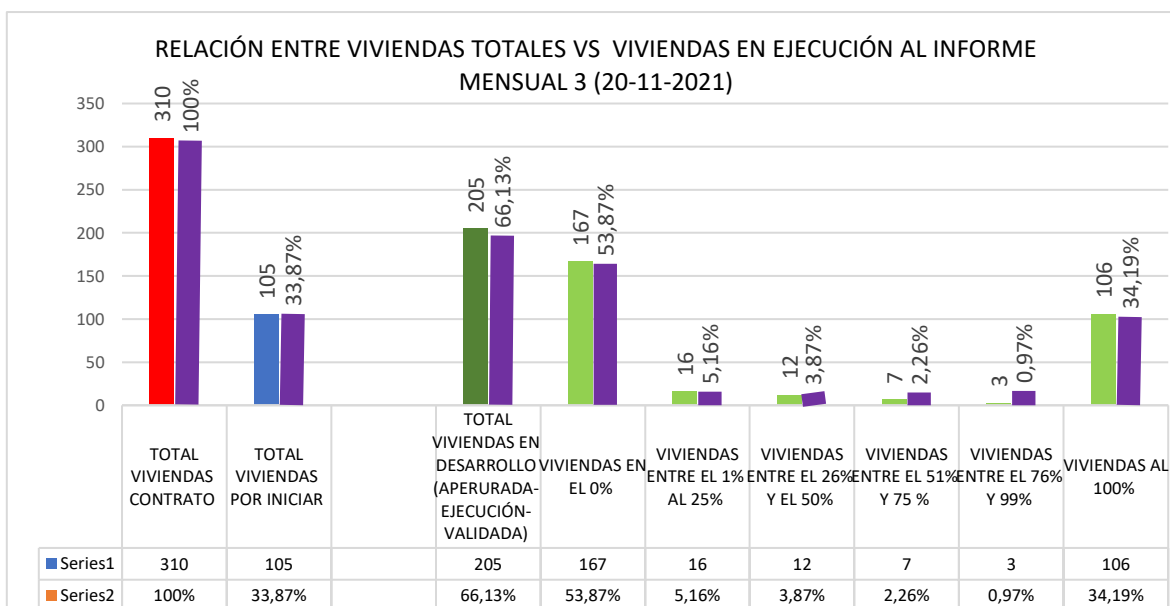

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.


(En este caso, el interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo).

Nombre del beneficiario (a): MARÍA DEL CARMEN ALFONSO

MV 1000

Desarrollo: POTOSÍ

MV 1000 MARÍA DEL CARMEN ALFONSO. ZONA COMPLEJA – POTOSÍ - DOS 2 VISITAS FALLIDAS – ARGUMENTA QUE NO DEJA INGRESAR (Temas Personales)

[illegible]

Concertación y respuesta a la inquietud

Se concreta enviar correo certificado para realizar visita, la correspondencia no pudo ser entregada, es este sentido se habla nuevamente con la beneficiaria y se acordó visita para el lunes 29 de noviembre 11 am.

MVJE 010
Desarrollo: JERUSALÉN

MV 010 VALIDACIÓN NO REALIZADA POR TEMAS ESTRUCTURALES



Concertación y respuesta a la inquietud

Se concreta Visita con la SDHT para el 19 de noviembre y verificar si es posible desarrollar las actividades, de esta visita, el resultado es que las actividades se pueden desarrollar.

3.3 Relación estado programación de los MV al informe mensual No. 3

Para el informe Mensual No. 3, se presenta la siguiente información por MV que da cuenta del cumplimiento en el desarrollo de las actividades. Así mismo, se aclara que por temas de logística el contratista ajusta las viviendas a ejecutar, ya que por actividades como la instalación de cubiertas, que requiere un manejo especial por la normativa distrital y nacional, adelanta algunas viviendas que están dentro de la programación, pero con fechas diversas para dar cumplimiento a la cantidad de validaciones, así como de entregas. Esto no significa que se encuentre en atraso, sino que modifica el momento de inicio de de actividades.

Nombre de tarea	% completado	Duración	Duración restante	Comienzo	Fin	Costo	% físico completado	Texto2
FASE I	42%	140 días	81,69 días	mié 18/08/21	mié 2/02/22	\$ 5.130.409.981	0%	
HABITARTE	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	0%	
MVCB_4629	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2244	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2411	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2413	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2414	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4929	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4407	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4561	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4791	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2277	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3706	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3773	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3984	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4043	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4198	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3991	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3998	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4185	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2615	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4003	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4365	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4366	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4011	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2053	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2055	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4401	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2252	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2242	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3669	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3710	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3798	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_3809	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3863	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3880	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3983	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4009	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4438	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4498	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4754	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4811	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4867	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0005	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0213	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0474	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0481	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0660	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0828	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0837	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0838	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0897	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_1072	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3410	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3433	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3876	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3888	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4351	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4363	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4475	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4751	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4900	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2013	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2019	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2020	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2034	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2049	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_4968	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3721	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3982	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3987	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4072	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4096	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4219	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MV_42838-IDU	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MV_42886-IDU	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3803	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3839	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_1020	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2355	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4644	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0666	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2278	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2376	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3191	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3329	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3396	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3650	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3703	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3709	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3748	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3752	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3793	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3822	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3885	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4175	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4628	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4694	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4732	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4744	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4801	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_4838	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4842	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4843	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4892	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2243	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2621	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3327	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3311	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3424	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3425	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4085	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4188	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4689	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3771	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4233	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3353	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4152	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4272	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3351	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3360	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	\$ 0	100%	VALIDADA
UNIR	81%	45 días	8,4 días	lun 4/10/21	lun 29/11/21	\$ 0	0%	
MVUN_017	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_099	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_115	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_128	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_132	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_146	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_151	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_160	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_171	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_173	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_174	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_182	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVUN_186	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_196	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_205	100%	15 días	0 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_222	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	0%	
MVUN_290	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_295	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_299	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_332	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_334	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_372	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_374	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_379	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_391	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_397	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_398	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_405	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	0%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_416	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_424	100%	15 días	0 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_443	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_464	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_469	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_480	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_484	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_486	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_492	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_588	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_770	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_187	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_218	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_106	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVUN_166	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_201	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_208	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_238	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_241	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_276	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_366	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_478	53%	15 días	7 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
JERUSALÉN	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_009	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_010	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_022	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_030	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_032	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_058	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_062	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_066	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_077	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_079	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_081	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_133	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_149	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_164	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_180	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_184	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_204	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_224	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_275	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_293	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_323	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_341	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	

MVJE_346	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_356	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_359	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_380	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_405	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_431	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_457	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_011	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_050	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_065	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_136	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_174	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_233	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_244	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_247	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_264	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_295	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_343	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_345	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_360	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_402	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_434	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_435	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_441	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_489	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_545	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_573	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_593	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_251	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_452	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_358	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVJE_453	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_557	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_429	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_546	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_572	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_162	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_243	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_254	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_319	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_400	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_574	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_581	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_559	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_179	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_241	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_321	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_440	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_561	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_110	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1006	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1007	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1009	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1015	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1016	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1017	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1028	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1042	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1043	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1045	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1049	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1056	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1058	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVJE_1063	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1067	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_1068	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_222	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_326	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_881	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	0%	
MVJE_882	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_889	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_892	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_901	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_907	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_909	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_916	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_920	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_923	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_928	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_929	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_941	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_942	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_950	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_953	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_957	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_959	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_962	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_968	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_991	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_992	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_999	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1137	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1139	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1024	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_868	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVJE_880	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_989	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1000	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1035	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1078	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1095	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_767	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_885	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_937	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_938	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_946	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_948	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_973	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_984	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_985	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1084	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1087	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1104	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1118	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1125	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	0%	
MVJE_1148	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_351	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_624	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_604	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	\$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
FASE 2	37%	115 días	72,91 días	mié 15/09/21	mié 2/02/22	\$ 5.130.409.981	0%	
EJECUCIÓN OBRA	37%	115 días	72,91 días	mié 15/09/21	mié 2/02/22	\$ 5.130.409.981	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 2/12/21	jue 2/12/21	\$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 16/12/21	jue 16/12/21	\$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 13/01/22	jue 13/01/22	\$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 27/01/22	jue 27/01/22	\$ 0	0%	
HABITARTE	86%	35 días	5,01 días	lun 4/10/21	mié 17/11/21	\$ 1.745.113.122	0%	

MVCB_4629	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.772.909	100%	ENTREGADA
MVCB_2244	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.220.291	100%	ENTREGADA
MVCB_2411	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.161.043	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2413	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.333.846	100%	ENTREGADA
MVCB_2414	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.307.938	100%	ENTREGADA
MVCB_4929	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.309.372	100%	ENTREGADA
MVCB_4407	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.185.678	100%	ENTREGADA
MVCB_4561	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.123.232	100%	ENTREGADA
MVCB_4791	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.240.673	100%	ENTREGADA
MVCB_2277	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.526.483	100%	ENTREGADA
MVCB_3706	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.654.587	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3773	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.155.339	100%	ENTREGADA
MVCB_3984	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.400.432	85%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4043	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.733.266	0%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4198	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.714.758	100%	ENTREGADA
MVCB_3991	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 13.470.639	100%	ENTREGADA
MVCB_3998	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.664.186	100%	ENTREGADA
MVCB_4185	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.712.337	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2615	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.648.857	100%	ENTREGADA
MVCB_4003	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.792.023	40%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4365	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.169.907	95%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4366	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.982.349	100%	ENTREGADA
MVCB_4011	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.027.382	100%	ENTREGADA
MVCB_2053	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.763.008	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2055	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.988.208	100%	ENTREGADA
MVCB_4401	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.216.898	100%	ENTREGADA
MVCB_2252	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.245.501	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2242	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.053.996	100%	ENTREGADA
MVCB_3669	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.050.103	100%	ENTREGADA
MVCB_3710	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.154.600	100%	ENTREGADA
MVCB_3798	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.378.630	100%	ENTREGADA
MVCB_3809	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.370.111	100%	ENTREGADA
MVCB_3863	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.097.047	100%	ENTREGADA

MVCB_3880	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.829.239	100%	ENTREGADA
MVCB_3983	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.042.385	100%	ENTREGADA
MVCB_4009	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.063.784	100%	ENTREGADA
MVCB_4438	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.978.389	100%	ENTREGADA
MVCB_4498	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.949.109	100%	ENTREGADA
MVCB_4754	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.052.384	100%	ENTREGADA
MVCB_4811	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 13.886.751	100%	ENTREGADA
MVCB_4867	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.966.393	100%	ENTREGADA
MVCB_0005	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.060.815	100%	ENTREGADA
MVCB_0213	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 15.315.241	100%	ENTREGADA
MVCB_0474	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.854.542	55%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0481	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.631.393	76%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0660	100%	30 días	0 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	\$ 14.550.454	100%	ENTREGADA
MVCB_0828	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.880.198	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0837	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.026.793	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0838	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.525.916	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0897	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.109.416	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_1072	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.479.082	50%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3410	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.398.820	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3433	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.362.664	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3876	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 11.792.829	67%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3888	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.606.867	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4351	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.864.573	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4363	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.476.620	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4475	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.274.749	69%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4751	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.126.351	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4900	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.629.730	64%	EN EJECUCIÓN- ATRASADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2013	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.046.330	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2019	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.294.500	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2020	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.975.065	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2034	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.882.006	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVCB_2049	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 11.106.257	0%	
MVCB_4968	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.005.724	35%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3721	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.110.686	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3982	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.864.180	100%	ENTREGADA
MVCB_3987	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.186.514	100%	ENTREGADA
MVCB_4072	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.346.812	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4096	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.978.130	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4219	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.422.674	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MV_42838-IDU	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 16.304.994	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MV_42886-IDU	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 16.234.000	0%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3803	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.936.279	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3839	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.607.166	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_1020	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.972.294	0%	
MVCB_2355	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.829.917	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4644	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.217.199	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0666	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.679.225	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2278	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.271.663	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2376	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.744.051	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3191	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.195.359	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3329	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.200.411	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3396	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.378.252	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3650	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.626.654	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3703	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.899.737	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3709	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.672.720	100%	ENTREGADA
MVCB_3748	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.107.381	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3752	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.979.775	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3793	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.000.216	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3822	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.109.359	100%	ENTREGADA
MVCB_3885	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.060.350	0%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4175	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.858.083	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4628	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.420.470	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVCB_4694	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.570.393	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4732	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.124.540	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4744	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.150.957	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4801	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.747.423	60%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4838	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.624.409	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4842	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.037.669	0%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4843	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.118.172	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4892	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.431.341	35%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2243	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.023.018	35%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2621	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.095.120	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3327	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.083.334	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3311	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.028.726	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3424	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.736.586	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3425	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.491.918	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4085	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.725.630	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4188	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.154.965	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4689	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.741.686	0%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3771	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.109.352	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4233	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.919.921	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3353	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.229.626	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4152	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.479.335	0%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4272	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.019.571	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3351	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 15.485.112	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3360	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.098.772	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
UNIR	23%	35 días	26,95 días	jue 21/10/21	vie 3/12/21	\$ 707.169.629	0%	
MVUN_017	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.886.179	0%	
MVUN_099	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.823.540	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_115	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.827.754	0%	
MVUN_128	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 12.437.445	47%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_132	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.586.448	38%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_146	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.912.999	51%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVUN_151	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.905.222	5%	EN EJECUCIÓN- ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_160	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.879.655	0%	
MVUN_171	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.050.033	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_173	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.495.972	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_174	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 13.809.097	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_182	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 11.550.891	0%	
MVUN_186	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.856.926	0%	
MVUN_196	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.845.751	0%	
MVUN_205	77%	30 días	7 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	\$ 14.785.713	0%	
MVUN_222	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.359.954	6%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_290	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.259.638	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_295	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.903.415	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_299	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.732.725	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_332	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.875.753	0%	
MVUN_334	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.704.974	0%	
MVUN_372	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.745.643	0%	
MVUN_374	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.905.741	0%	
MVUN_379	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 12.732.757	5%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_391	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 11.278.168	0%	
MVUN_397	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 11.312.669	0%	
MVUN_398	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.781.556	0%	
MVUN_405	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 13.916.798	0%	
MVUN_416	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 14.657.790	0%	
MVUN_424	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	\$ 12.304.478	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_443	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.835.929	0%	
MVUN_464	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 13.625.717	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_469	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.391.733	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_480	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 13.955.235	0%	
MVUN_484	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 12.231.105	100%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_486	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.135.421	0%	
MVUN_492	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.893.414	0%	
MVUN_588	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.202.574	43%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN

MVUN_770	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.896.848	2%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_187	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 11.955.282	0%	
MVUN_218	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 13.548.492	0%	
MVUN_106	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.797.976	0%	
MVUN_166	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.036.113	0%	
MVUN_201	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.932.402	0%	
MVUN_208	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.049.204	0%	
MVUN_238	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 13.983.398	0%	
MVUN_241	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.039.192	49%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_276	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.514.793	0%	
MVUN_366	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.710.968	0%	
MVUN_478	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.308.148	0%	
JERUSALÉN	0%	30 días	30 días	jue 9/12/21	jue 13/01/22	\$ 2.678.127.231	0%	
MVJE_009	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.498.766	0%	
MVJE_010	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.849.110	0%	
MVJE_022	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.842.430	0%	
MVJE_030	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.214.554	0%	
MVJE_032	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.563.995	30%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_058	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.247.104	0%	
MVJE_062	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.123.130	0%	
MVJE_066	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.090.065	25%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_077	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.193.866	0%	
MVJE_079	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.299.881	0%	
MVJE_081	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.110.444	0%	
MVJE_133	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.499.698	0%	
MVJE_149	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.074.219	0%	
MVJE_164	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.936.491	0%	
MVJE_180	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.167.154	0%	
MVJE_184	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.188.744	0%	
MVJE_204	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.285.799	0%	
MVJE_224	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.039.766	0%	
MVJE_275	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.469.150	52%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_293	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.123.020	0%	

MVJE_323	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.162.643	0%	
MVJE_341	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.001.944	0%	
MVJE_346	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.220.890	0%	
MVJE_356	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.092.498	0%	
MVJE_359	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.150.913	0%	
MVJE_380	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.133.296	0%	
MVJE_405	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.234.268	0%	
MVJE_431	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.095.101	0%	
MVJE_457	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.194.460	0%	
MVJE_011	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.168.826	26%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_050	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.020.546	0%	
MVJE_065	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.385.690	0%	
MVJE_136	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.454.385	0%	
MVJE_174	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.397.753	0%	
MVJE_233	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.378.699	0%	
MVJE_244	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.958.552	0%	
MVJE_247	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.491.786	0%	
MVJE_264	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.076.494	40%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_295	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.359.361	0%	
MVJE_343	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.228.380	0%	
MVJE_345	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.372.636	0%	
MVJE_360	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.361.272	0%	
MVJE_402	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.471.955	0%	
MVJE_434	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.422.379	0%	
MVJE_435	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.320.092	0%	
MVJE_441	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.103.250	0%	
MVJE_489	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.419.743	0%	
MVJE_545	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.407.693	0%	
MVJE_573	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.389.813	8%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_593	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.167.643	0%	
MVJE_251	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.149.213	0%	
MVJE_452	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.040.864	0%	
MVJE_358	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.211.303	24%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVJE_453	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.036.741	0%	
MVJE_557	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.268.536	0%	
MVJE_429	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 13.937.847	5%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_546	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.439.003	0%	
MVJE_572	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.047.191	16%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_162	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.493.578	0%	
MVJE_243	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.402.012	0%	
MVJE_254	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.389.459	0%	
MVJE_319	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.105.073	0%	
MVJE_400	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.110.119	0%	
MVJE_574	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.160.217	0%	
MVJE_581	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.215.872	0%	
MVJE_559	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.455.505	0%	
MVJE_179	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.164.944	0%	
MVJE_241	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.138.199	0%	
MVJE_321	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.039.244	0%	
MVJE_440	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.282.202	0%	
MVJE_561	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.362.117	0%	
MVJE_110	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.337.355	0%	
MVJE_1006	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.093.691	0%	
MVJE_1007	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.910.468	0%	
MVJE_1009	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.171.366	0%	
MVJE_1015	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.019.107	0%	
MVJE_1016	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.676.193	0%	
MVJE_1017	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.092.575	0%	
MVJE_1028	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.083.189	0%	
MVJE_1042	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.389.603	0%	
MVJE_1043	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.896.020	0%	
MVJE_1045	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.373.688	0%	
MVJE_1049	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.024.624	10%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1056	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.920.066	0%	
MVJE_1058	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.077.888	0%	
MVJE_1063	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.111.734	0%	
MVJE_1067	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.938.178	0%	

MVJE_1068	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.949.048	0%	
MVJE_222	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.461.524	0%	
MVJE_326	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 15.070.584	0%	
MVJE_881	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	\$ 14.912.807	0%	
MVJE_882	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.956.659	5%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_889	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.709.876	0%	
MVJE_892	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.243.146	0%	
MVJE_901	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.156.773	0%	
MVJE_907	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.845.651	0%	
MVJE_909	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.018.449	0%	
MVJE_916	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.960.386	0%	
MVJE_920	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.766.071	0%	
MVJE_923	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.745.662	0%	
MVJE_928	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.899.021	0%	
MVJE_929	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.857.760	0%	
MVJE_941	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.200.298	0%	
MVJE_942	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.025.933	0%	
MVJE_950	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.977.626	0%	
MVJE_953	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.603.840	0%	
MVJE_957	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.934.728	0%	
MVJE_959	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.164.415	0%	
MVJE_962	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.024.624	5%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_968	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.116.274	0%	
MVJE_991	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.011.440	0%	
MVJE_992	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.926.773	0%	
MVJE_999	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.859.709	0%	
MVJE_1137	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.040.203	0%	
MVJE_1139	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.970.535	0%	
MVJE_1024	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.823.008	0%	
MVJE_868	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.117.877	0%	
MVJE_880	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.113.157	0%	
MVJE_989	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.777.145	0%	
MVJE_1000	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.106.668	0%	
MVJE_1035	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.088.452	0%	

MVJE_1078	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.922.421	0%	
MVJE_1095	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.918.312	0%	
MVJE_767	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.950.466	0%	
MVJE_885	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.077.502	0%	
MVJE_937	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.043.535	0%	
MVJE_938	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.911.519	0%	
MVJE_946	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.350.170	0%	
MVJE_948	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.528.770	0%	
MVJE_973	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.995.903	0%	
MVJE_984	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.933.342	0%	
MVJE_985	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.117.764	17%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_1084	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.697.027	0%	
MVJE_1087	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.114.257	0%	
MVJE_1104	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.652.797	0%	
MVJE_1118	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.976.203	0%	
MVJE_1125	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.003.071	0%	
MVJE_1148	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.485.537	20%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_351	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.460.868	22%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_624	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 14.875.797	0%	
MVJE_604	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	\$ 15.238.026	12%	EN EJECUCIÓN ADELANTO SEGÚN PROGRAMACIÓN
FIN	0%	0 días	0 días	mié 2/02/22	mié 2/02/22	\$ 0	0%	

Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad																
Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL												Fecha	20-nov-21			
CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020																
Contrato de obra		794 DE 2021					Plazo		Cinco (5) meses 15 días							
Objeto		CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.					Acta de inicio		18 de Agosto de 2021							
CDP No.		938-07 de abril de 2021		CRP No.		133011601010000007715		Valor del contrato		CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$5.130.409.981) M/Cte						
Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.																
Contrato de interventoría		797-2021					Plazo		Seis (6) meses 15 días							
Objeto		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"8					Acta de inicio		18 de Agosto 2021							
CDP No		969 ABRIL 16 DE 2021		CRP No.		133011601010000007715		Valor del contrato		Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos (\$615.594.670) M/Cte.						
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT												Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				Acta de Entrega a Satisfacción				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance					
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Edgar Roa	JUAN PABLO II	99	311	99	0	53	13	81	5	87,38%	81				
		URB. COMPARTIR	13		13	0	7	4	9	0	83,16%	9				
		MARANDU	7		7	0	5	0	5	2	71,43%	5				
Técnico Responsable	ACACIAS	1	1		0	0	1	0	0	35,00%	0					
	UNIR II	50	29		21	16	10	11	29	26,77%	11					
	POTOSI	122	67		55	0	22	0	100	2,13%	0					
	JERUSALEN	18	8		10	0	5	0	13	3,17%	0					
	LAS BRISAS	1	0		1	0	0	0	1	0,00%	0					
Subtotal			311	311	224	87	81	55	106	150	38,63%	106				
AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL												% DE EJECUCION MENSUAL N° 3	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Proyecto Ciudad Bolívar				FASE I			Tiempo Programación			SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 1 AL 7		SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21		
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución	SEMANA 11	SEMANA 12		SEMANA 13	SEMANA 14		
BARRIO O TERRITORIO - JUAN PABLO II																
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI NO	\$ 12.899.586,0	\$ 10.814.804,0	7/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI NO	\$ 12.899.947,0	\$ 11.944.526,0	8/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI NO	\$ 12.678.735,0	\$ 11.398.939,0	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI NO	\$ 12.020.042,0	\$ 11.427.635,0	14/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI NO	\$ 11.974.102,0	\$ 12.204.961,0	10/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO	\$ 12.897.510,0	\$ 11.186.603,0	9/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO	\$ 12.894.063,0	\$ 11.626.077,0	13/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO	\$ 12.703.070,0	\$ 10.707.871,0	9/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO		\$ 10.902.052,0	9/09/2021	27/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		\$ 11.864.372,0	12/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	52,98%	73,75%	97,06%	100,00%
11	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		\$ 11.329.166,0	28/10/2021		EN EJECUCION	68,70%	0,00%	23,01%	48,21%	68,70%
12	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		\$ 11.797.280,0	7/10/2021	3/11/2021	ENTREGADA	100,00%	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
13	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		\$ 12.002.565,2	7/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	80,32%	100,00%	100,00%	100,00%
14	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		\$ 11.887.610,4	6/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	88,96%	100,00%	100,00%	100,00%
15	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		\$ 11.489.381,0	6/10/2012	10/11/2021	ENTREGADA	100,00%	69,77%	83,33%	100,00%	100,00%
16	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		\$ 11.245.957,8	12/10/2021		EN EJECUCION	95,00%	53,17%	65,90%	67,89%	95,00%
17	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		\$ 11.890.753,3	11/10/2021	9/11/2021	ENTREGADA	100,00%	61,58%	94,10%	100,00%	100,00%
18	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		\$ 10.023.595,0	20/10/2021		EN EJECUCION	64,30%	23,00%	41,44%	54,56%	64,30%
19	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		\$ 9.359.388,0	14/10/2021		EN EJECUCION	67,03%	8,95%	20,60%	47,39%	67,03%
20	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		\$ 10.799.101,0	14/10/2021	8/11/2021	ENTREGADA	100,00%	53,97%	97,80%	100,00%	100,00%
21	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		\$ 11.769.237,4	15/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	25,62%	53,52%	100,00%	100,00%
22	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		\$ 11.952.659,2			VALIDADA - CUBIERTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		\$ 11.021.230,8	21/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	22,38%	54,60%	100,00%	100,00%
24	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		\$ 11.704.303,9	9/11/2021		EN EJECUCION - CUBIERTA	60,34%	0,00%	0,00%	5,03%	60,34%
25	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		\$ 12.095.771,5	20/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	26,33%	42,06%	100,00%	100,00%
26	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI NO		\$ 12.247.096,40	16/11/2021		EN EJECUCION	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%
27	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI NO	\$ 12.503.233,92	\$ 12.077.142,10	14/09/2021	12/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
28	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO	\$ 12.940.220,00	\$ 11.724.531,40	8/09/2021	22/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
29	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI NO	\$ 12.124.137,35	\$ 12.238.468,00	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
30	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI NO	\$ 12.038.543,45	\$ 11.377.892,80	24/09/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,00%	100,00%	100%	100,00%
31	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI NO		\$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI NO		\$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI NO	\$ 11.015.175,40	\$ 10.770.153,00	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
34	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO	\$ 12.388.424,33	\$ 12.024.568,50	8/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
35	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO	\$ 12.169.139,33	\$ 12.003.602,50	7/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
36	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO	\$ 11.928.872,56	\$ 11.841.207,00	21/09/2021	9/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,00%	96,00%	100%	100,00%
37	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO	\$ 11.012.626,54	\$ 10.652.916,00	21/09/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	99,00%	99,00%	100%	100,00%
38	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO	\$ 12.302.471,90	\$ 12.076.903,30	6/10/2021	2/11/2021	ENTREGADA	100,00%	99,00%	100,00%	100%	100,00%
39	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO	\$ 12.413.430,16	\$ 12.052.125,10	21/09/2021	8/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,00%	95,00%	100%	100,00%
40	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI NO	\$ 12.204.062,14	\$ 12.150.294,90	12/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	40,00%	70,00%	100%	100,00%
41	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI NO	\$ 12.978.974,00	\$ 11.998.548,50	13/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	65,00%	80,00%	100%	100,00%

42	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI			\$	11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	NO												
				SI	\$	12.743.873,00	\$	11.606.673,70	14/10/2021	8/11/2021	ENTREGADA	100,00%	75,00%	90,00%	100%	100,00%
				NO												
44	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI			\$	11.923.030,50	29/10/2021		EN EJECUCION	35,00%	5,00%	15,00%	20%	35,00%
				NO												
45	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI	\$	12.241.965,23	\$	11.592.989,00	12/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	65,00%	80,00%	100%	100,00%
				NO												
46	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI	\$	12.600.337,78	\$	11.981.782,60	28/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	0,00%	25,00%	68%	100,00%
				NO												
47	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI	\$	12.140.338,03	\$	12.198.500,50	21/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	60,00%	100,00%	100%	100,00%
				NO												
48	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI	\$	11.522.479,63	\$	11.854.190,20	15/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	40,00%	55,00%	75%	100,00%
				NO												
49	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI	\$	12.978.974,00	\$	12.205.262,30	22/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	15,00%	40,00%	75%	100,00%
				NO												
50	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INÉS CORTES LOPEZ	SI	\$	12.978.974,00	\$	11.991.555,40	21/10/2021	11/11/2021	ENTREGADA	100,00%	50,00%	70,00%	100%	100,00%
				NO												
51	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI			\$	11.152.685,90	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
52	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI	\$	12.975.027,15	\$	11.211.390,00	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
53	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI	\$	12.978.940,00	\$	11.927.560,50	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
54	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI	\$	12.616.698,91	\$	12.087.004,90	8/09/2021	11/10/2011	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
55	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI	\$	12.978.942,00	\$	12.289.771,00	10/09/2021	13/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
56	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI			\$	11.970.900,00	8/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
57	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI			\$	12.063.817,50	9/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
58	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI	\$	12.086.766,49	\$	12.059.809,40	10/09/2021	11/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
59	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI	\$	9.725.095,00	\$	9.602.199,70	9/09/2021	13/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
60	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI	\$	12.978.390,83	\$	12.079.596,40	8/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
61	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI	\$	12.460.609,4	\$	11.947.615,50	8/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
62	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI			\$	12.032.573,60	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
63	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI	\$	12.636.225,99	\$	12.169.719,00	8/09/2021	5/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
64	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI	\$	12.978.434,15	\$	12.149.156,80	27/09/2021	14/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
65	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI	\$	12.516.986,46	\$	11.701.628,10	9/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
66	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI	\$	12.253.349,05	\$	11.769.775,40	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
67	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI	\$	12.978.808,77	\$	11.326.716,60	7/09/2021	11/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
68	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI	\$	11.473.441,99	\$	11.528.955,20	7/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
69	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI			\$	11.792.129,40	11/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	48,00%	78,00%	100,00%	100,00%
				NO												
70	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI			\$	11.676.457,80	5/10/2021	29/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
71	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI					11/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	24,00%	43,00%	100,00%	100,00%
				NO												
72	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI							VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
73	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI			\$	11.678.378,50	12/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	15,00%	50,00%	72,00%	100,00%
				NO												
74	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI			\$	11.386.359,00	30/09/2021	25/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
75	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI					11/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												
76	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI			\$	11.887.405,00	11/10/2021	11/11/2021	ENTREGADA	100,00%	54,00%	71,00%	100,00%	100,00%
				NO												
77	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI	\$	12.978.495,17	\$	11.878.089,50	20/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				NO												

78	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO	\$ 12.978.659,81	\$ 11.904.933,20	20/09/2021	14/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
79	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO	\$ 1.297.826,00		30/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
80	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		\$ 12.028.047,20	29/09/2021	25/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
81	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		\$ 11.991.549,20	29/09/2021	11/11/2021	ENTREGADA	100,00%	72,00%	90,00%	100,00%	100,00%
82	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		\$ 11.196.334,10	2/11/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
83	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		\$ 11.992.608,00	29/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
84	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		\$ 12.424.274,80	6/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	48,00%	85,00%	95,00%	100,00%
85	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		\$ 11.825.187,60	29/09/2021	29/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
86	MVCB_2252N	KR 18V BIS 68A 42 SUR	ABIGAIL PARDO	SI NO		\$ 12.099.603,50	16/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87	MVCB_2252	TV 18V BIS 38A 55 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		\$ 12.099.603,50	16/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
88	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		\$ 11.693.068,00	18/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.638.243,00	3/11/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
90	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		\$ 11.739.701,00	15/10/2021		EN EJECUCION	40,00%	12,00%	23,00%	25,00%	40,00%
91	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.955.384,30	15/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	48,00%	60,00%	82,00%	100,00%
92	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.926.494,00	2/11/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	0,00%	4,00%	95,00%	100,00%
93	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.796.968,00	13/10/2021	2/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
94	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		\$ 11.938.400,60	20/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	32,00%	70,00%	90,00%	100,00%
95	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		\$ 12.222.565,40	15/10/2021		EN EJECUCION	85,00%	4,00%	12,00%	27,00%	85,00%
96	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO	\$ 12.072.506,95	\$ 12.052.789,00	21/10/2021	10/11/2021	ENTREGADA	100,00%	33,00%	75,00%	100,00%	100,00%
97	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO	\$ 12.940.140,77	\$ 10.690.982,90	13/10/2021	12/11/2021	ENTREGADA	100,00%	18,00%	55,00%	100,00%	100,00%
98	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.645.016,29	11/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	22,00%	35,00%	50,00%	100,00%
99	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO	\$ 12.160.207,60	\$ 12.027.459,50	24/09/2021	22/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BARRIO O TERRITORIO - URBANIZACION COMPARTIR														
100	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		\$ 11.953.028,00	8/10/2021	11/11/2021	ENTREGADA	100,00%	40,11%	72,10%	100,00%	100,00%
101	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		\$ 11.612.217,00	15/10/2021		EN EJECUCION	75,81%	6,00%	23,08%	29,69%	75,81%
102	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		\$ 11.789.319,00	15/10/2021		EN EJECUCION	55,28%	12,16%	20,62%	41,34%	55,28%
103	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO		\$ 12.284.986,00	12/10/2021		EN EJECUCION	50,00%	15,00%	35,00%	40,00%	50,00%
104	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO	\$ 12.978.974,00	\$ 12.154.953,00	6/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	15,00%	50,00%	85,00%	100,00%
105	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO	\$ 12.978.809,00	\$ 11.547.979,00	30/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
106	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		\$ 10.062.877,30	14/10/2021	9/11/2021	ENTREGADA	100,00%	34,00%	85,00%	100,00%	100,00%
107	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.197.949,00	4/10/2021	29/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
108	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO	\$ 12.816.618,27	\$ 12.940.470,50	4/10/2021	2/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
109	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		\$ 11.882.772,80	16/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
110	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO	\$ 12.900.000,00	\$ 11.528.505,00	4/10/2021	25/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
111	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.926.026,00	21/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
112	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO	\$ 12.900.000,00	\$ 11.809.681,00	21/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BARRIO O TERRITORIO - MARANDU													
113	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENET GONZALEZ QUINTERO	SI NO		\$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
114	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI NO		\$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
115	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.895.402,07	7/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
116	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO	\$ 12.023.740,46	\$ 11.811.116,20	7/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
117	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO	\$ 12.548.436,06	\$ 11.941.531,50	8/09/2021	13/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
118	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO	\$ 12.454.097,90	\$ 9.757.539,80	8/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
119	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO	\$ 12.978.000,00	\$ 11.884.972,10	7/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BARRIO O TERRITORIO - ACACIAS													
120	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO		\$ 10.994.502,00	8/11/2021		EN EJECUCION	35,00%	0,00%	0,00%	5,00%

BARRIO O TERRITORIO - UNIR II													
121	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		\$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
122	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO	\$ 10.705.308,00	\$ 9.707.226,00	15/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	49,63%	57,06%	79,11%
123	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		\$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
124	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		\$ 12.538.076,00	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
125	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO	\$ 12.889.726,00	\$ 10.814.060,70	7/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	64,83%	67,98%	70,10%
126	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 9.765.458,80	27/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	1,84%	24,30%	45,12%
127	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 11.422.010,10	7/10/2021	4/11/2021	ENTREGADA	100,00%	80,38%	100,00%	100,00%
128	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO	\$ 12.978.942,00	\$ 11.764.713,90	12/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	80,82%	100,00%	100,00%
129	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		\$ 12.149.324,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
130	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSY CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO	\$ 12.978.942,00	\$ 11.150.820,20	7/10/2021	4/11/2021	ENTREGADA	100,00%	90,49%	100,00%	100,00%
131	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO	\$ 12.263.208,00	\$ 11.271.883,80	27/10/2021		EN EJECUCION	43,36%	2,04%	14,90%	34,75%
132	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		\$ 11.702.890,70			RENUNCIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
133	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		\$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
134	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 11.935.867,00	14/10/2021		EN EJECUCION	49,42%	25,00%	27,44%	30,64%
135	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		\$ 11.768.059,40			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
136	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 9.870.988,30	14/10/2021		EN EJECUCION	46,59%	27,89%	36,73%	42,36%
137	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		\$ 11.097.935,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
138	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		\$ 9.167.373,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
139	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO	\$ 12.510.042,00	\$ 11.692.638,60	15/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	44,56%	49,94%	79,25%
140	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 11.828.107,30	14/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	45,09%	59,86%	74,97%
141	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 11.317.173,00	20/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	17,61%	29,38%	45,48%
142	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 10.711.089,20	21/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	15,05%	19,27%	33,46%
143	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 10.959.600,90	21/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	15,00%	39,50%	44,01%
144	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO	\$ 12.978.900,00	\$ 10.782.895,00	27/10/2021		EN EJECUCION	30,18%	1,89%	9,45%	19,35%
145	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		\$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
146	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		\$ 11.396.789,00	17/11/2021		EN EJECUCION	6,00%	0,00%	0,00%	6,00%
147	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		\$ 11.822.895,10	17/11/2021		EN EJECUCION	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%

148	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI		\$ 11.675.371,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
149	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	NO		\$ 11.829.540,80	9/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
150	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI		\$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
151	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	NO		\$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
152	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI		\$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
153	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	NO		\$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
154	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI		\$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
155	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	NO		\$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
156	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI		\$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
157	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	NO		\$ 10.105.363,40	8/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
158	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI	\$ 12.978.900,00	\$ 11.042.062,90	28/10/2021		EN EJECUCION	51,16%	1,88%	19,84%	29,21%	51,16%
159	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	NO		\$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
160	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI		\$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
161	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	NO		\$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
162	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI		\$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
163	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	NO		\$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
164	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI		\$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
165	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	NO		\$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
166	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI		\$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
167	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	NO		\$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
168	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI		\$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
169	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	NO		\$ 11.633.167,20			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
170	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI		\$ 8.950.926,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

179	MVJE_224	KR 46A 82 04 SUR	ALEXANDRA MOLINA RINCON	SI		\$ 11.936.322,20	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
180	MVJE_1049	CL 82 SUR 46A 24	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	NO		\$ 11.924.304,70	11/11/2021		EN EJECUCION	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
181	MVJE_066	CL 82 SUR 46A 30	ERNESTO CARDENAS	SI		\$ 11.976.242,30	11/11/2021		EN EJECUCION	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
182	MVJE_1058	CRA 46A 81 B 09 SUR	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	NO		\$ 11.966.578,10	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
183	MVJE_323	KR 46A 81A 10 SUR	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	SI		\$ 12.033.843,70	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
184	MVJE_882	CL 81 A SUR 46 A 10	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	NO		\$ 11.870.363,71	11/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
185	MVJE_431	CL 81A SUR 46A 24 MJ	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	SI		\$ 11.980.238,50			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
186	MVJE_062	CL 81 SUR 46A 37	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	NO		\$ 12.002.483,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
187	MVJE_264	CL 80A SUR 46A 17	ALCIRA TEATINO GARCIA	SI		\$ 11.965.471,00	11/11/2021		EN EJECUCION	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
188	MVJE_180	CL 80A SUR 46A 36	DAISSY GARZON TAFUR	NO		\$ 12.037.424,00	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
189	MVJE_1068	DG 81 SUR 45B -59	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	SI		\$ 11.864.323,53	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
190	MVJE_251	DG 81 SUR 45B 53	LUZ AMANDA BUITRAGO	NO		\$ 12.023.184,60	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
191	MVJE_380	DG 81 SUR 45B 41	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	SI		\$ 12.010.552,10	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
192	MVJE_928	DG 81 A SUR 45 B 26	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	NO		\$ 11.824.619,83			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
193	MVJE_133	KR 45B 81 15 SUR	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	SI		\$ 11.507.697,10			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
194	MVJE_359	KR 45B 81 09 SUR	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	NO		\$ 12.024.533,70			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
195	MVJE_022	DG 81 SUR 45B 52	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	SI		\$ 11.779.705,70			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
196	MVJE_1042	DG 81 SUR 45B 46	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	NO		\$ 11.420.319,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
197	MVJE_174	DG 81 SUR 45B 34	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	SI		\$ 12.220.439,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
198	MVJE_941	DG 81 SUR 45B 28	EDGAR ELI SANCHEZ GOMEZ	NO		\$ 11.270.077,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
199	MVJE_457	DG 81 SUR 45B 16	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	SI		\$ 12.059.095,20			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
200	MVJE_942	DG 80A SUR 45 63	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	NO		\$ 11.131.692,91			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
201	MVJE_077	DG 80A SUR 45 59	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	SI		\$ 12.058.623,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
202	MVJE_1016	DG 80A SUR 45 45	LUZ DARY GARCÍA MORALES	NO		\$ 11.647.771,89			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
203	MVJE_1017	DG 80 A SUR 45 39	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	SI		\$ 11.184.582,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
204	MVJE_907	DG 80 SUR 45 33	ANA ISABEL GONZALEZ	NO		\$ 11.782.262,83			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
205	MVJE_1045	DG 80 SUR 45 81	ALBERTO EFRÁIN CORREA HERNANDEZ	SI		\$ 11.407.689,27			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
206	MVJE_079	DG 80 SUR 45 86	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	NO		\$ 12.142.762,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
207	MVJE_065	Dg.79D SUR 45B 33	RASALBA TELLEZ	SI		\$ 12.210.865,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
208	MVJE_184	DG 80 SUR 45 56	BLANCA ROCIO CASTIBLANCO	NO		\$ 12.054.559,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
209	MVJE_545	CL 78A SUR 45-90	LADY ESPERANZA ACOSTA	SI		\$ 12.228.327,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
210	MVJE_110	TV 44B 78A 55 SUR	RIGOBERTO OSMA ARMERO	NO		\$ 12.172.503,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
211	MVJE_247	TV 44A 78A 93 SUR	WILLIAM HUMBERTO ARIAS	SI		\$ 12.295.067,50	19/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
212	MVJE_233	CL 78A BIS SUR 44A 15	ODALINA ARDILA	NO		\$ 11.411.665,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
213	MVJE_889	CL 80 SUR 44A 55	LUZ FANNY GARAY RAMOS	SI		\$ 11.674.504,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
214	MVJE_402	CL 80A SUR 44A 72	LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS	NO		\$ 12.279.329,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
215	MVJE_892	KRA 45 80 22 SUR	RUTH EDITH LEAL CRUZ	SI		\$ 12.097.735,10			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
216	MVJE_136	CL 80A SUR 44A 43	JAIR CORTEZ PINZON	NO		\$ 12.265.385,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

217	MVJE_962	CL 80B 44A 43 SUR	RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ	SI		\$	11.924.304,80	17/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
218	MVJE_1148	CL 80B SUR 44A 57	LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	NO		\$	11.496.457,94	17/11/2021		EN EJECUCION	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
219	MVJE_985	CL 80B SUR 44A 63	ANGELA SUAREZ RAMOS	SI		\$	11.998.224,71	17/11/2021		EN EJECUCION	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%
220	MVJE_295	CL 80B SUR 44A 69	HENRY GIRALDO	NO		\$	12.189.969,10			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
221	MVJE_1006	CL 81 SUR 44A 50	CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEEN	SI		\$	11.979.120,22			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
222	MVJE_957	CL 81 SUR 44A 63	LUZ STELLA AGUILERA	NO		\$	11.852.958,52			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
223	MVJE_275	TV 44A 78A 34 SUR	DIANA BELEN HERNANDEZ	SI		\$	12.277.102,80	9/11/2021		EN EJECUCION	52,00%	0,00%	0,00%	21,00%	52,00%
224	MVJE_032	TV 44 BIS 78 53 SUR	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	NO		\$	11.558.725,80	9/11/2021		EN EJECUCION	30,00%	0,00%	0,00%	16,00%	30,00%
225	MVJE_011	TV 44 BIS 79-17 SUR	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	SI		\$	12.038.750,50	9/11/2021		EN EJECUCION	26,00%	0,00%	0,00%	10,00%	26,00%
226	MVJE_010	TV 44 BIS 79 23 SUR	YOLANDA MENESES	NO		\$	11.785.007,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
227	MVJE_050	CL 79A SUR 42-51	HERSILIA PARRA PEÑA	SI		\$	11.921.067,70			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
228	MVJE_351	TV 44 BIS 78-52 SUR	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	NO		\$	12.270.530,00	12/11/2021		EN EJECUCION	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,00%
229	MVJE_356	KR 44A 78 43 SUR	ANA ROSA SOSA	SI		\$	11.978.172,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
230	MVJE_573	KR 44 -78 59 SUR	SANDRA MILENA PRECIADO	NO		\$	12.214.137,10	12/11/2021		EN EJECUCION	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
231	MVJE_452	CL 79 SUR 42 10	PEDRO JULIO UREÑA	SI		\$	11.937.194,00	17/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
232	MVJE_405	KR 44A 78 16 SUR MJ	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	NO		\$	12.090.689,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
233	MVJE_149	CL 78 SUR 42 05	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	SI		\$	11.963.665,70			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
234	MVJE_624	KR 43 77 37 SUR	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA	NO		\$	11.806.187,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
235	MVJE_293	KR 42 77 15 SUR	ELSA MARIA MARTINEZ	SI		\$	12.002.396,60	19/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
236	MVJE_1084	KR 46 82A 26 SUR	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ	NO		\$	11.664.307,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
237	MVJE_938	KR 45C 82 45 SUR	NIEVES DURAN IBATA	SI		\$	11.834.538,91			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
238	MVJE_081	KR 45C 82 21 SUR	ESTRELLA WILCHES	NO		\$	11.992.416,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
239	MVJE_1009	DG 81 B SUR 45 B 35	FELIPE DUARTE VARGAS	SI		\$	12.040.766,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
240	MVJE_901	KR 45C 82B 22 SUR	JORGE GERENA TORRALBA	NO		\$	12.029.185,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
241	MVJE_1104	KR 45C 82B 10 SUR	MARIA ALICIA LOPEZ CASTILLO	SI		\$	11.629.204,37			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
242	MVJE_1067	CR 45C 82 60 SUR	UBALDINA PALACIOS CASTRO	NO		\$	11.855.696,69			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
243	MVJE_881	KR 45C 82 34 SUR	GLORIA LUZ BLANCO BELLO	SI		\$	11.835.560,70			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
244	MVJE_929	DG 81A SUR 45B 17 MJ	WILLIAM MARTINEZ CUBILLOS	NO		\$	11.791.873,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
245	MVJE_593	DG 81B SUR 45B 03 MJ	YESID VILLAMIL	SI		\$	12.037.811,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
246	MVJE_999	KR 45B 82 05 SUR	MARÍA JUDITH QUIÑÓNEZ ORTEGA	NO		\$	11.793.420,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
247	MVJE_937	KR 45B 82B 09 SUR	RAQUEL VARGAS MORALES	SI		\$	11.145.662,84			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
248	MVJE_1024	KR 45B 82B 10 SUR	ALVARO BAEZ RODRIGUEZ	NO		\$	11.764.292,15			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
249	MVJE_1035	KR 45B 82B 04 SUR	DIGNA MARIA ROJAS DE DIAZ	SI		\$	11.974.961,85			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
250	MVJE_1118	KR 45 A 82 51 SUR	NANCY OLIVERO	NO		\$	11.885.874,64			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
251	MVJE_1028	CL 82B SUR 45-10	ARSENIO PARDO VELANDIA	SI		\$	11.970.784,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
252	MVJE_1063	CR 45 82A 09 SUR	MIGUÉL ÁNGEL GARCÍA	NO		\$	11.993.439,91			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
253	MVJE_916	KR 45 A 82 34 SUR	AMANDA LOZANO TAPIERO	SI		\$	11.873.322,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
254	MVJE_920	KR 45 82 23 SUR	BLANCA LILIA RAMIREZ	NO		\$	11.719.103,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
255	MVJE_1056	KR 45 82 09 SUR	BLANCA CECILIA SANABRIA	SI		\$	11.841.322,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

256	MVJE_992	KR 45 82 05 SUR	JORGE LUIS RODRIGUEZ NIETO	SI		\$ 11.846.644,70			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
257	MVJE_179	KR 45A 82 06 SUR	BUENAVENTURA BECERRA FUQUENE	NO		\$ 12.035.670,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
258	MVJE_341	KR 45 82 03 SUR MJ 1	OLGA PATRICIA RAMOS SUAREZ	SI		\$ 11.906.305,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
259	MVJE_1095	CL 81 SUR 45 15	ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ	NO		\$ 11.839.930,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
260	MVJE_346	CL 81 SUR 45 38	HECTOR BERNAL PINTO	SI		\$ 12.080.070,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
261	MVJE_345	CL 81 SUR 45 16	DELIO ALAPE CONDE	NO		\$ 12.200.505,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
262	MVJE_991	KR 45 81 18 SUR	BENJAMIN BALLESTROS BALLESTEROS	SI		\$ 11.913.840,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
263	MVJE_989	CL 82 SUR 44A 77	ANA JUDITH BERMUDEZ VARGAS	NO		\$ 11.727.893,18			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
264	MVJE_1078	CL 82A SUR 44A 74 MJ 1	OSTILIO PABON GAMEZ	SI		\$ 11.843.190,46			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
265	MVJE_1125	CL 82C BIS 44B 04	ROSA MARIA VARGAS	NO		\$ 11.907.198,72			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
266	MVJE_946	CL 82C BIS SUR 44A 59	SOLANGEL AMAYA	SI		\$ 11.389.023,87			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
267	MVJE_885	CL 82 SUR 44A 43	JOSE RAMIRO LEON ARISMENDY	NO		\$ 11.966.271,34			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
268	MVJE_1043	CL 82 SUR 44A 44	JOSE DE JESUS PEÑA	SI		\$ 11.822.238,37			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
269	MVJE_984	CL 81A SUR 44A 49	CELMIRA BENITEZ CASTRO	NO		\$ 11.851.859,29			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
270	MVJE_959	CL 82 SUR 44A 38	GLORIA AZUCENA DIAZ PINEDA	SI		\$ 12.035.249,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
271	MVJE_968	CL 82 SUR 44A 25	OFELIA PUERTA ARIAS	NO		\$ 11.997.042,97			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
272	MVJE_923	KR 44A 81A 17 SUR	DEICY PUERTAS ARIAS	SI		\$ 11.702.906,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
273	MVJE_973	KR 44A 81A 03 SUR	MARGARITA CRUZ SANCHEZ	NO		\$ 11.901.509,52			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
274	MVJE_950	KR 44A 81A 26 SUR	ANA LUCIA BELTRAN	SI		\$ 11.887.004,73			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
275	MVJE_953	CL 82 42 76 SUR	HERMEINDA AGUIAR DE GUTIERREZ	NO		\$ 11.590.349,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
276	MVJE_948	CL 81A SUR 42 89	ERALDO PEÑA	SI		\$ 11.530.769,53			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
277	MVJE_1015	KR 44A 80B 04 SUR	MARCO AURELIO GARCIA SALAZAR	NO		\$ 11.919.926,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
278	MVJE_489	CL 79B SUR 42 81	LUIS ALBERTO CASTELLANOS	SI		\$ 12.237.890,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
279	MVJE_440	CL 80 SUR 42-27	MARIA REINA DEL CARMEN ROMERO	NO		\$ 12.128.732,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
280	MVJE_343	CL 80 SUR 42 45	ADOLFO SABOGAL HERNANDEZ	SI		\$ 12.086.016,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
281	MVJE_204	CL 80B SUR 42 17	MARIA BLANCA AZUCENA SAENZ MONTAÑO	NO		\$ 11.337.936,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
282	MVJE_441	CL 80 SUR 41 45	MARIA ALCIRA ZARATE	SI		\$ 11.986.706,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
283	MVJE_241	CALLE 80 SUR # 42-24	RUBY STELLA JAIMES	NO		\$ 12.014.443,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
284	MVJE_164	CL 80B SUR 40 03	SARA RODRIGUEZ RAMOS	SI		\$ 11.854.358,30			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
285	MVJE_009	CL 80B SUR 39 24	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	NO		\$ 12.300.608,10			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
286	MVJE_360	CL 80B SUR #40-18	ARTURO FLOREZ BARAJAS	SI		\$ 12.191.485,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
287	MVJE_434	CL 80 SUR#40-34	NOHEMI MORALES ORTIZ	NO		\$ 12.239.982,60			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
288	MVJE_435	CL 80 SUR # 41-04	JUVENAL ESPINOSA MUR	SI		\$ 12.158.802,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
289	MVJE_1139	CL 79 SUR 40 05	OSCAR ALIRIO GAITAN MOLINA	NO		\$ 11.881.376,45			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
290	MVJE_321	CALLE 79 SUR 39 40	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	SI		\$ 11.935.907,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
291	MVJE_868	CL 79 SUR 37 46	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	NO		\$ 11.998.314,71			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
292	MVJE_030	KR 40 78 06 SUR	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	SI		\$ 12.075.043,30			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BARRIO JERUSALÉN													
293	MVJE_546	TV 45 # 77 - 36 SUR	RAMIRO GUZMAN BETANCOURT	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
294	MVJE_254	CL 81 SUR 44A 26	MARIA HILDA GUAQUETA GONZALEZ	SI NO				VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
295	MVJE_243	CL 81 SUR 44A 49	MARIA DE JESUS GARAVITO GARCIA	SI NO			18/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
296	MVJE_222	CL 80 B SUR 42 10	MARIELA RODRIGUEZ BELTRAN	SI NO	\$	12.271.051,30		SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
297	MVJE_572	KR 44 78 72 SUR	FABIOLA GARCIA DURAN	SI NO			17/11/2021	EN EJECUCION	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%
298	MVJE_358	KR 43 78 SUR 48 CASA 1	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	SI NO	\$	12.270.530,00	12/11/2021	EN EJECUCION	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,00%
299	MVJE_604	KR 43 78 46 SUR CASA 2	VIVIANA BOHORQUEZ	SI NO			12/11/2021	EN EJECUCION	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%
300	MVJE_429	CRA 43 # 78 - 15 sur	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	SI NO			17/11/2021	EN EJECUCION	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
301	MVJE_574	CR 44 77 37 SUR	LUÍS ARMANDO SANABRIA	SI NO				VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
302	MVJE_319	CL 80 B SUR 41 03	MANUEL FONSECA ALVAREZ	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
303	MVJE_559	DG 79A SUR 40-50	DORIS ROCIO GUAYACAN BERNAL	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
304	MVJE_557	DIAG 79 SUR- # 40-21	JOSE JULIAN ROJAS	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
305	MVJE_561	DG 79 A SUR 40 08	MARIA GLORIA CASTAÑEDA	SI NO	\$	12.192.156,30		SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
306	MVJE_162	CRA 40 78 B 03 SUR	ELIAS OSPINA FRANCO	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
307	MVJE_400	CL 79A SUR 38 10	MARIA FLORALBA DAVID ERAZO	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
308	MVJE_453	CL 78A SUR 38 44	MERLY BELTRAN AGUDELO	SI NO	\$	11.933.921,40		VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
309	MVJE_581	CALLE 78 SUR 39 40	JAIME DONCEL CASILIMAS	SI NO				SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
310	MVJE_1137	CR 45B 82C 04 SUR	LUZ SILENIA PAN MALDONADO	SI NO	\$	11.936.669,20		SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LAS BRISAS														
311	MVJE_767	DG 81A SUR 45B 35	MARIA GENOVEVA AMELINES OCAMPO	SI NO	\$	11.865.448,45			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



FECHA	PERIODO No.	3	DEL	21/10/2021	AL	20/11/2021
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021			
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días			
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0			
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022			
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0			
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0			
VALOR INICIAL :	\$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	\$ 5.130.409.981			
VALOR ADICIÓN(ES):	0	VALOR ADICIÓN(ES):	\$ -			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$ -			
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	\$ -			
VALOR POR PAGAR:	\$ -	VALOR POR PAGAR:	\$ -			
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.			

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO


Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar


PROGRAMADO VS EJECUTADO - UNIR II

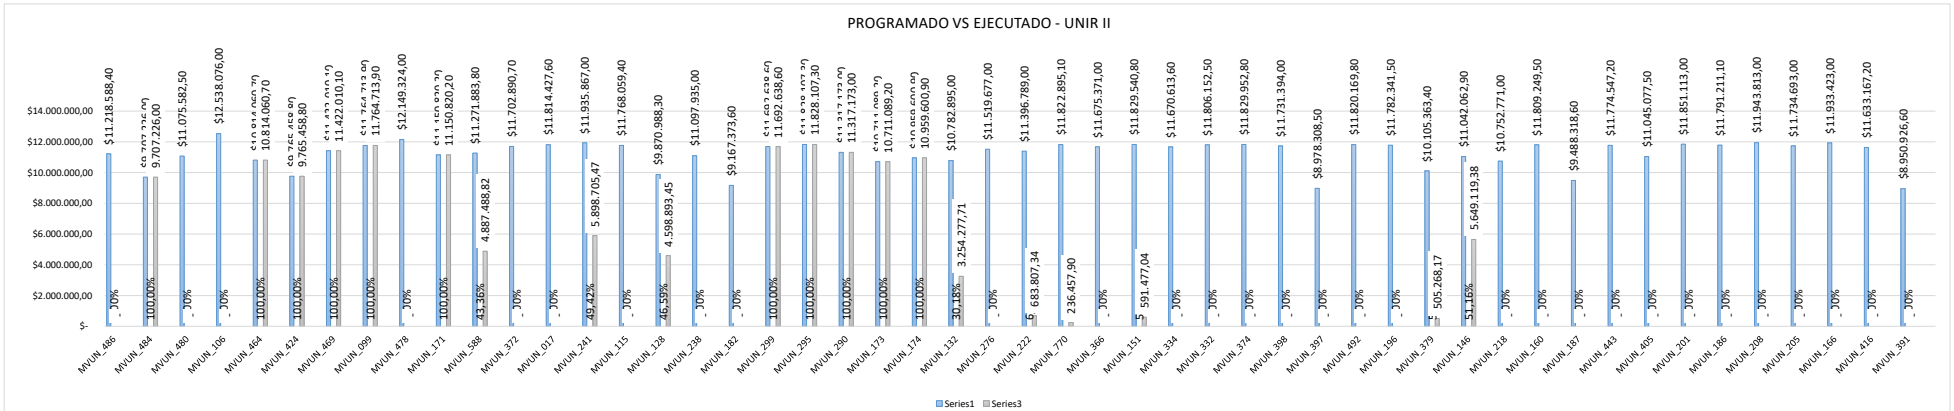

PROGRAMADO VS EJECUTADO - HABITARTE

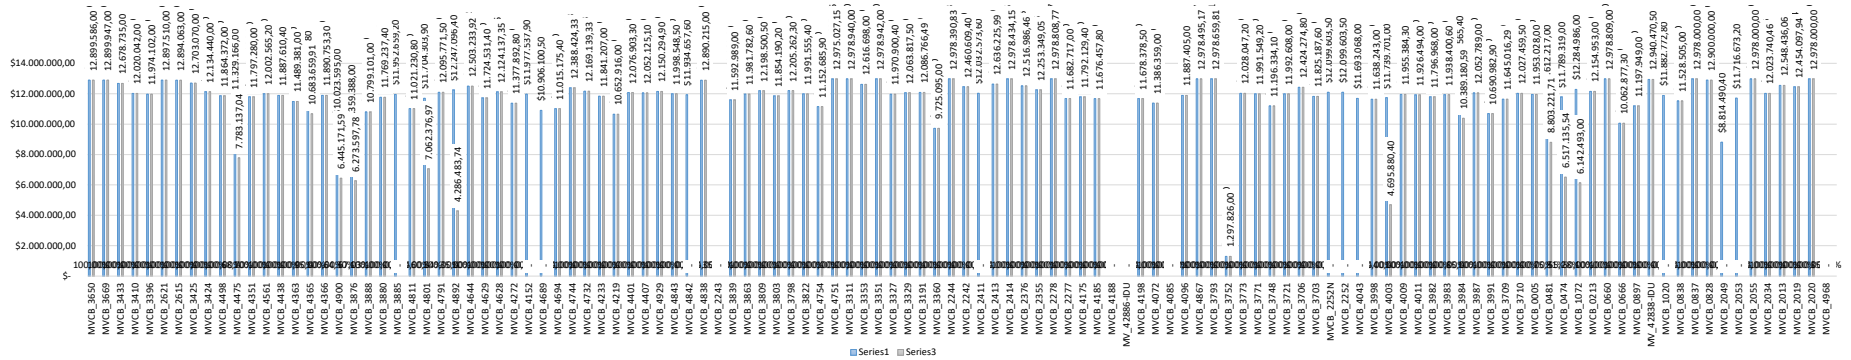

PROGRAMADO VS EJECUTADO - JERUSALEN

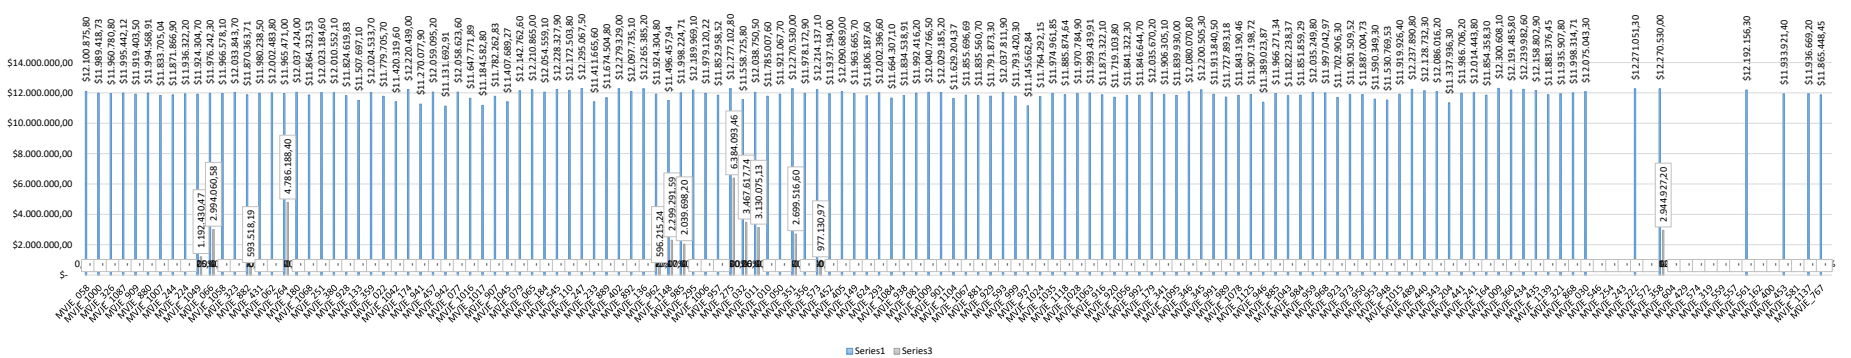

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES N° 2 - ESTADO DE AVANCE MENSUAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - HABITARTE

1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA

5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
10	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace entrega de obras al beneficiario . Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
11	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	Se terminan actividades de pañete. Se termina estuco de muros de alcoba 1, sala comedor y hall de acceso. continuó con pañete de muros en área de lavandería y alcoba 2. Se enchaparon muros y mesón de cocina. Se avanza en enchape de pared de lavandería y se instaló el lavadero. elaboraron poyo y mochetas para lavadero en área de lavandería. Se enchapó el piso de la zona de lavandería.
12	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
13	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
14	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
15	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
16	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	Se termina enchape de piso y pared del área de baño. Se emboquilló el enchape de piso de alcobas, salacomedor, hall de acceso. Se fundieron el mesón, entrepaño y poyo en cocina; se enchapan pared, mesón y piso de la misma. Se termina pintura vinilo en sala, hall de acceso. Se terminan las actividades en esta vivienda; pendiente de entrega.
17	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
18	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	En la zona de cocina se demolió el mesón y enchape antiguo; se levantan mochetas y se funden mesón y entrepaño.
19	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se inician actividades de enchapes de mesón y muros en la cocina. Se avanza en enchape de muros en el área de baño. Se enchapó con cerámica el piso de la alcoba 1.
20	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
21	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace entrega de obras al beneficiario . Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
22	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
23	MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace entrega de obras al beneficiario . Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
24	MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	Se desmontó la estructura y teja de zinc antigua de cubierta . Se instala perfiliería metálica para correas y se monta la teja arquitectónica. Se demolió enchape y mesón antiguos en cocina y se avanzan en enchape de pared. En el área de baño se instaló enchape de piso y pared.
25	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace entrega de obras al beneficiario . Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
26	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
27	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	Continúa el atraso en el desarrollo de las actividades programadas. En el área de cocina se fundieron el mesón, entrepaño y poyo, se enchaparon los muros. En la zona de lavandería se enchaparon mochetas y muros. Se termina el enchape de piso en el comedor. Se estucan áreas sobre enchape de muro de la cocina y lavandería.
28	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	Se sigue presentando atraso en la ejecución. Se termina estucado de muros de alcobas 1, 2 y 3. Se avanza en enchape de piso de hall de alcobas y sala.
29	MVCB_4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	El día 16 de noviembre se realiza acta de inicio en el predio El día 19 de noviembre se ha instalado la perfiliería con anticorrosivo y cubierta en garaje, adicionalmente se desmonta cielo raso en madera en sala
30	MVCB_4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 2 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado. El día 4 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado El día 5 de noviembre, se realiza entrega del predio a beneficiaria
31	MVCB_4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021
32	MVCB_4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
33	MVCB_4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.

34	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
35	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. El día 7 de octubre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario
36	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 19 de octubre se instala puerta de baño y se realiza boquilla de mesón en cocina e instalación de lavaplatos. El día 19 de octubre se entrega predio a la beneficiaria.
37	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 19 de octubre, en espera de llegada de puerta y detalles de acabados en baño y cocina El día 20 de octubre, en espera de llegada de puerta. El día 21 llega la puerta y se instala El día 22 de octubre se entrega el predio a beneficiario
38	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario.
39	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 9 de noviembre nos presentamos en el predio pero nadie abre la puerta, se solicita al Director de interventoría los requisitos para la entrega unilateral.. El día 11 de noviembre se ha llamado reiteradamente al beneficiario pero no contesta. El día 12 de Noviembre se realiza acta de entrega al beneficiario
40	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 18 de Noviembre, se ha realizado enchape de muros en baño, piso en zona de ropas y piso en alcoba del segundo nivel.
41	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 8 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
42	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 2 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
43	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 9 de noviembre se solicita al constructor arreglo de pintura de la estructura de la cubierta, mesón de cocina, arreglo de enchape del lavamanos. El día 11 de noviembre se revisan cantidades y se pide pintura de muros en la sala que fue pañetada, arreglos de mesón en cocina, en pañete, pañete y boquilla y arreglos de boquilla en zona de ropas y nivelar el platero y ajustar la puerta del baño El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
44	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 16 de Noviembre se espera la puerta para ser instalada El día 18 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
45	MVCB 4233	Beatriz Corredor Rosique	El día 9 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
46	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 9 de noviembre, se revisa piso de la alcoba de la beneficiaria y se revisa pisos de todo el predio El día 11 de noviembre se revisan actividades ejecutadas y se solicita pintura de muro en hall, arreglo de ducha y manguera de lavamanos, arreglo de pañete parte inferior del mesón arreglo de puerta del baño El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega del predio a nuera de la beneficiaria
47	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 16 de noviembre se empieza a armar el mesón de cocina
48	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 de septiembre se realiza validación del predio
49	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	El día 8 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario
50	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 9 de noviembre se realiza actividad de cielo raso en hall y pintura de muros El día 11 de noviembre se visita el predio para validar cantidades y verificar las actividades realizadas, se solicita detallar pintura en escaleras y hall alcobas, instalar el agua en el sanitario del segundo piso y limpiar pvc del cielo raso. El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega a familiar del beneficiario
51	MVCB 3863	Fabio Rodríguez	El día 16 de noviembre se realiza acta de entrega al beneficiario
52	MVCB 3809	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 2 de noviembre se termina la actividad de enchape de piso y se esta instalando cielo raso en hall y comedor. Continúa la actividad de estuco de muros todo el predio. El día 4 de noviembre se terminan las actividades y en espera de la llegada de la puerta y acabados con silicona en el cielo raso El día 5 de noviembre se realiza acta de entrega
53	MVCB 3803	Luz Dary Sáenz Capera	El día 16 de noviembre se realiza observación de reparación de cielo raso en sala ya que presentaba catenaria y se colocó nivel, donde efectivamente reportaba un desnivel. Se ha realizado el enchape de muros en el baño y se estaba realizando enchape de mesón en cocina. El día 17 se realiza entrega a la beneficiaria
54	MVCB 3798	María Aliría Medina de Beltrán	El día 16 de noviembre se realiza enchape de muro de zona de ropas y mesón de cocina El día 17 se realiza entrega a la beneficiaria

55	MVCB_3822	Sory Inés Costes López	El día 9 de Noviembre se realiza alistado de piso alcoba 2, actividad de estuco en muros y pintura de muros. El día 11 de noviembre se realiza acta de entrega
56	MVCB_4968	Lucas Raúl Beltrán Prieto	El día 8 de noviembre, se realiza acta de inicio
57	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
58	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
59	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
60	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
61	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
62	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
63	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
64	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
65	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Técnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
66	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Se realiza apertura de obra el miercoles 17 de noviembre, donde se presenta personal de obra. Hasta la fecha del presente informe no se inician actividades de obra.
67	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 17 de noviembre de 2021.
68	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 17 de noviembre de 2021.
69	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
70	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 17 de noviembre de 2021.
71	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el día 19 de Octubre de 2021.
72	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 8 de Octubre de 2021.
73	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el día 13 de Octubre de 2021.
74	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 8 de Octubre de 2021.
75	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 8 de Octubre de 2021.
76	MVCB_2252N	ABIGAIL PARDO	Se realiza apertura de la vivienda el día 16 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales al beneficiario quien esta de acuerdo con las intervenciones.
77	MVCB_2252N	CAMPO ELIAS GIL PARDO	Se realiza apertura de la vivienda el día 16 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales al beneficiario quien esta de acuerdo con las intervenciones.
78	MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	Se realiza apertura de la vivienda el día 18 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones.
79	MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 17 de Noviembre de 2021.
80	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda en la se evidencia avance en instalacion de enchape de pared en cocina y baño, se inicia con instalacion de enchape de piso en hall.
81	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 16 de Noviembre de 2021.
82	MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 16 de Noviembre de 2021.
83	MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 2 de Noviembre de 2021.
84	MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 16 de Noviembre de 2021.
85	MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso de sala y habitaciones, se finaliza intervencion en cocina y baño.
86	MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 10 de Noviembre de 2021.
87	MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el día 12 de Noviembre de 2021.
88	MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el día 16 de Noviembre de 2021.
89	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el día 22 de Octubre de 2021.

90	MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Octubre de 2021.
91	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Noviembre de 2021.
92	MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 16 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones.
93	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Octubre de 2021.
94	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
95	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: ENGATIVA - UNIR II			
96	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
97	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO .En conjunto con el contratista y la interventoría.
98	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
99	MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
100	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
101	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
102	MVUN_478	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
103	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
104	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de : instalacion de Cieloraso en PVC.Aplicacion de estuco sobre muros y Pintura.
105	MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda
106	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria,
107	MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
108	MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria,
109	MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
110	MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
111	MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
112	MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de: Instalacion de Combo Sanitario y Puerta de Madera.Aplicacion de estuco sobre muros y Pintura.
113	MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
114	MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
115	MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
116	MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de : Instalacion de Cieloraso en PVC y Luces LED,
117	MVUN_222	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
118	MVUN_770	JOSE YECID LAVERDE NIETO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
119	MVUN_151	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO .En conjunto con el contratista y la interventoría.
120	MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
121	MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de : Instalacion de Enchape muro cocina,aplicación de estuco y Alistado de Pisos,
122	MVUN_416	RICARDO CARDENAS GARCIA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
123	MVUN_391	IMELDA RODRIGUEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JERUSALEN			
124	MVJE_1068	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	El día 17 de noviembre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de apertura de actividades en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
125	MVJE_251	LUZ AMANDA BUITRAGO	El día 17 de noviembre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de apertura de actividades en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
126	MVJE_380	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	El día 17 de noviembre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de apertura de actividades en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
127	MVJE_928	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
128	MVJE_133	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
129	MVJE_359	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
130	MVJE_022	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
131	MVJE_1042	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
132	MVJE_174	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
133	MVJE_941	EDGAR ELI SANCHEZ GOMEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
134	MVJE_457	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
135	MVJE_942	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
136	MVJE_077	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
137	MVJE_1016	LUZ DARY GARCÍA MORALES	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
138	MVJE_1017	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
139	MVJE_907	ANA ISABEL GONZALEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
140	MVJE 545	Lady Esperanza Acosta	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio
141	MVJE402	Lenis Guimar Giraldo Lancheras	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio
142	MVJE 233	Odalina Ardila	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio
143	MVJE 985	Angela Suarez Ramos	El día 17 de Noviembre, se realiza acta de inicio de actividades El día 19 de noviembre se realiza alistado de piso en sala, cocina y alcobas y se inicia actividad de pañete en las dos alcobas
144	MVJE 962	Raúl Muñoz Rodríguez	El día 17 de Noviembre, se realiza acta de inicio de actividades El día 19 de noviembre se demuele enchape de muros en baño y enchape de piso en baño y llega estructura para cielo raso , cemento para alistado y pegacord para el piso
145	MVJE 1006	Campo Elías Cubides Ballen	El día 8 de Noviembre, se realiza validación del predio
146	MVJE 295	Henry Giraldo	El día 10 de Noviembre, se realiza validación del predio
147	MVJE 1148	Luis Eduardo Jiménez	El día 17 de Noviembre, se realiza acta de inicio de actividades. El día 18 de noviembre se inicia alistado de piso en el área de estampado y se va a contemplar reubicar el piso del taller de corte ya que se presenta una fuga de agua constante El día 19 de noviembre
148	MVJE 957	Luz Stella Aguilera	El día 10 de Noviembre, se realiza validación del predio
149	MVJE 962	William Humberto Arias	El día 17 de Noviembre, se realiza validación del predio El día 19 de Noviembre se realiza acta de inicio
150	MVJE 889	Luz Fanny Garay	El día 17 de Noviembre, se realiza validación del predio
151	MVJE 110	Rigoberto Osma	El día 19 de Noviembre, se realiza validación del predio
152	MVJE 892	Ruth Edith Leal	El día 19 de Noviembre, se realiza validación del predio
153	MVJE 254	María Hilda Guaqueta González	El día 10 de Noviembre, se realiza validación del predio
154	MVJE 243	María de Jesús Garavito	El día 18 de Noviembre, se realiza acta de inicio de actividades
155	MVJE_572	FABIOLA GARCIA DURAN	Se realiza apertura de obra el miercoles 17 de noviembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete y estuco de muros de sala y alcoba 1, alistados de piso en cocina 1, sala 1 y alcoba 1.

156	MVJE_358	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete y estuco de muros de alcobas, sala y hall. Demolición de mesón de cocina y fundición de poyo y mocheta para mesón nuevo. Puntos hidrosanitarios en cocina. Alistados de piso en todo el area.
157	MVJE_604	VIVIANA BOHORQUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete y estuco de muros de alcobas, sala y hall. Demolición de enchapes de cocina y baño. Demolición de pañete en baño.
158	MVJE_429	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	Se realiza apertura de obra el miercoles 17 de noviembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de baño.
159	MVJE_574	LUÍS ARMANDO SANABRIA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
160	MVJE_453	MERLY BELTRAN AGUDELO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
161	MVJE_011	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Demolición de mesón de cocina y enchape de esta área, fundición de mesón nuevo con sus respectivos putnos hidrosanitarios, enchape de muro de cocina. Se hace pre entrega de alcoba 2 con actividades de enchape de piso y pintura de muros terminadas.
162	MVJE_032	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Alistado de piso en cocina, enchape de piso y muros en cocina, fundición de mesón con sus respectivos puntos hidrosanitarios. Se hace pre entrega de alcobas 1 y 2 con actividades de enchape de piso y pintura de muros terminadas.
163	MVJE_275	DIANA BELEN HERNANDEZ	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Pañete y estuco de muros de todo el área, enchapes de piso en baño, enchapes de muros en baño y patio. Se solicita al personal de obra cambiar piezas de enchape mal ejecutadas. Puntos hidrosanitarios en baño y patio terminados.
164	MVJE_351	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Alistado de piso y enchape del mismo en garaje y alcoba 3, pintura de muros de estos mismos espacios. Se hace entrega parcial de garaje y alcoba 3.
165	MVJE_050	HERSILIA PARRA PEÑA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
166	MVJE_452	PEDRO JULIO UREÑA	Se realiza apertura de obra el miercoles 17 de noviembre, donde se presenta personal de obra, se acuerda iniciar actividades el próximo lunes 22 de noviembre debido a que los beneficiarios desocuparán los espacios a intervenir.
167	MVJE_573	SANDRA MILENA PRECIADO	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Enchape de muros de cocina y alcoba 2.
168	MVJE_356	ANA ROSA SOSA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
169	MVJE_149	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
170	MVJE_293	ELSA MARIA MARTINEZ	Se realiza apertura de obra el viernes 19 de noviembre, donde se presenta personal de obra e inicio de actividades.
171	MVJE_241	RUBY STELLA JAIMES	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
172	MVJE_360	ARTURO FLOREZ BARAJAS	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
173	MVJE_164	SARA RODRIGUEZ RAMOS	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
174	MVJE_435	JUVENAL ESPINOSA MUR	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
175	MVJE_434	NOHEMI MORALES ORTIZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
176	MVJE_624	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROG	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
177	MVJE_321	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
178	MVJE_405	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	Se hace visita de validación el día martes 16 de noviembre de 2021, donde se hace levantamiento del predio y se realiza presupuesto con actividades a ejecutar.
179	MVJE_009	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	Se hace visita de validación el día miercoles 17 de noviembre de 2021, donde se hace levantamiento del predio y se realiza presupuesto con actividades a ejecutar.
180	MVJE_868	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	Se hace visita de validación el día miercoles 17 de noviembre de 2021, donde se hace levantamiento del predio y se realiza presupuesto con actividades a ejecutar.
181	MVJE_030	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	Se hace visita de validación el día miercoles 17 de noviembre de 2021, donde se hace levantamiento del predio y se realiza presupuesto con actividades a ejecutar.
182	MVJE_010	YOLANDA MENESES	Se hace visita en compañía de la secretaria del habitat para evidenciar problemas estructurales previstos en visita anterior. Se determina que la vivienda puede ser intervenida y se reprograma visita de validación para el próximo lunes 22 de noviembre de 2021.
183	MVJE_224	ALEXANDRA MOLINA RINCON	Se realiza apertura de la vivienda el día 17 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones.
184	MVJE_1049	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en preparacion y alistado de piso en habitacion y hall
185	MVJE_066	ERNESTO CARDENAS	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en preparacion, alistado y enchape de piso en habitaciones, se realiza demolicion de pañete en baño.

186	MVJE_431	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	Se realiza validacion de la vivienda en la cual se evidencia como prioridad intervencion en cocina, zona de lavado y sala comedor.
187	MVJE_264	ALCIRA TEATINO GARCIA	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en preparacion, alistado e instalacion de enchape de piso en habitaciones, sala comedor y enchape de pared en baño.
188	MVJE_180	DAISSY GARZON TAFUR	Se realiza apertura de la vivienda el día 17 de Noviembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones.
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA			
ACTIVIDAD			RESPONSABLE
			FECHA PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES			
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.			
Barrio o Territorio estado del Tiempo :			
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA			
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)			

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

A la fecha del presente informe no se presentan por parte del contratista acciones que conlleven a presentar incumplimiento en la ejecución del contrato de obra

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.

(cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

- VER ANEXO PARAFISCALES OBRA (1)
- VER ANEXO PARAFISCALES INTERVENTORÍA (2)

4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)
- VER ANEXO OFICIOS INTERVENTORÍA (4)

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

Las pólizas no han tenido modificación alguna a la fecha del informe

SEGUROS DEL ESTADO S.A.											
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL											
DECRETO 1082 DE 2015											
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.				SUCURSAL NORTE				COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101247513	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO				VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO				VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			
01 08 2021				18 08 2021				08 04 2027			
A LAS HORAS 00:00				A LAS HORAS 23:59				TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INPLAYCO S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 880.524.188-8			
DIRECCIÓN: CR 16 A.NRO. 82 - 13 OFICINA 201								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6181157			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT								IDENTIFICACIÓN NIT: 888.988.081-8			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3581600			
ADICIONAL:											
OBJETO DEL SEGURO											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN A ESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA.											
GARANTIZAR EL CONTRATO 797 DE 2021 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 1 - 2021											
AMPAROS											
RIESGO: INTERVENTORIA											
AMPAROS											
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				SOMA ASEG/ACTUAL		SOMA ASEG/ANTERIOR	
18/08/2021				10/10/2022				\$125,138,934.00			
18/08/2021				09/04/2027				\$125,138,934.00			
18/08/2021				09/04/2025				\$61,539,467.00			
ACELERACIONES											
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ANTERIOR CITADA Y SEGURO ACTA DE INICIO DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 AL CONTRATO 797 DE 2021 DE ACORDA A LA VIGENCIA TÉCNICA.											
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.											
VALOR PRIMA NETA											
GASTOS EXPEDICIÓN											
IVA											
TOTAL A PAGAR											
VALOR ASEGURADO TOTAL											
PLAN DE PAGO											
\$ ****1,695,275.00											
\$ *****20,000.00											
\$ *****326,092.00											
\$ *****2,042,367.00											
\$ *****307,797,335.00											
CONTADO											
INTERMEDIARIO											
DISTRIBUCIÓN SOA SEGURO											
NOMBRE											
CLAVE											
% DE PATE											
NOMBRE COMPAÑÍA											
% PATE											
VALOR ASEGURADO											
AGENCIA DE SEGUROS SALAZARSA E HIJO 93106											
100.00											
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.											
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.											
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.											
ESTADO S.A. - SEGUROS DE VIDA DEL											
ESTADO S.A. - SEGUROS DE ACCIDENTES DEL											
ESTADO S.A. - SEGUROS DE FIANZA DEL											
ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.											
15-44-101247513											
FIRMA AUTORIZADA: Nubia Mora - Vicepresidenta Ejecutiva											
FIRMA TOMADOR											
PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM											
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-39 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2121808											
ADRIANABERNALDE 1											

**AMPAROS
ASEG/ACTUAL**

VIGENCIA DESDE - VIGENCIA HASTA SUMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2021	10/10/2022	\$123,118,934.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2021	09/04/2027	\$123,118,934.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2021	09/04/2025	\$61,559,467.00

Aseguradora

Seguros del estado S. A

No. De póliza:

15-44-101247513

Fecha de Expedición:

01/09/2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

Las pólizas no han tenido modificación alguna a la fecha del informe

				COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO			
Somos tu compañía siempre NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES				ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001			
Nº. PÓLIZA	CSC-100014084	Nº. ANEXO	3	Nº. CERTIFICADO	280032534	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN		09/09/2021		CEN SABANA CENTRO	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas del 18/08/2021		24:00 Horas del 06/03/2025				N/A	
TOMADOR		CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020		No. DOC. IDENTIDAD		901.506.599-0	
DIRECCIÓN		TRANSVERSAL 21 BIS N 59-57		TELÉFONO		3112887795	
ASEGURADO		BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT		No. DOC. IDENTIDAD		899.999.061-9	
DIRECCIÓN		CARRERA 60 NO.63A-52		TELÉFONO		3241000	
BENEFICIARIO		BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT		No. DOC. IDENTIDAD		899.999.061-9	
DIRECCIÓN		CARRERA 60 NO.63A-52		TELÉFONO		3241000	
OBJETO DE CONTRATO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 794 DE 2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 1. 2021. TOMADOR//AFIANZADO: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 SAFRID INGENIERIA S.A.S., NIT. 900.520.848 4 (PART 50%) ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S., NIT. 822.006.084 8 (PART 50%)							
NOMBRE DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA A SEGUROS \$	
CUMPLIMIENTO		00:00 Horas del 18/08/2021		24:00 Horas del 02/06/2022		1,026,081,996.20	
PRESTACIONES SOCIALES		00:00 Horas del 18/08/2021		24:00 Horas del 02/02/2025		513,040,998.10	
CALIDAD DEL SERVICIO		00:00 Horas del 18/08/2021		24:00 Horas del 02/12/2022		1,026,081,996.20	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		00:00 Horas del 02/02/2022		24:00 Horas del 02/02/2024		1,026,081,996.20	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		00:00 Horas del 18/08/2021		24:00 Horas del 02/06/2022		1,530,122,994.30	
TOTAL A SEGURO						5,130,409,981.00	
INTERMEDIARIOS		TIPO		% PARTICIPACIÓN			
DIANA ALFONSO DUARTE		AGENTES		100.00			
DISTRIBUCIÓN COSEGURO							
COMPANIA	TIPO COSEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN			
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 09/09/2021							
PRIMA BRUTA		\$		1,028,893.00			
DISECUENTOS		\$					
EXTRA PRIMA		\$					
PRIMA NETA		\$		1,028,893.00			
GASTOS EXP.		\$		0.00			
IVA		\$		195,490.00			
TOTAL A PAGAR		\$		1,224,383.00			
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA							
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCERÍA). PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1086 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNCIÓN AMENOR EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARTABULA, MANIFESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTA ADICIONALMENTE QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRVDU DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.							
Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.				TOMADOR			
Cumplimos las leyes de nuestro país actuando responsablemente. Presalvo el Medio Ambiente en todo lo que hacemos y actuamos.				Líneas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713			

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,026,081,996.20	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/02/2025	513,040,998.10	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/12/2022	1,026,081,996.20	1,028,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 02/02/2022	24:00 Horas del 02/02/2024	1,026,081,996.20	0.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,539,122,994.30	0.00
TOTAL ASEGURADO			5,130,409,981.00	

Aseguradora

No. De póliza:

No. De Certificado:

Fecha de Expedición:

Compañía Mundial de seguros S. A

CSC-1000014084

280032534

08/09/2021

Con relación a este punto se indica que la interventoría como el contratista se encuentran con las garantías (Pólizas) actualizadas, firmadas y vigentes.

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

MV 4009
APERTURADO: 03/112021
FLOR ALBA CORTES
CIUDAD BOLÍVARHABITARTE 2029 JUAN PABLO II
CRA 18Q BISA 66A 67 SUR
3206568881

Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La beneficiaria manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia de este, ni datos de valor de este, se abre PQRS.

Se realiza seguimiento.

Se recomienda a la beneficiaria estar pendiente de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones iniciales entre las que estaban el cuidado de sus objetos personales y de valor. Se realiza seguimiento a la PQRS interpuesta; de igual manera se informa a la beneficiaria que el caso será llevado a comité. MVCB_4009 FLORALBA CORTES Se hace entrega de documento respuesta en el cual se informa que el caso no cuenta con las pruebas suficientes para dar una respuesta afirmativa, la señora se niega a firmar el recibido, los allí presentes firman en constancia y se toma registro fotográfico.

CERRADO

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA								
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
FECHA	24/10/2021		PERÍODO No.		10	DEL	18/10/2021	AL	24/10/2021
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	797-2021				CONTRATO No.:	794-2021			
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días				PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días			
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021				FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0				**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0				**FECHA DE REINICIACIÓN:	0			
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022				FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022			
PLAZO ACTUALIZADO:	0				PLAZO ACTUALIZADO:	0			
PLAZO TRANSCURRIDO:	0				PLAZO TRANSCURRIDO:	0			
VALOR INICIAL :	\$ 615.594.670,00				VALOR INICIAL :	\$ 5.130.409.981,00			
VALOR ADICIÓN(ES):	\$ -				VALOR ADICIÓN(ES):	\$ -			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -				VALOR ACTUALIZADO:	\$ -			
VALOR ANTICIPO:	\$ -				VALOR ANTICIPO:	\$ -			
VALOR POR PAGAR:	\$ -				VALOR POR PAGAR:	\$ -			
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO				INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO					FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.									
3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL									
Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra. Fase de validación y apropiación:									
4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA									
CIUDAD BOLIVAR									
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU									
INFORME MENSUAL 3									
SOCIALIZACIONES									

<p>El día 26 de octubre de 2021, se realizaron tres socializaciones en el territorio de Jerusalén Ciudad Bolívar, se desarrollaron en los horarios 8:30AM, 10:30 am y 12:30 M. Cada reunión tuvo una convocatoria para un total de 47 beneficiarios. La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación. Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés siga igual conforme en tanto se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar, además de la valoración de las condiciones de salud para contrarrestar cualquier tipo de contagio por Covid 19.</p> <p>Beneficiarios convocados 141 Vía telefónica 113 Correo certificado 28 Asistentes 117</p>
VALIDACIONES REALIZADAS
02/11/2021 - MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
02/11/2021 - MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - MVJE_572: FABIOLA GARCÍA DURAN . Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
02/11/2021 - MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - MVJE_050: HERSILIA PARRA PEÑA . Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
2/11/2021 MVCB_2252 CAMPO ELÍAS GIL PARDO Se realiza visita de validación al predio se realiza formato de caracterización de los dos predios con la información de los beneficiarios, Es importante resaltar que se solicita a la SDHT realizar acompañamiento para establecer las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta que sobra presupuesto
03/11/2021 MVJE_1068 GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN. Se realiza validación técnica y social. Recibe visita con carta de autorización esposa FABIENNE GAONA. Sin novedades.
03/11/2021 MVJE_251 LUZ AMANDA BUITRAGO Se realiza validación técnica y social.Recibe visita con carta de autorización hija LEIDY VANNESA HURTADO. Sin novedades.
03/11/2021 MVJE_380 JOSE JOAQUÍN ZAMORA LEÓN Se realiza validación técnica y social.Recibe visita con carta de autorización hija ADELAIDA ZAMORA. Sin novedades.
03/11/2021 MVJE_174 LUZ ESTELA SANCHEZ CORTES: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
03/11/2021 MVJE_1042 MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
03/11/2021 MVJE_545 LADY ESPERANZA ACOSTA SANDOVAL , SIN NOVEDAD NUMERO DE EJECUCIÓN 209
03/11/2021 MVJE_233 ODALINA ARDILA , SIN NOVEDAD
03/11/2021 MVJE_402 LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS, SIN NOVEDAD
03/11/2021 MVJE_022 PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
04/11/2021 MVJE_909 JOSE GREGORIO BELTRAN Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
04/11/2021 MVJE_224 ALEXANDRA MOLINA RIKNCON Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio,se realizara intervencion en el segundo piso se llega a compromiso con la beneficiaria que para la fecha de inicio de obra la beneficiaria debera realizar el cambio ded cubierta.
04/11/2021 MVJE_1058 LIGIA YINETH RODRIGUEZ Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio, la vivienda se encuentra dividida en 2 por lo cual se realizara intervencion en las 2 areas.
04/11/2021 MVJE_323 SANDRO ESTEBAN LEYTON Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio, se realizara intervencion al sugundo piso
05/11/2021 MVJE_880 RAQUEL GARCIA Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 MVJE_1007 ANA LEONOR CELIS DE MATINEZ Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 MVJE_1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.

05/11/2021	MVJE_066 ERNESTO CARDENAS	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021	- MVJE_452: PEDRO JULIO UREÑA	. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021	- MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021	- MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.	Atiende la visita su esposo CARLOS ALBERTO RIVAS, no tiene carta de autorización, se hace contacto telefónico con la beneficiaria quien autoriza al señor, la social del contratista le indica que debe hacer carta de autorización.
05/11/2021	- MVJE_429: MARÍA MYRIAM CASTELLANOS MORALES	. Atiende la visita su hijo BORWMAN ALEXÁNDER GONZÁLEZ CASTELLANOS ya que la beneficiaria tiene discapacidad cognitiva; se adjunta carta de autorización y fotocopias de las cédulas.
08-11-2021	MVJE_985 ANGELA SUAREZ RAMOS	,SIN NOVEDAD NUMERO DE EJECUCIÓN 209
08-11-2021	MVJE_962 ,RAUL MUÑOZ RODRÍGUEZ	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
08/11/2021	- MVJE_573: SANDRA MILENA PRECIADO.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
08/11/2021	- MVJE_356: ANA ROSA SOSA DIAZ DE GONZÁLEZ.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
08/11/2021	- MVJE_149: LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio. POSTULADO PARA HISTORIA DE VIDA
08-11-2021	MVJE_1006 CAMPO ELÍAS CUBIDES BALLEEN,	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
09/11/2021	MVJE_941 EDGAR ELI SANCHEZ GÓMEZ.	Recibe visita hija autorizada Anyul Andrea Sánchez Campero Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_457 HILDA MERY PALOMO GUARIN.	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_133 LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA.	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
9/11/2021	MVJE_326 LUZ MARINA SIERRA SIERRA	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
9/11/2021	MVJE_882 DUMAR ESTIVEN SASOQUE	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades, vivita atendida por la esposa del beneficiario.
9/11/2021	MVJE_062 PEDRO CLAVER SIERRA DE LA OZ	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades, visita atendida por la esposa del beneficiario ROSALBA HERNANDEZ quien informa que no desea que se intervengan los pisos de la vivienda, en la validacion se evidencia que el cableado electrico no esta canalizado ni regateado se informa que el contratista no realiza actividades electricas raszon por la cual el beneficiario debe ejecutar dicha actividad sin embargo refieren no tener dinero para canalizar y regatear los cables se levanta acta.
9/11/2021	MVJE_264 ALCIRA TEATINO GARCIA	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_244 JAIRO BERNAL	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_058 DILMA MARIA DEL CARMEN RIVERA	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_1087 ALONSO OIDOR	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades, se solicita al beneficiario mantener su mascota encerrada durante la ejecucion de las obras ya que el perro es agresivo con personas externas a la vivienda.
09/11/2021	MVJE_359 CARMEN ELISA PRADA ABELLO.	Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
09/11/2021	MVJE_928 JUAN CARLOS NAVA SALCEDO.	Recibe visita esposa autorizada ANA SOFÍA GARZÓN GALINDO. Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
10-11-2021	MVJE_1148 LUIS EDUARDO JIMÉNEZ VERA	SIN NOVEDAD
10-11-2021	MVJE_295 HENRY GIRALDO	SIN NOVEDAD
10-11-2021	MVJE_254 MARIA HILDA GUAQUETA GONZÁLEZ	SIN NOVEDAD
10-11-2021	MVJE_957 LUZ STELLA AGUILERA	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
10-11-2021	MVJE_243 IMARIA DE JESÚS GARAVITO GARCÍAN	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
10/11/2021	- MVJE_293: ELSA MARÍA MARTÍNEZ.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021	- MVJE_241: RUBY STELLA JAIMES.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021	- MVJE_360: ARTURO FLORES BARAJAS.	Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.

10/11/2021 - MVJE_164: SARA RODRÍGUEZ RAMOS. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021 - MVJE_435: JUVENAL ESPINOSA MUR. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021 - MVJE_434: NOHEMI MORALES ORTIZ. Recibe la visita su hijo autorizado JONATHAN ESNEIDER ESTUPIÑÁN MORALES. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021 - MVJE_574: LUIS ARMANDO SANABRIA. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
10/11/2021 - MVJE_624: DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA.. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
11/11/2021 MVJE_180 DAISSY GARZON Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
12/11/2021 - MVJE_321: JOSÉ MIGUEL MORENO ROBAYO. Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
12/11/2021 - MVJE_453: MERLY BELTRÁN AGUDELO. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
12/11/2021 MVJE_942 JESÚS ANTONIO GARAVITO: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
12/11/2021 MVJE_1016 LUZ DARY GARCIA MORALES: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
12/11/2021 MVJE_077 MARIA MAGNOLIA ARIAS: Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
12/11/2021 MVJE_1017 OSWALDO HERNANDEZ SÁNCHEZ. Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
12/11/2021 MVJE_907 ANA ISABEL GONZALEZ Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.
16/11/2021 - MVJE_405: DIANA BEATRIZ AVELLANEDA DÍAZ. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021 - MVJE_868: MARÍA IDALINA PALOMINIO MENDOZA. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021 - MVJE_030: NUBIA LUCERO NEIRA JERENA. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021 - MVJE_009: MARÍA MERY VARGAS LÓPEZ. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021 MVJE_431 MARIA BELLANID MENDEZ Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realizar la medición al predio, atiende la vivista la hija de la beneficiaria
17-11-2021 MVJE_247 _WILLIAN HUMBERTO DIAS ,SIN NOVEDAD , POTOSI -JERURALEN
17-11-2021 MVJE_889_ LUZ GARAY RAMOS ,SIN NOVEDAD , POTOSI -JERURALEN
19-11-2021 MVJE _892 _RUTH EDITH LEAL CRUZ ,SIN NOVEDAD - POTOSI
19-11-2021 MVJE _110 _RIGOBERTO OSMA ARMERI , SIN NOVEDAD . POTOSI
VALIDACIONES FALLIDAS
02/11/2021 - MVJE_010: YOLANDA MENESES. VALIDACIÓN FALLIDA. No se logra hacer la validación ya que la vivienda presenta varios inconvenientes estructurales; se solicitará acompañamiento de la entidad.
02/11/2021 - MVJE_356: ANA ROSA SOSA DIAZ DE GONZÁLEZ. VALIDACIÓN FALLIDA. No se logra hacer vándacion ya que la familia se encuentran haciendo obras en la vivienda, se hace contacto telefónico con uno de los hijos y se agenda la validación para la semana entrante.
08/11/2021 - MVJE_405: DIANA BEATRIZ AVELLANEDA DÍAZ. VALIDACIÓN FALLIDA. No se logra hacer vándacion ya que la familia se encuentran haciendo obras en la vivienda, se levanta acta de compromiso en la cuál se le da un plazo a la familia de 8 días para terminar.dichas obras.
09/11/2021 MVJE_1000 MARIA DEL CARMEN ALONSO VALIDACIÓN FALLIDA se realiza segunda validacion fallida la beneficiaria se encontraba citada a la 1 de la tarde sin embargo no llego a la vivienda, se realizara una tercer visita de no ser posible encontrar a la beneficiaria se reportara a la SDHT.
10/11/2021 - MVJE_319: MANUEL FONSECA ALVAREZ. VALIDACIÓN FALLIDA. No se logra hacer la validación ya que la familia se encuentra haciendo obras , el contratista le indica que la semana entrante se acercará nuevamente al predio.
10/11/2021 - MVJE_624: DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA. VALIDACIÓN FALLIDA. No atienden a la puerta, el teléfono está errado. Se deja volante bajo puerta con el contacto del consorcio.

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
21/10/2021 - MVCB_ 3809 : ISABEL IBAÑEZ ALANREZ , APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD -
21/10/2021 - MVCB_ 3822: SORY INES CORTES LOPEZ ,/quien presenta discapacidad(retraso cognitivo moderado) y es quien aparece como beneficiaria del mejoramiento de vivienda, por lo tanto quien firma la documentación es la Señora CLARA INES CORTES, propietaria de la vivienda Desarrollo: Juan Pablo II. Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
22/10/2021 MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
22/10/2021 - MVCB_ 3798: MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN ,APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD
28/10/2021 MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ TOQUICA Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
28/10/2021 MVCB_ 4475. MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO: Se realiza la apertura de obra en presencia de contratista e interventoria, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Sin novedades y/o inconformidades. Se presentan maestros de obra encargados.
29/10/2021 - MVCB_ 3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO. Atiende la visita su hermano autorizado YESID SIMBAQUEBA AFRICANO. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
29/10/2021 MVCB_ 2243 HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
02/11/2021 - MVCB_ 3748: ANA CECILIA CAMACHO. Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
2/11/2021 MVCB_ 4011 MARÍA SILVERIA SIGUA Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
3/11/2021 MVCB_ 3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
08/11/2021 MVCB_ 4968 LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO: Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
09/11/2021 MVCB_ 4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO: Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
09/11/2021 - MVJA_ 011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
09/11/2021 - MVJA_ 032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
09/11/2021 - MVJA_ 275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Atiende su hija autorizada JESICA BASTO. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad Se presentan maestros encargados.
11/11/2021 MVJE_ 264 ALCIRA TEATINO GARCIA Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
11/11/2021 MVJE_ 882 DUMAR ESTIVEN SASTOQUE Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
11/11/2021 MVJE_ 1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
11/11/2021 MVJE_ 066 ERNESTO CARDENAS Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
12/11/2021 - MVJA_ 351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad Se presentan maestros encargados.
12/11/2021 - MVJA_ 358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ. Recibe la visita su esposo autorizado ALBERTO RIVAS. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad Se presentan maestros encargados.
12/11/2021 - MVJA_ 604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad Se presentan maestros encargados.
12/11/2021 - MVJA_ 573: SANDRA MILENA PRECIADO. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad Se presentan maestros encargados.
16/11/2021 MVBC_ 4892 JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA , SIN NOVEDAD (CUBIERTA) _ JUAN PABLO II
16/11/2021 MVCB_ 2252 CAMPO ELIAS GIL PARDO Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
16/11/2021 MVCB_ 2252N ABIGAIL PARDO Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales al encargado del predio su hijo CAMPO ELIAS GIL
16/11/2021 MVCB_ 1020 ALIX MAYORGA GARCIA Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
17/11/2021 MVJE_ 323 SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales

17/11/2021	MVJE_323 SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
17/11/2021	MVJE_180 DAISSY GARZON TAFUR	Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
17/11/2021	MVJE_224 ALEXANDRA MOLINA RINCON	Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
17/11/2021	MVJE_380 JOSE JOAQUÍN ZAMORA LEÓN	Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
17/11/2021	MVCB_2411: MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ	: Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y se presentan maestros encargados. EL contratista hace el compromiso con el beneficiario de iniciar labores constructivas el día martes 23-11
17/11/2021	MVJE_452: PEDRO JULIO UREÑA.	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y se presentan maestros encargados. Se hace el compromiso con el beneficiario de iniciar labores constructivas el día lunes 22-11 ya que necesita desocupar las áreas a intervenir.
17/11/2021	MVJE_251 LUZ AMANDA BUITRAGO:	Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
17/11/2021	MVJE_1068 GERARDO ANTONIO ALFONSO	: Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
17/11/2021	MVJE_1148 _ LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	, SIN NOVEDAD , POTOSI
17/11/2021	MVJE_962_ RAUL MUÑOZ, AUTORIZA A LA SEÑORA	; LUZ Faridy preciado (suegra), POTOSI
17/11/2021	MVJE_572: FABIOLA GARCÍA DURAN..	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021	MVJE_429: MARÍA MIRIAM CASTELLANOS.	Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
17/11/2021	MVJE_985 _ ANGELA SUAREZ RAMOS	, SIN NOVEDAD . POTOSI
18/11/2021	MVCB_4043 SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
18/11/2021	MVJE_243 MARIA DE JESUS GARAVITO	SIN NOVEDAD . POTOSI
19/11/2021	MVJE_247 WILLIAM HUMBERTO ARIAS	, SIN NOVEDAD . POTOSI
19/11/2021	MVJE_293: ELSA MARÍA MARTÍNEZ.	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y se presentan maestros encargados. Se hace el compromiso con el beneficiario de iniciar labores constructivas el día lunes 22-11 ya que necesita desocupar las áreas a intervenir.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II		
APERTURAS FALLIDAS		
	no se presentaron en el transcurso de la semana	
SEGUIMIENTOS SOCIALES		
21/10/2021	MVCB_3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA,	NO se evidencian avaces en la obra la beneficiaria expresa su molestia por la inactividad en las obras.
21/10/2021	MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.	Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra
21/10/2021	MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
21/10/2021	MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
21/10/2021	MVCB_4072: SAIRA RAMÍREZ VARGAS	. La encargada MIRIAM SÁNCHEZ manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
21/10/2021	MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.	Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por qué los maestros retomaron labores constitutivas.
21/10/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO	se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se establece con la beneficiaria nueva fecha para el cumplimiento de compromiso referente al cambio de tejas especificas en el predio para poder garantizar las labores realizadas en los diversos espacios
21/10/2021	MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO	se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
21/10/2021	MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA	se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría, la hija de la beneficiaria informa que está conforme con las labores realizadas por el maestro y manifiesta su conformidad con las labores

21/10/2021	MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría, los beneficiarios estar molestos debido a la manera como se llevó a cabo el proceso de instalación de cenefa decorativa en el baño, así mismo porque a la fecha no se cuenta con puerta en este.
21/10/2021	MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría, la beneficiaria manifiesta estar conforme con el avance, informa así mismo que incluyeron otro maestro con el fin de avanzar en las actividades del predio
22/10/2021	MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría, se evidencia avance importante en las labores de obra, el beneficiario manifiesta estar conforme con las labores y se establece que los maestros ya cumplieron con el compromiso de no fumar al interior del predio.
22/10/2021	- MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Seguimiento en el cual el señor Pedro solicita cambiar una actividad, el contratista le indica que se contemplará. No se evidencia personal en obra.
22/10/2021	- MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON. Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, la beneficiaria manifiestan conformidad, se observa maestros encargados adelantando actividades
22/10/2021	- MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA. Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario no indica dudas e inquietudes
22/10/2021	- MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad
22/10/2021	- MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. Seguimiento en el cuál se observan a los maestros encargados. Se hace contacto teléfono con la encargada y manifiesta conformidad con los avances constructivos.
22/10/2021	- MVCB_4072: SAIRA RAMÍREZ VARGAS . La encargada MIRIAM SÁNCHEZ manifiesta conformidad con los avances constructivos; se le hace la entrega del enchape de una habitación. Se observa personal de obra en el predio .
22/10/2021	- MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ. La beneficiaria manifiesta inconformidad ya que los maestros no han laborado la semana en curso con normalidad. El contratista le indica que el día lunes retomará labores
22/10/2021	- MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS. seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas ya que el personal de obra retoma labores. Se observa personal de obra en el predio
22/10/2021	- MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. No atienden a la puerta, no se evidencia personal en el predio.
22/10/2021	- MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ. Seguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
22/10/2021	- MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ. Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores constitutivas.
22/10/2021	- MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ. Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores constitutivas.
22/10/2021	MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON: Recibe visita autorizado EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reportan dudas y/o inconformidades respecto a los avances en las obras.
22/10/2021	MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ. se realiza visita de seguimiento por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades de pañete. Beneficiario no reporta dudas y/o inconformidades.
22/10/2021	MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS. Se realiza visita de seguimiento social contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto frente al presupuesto. No reporta inconformidades.
22/10/2021	MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades de pañete. Beneficiario no refiere inconformidades con los avances, se resuelven dudas al respecto con la obra.
22/10/2021	MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO, Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se realiza contacto telefónico con autorizada NUBIA NANCY CARRETO, se resuelven dudas frente actividades en cocina y material de enchape para piso, se deja claridad que para el proyecto se usa un color estándar y no hay posibilidad de elección. Refiere conformidad con los avances.
22/10/2021	MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO. Se realiza seguimiento social y técnico con interventoría y contratista. Se evidencia maestro acopiando arena para actividades de pañete. No se evidencia avances en las obras.
22/10/2021	MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ. Se realiza visita social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades de pañete. No se evidencia mayor avances desde día de apertura 15/10/2021. Se resuelven dudas a la beneficiaria
22/10/2021	MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO. Atiende visita hijo autorizado EDIXSON GERARDO CAMELO. Se realiza visita de seguimiento social. Maestros se encuentran en renovación de curso de alturas. Se evidencias avances en las obras. Autorizado no reporta dudas y/o inquietudes con los avances.
22/10/2021	MVCB_4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO. Recibe visita nieta autorizada KAREN PIRACHICAN. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades de pañete. No se reportan dudas y/o inquietudes con los avances en obra.
22/10/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO. Recibe visita utorizada GLADYS ARIAS, arrendataria. Se realiza visita social a la obra, se evidencia maestros ejecutando actividades de pañete. Autorizada no reporta dudas/inconformidades al respecto con las obras avanzadas.
22/10/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA. Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances en las obras.

22/10/2021 MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR. Se realiza visita social y técnica de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. Se resuelven dudas a la beneficiará de actividades en área de la cocina. Expresa conformidad con los avances. Desarrollo Juan Pablo II. Cumple con compromiso de instalación de flanches para continuar actividades de cielo raso.
22/10/2021 MVCB_ 4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO. Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con los avances en obra.
22/10/2021 MVCB_ 4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO: Recibe visita encargada esposa MIRIAM LÓPEZ. Se realiza visita de seguimiento social y técnico, contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de enchapé piso. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
22/10/2021 MVCB_ 4498 ELCI RUTH ORTIZ MORENO: Recibe visita Hija autorizada JERALDIN GARAVITO. Se evidencian maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades hasta el avance de las obras. Beneficiaria expresa conformidad con las obras.
22/10/2021 - MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ. Seguimiento en el cuál se evidencia maestros encargados en el predio. El beneficiario indica conformidad y no manifiesta dudas e inquietudes
23/10/2021- MVCB_3709 : CESARIO BONILLA VERA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el encargado del predio JHON JAIRO LLANOS CUELLAR no se encontraba al momento de la visita.
23/10/2021- MVCB_0838 :LIGIA LOMBANA DE LUMPIA, Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
23/10/2021- MV_42838- IDU : DESIDERIO MAYORGA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
23/10/2021- MVCB_2020: BLANCA CUSTODIA MORENO, Acompañamiento metodologia historia de vida
25/10/2021 MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES. Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Beneficiará expresa inconformidad por demoras en las obras 46 días en ejecución. Falta rematar áreas intervenidas. Se alerta al contratista para dar prioridad y finalizar entrega.
25/10/2021- MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON: Recibe visita autorizado EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ. Se realiza visita social a la obra evidenciando maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto actividades de obra. Manifiesta conformidad con los avances.
25/10/2021 MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ: Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestro en la vivienda. Beneficiarios expresan inconformidad por intermitencia de personal la semana pasada. Se le informa que están dentro del tiempo de ejecución, sin embargo será informado y avanzar de manera significativa en las obras.
25/10/2021 MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS: Se realiza visita de seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas. Expresa conformidad con los avances y personal de obra.
25/10/2021 MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES. Se realiza seguimiento social a la obra por parte interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere inconformidades con los avances, no hay dudas al respecto.
25/10/201 MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO: Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
25/10/2021 - MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA. Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargado.
25/10/2021 - MVCB_4185: PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Seguimiento se evidencia personal en obra.
25/10/2021 - MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON. Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
25/10/2021 - MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA. Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. Atienden la visita la esposa encargada del beneficiario Mary Luis Raba, no indica dudas e inquietudes.
25/10/2021 - MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad .
25/10/2021 - MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. Seguimiento en el cuál no se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria.
25/10/2021 - MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. No atienden a la puerta, no se evidencia personal en el predio.
25/10/2021 - MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS. seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. No se observa personal de obra en el predio.
25/10/2021 - MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ. La beneficiaria no atiende a la puerta, los maestros no están laborando y el contratista le había indicado que el día de hoy retomaban labores.
25/10/2021 - MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON. Nuevamente se procede a la vivienda ya que un familiar tiene dudas sobre una actividad en el baño. El contratista le indica que lo revisara ya que debe hacer un cambio en el presupuesto. Se hace contacto teléfono con la autorizada y se deja registro en bitácora
25/10/2021 - MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ. Seguimiento en el cuál se evidencia maestros encargados en el predio. El beneficiario indica conformidad y no manifiesta dudas e inquietudes.
25/10/2021 MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria manifiesta que los maestros no han asistido al predio desde el día viernes, pide se aceleren las labores.
25/10/2021 MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO Se realiza seguimiento evidenciando importante avance, se realiza verificación de espacios para entrega.
25/10/2021 MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO Se realiza seguimiento evidenciando y realizando medición para entrega al predio
27/10/2021 MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA Se realiza visita de seguimiento al predio social de obra e interventoría en la cual se evidencia que no cuentan con maestros, los beneficiarios solicitan se establezca una cuadrilla fija para las labores, esto debido a temas de seguridad de los residentes como del jardín que funciona en el hogar.

27/10/2021	MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL	Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia importante avance en el predio y los beneficiarios manifiestan estar conformes con las labores a la fecha.
27/10/2021	MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia importante avance en el predio y los beneficiarios manifiestan estar conformes
27/10/2021	MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO	Se realiza visita de seguimiento al predio social de obra e interventoría en la cual se evidencia que no cuentan con maestros, los beneficiarios solicitan se establezca una cuadrilla fija para las labores, esto debido a temas de seguridad de los residentes, Se solicita dar prioridad a las obras teniendo en cuenta que en la vivierend se encuentra una mujer en estado de gestacion
27/10/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO	Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia aun ausencia de los trabajadores a lo cual se solicita cambio de los mismos o que laboren únicamente en este predio
27/10/2021	- MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.	Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados.
27/10/2021	- MVCB_4185: PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.	Seguimiento se evidencia personal en obra.
27/10/2021	- MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
27/10/2021	- MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.	Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. Atienden la visita la esposa encargada del beneficiario Mary Luis Raba, no indica dudas e inquietudes.
27/10/2021	- MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.	Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad
27/10/2021	- MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.	Seguimiento en el cuál no se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria
27/10/2021	- MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.	Se evidencia maestros en el predio
27/10/2021	- MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.	seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
27/10/2021	- MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.	Se observa personal de obra en el predio.
27/10/2021	MVCB_4498 ELCI RUTH ORTIZ MORENO:	Recibe visita Hijo autorizado CARLOS TAFUR . Se evidencian maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto a las obras. No se evidencia inconformidades con el avance de las obras.
27/10/2021	MVCB_4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:	Recibe visita encargada esposa MIRIAM LÓPEZ . Se realiza visita de seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de enchapé baño e instalación cielo Razo. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
27/10/2021	MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:	Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con los avances.
27/10/2021	MVCB_4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.	Se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. Se realiza contacto telefónico con beneficiar solicitando ajustar flanches en el techo, debido a que se está filtrando el agua y se evidencia el levantamiento del estuco.
27/10/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.	Se realiza visita de seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
27/10/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO.	Recibe visita autorizada GLADYS ARIAS , arrendataria en la vivienda. Se realiza visita social a la obra, se evidencia maestros ejecutando actividades. Autorizada no reporta dudas/inconformidades. Se solicita al contratista avanzar en áreas de cocina y baño, se evidencia poco avance.
27/10/2021	MVCB_4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.	Recibe visita nieta autorizada KAREN PIRACHICAN . Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inquietudes. Se evidencia que beneficiario cumple compromiso de arreglo de canal para continuar con actividades.
27/10/2021	MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.	Atiende visita hijo autorizado EDIXSON GERARDO CAMELO . Se realiza visita de seguimiento social. Se evidencia maestros ejecutando actividades, sin embargo se realiza contacto telefónico con técnico del contratista encargado para solicitar visita y resolver dudas al maestro. Autorizado no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021	MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:	Se realiza seguimiento social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiaria no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021	MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.	Se realiza seguimiento social a la obra con interventoría y contratista. No se evidencia avances en las obras. Maestro se encuentra ejecutando actividades. Se resuelven dudas al beneficiario.
28/10/201	MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances.
28/10/2021	MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES:	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere inconformidades con los avances, no hay dudas al respecto.
28/10/2021	MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:	Se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro en la vivienda. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances.
28/10/2021	MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS:	Se realiza visita de seguimiento social por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto con actividades reportadas en el presupuesto. Se le recomienda a la familia, seguir el protocolo de bioseguridad dentro de e la vivienda.
28/10/2021-	MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:	Recibe visita autorizado EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ . Se realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto a actividades de obra. No refiere inconformidades.
28/10/2021	MVCB_4811JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Beneficiario no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021	MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA	Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, se realiza medición por parte del área técnica de los espacios, el beneficiario solicita no se instale la puerta del baño y se le deje debido a los inconvenientes de humedad que se están generando en el predio.
28/10/2021	MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA	Se realiza seguimiento al predio y se evidencia progreso en las labores de obra con importante avance, se establece revisión de las actividades realizadas.

28/10/2021	MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto frente al presupuesto y actividades a ejecutar. No refiere inconformidades con lo expuesto.
29/10/2021	MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.	Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol. Se le recuerda el conducto regular, sooo resolver dudas con contratista e interventoría.
29/10/2021	MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.	seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
29/10/2021	MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.	Seguimiento en el cuál se observan los maestros encargados. la Beneficiaria manifiesta gratitud por las labores adelantadas
29/10/2021	MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.	Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria indica una inquietud técnica la cual es resuelta por el narra encargadas.
29/10/2021	MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA.	Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario, no indica dudas e inquietudes.
29/10/2021	MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa que la familia se encuentra levantando cubierta, está haciendo actividades simultáneas. Se paran labores constructivas hasta que la beneficia acabe de arreglar cubierta.
29/10/2021	MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.	Se observa personal de obra en el predio
29/10/2021	MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ.	Seguimiento en el cuál el contratista le indica al beneficiario que el martes los maestros retomarán labores constructivas.
02/11/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO.	Recibe visita autorizada GLADYS ARIAS, arrendataria en la vivienda.e realiza visita social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades en cocina. Autorizada no reporta dudas/inconformidades.
02/11/2021	MVCB_4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.	Recibe visita nieta autorizada KAREN PIRACHICAN. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inquietudes.
02/11/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.	Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades en zona lavandería. No se reportan dudas y/o inconformidades.
02/11/2021	MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.	Atiende visita hijo autorizado EDIXSON GERARDO CAMELO. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas frente a zonas que serán intervenidas con vinilo. Expresa Conformidad con la respuesta. y avances en las obras.
02/11/2021	MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON.	Recibe visita autorizado EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ. e realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades de enchapé piso cerámico. No reporta dudas y/o inconformidades.
02/11/2021	MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO.	Autoriza a CINDY GUEVARA para estar al tanto de las obras. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades en cocina. Se resuelven dudas al respecto, expresa conformidad con los avances.
02/11/2021	MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades. Expresa conformidad con los avances.
2/11/2021	MVCB_4233 BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	, Se evidencia avances en obra, avances en acabados, vivienda sin novedad.
2/11/2021	MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,	Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021	MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANCA,	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA NO SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA.
2/11/2021	MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON,	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA SE EVIDENCIA AVANCES DE ACABADOS, SE HACEN RECOMENDACIONES POR PARTE TÉCNICA. (LA HOJA ES MÁS CORTA QUE EL VANO DE LA PUERTA).
2/11/2021	MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO	,SE REALIZA VISITA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA EL SEÑOR LEONARDO MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO POR FRENTE A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
2/11/2021	MVCB_3822 SORY INES CORTES LOPEZ	,SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
2/11/2021	MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,	Se realiza seguimiento social. Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021	MCVB_3809 ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	, SE REALIZA SEGUIMIENTO SE EVIDENCIAN ACABADO EN OBRAS
2/11/2021	MCVB_2243 HECTOR EUSTORGIO LOPEZ	, Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021	MCVB_3839 JOSE OLIVO CUADRADO	, Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021	MCVB_4272	, NIEVES LIZARAZO VALBUENA Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
02/11/2021	MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:	Se realiza visita social de seguimiento a la obra, para verificar posible entrega. Se evidencia falta de remates en área de cocina y zona de lavandería.
03/11/2021	MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES	Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La señora manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.
03/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa solicito a los maestros redistribuir el mesón, el área técnica verifica y realiza redistribución del espacio.
03/11/2021	MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL	Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el avance de las obras, se realizan recomendaciones técnicas a los maestros.

03/11/2021	MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el inicio de labores de los maestros en el predio, se explican actividades técnicas a los nuevos maestros
03/11/2021	MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría no se encuentra a la beneficiaria en el predio, se evidencia importante avance de obra.
03/11/2021	MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría y la hija del beneficiario realiza consultas sobre temas relacionados con la pintura de techos, si es necesario mover la estufa y referente al lavaplatos del predio, se da claridad a las dudas por parte del área técnica
03/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO	Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria informa que se está cumpliendo con el compromiso de mejoramiento de cubierta por parte de ella, los maestros se encuentran trabajando en el predio
04/11/2021-	MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:	Recibe visita autorizado EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ . Se realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de cielo raso. Falta instalación de puerta y remates para finalizar entrega. No reporta inconformidades con los avances en obra
04/11/2021	MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:	se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro en la vivienda. No se reportan dudas y/o inconformidades.
04/11/2021	MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS:	Se realiza visita de seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas. Expresa conformidad con los avances y personal de obra.
04/11/2021	MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES.	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de sobrepeso. Se resuelven dudas frente actividades a desarrollar en cocina, se realiza orientación técnica, sin embargo se realizara mesón conforme a su solicitud. Se deja anotación en bitácora.
04/11/2021 -	MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.	Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados
04/11/2021 -	MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa que la familia se encuentra levantando cubierta, está haciendo actividades simultáneas. Se paran labores constructivas hasta que la beneficia acabe de arreglar cubierta.
04/11/2021 -	MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.	Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario no se encontraba en el momento de la visita.
04/11/2021 -	MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.	Seguimiento en el cuál la beneficiaria indica conformidad, se observan maestros en el predio .
04/11/2021 -	MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.	Seguimiento en el cuál se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria.
04/11/2021 -	MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO.	La vivienda se Aperturo el 2 de noviembre y no se han presentado los maestros en el predio. El contratista indica que el lunes iniciaran labores. No se encuentra la beneficiaria en el predio. Se le solicita a la social hacer contacto telefónico con la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
04/11/2021 -	MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.	Se observa personal de obra en el predio.
04/11/2021 -	MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.	Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol.
04/11/2021	MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ.	Seguimiento en el cuál el contratista le indica al beneficiario que el día de ayer los maestros retomarán labores constructivas.
04/11/2021	MVCB_1072 , FLORINDA CADENA NINO,	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA .SE RETOMA OBRA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
04/11/2021	MVCB_3803,LUZ DARY SAENZ CAPERA	Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021	MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ TOQUICA,	Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021	MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE,	Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021	MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades de estuco. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.	Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades en zona lavandería. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021	MVCB_4475 MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO.	Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se resuelven dudas a la beneficiará frente algunas actividades en presupuesto. No expresa inconformidades con los avances
05/11/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.	Se realiza visita de seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO.	Recibe visita autorizada GLADYS ARIAS, arrendataria en la vivienda.Se realiza visita social a la obra,No se evidencia maestros en la vivienda. Poco avance en las obras, se alerta al contratista para dar continuidad a la obras.
05/11/2021	MVCB_4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades de remates para finalizar las obras. No se reportan dudas y/o inquietudes.
05/11/2021	MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.	Atiende visita hijo autorizado EDIXSON GERARDO CAMELO. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas frente actividades de remate. No reporta inconformidades con las obras ejecutadas.
05/11/2021	MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:	e realiza seguimiento social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiaria expresa inconformidad con los maestros, debido a que no se evidencia mayor avances en las obras.
05/11/2021	MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.	e realiza seguimiento social a la obra con interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiario expresa inconformidades con la intermitencia y poco avance en las obras.
05/11/2021	MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.	Seguimiento en el cuál la beneficiaria indica conformidad, se observan maestros en el predio culminado labores para realizar la entrega.
05/11/2021	MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.	Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados.

05/11/2021	MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN SE REALIZA SEGUIMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO Y SOCIAL DE INTERVENTORÍA,Y DIRECTOR DE OBRA, SE EVIDENCIAN MAESTROS EN OBRA EN EJECUCIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL BENEFICIARIO,
05/11/2021	MVCB_4401 , GLORIA STELLA ALARCON ,SE EVIDENCIAN AVANCES EN ACABADOS EN OBRA , INSTALACIÓN DE LA PUERTA
05/11/2021	MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO , SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
05/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA Se realiza visita de seguimiento social, se evidencia importante avance en habitación y cocina, la beneficiaria está conforme con las labores
05/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria informa que tan pronto le entreguen las dos habitaciones ella se moverá hacia estos espacios debido a la necesidad de reubicarse.
08/11/2021	- MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA. Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados.
08/11/2021	MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, se solicita a la beneficiaria copia de factura del teléfono celular perdido para seguir con el trámite de la PQRS.
08/11/2021	MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA Se realiza seguimiento social al predio, no se encuentra a la beneficiaria, se evidencia avance importante en las labores de cubierta del mismo.
08/11/2021	MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el avance de las obras.
08/11/2021	MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el inicio de labores de los maestros en el predio.
08/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA Se realiza seguimiento al predio y se evidencian labores en la cocina y habitación.
08/11/2021	MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría y la hija del beneficiario refiere que están conformes con el avance de las labores en el predio.
08/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO Se realiza seguimiento al predio, se evidencia cumplimiento del compromiso que tenía la beneficiaria, los maestros se encuentran trabajando en el predio
08/11/2021	- MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON. Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
08/11/2021	- MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA. Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario no se encontraba en el momento de la visita.
08/11/2021	- MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. Seguimiento en el cuál se observan a los maestros encargados. No se encuentra la Beneficiaria.
08/11/2021	- MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. Se observa personal de obra en el predio
08/11/2021	- MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO. Se evidencia personal de obra en el predio. La vivienda se encuentra desocupada.
08/11/2021	- MVCB_0666: ALFONSO SAENZ FERNANDEZ. Seguimiento en el cuál el beneficiario manifiesta conformidad con las obras.
08/11/2021	- MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ. Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol
08/11/2021	MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA. Se realiza visita de seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros finalizando actividades para entrega de vivienda. No se reportan dudas y/o inconformidades.
10/11/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO. Recibe visita autorizada GLADYS ARIAS, arrendataria en la vivienda. Se realiza visita social a la obra, se evidencia poco avance en las obras, se realiza contacto telefónico con la beneficiaria para resolver dudas escritas en bitácora, no responde al contacto. Sin embargo área técnica deja escrita las aclaraciones.
10/11/2021	MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO. Atiende visita hijo autorizado EDIXSON GERARDO CAMELO. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, se evidencia maestro ejecutando finalizando actividades. No reporta inconformidades con las obras ejecutadas.
10/11/2021	MVCB_4475. MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO. Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. No expresa dudas y/o inconformidades con los avances.
10/11/2021	MVCB_4498. ELCI RUTH ORTIZ MORENO. Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencian maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades hasta el avance de las obras.
10/11/2021	MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO: Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Expresa conformidad con los avances. No reporta dudas. Se recomienda al beneficiario solucionar filtración de agua en techo de baño, para prologar el cuidado del enchape instalado.
10/11/2021	MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades.
10/11/2021	- MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Atiende su hija autorizada JESICA BASTO. La familia indica conformidad. Se evidencia a los maestros encargados.
10/11/2021	- MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Se evidencia a los maestros encargados. La señora Mercedes indica conformidad por el inicio de las obras .
10/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria informa que se encuentra conforme con los avances, ya se encuentra ubicada en las habitaciones posteriores del predio.

10/11/2021	MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES	Se realiza seguimiento social, se le informa a la beneficiaria que el contratista no dará garantías de las actividades ejecutadas tanto de enchape como estuco y granito ya que estas fueron afectadas por las filtraciones en cubierta, desde la fecha de la apertura se informó a la beneficiaria quien se comprometió a realizar el cambio de las tejas. Teniendo en cuenta que se llegó a la altura de 2.50 de pañete y no es posible aumentar la altura debido a que es necesario utilizar andamio, se le informo a la beneficiaria que se iba a dejar el corte a esta altura, ella informo a contratista e interventoría que culminaría el pañete razón por la cual no se terminó el corte, en revisión técnica ya se ejecutó actividad de estuco y pintura sin embargo la beneficiaria no realizo dicha actividad. Se recomienda a la beneficiaria estar pendiente de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones iniciales entre las que estaban el cuidado de sus objetos personales y de valor. Se realiza seguimiento a la PQRS interpuesta; de igual manera se informa a la beneficiaria que el caso será llevado a comité.
10/11/2021	MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA	Se realiza seguimiento social al predio, no se localiza a la beneficiaria, sin embargo se evidencia avance en enchapes de espacios y en culminación de labores de cubierta.
10/11/2021	MVCB_3984 BARBARA ORTIZ	Se realiza visita de seguimiento al predio social, la beneficiaria refiere estar conforme con el avance y se observa avance importante en cocina, baño y patio.
10/11/2021	MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza visita de seguimiento al predio social, la hija del beneficiario refiere estar conforme se evidencia avance importante en las labores de habitaciones y cocina
10/11/2021	MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL	Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría la beneficiaria informa estar conforme con las labores realizadas.
10/11/2021	MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza visita de seguimiento social, viviednda sin novedad
10/11/2021	- MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.	el señor Juan indica felicidad por el comienzo de las labores constructivas. Se evidencia a los maestros encargados.
11-11-2021	MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,	SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
11-11-2021	MVCB_3803,LUZ DARY SAENZ CAPERA	SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA LA BENEFICIARIA MANIFIESTA SU INCONFORMIDAD FRENTE A LAS OBRAS , POR PISO , COCINA , BAÑO .POR LA PARTE TECNICA LE ACLARAN DUDAS A LA BENEFICIARIA
11-11-2021	MVCB_3822 SORY INES CORTES LOPEZ ,	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN ACABADO DE OBRA
11-11-2021	MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE,	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
11/11/2021	- MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.	Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
11/11/2021	- MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.	Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario indica felicidad por las labores constructivas.
11/11/2021	- MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO.	Se evidencia maestros en la casa y conformidad por partes de la familia.
11/11/2021	MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:	se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiario no reporta dudas y/o inconformidades con los avances en obra.
11/11/2021	MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades.
11/11/2021	MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Recibe visita autorizada NUBIA NANCY CARRETO, se resuelven dudas a respetos con actividades a ejecutar. Se evidencia conformidad con los avances en obra.
11/11/2021	MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:	Se realiza seguimiento social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoría. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades.
11/11/2021	MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.	Se realiza seguimiento social a la obra con interventoria y contratista. Se evidencia poco avance por intermitencia en los maestros asignados. Beneficiario expresa inconformidad por daños en lámina de pisos en las alcobas, durante actividades de pañete y pintura. Se informa al contratista quien se compromete a dar respuesta el día martes.
11/11/2021	- MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.	Se evidencia personal de obra en el predio. La vivienda se encuentra desocupada.
12/11/2021	- MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.	Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol, se hace pre entrega de algunas áreas intervenidas.
12/11/2021	- MVJA_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ.	Atiende su hija autorizada JESICA BASTO. La familia indica conformidad. Se evidencia a los maestros encargados.
12/11/2021	- MVJA_573: SANDRA MILENA PRECIADO..	Atiende su hija autorizada JESICA BASTO. La familia indica conformidad. Se evidencia a los maestros encargados.
12/11/2021	MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza visita de seguimiento social y evidencia avance en placa de piso habitación, la beneficiaria refiere estar conforme con el avance.
12/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza visita de seguimiento social, se solicita al contratista dar dceleridad en la obra ya que no se evidencia avance.
12/11/2021	MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES	Se realiza seguimiento social al predio, la beneficiaria no se encuentra en el predio, los maestros no pueden laborar pues no hay nadie en el mismo para abrir.
12/11/2021	MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA	Se realiza seguimiento social al predio, no se localiza a la beneficiaria, se evidencia culminación en labores de obra, se reprograma entrega para el día martes 16 de noviembre
12/11/2021	MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL	Se realiza visita de seguimiento al predio social la beneficiaria refiere estar conforme, el área técnica manifiesta próxima entrega de las labores de obra
12/11/2021	MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza visita de seguimiento social al predio, la beneficiaria refiere estar conforme e informa que solicito dos tipos de piso diferentes para los espacios comunes y las habitaciones.

15/11/2021	MVCB_ 4498. ELCI RUTH ORTIZ MORENO.	Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia finalizando obras para entrega de mejoramiento.
16/11/2021	- MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO.	Se evidencian a los maestros encargados del predio y conformidad por parte del beneficiario
16/11/2021	- MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN.	Se evidencia a los maestros encargados. La señora Mercedes indica conformidad por el inicio de las obras
16/11/2021	- MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ.	Se evidencia a los maestros encargados; la Beneficaria no indica dudas o inquietudes
16/11/2021	- MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.	El señor Juan indica felicidad por el comienzo de las labores constructivas. Se evidencia a los maestros encargados.
16/11/2021	- MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.	Se evidencian a los maestros encargados; la vivienda está desocupada.
16/11/2021	MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza visita de seguimiento social y no se evidencia avance en las labores se solicita a los maestros celeridad en las labores del predio.
16/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza seguimiento al predio y no se evidencia avance importante, se solicita al personal dar celeridad a las acciones
16/11/2021	MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES	Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, se evidencia ausencia de los maestros en el mismo, se solicita al área encargada realizar las acciones correspondientes
16/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO	Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en el predio.
16/11/2021	- MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ.	Recibe la visita su esposo autorizado ALBERTO RIVAS. Se observan a los maestros encargados del predio. La vivienda esta desocupada. Se observa personal en el predio.
16/11/2021	- MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO.	Se evidencian a los maestros encargados del predio y conformidad por parte del beneficiario
16/11/2021	MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,	SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA ACABADOS
16/11/2021	MVCB_3803,LUZ DARY SAENZ CAPERA	SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA LA BENEFICIARIA MANIFIESTA SU INCONFORMIDAD FRENTE A LAS OBRAS , LA PARTE TECNICA REALIZA ACLARACIONES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
17/11/2021	- MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ.	Se observan a los maestros encargados del predio. La vivienda esta desocupada.
18/11/2021	MVCB_4968 LUCAS RAÚL BELTRÁN PRIETO.	Se realiza visita de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. No se reportan novedades.
18/11/2021	MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIÑO.	Recibe visita autorizada GLADYS ARIAS, arrendataria en la vivienda. Se realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal finalizando actividades para entrega de mejoramiento. No se reportan novedades.
18/11/2021	MVCB_4475. MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO.	Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se resuelven dudas a beneficiaria frente actividades a ejecutar, expresa claridad y conformidad con los avances.
18/11/2021	MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades.
18/11/2021	MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:	Se realiza seguimiento social y técnico a la obra, en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia nuevo personal ejecutando actividades. Debido a la intermitencia del personal, se han retrasado las obras.
18/11/2021	MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.	e realiza seguimiento social a la obra con interventoria y contratista. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se le recuerda al beneficiario que no puede realizar obras alternas al mejoramiento. Expresa conformidad con el nuevo personal y avances en obra.
18/11/2021	MVCB_2252 CAMPO ELIAS GIL PARDO	Se realiza visita de seguimiento social sin avance de obra, se explican memorias a los maestros
18/11/2021	MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance en las labores de cocina, baño y segunda habitación.
18/11/2021	MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza seguimiento al predio y se da respuesta a inquietud manifiesta en bitácora con respecto a manejo y retiro de materiales.
18/11/2021	MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO	Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en el predio, se toman medidas y se revisan espacios.
18/11/2021	MVCB_2252N ABIGAIL PARDO	Se realiza visita de seguimiento social sin avance de obra, se explican memorias a los maestros
18/11/2021	MVCB_4801. LUIS HERNANDO MARTINEZ:	Autorizada Sobrina GLORIA PATRICIA VIATE. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. No se reportan novedades.
19/11/2021	MVCB_16 -11-2021 MVCB_2243 HECTOR EUSTORGIO LOPEZ JUA PABLO II,	SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
19/11/2021	MVJE_962 RAUL MUÑOZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA

19/11/2021	MVJE_ 1148	LUIS EDUARDO JIMENEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
19/11/2021	MVJE_ 985	ANGELA SUAREZ RAMOS	, SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
19/11/2021	- MVJE_ 275:	DIANA BELEN HERNÁNDEZ.	Atiende su hija autorizada JESICA BASTO. La familia indica conformidad. Se evidencia a los maestros encargados.
19/11/2021	- MVJE_ 032:	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN.	Se evidencia a los maestros encargados. La señora Mercedes indica conformidad por el inicio de las obras
19/11/2021	- MVJE_ 351:	JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO.	Se evidencian a los maestros encargados del predio y conformidad por parte del beneficiario.
19/11/2021	- MVJE_ 011:	JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.	La familia indica felicidad por el comienzo de las labores constructivas. Se evidencia a los maestros encargados.
19/11/2021	- MVJE_ 429:	MARÍA MIRIAM CASTELLANOS .	Se evidencian a los maestros encargados del predio y conformidad por parte de la familia.
19/11/2021	- MVJE_ 604:	NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.	Se evidencian a los maestros encargados; la vivienda está desocupada.
19/11/2021	- MVJE_ 358:	ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ.	No se observan a los maestros encargados del predio. El contratista le indica a la beneficia que se encuentran en bodega.
19/11/2021	- MVJE_ 573:	SANDRA MILENA PRECIADO.	Se evidencian a los maestros encargados; la beneficia no indica dudas e inquietudes, se evidencia conformidad.
19/11/2021	- MVJE_ 010:	YOLANDA MENESES.	VISITA PARA VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA. Se realiza visita en compañía de la SDHT para revisar la estructura de la vivienda, se levanta acta en el cuál se le explica a la familia sobre las garantías del mejoramiento de vivienda. Se hace el compromiso de realizar validación el Lunes 22-11-21.
19/11/2021	MVCB_ 4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance en las labores de cocina, baño y segunda habitación.
19/11/2021	MVCB_ 4009	FLORALBA CORTES	Se realiza seguimiento al PQRS, Se hace entrega de documento respuesta en el cual se informa que el caso no cuenta con las pruebas suficientes para dar una respuesta afirmativa, la señora se niega a firmar el recibido, los allí presentes firman en constancia y se toma registro fotográfico.
19/11/2021	MVCB_ 3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance en enchapes y se toma medida de espacios, se evidencia boca puertas en granito en proceso.
ENTREGAS			
22/10/2021	MVCB_ 4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ.	Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombros. Sin novedades,
22/10/2021-	MVCB_ 3710:	JORGE EDUARDO MORENO,	Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos, acta de entrega técnica, acta de cierre social, se entrega de volante adhesivo de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento y entrega de kit ecológico.
25/10/2021	- MVCB_ 4072:	SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS.	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
25/10/2021	- MVCB_ 3773:	MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
25/10/2021	- MVCB_ 0838	LIGIA LOMBANA	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
27/10/2021	MVCB_ 3424.	GIANNI GIOVANNA REYES:	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
29/10/2021	- MVCB_ 3703:	HILDA VARGAS GRANADO.	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
29/10/2021	- MVCB_ 4185:	PEDRO AVELINO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
29/10/2021	MVCB_ 0897	CESARIO BONILLA	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
2/11/2021	MVCB_ 3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
2/11/2021	MV_ 42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
2/11/2021	MVCB_ 4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO,	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
03/11/2021	MVCB_ 4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR.	Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
05/11/2021	MVCB_ 4561	ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:	Se realiza entrega a esposa autorizada MIRIAM LÓPEZ. de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.

[illegible]

17/11/2021 MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.: Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_4498. ELCI RUTH ORTIZ MORENO. Recibe hija autorizada JERALDIN MORENO. Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 - MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA. Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 - MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMIRES Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 - MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN , Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_3803 LUZ DARY SAENZ CAPERA Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
17/11/2021 MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombros. Sin novedades y/o inconformidades.
RENUNCIAS
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
03/11/2021 MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La señora manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.
MVCB_4009 FLORALBA CORTES Se recomienda a la beneficiaria estar pendiente de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones iniciales entre las que estaban el cuidado de sus objetos personales y de valor. Se realiza seguimiento a la PQRS interpuesta; de igual manera se informa a la beneficiaria que el caso será llevado a comité.
MVCB_4009 FLORALBA CORTES Se hace entrega de documento respuesta en el cual se informa que el caso no cuenta con las pruebas suficientes para dar una respuesta afirmativa, la señora se niega a firmar el recibido, los allí presentes firman en constancia y se toma registro fotográfico.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
no se realizaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
21/10/2021-MVUN_424:MARIA ETELFINA CASTIBLANCO RINCÓN, validación sin novedad
21/10/2021-MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, validación sin novedad
08/11/2021- MVUN_151 SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS, validación sin novedad
08/11/2021- MVUN_222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO,validación sin novedad
16/11/2021- MVUN_770: JOSE YECID LAVERDE NIETO, validación sin novedad
18/11/2021-MVUN_391 :IMELDA RODRÍGUEZ,validación sin novedad

VALIDACIONES FALLIDAS
08/11/2021- MVUN_366 JANNETTE ESQUIVA CORTÉS , validación fallida ya que la beneficiaria está realizando actividades de construcción en la cubierta.
18/11/2021- MVUN_416 RICARDO CÁRDENAS GARCÍA , validación fallida ya que el beneficiario realizará placa en su vivienda.
18/11/2021- MVUN_478 HÉCTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA , validación fallida ya que el beneficiario esta realizando labores constructivas.
APERTURAS
21/10/2021- MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
21/10/2021- MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales,
27/10/2021- MVUN_588:AMIRA PEREZ CORTES , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
27/10/2021- MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
27/10/2021- MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
28/10/2021- MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERANDEZ , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
08/11/2021- MVUN_379.CAROLINA MALDONADO BELTRÁN , encargada del mejoramiento y propietaria del predio NOHORA NELLY BELTRÁN DÍAZ . Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras socialización de presupuesto a satisfacción de la familia , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
09/11/2021- MVUN_151.SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS , Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia, , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
17/11/2021- MVUN_770: JOSE YECID LAVERDE NIETO , Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia, se realiza entrega de Kit de bioseguridad
17/11/2021- MVUN_106 CANDE DE JESÚS ESPITIA LÓPEZ , encargado del predio CRISTIAN FELIPE DURÁN se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia, se realiza entrega de Kit de bioseguridad
17/11/2021- MVUN_222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO , Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras socialización de presupuesto a satisfacción de la familia , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
21/10/2021- MVUN_1241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
28/10/2021- MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario no se encontraba al momento de la visita
25/10/2021- MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
25/10/2021- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
25/10/2021- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021- MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando

25/10/2021- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se stan ejecutando
28/10/2021- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se stan ejecutando
25/10/2021- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
25/10/2021- MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades ejecutadas
25/10/2021- MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
28/10/2021- MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
02/11/2021- MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario no se encontraba al momento de la visita
02/11/2021- MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
02/11/2021- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
02/11/2021- MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades ejecutadas
02/11/2021- MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
02/11/2021- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
02/11/2021- MVUN_099:FERNANDO MORENO MARIÑO , ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
03/11/2021- MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERANDEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la encargada del predio MARILINDA HERNANDEZ esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
03/11/2021- MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
03/11/2021- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
03/11/2021- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
03/11/2021- MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
03/11/2021- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
04/11/2021- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, realizamos seguimiento debido a la problemática presentada con los maestros ya que el hijo del beneficiario no permitió el ingreso a la vivienda se deja acta de constancia de la visita y se aclara al beneficiario qué solo nos entenderemos con el para el proceso de mejoramiento
04/11/2021- MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
05/11/2021- MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
05/11/2021- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el esposo de la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, la beneficiaria no atendió a la puerta no hay maestros ejecutando actividades de obra.
05/11/2021- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, seguimiento de obra con maestro para ejecutar compromisos pactados el día de ayer donde no atienden a la puerta y el beneficiario no contesta el celular.
05/11/2021- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
05/11/2021- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- MVUN_588:AMIRA PEREZ CORTES , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el encargado del predio JUAN CARLOS CASTILLO esta conforme con las actividades ejecutadas.
05/11/2021- MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.

[illegible]

17/11/2021- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
18/11/2021- MVUN_588:AMIRA PEREZ CORTES , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el encargado del predio JUAN CARLOS CASTILLO esta conforme con las actividades ejecutadas.
18/11/2021 MVUN_222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO ., Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
18/11/2021- MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
19/11/2021- MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO ,Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
19/11/2021- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
19/11/2021- MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, no se evidencian maestros realizando actividades de obra.
19/11/2021- MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
19/11/2021- MVUN_151 SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS , Se realiza visita de seguimiento en compañía de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
ENTREGAS
04/11/2021- MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS , Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
04/11/2021- MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON , Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
05/11/2021- MVUN_099:FERNANDO MORENO MARIÑO , Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
16/11/2021- MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO , Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
16/11/2021- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS , Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
18/11/2021- MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN , Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
18/11/2021- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO ,Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
19/11/2021- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ , Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
17/11/2021 MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
17/11/2021 MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
17/11/2021 MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
RENUNCIAS
28/10/2021- MVUN_372: JENNY MARCELA GUERRERA , Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria quién asegura que renuncia al subsidio ya que vendo su predio, se realizaron los respectivos seguimientos del caso y se cuenta confirma de la renuncia y fotocopia de cédula de la beneficiaria.
PQRS
PAC CIUDAD BOLIVAR

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad, en el punto de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente: Martes: 8:30 am a 12:00 p.m Y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.

PAC UNIR

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad, en el punto de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado en la Calle 75 #119-26, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente: Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.

19/10/2021-ATENCIÓN PAC: No se recepciono ninguna atención

HISTORIAS DE VIDA

BARRIO O TERRITORIO

UNIR

HISTORIAS DE VIDA

21/10/2021- MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO, postulación historia de vida

BARRIO O TERRITORIO

HISTORIAS DE VIDA


5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

MVJE_1000: MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA Se realiza segunda visita de validación al predio ubicado en KR 46A 82A 35 SUR - JERUSALÉN - POTOSÍ, el día 9 de noviembre de 2021 con el fin de dar cumplimiento a la cita establecida con la beneficiaria, no se encuentra a nadie en el mismo, se realizan varias llamadas telefónicas y no responden.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		
7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
<div>Imagen</div>		

DESARROLLO CIUDAD BOLIVAR		
VALIDACIÓN 10-11-2021 MVJE 295 HENRY GIRALDO-JERUSALEN POTOSI	VALIDACIÓN -10-11-2021 MVJE 254 MARIA HILDA GUAQUETA GONZÁLEZJERUSALEN POTOSI	VALIDACIÓN 10-11-2021 MVJE 957 LUZ STELLA AGUILERA-JERUSALEN POTOSI
		
VALIDACIÓN, MVJE_941 EDGAR ELI SÁNCHEZ GÓMEZ., POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_457 HILDA MERY PALOMO GUARIN. POTOSI	VALIDACIÓN, MVJ_133 UGIA INÉS SALAZAR DE PRADA. POTOSI
		
VALIDACIÓN, MVJE_942 JESUS ANTONIO GARAVITO, POTOSI.	VALIDACIÓN, MVJE_077 MARIA MAGNOLIA ARIAS, POTOSI.	VALIDACIÓN, MVJE_1016 LUZ DARY GARCIA MORALES, POTOSI
		
VALIDACIÓN, MVJE_359 CARMEN ELISA PRADA ABELLO. POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_928 JUAN CARLOS NAVA SALCEDO. POTOSI.	VALIDACIÓN 08-11-2021 MVJE_985 ANGELA SUAREZ RAMOS -JERUSALEN POTOSI
		
Validación FALIDA . MVJE_405: DIANA BEATRIZ AVELLANEDA DÍAZ. Desarrollo Potosi	Validación. MVJE_573: SANDRA MILENA PRECIADO. Desarrollo Potosi	Validación. MVJE_356: ANA ROSA SOSA DIAZ DE GONZÁLEZ. Desarrollo Potosi
		
VALIDACIÓN, MVJE_1017 OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ, POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_907 ANA ISABEL GONZALEZ, POTOSI.	VALIDACIÓN 10-11-2021 MVJE_243 MARIA DE JESÚS GARAVITO GARCÍAN JERUSALEN POTOSI
		

Validación. MVJE_434: NOHEMI MORALES ORTIZ. Desarrollo: Potosí	VALIDACIÓN, MVJE_326 LUZ MARINA SIERRA SIERRA, DESARROLLO POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_058 DILMA MARIA DEL CARMEN RIVERA, DESARROLLO POTOSI
		
VALIDACIÓN, MVJE_1087 ALONSO ODOR, DESARROLLO POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_264 ALCIRA TEATINO, DESARROLLO POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_244 JAIRO BERNAL, DESARROLLO POTOSI
		
VALIDACIÓN, MVJE_882 DUMAR ESTIVEN SASOQUE, DESARROLLO POTOSI	VALIDACIÓN, MVJE_062 PEDRO CLAVER SIERRA, DESARROLLO POTOSI	VALIDACION FALLIDA MVJE_1000 MARIA DEL CARMEN ALONSO
		
Apertura de obra. MVJA_011. JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. Desarrollo Potosí.	Apertura de obra. MVJA_032. MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Desarrollo Potosí	Apertura de obra. MVJA_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Desarrollo Potosí
		
Apertura de obra. MVJA_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ. Desarrollo Potosí	Apertura de obra. MVJA_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ Desarrollo Potosí	Apertura de obra. MVJA_573: SANDRA MILENA PRECIADO. Desarrollo Potosí
		
Apertura de obra. MVJA_264 ALCIRA TEATINO. Desarrollo Potosí	Apertura de obra. MVJA_882 DUMAR ESTIVEN SASOQUE Desarrollo Potosí	Apertura de obra. MVJA_1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA. Desarrollo Potosí
		

SEGUIMIENTO, MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ, COMPATIR	SEGUIMIENTO, MVCB_0481: MARCO JULIO MARTINEZ MADERO, COMPATIR
		
Seguimiento de obra. MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA. Desarrollo Juan Pablo II	SEGUIMIENTO DE OBRA 11-11-2021 MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN, Desarrollo Juan Pablo II	SEGUIMIENTO DE OBRA 11-11-2021 MVCB_3803, LUZ DARY SAENZ CAPERA Desarrollo Juan Pablo II
		
SEGUIMIENTO DE OBRA 11-11-2021 MVCB_3822 SORY INES CORTES LOPEZ _ Desarrollo Juan Pablo II	SEGUIMIENTO DE OBRA _11-11-2021 MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE Desarrollo Juan Pablo II	PAC JUAN PABLO II 09.11.2021
		
SEGUIMIENTO, MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_3880 FIDELIGNO RODRIGUEZ, JUAN PABLO II
		
Seguimiento de obra. MVJA_032. MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Desarrollo Potosí	Seguimiento de obra. MVJA_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Desarrollo Potosí	Seguimiento de obra. MVCB_3721: ANIA LUCIA VEGA AFRICANO. Desarrollo: Juan Pablo II
		
SEGUIMIENTO, MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4475. MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO, JUAN PABLO II
		

SEGUIMIENTO, MVCB_4498, ELCI RUTH ORTIZ MORENO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZÁLEZ, JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES DESARROLLO JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS DESARROLLO JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_4009 FLORALBA CORTES DESARROLLO JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO MVCB_4968 LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO, ACACIAS IV	SEGUIMIENTO, MVCB_4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ, JUAN PABLO II	ATENCIÓN ALUSUARBO, JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO, MVCB_0481 MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO, COMPARTIR	SEGUIMIENTO, MVCB_0474 MABEL ASTRID LÓPEZ GAMEZ, COMPARTIR	SEGUIMIENTO, MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO, JUAN PABLO II
		

SEGUIMIENTO, MVCB_4498, ELCI RUTH MORENO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4475, MARÍA SUSANA PRAGAUTA CARILLO, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES, JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO 19-11-2021 MVBC_4892 JOSE VICTORINO MORENO VELANDIA	SEGUIMIENTO DE OBRA 16-11-2021 MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN, JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO DE OBRA 16-11-2021 MVCB_3803, LUZ DARY SAENZ CAPERA, JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO DE OBRA 16-11-2021 MVCB_2243 HECTOR EUSTORGIO LOPEZ JUA PABLO II	SEGUIMIENTO DE OBRA, 19-11-2021 MVJE_962 RAUL MUÑOZ - POTOSI JERUSALEN	SEGUIMIENTO 19-11-2021 MVJE_1148 LUIS EDUARDO JIMENEZ - POTOSI JERUSALEN
		
SEGUIMIENTO 19-11-2021 MVJE_985 ANGELA SUAREZ RAMOS - POTOSI JERUSALEN	Seguimiento de obra. MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_032. MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Desarrollo: Potosi
		
Seguimiento de obra. MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_032. MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Desarrollo: Potosi
		
Seguimiento de obra. MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO. Desarrollo: Potosi
		
Seguimiento de obra. MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ Desarrollo: Potosi	VISITA PARA VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA. MVJE_010: YOLANDA MENESES. Desarrollo: Potosi	Seguimiento de obra. MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ Desarrollo: Potosi
		

Seguimiento de obra. MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN. Desarrollo: Potosí	Seguimiento de obra. MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO. Desarrollo: Potosí	Seguimiento de obra. MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. Desarrollo: Potosí
		
Seguimiento de obra. MVJE_573: SANDRA MILENA PRECIADO. Desarrollo: Potosí	Seguimiento de obra. MVJE_429: MARÍA MIRIAM CASTELLANOS. Desarrollo: Potosí	Seguimiento de obra. MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ. Desarrollo: Potosí
		
Seguimiento de obra. MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ. Desarrollo: Potosí	Seguimiento de obra. MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ. Desarrollo: Potosí	SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_2252 ELIAS GIL DESARROLLO JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_2252N ABIGAIL PARDO DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_3998 ETELINA PUERTAS DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_4004 MARIELA HOYOS DESARROLLO JUAN PABLO II
		
ENTREGAS		
Entrega de obra. MVCB_4185: PEDRO AVELINO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II	Entrega de vivienda - MVCB_3710: JORGE EDUARDO MORENO. Desarrollo Juan Pablo II	ENTREGA MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ, JUAN PABLO II
		
ENTREGA MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA. DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR	ENTREGA MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA, DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR (19/10/2021)	ENTREGA MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO DESARROLLO URBANIZACIÓN COMPARTIR (19/10/2021)
		

ENTREGA MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR (19/10/2021)	ENTREGA, MVCB_3424 GIANNI GIOVANNA REYES, JUAN PABLO II	Entrega de vivienda. MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS. Desarrollo Juan Pablo II
		
Entrega de vivienda. MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ Desarrollo Juan Pablo II	Entrega de obra. MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADO. Desarrollo Juan Pablo II	ENTREGA, MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA, DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR
		
ENTREGAS REALIZADAS 2/11/2021 MVCB_4401 GUSTAVO MARTÍNEZ PRIETO, Desarrollo Juan Pablo II	ENTREGAS REALIZADAS 5/11/2021 MVCB_3809 ISABEL IBÁÑEZ ALVAREZ, Desarrollo Juan Pablo II	ENTREGAS REALIZADAS 5/11/2021 MVCB_4272 NIEVES LIZARAZO VALBUENA Desarrollo Juan Pablo II
		
ENTREGA, MVCB_4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR, JUAN PABLO II	ENTREGA, MVCB_4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO, JUAN PABLO II	ENTREGA, MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO, JUAN PABLO II
		
ENTREGA, MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO, JUAN PABLO II	ENTREGA DE VIVIENDA MVCB_3839 JOSÉ OLIVO CUADRADO DESARROLLO JUAN PABLO II	ENTREGA DE VIVIENDA MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANA DESARROLLO JUAN PABLO II
		
ENTREGA, MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA, JUAN PABLO II	ENTREGA, MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO, JUAN PABLO II	Entrega de vivienda. MVCB_8666: ALFONSO SÁENZ HERNÁNDEZ. Desarrollo Compartir.
		

		
ENTREGA, MVCB_ 4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZÁLEZ, JUAN PABLO II	Entrega de vivienda, MVJE_ 3748: ANA CECILIA CAMACHO Desarrollo: Juan Pablo	Entrega de vivienda, MVJE_ 4198: LUCIO CIFUENTES VEGA Desarrollo: Juan Pablo
		
ENTREGA MVCB_ 4009 FLORALBA CORTES DESARROLLO JUAN PABLO II	ENTREGA MVCB_ 4011 MARIA SILVERIA SIGUA DESARROLLO JUAN PABLO II	ENTREGA MVCB_ 3983 MARTHA JANETH LANDAZABALDESARROLLO JUAN PABLO II
		
ENTREGA MVCB_ 3709 GRACIELA QUINTERO DESARROLLO JUAN PABLO II		
		
DESARROLLO UNIR II		
VALIDACIONES		
Validación fallida. MVUN_ 276 GONZALO MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Desarrollo UNIR II	Validación.MVUN_ 132:GRACIELA ESPITIA MORALES. Desarrollo UNIR II	Validación.MVUN_ 379:CAROLINA MALDONADO BELTRÁN.Desarrollo UNIR II
		
Validación.MVUN_ 424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN.Desarrollo UNIR II	Validación. MVUN_ 146: FRANCISCO LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Desarrollo UNIR II	ATENCIÓN PAC. Desarrollo UNIR II
		
Validación.MVUN_ 151:SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS. Desarrollo UNIR II	Validación.MVUN_ 222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO. Desarrollo UNIR II	Validación fallida. MVUN_ 366 JANNETTE ESQUIVA CORTÉS. Desarrollo UNIR II
		

		
Seguimiento de obra.MVUN_1241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO.Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ.Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra.MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS. Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra. MVUN_469 JUVENAL MELO PINZON.Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra. MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO.Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra. MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO. Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra.MVUN_1241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO.Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ.Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra.MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra.MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS. Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra.MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ.Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra. MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO. Desarrollo UNIR II	Seguimiento de obra. MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO. Desarrollo UNIR II
		

		
<p>Seguimiento de obra.MVUN_1241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ. Desarrollo UNIR II</p>	<p>Seguimiento de obra.MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ.Desarrollo UNIR II</p>	<p>Seguimiento de obra.MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ.Desarrollo UNIR II</p>
		
<p>Seguimiento de obra.MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS. Desarrollo UNIR II</p>	<p>Seguimiento de obra. MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO. Desarrollo UNIR II</p>	<p>Seguimiento de obra. MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO. Desarrollo UNIR II</p>
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL					ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPANIAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS					
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCR_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	22/10/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_299	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_132	GRACIELA ESPINOSA MORALES	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021															
MVUN_151	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021															
MVUN_171	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	4/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERRERO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_222	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitácora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								

[illegible]

MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	29/09/2021	11/11/2021	Si	Si	X			X								
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	23/09/2021	9/11/2021	Si	Si	X			X								
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	8/09/2021	11/10/2021	Si	Si	X			X								
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	24/09/2021	5/11/2021	Si	Si	X			X								
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	10/09/2021	13/10/2021	Si	Si	X			X								
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para alli reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicaci3n, entre otras	9/09/2021	13/10/2021	Si	Si	X			X								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES


6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutando actividades de validación, de socialización, así como actividades de obra;

RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 3


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT				Fase 2: Ejecución de obras							
Territorio o barrio a intervenir	Barrios	Predios	Total Predios	Validación		Ejecución					
				Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Marandu	7	311	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
	Juan Pablo II	99		99	0	35	13	81	5	87,28%	81
	Urbanización Compartir	13		13	0	6	4	9	0	83,84%	9
Técnico Responsable	Potosi	122		67	55	0	22	0	100	2,44%	0
	Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
	Jerusalen	18	8	10	0	5	0	13	1,46%	0	
	UNIR	50	29	21	16	10	11	29	26,77%	11	
	Acacias	1	1	0	0	1	0	0	35,00%	0	
Subtotal		311		274	87	62	55	106	150	38,53%	106

Para el informe mensual No. 3 entre el 21 de OCTUBRE y el 20 de NOVIEMBRE, y según la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2021**, se encuentra en **cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que la fecha se entrega 106 viviendas de 134 para el 29 de NOVIEMBRE de 2021.

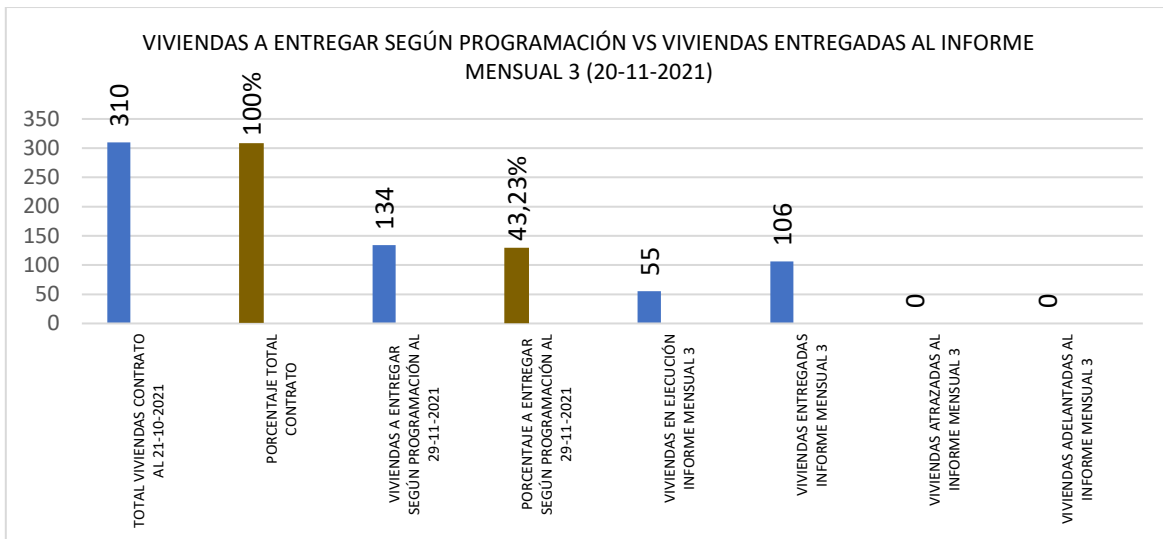


RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 3 DEL 21 DE OCT. AL 20 DE NOV.


Para el mes 3, el Consorcio ORIP SAFRICON 2020 se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

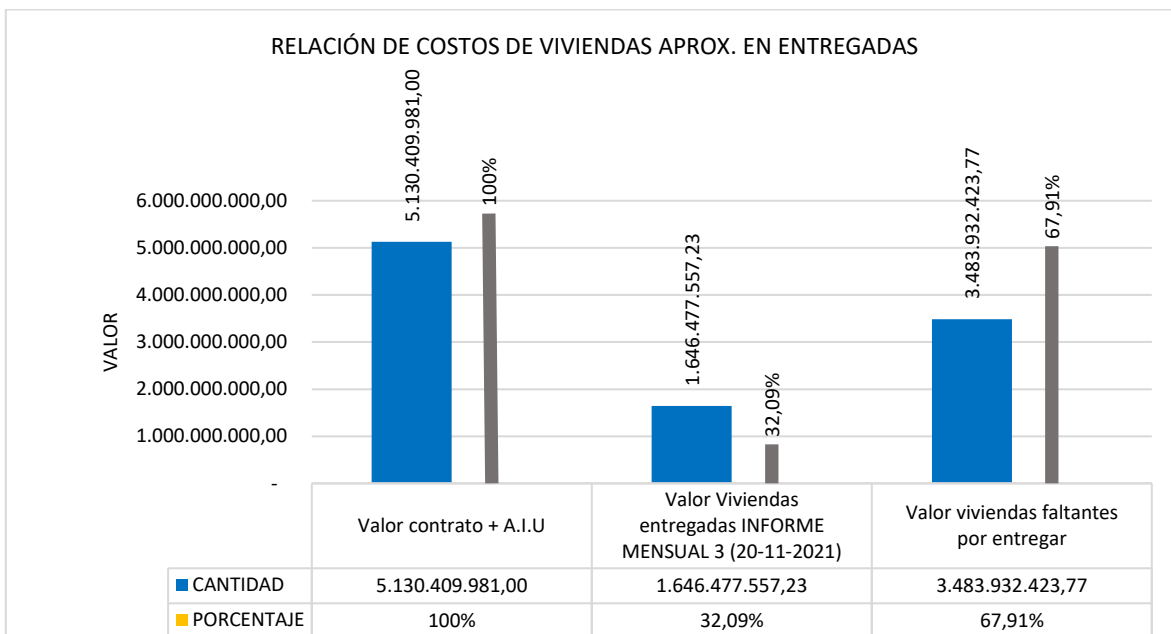


Así mismo, el contratista presenta un porcentaje en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para el informe mensual 3 del 32.09%. Aprox. En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 73 días para finalizar el contrato con 205 viviendas por entregar.

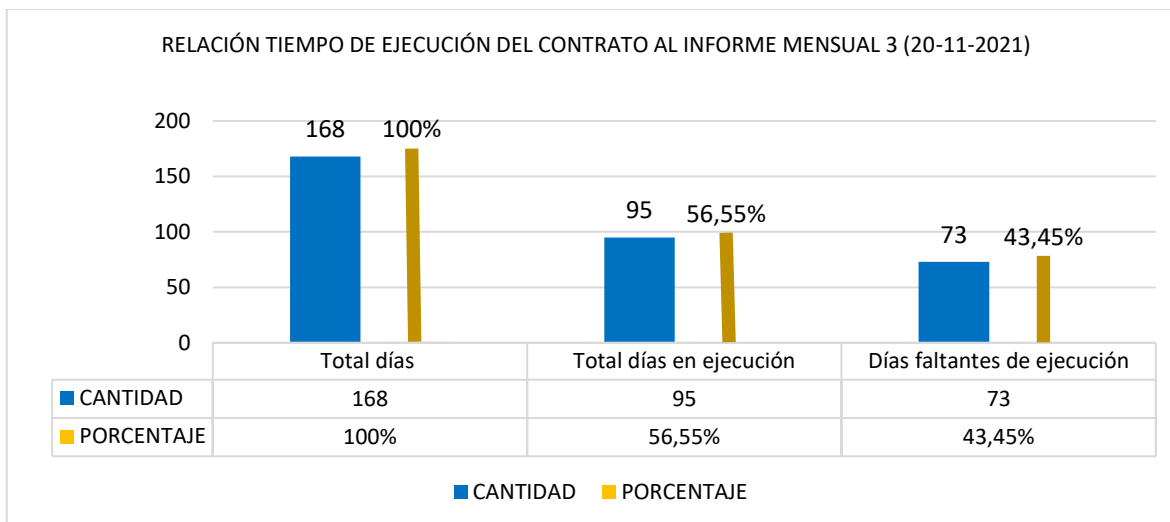

Finalmente, en este periodo y, de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio ORIP SAFRICON 2020 se encuentra en cumplimiento de las viviendas a entregar, ya que para el día 29 de NOVIEMBRE de 2021 entregará 134 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 106 viviendas, faltado 28 viviendas por entregar para el próximo informe, de igual manera, se encuentran en ejecución de 55 viviendas.

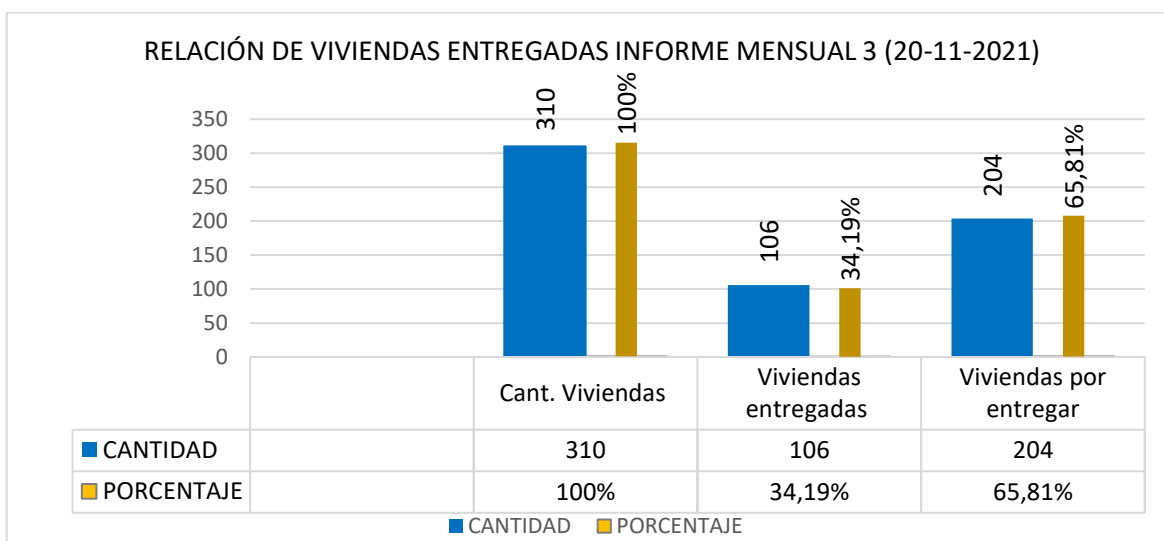

De acuerdo con la ejecución que está realizando el contratista, a continuación, se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que al informe mensual 3 se encuentran activas.

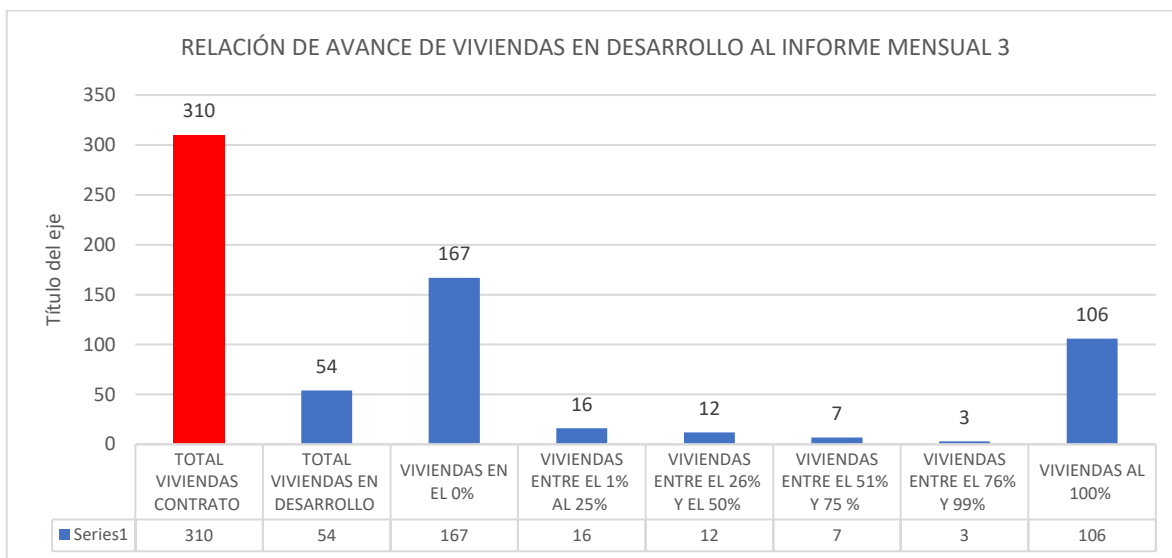

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe se ha gestionado dos cuentas para ordenes de giro de anticipos del contrato, en lo referente a cortes, se registra 2 pagos en el presente informe para 105 Mv.

Costos generales

Corte 1

TOTALES		\$	4.023.472.286,00	\$497.866.538,00
AIU		\$	1.046.102.794,00	\$129.445.300,00
COSTO TOTAL		\$	5.069.575.080,00	\$627.311.838,00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		\$	60.834.901,00	
COSTO TOTAL		\$	5.130.409.981,00	\$627.311.838,00
VALOR DEL ANTICIPO	\$1.539.122.994,00			
AMORTIZACION ANTICIPO	\$188.193.551,00			\$188.193.551,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$1.350.929.443,00			
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	\$3.591.286.987,00			\$439.118.287,00

COSTOS GENERALES				CORTE 2
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		\$	4.023.472.286	\$ 5.069.575.080
TOTALES		\$	4.023.472.285,51	\$817.225.828,00
AIU		\$	1.046.102.794,23	\$212.478.715,00
COSTO TOTAL		\$	5.069.575.079,74	\$1.029.704.543,00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		\$	60.834.901,00	
COSTO TOTAL		\$	5.130.409.980,74	\$1.029.704.543,00
VALOR DEL ANTICIPO	\$1.539.122.994,00			
AMORTIZACION ANTICIPO				\$308.911.363,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$1.042.018.080,00			
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	\$3.591.286.986,74			\$720.793.180,00

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

Al presente informe se han gestionado dos órdenes de giro para el anticipo, Estas órdenes contemplan la adquisición de los siguientes insumos.

ORDEN DE GIRO No. 3

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTES DE MATERIALES

CANTIDAD

GLOBAL

ORDEN DE GIRO No. 4

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

CANTIDAD

GLOBAL (1)

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

ORDEN DE GIRO No. 3

[illegible]

ORDEN DE GIRO No. 4

[illegible]

7. INFORME SISO



INFORME MENSUAL SST
21 de octubre al 20 noviembre 2021



INFORME INTERVENTORÍA SISO G1 - CONTRATO 797 DE 2021

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME MENSUAL
DESDE	21/09/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	3
HASTA	20/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

1.1 CONTRATISTA

Se Implementan protocolos de Bioseguridad, para las actividades de validación y protocolo de Bioseguridad general el cual se implementan en la ejecución de las viviendas con alcance Beneficiarios y Trabajadores.

- Se asistió al Seguimiento de obra con secretaria del Hábitat y el IDU.
- Revisión de Planilla de Seguridad Social Personal operativo. El personal de obra viene ingresando gradualmente y se verifica que las afiliaciones sean correctas y que cuenten con el certificado médico de aptitud, se ha realizado la inducción de manera casi personalizada, por el manejo de reuniones.
- Se les realiza charlas al Personal Administrativo cada 15 Días.
- Implementación de protocolo de bioseguridad en las visitas de seguimiento, por parte del personal administrativo., contratista e interventoría y operativo y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
- Se realizan entregas de Vivienda cumpliendo con el acta de entrega a Satisfacción de vivienda sin escombros en la obra, firmada por el beneficiario.
- Acompañamiento en visitas de la secretaria del Hábitat en seguimiento en el sector de Juan Pablo II, Jerusalén y Unir.
- Inducción al personal operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y divulgación del protocolo de bioseguridad se está en la revisión de afiliaciones sal SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo proyectado para ingresar.
- Entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios cubriendo las casas que están en ejecución al momento.
- Del personal extranjero quedan activos 6 personas.
- Se aprueba procedimiento para cambio de cubiertas Segundo Nivel por parte de interventoría, se realiza seguimiento en obra.
- Entrega de la señalética a los beneficiarios, durante las entregas de Viviendas
- Divulgación de protocolo de bioseguridad a Beneficiario, en compañía de la interventoría.
- Inspecciones de pulidoras, taladros andamios, y EPP usadas en las viviendas de cambio de cubierta en ejecución y se hace charla sobre trabajos seguros en alturas.
- Charla de contaminación por aerosoles, uso adecuado del agua, cambio climático, alcohol tabaquismo y drogas y uso adecuado de EPP.
- Adicional a esto se lleva el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, también se hace el alistamiento e instalación en cuanto a señalización para la Oficina del PAC sector POTOSI, envasado y distribución de los Kit para beneficiario y Kit para pareja de trabajadores, estos kits son ubicados en cada una de las casas. Se ha dado respuesta a los requerimientos que la interventoría realiza a través de oficios.
- En relación a los aspectos ambientales se instaló un punto ecológico en el PAC sector POTOSI y se continúa la recolección de escombros para la disposición en la Escombrera Cemex, que está autorizada por la SDA.
- Elaboración de Informes acuerdo a los tiempos contemplados.
- El plan de trabajo tiene actividades planteadas que no se desarrollan semanalmente, entre ellas el ingreso y retiro de personal y las inducciones de ingreso, por esta razón se ve disminuido el porcentaje de cumplimiento, las actividades se llevan en un porcentaje alto de ejecución.

1.2 INTERVENTORIA

Se continúa con el diligenciamiento de la encuesta mensual de salud de la interventoría

Se asiste a la jornada de Socialización programada para el día el 26 de octubre en POTOSÍ, se verificó el cumplimiento de lo planteado en el protocolo de socialización. Se verificó el distanciamiento social, la limpieza de áreas, señalización, información para el correcto lavado de manos.

Se hizo recarga permanente de los kits de bioseguridad al personal de interventoría, frasco de alcohol, frasco de gel antibacterial y tapabocas. Algunas de las charlas a interventoría han sido vía WA y otras en campo, los temas han sido variados y se describen en el cuerpo del informe.

Se continúa el acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimiento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios.

Con la puesta en marcha del procedimiento para instalar cubierta se dio el aval para trabajar en alturas superiores a 1.50, siguiendo el procedimiento y las medidas de control presentados.

Existen sectores en donde se ha evidenciado que el riesgo público es muy elevado y se han dado pautas para no realizar desplazamientos aislados, siempre debe hacerse en grupo, situación presentada en CB y potosí y en Engativá.

Durante las visitas de seguimiento se acompaña al personal SISO del contratista en la entrega de KIT a los maestros, brindando la información de uso y reforzando con el beneficiario también sobre el uso del kit entregado a ellos; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas.

No se han presentado eventos de accidentes, incidentes o contagios por Covid 19.

La entrega de los kits fue verificada las casas que tienen obra activa, encontrando que se hace uso y se cumplió cabalmente con las entregas y cantidades propuestas, así mismo se aprovecha para verificar el cumplimiento de trabajos seguros, uso de EPP, y aplicación de protocolos. Durante las entregas se evidencia que las casa no estén con escombros producto de las obras realizadas, dejando el respectivo soporte.

El Seguimiento al plan de trabajo presentado por el consorcio se hace semanalmente y hasta la fecha de las 175 actividades programadas desde el inicio de obra a la fecha de corte se ha cumplido en el 94.29% en promedio, la disminución de porcentaje obedece a la programación de actividades que no se llevaron a cabo, por la misma logística del proyecto por ejemplo se programan inducciones y revisión de afiliaciones pero esa semana no hubo ingresos lo que hace que el porcentaje baje en dos o tres actividades; y de las 282 actividades planeadas para el proyecto se han completado 165 lo que tendría un porcentaje de 58.51% para el proyecto.

Se reciben soportes de ingreso y pagos de la seguridad social, a la fecha de corte se cuenta con 6 extranjeros activos.

2 CAPACITACION	
2.1 CAPACITACION CONTRATISTA	
CONTAMINACIÓN POR AEROSOLES USO ADECUADO DEL AGUA TRABAJO EN ALTURA CAMBIO CLIMATICO USO ADECUADO EPP CHARLA ALCOHOL, TABAQUISMO Y DROGAS	La charlas se realizaron de acuerdo al plan de trabajo
2.2 CAPACITACION INTERVENTORIA	
IMPORTANCIA REPORTE DE CONDICIONES D ESALUD AHORRO DEL AGUA USO DE EPP DURANTE LOS RECORRDIOS RIESGO PÚBLICO PUNTO ECOLOGICO	Charlas realizadas de manera presencial y virtual con apoyo de videos por W.A
3 Gestión Ambiental	
<p>La recogida de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombros y se haga entrega los afiches del correcto lavado de manos y las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde)</p> <p>Se mantiene el punto ecológico del PAC de Juan Pablo II hasta la fecha de corte de este informe, se cuenta con Pac en UNIR II y se hace alistamiento para apertura del PAC Potosí.</p> <p>Los escombros generados a la fecha de corte, se han Retirado gradualmente, se anexa recibo de la escombrera. se completaron 36 metros cubicos en el mes y 66 en total del proyecto</p>	

3.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
MENSUAL	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	36	CEMEX - San Antonio	Se recibe copia de vale de disposición
PROYECTO	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	66	CEMEX - San Antonio	Se recibe copia de vale de disposición

4. Gestión en SST (Seguridad Y Salud en el trabajo)	
4.1 CONTRATISTA	
<ul style="list-style-type: none"> • Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las Aperturas de Vivienda, se hace el seguimiento a los beneficiarios y maestros. • En las visitas a los MV se refuerza el tema de Bioseguridad y se hacen charlas SST • Seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros y recargas si fuese necesario. • Se refuerza al personal operativo con la charla sobre diferentes temas en SST, bioseguridad y medio ambiente. • Actualmente se cuenta con 6 personas extranjeras activas • En las entregas programadas se verifica, que las viviendas estén libres de escombros • El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona. • Revisión de planillas de Seguridad Social. 	
4.2 INTERVENTORIA	
<p>Entrega de Kit Bioseguridad a Profesionales de Interventoría y reposición de los elementos utilizados</p> <p>Seguimiento al plan de Trabajo del contratista,</p> <p>Verificación de uso de elementos de protección, reportando condiciones y actos insgueros para su corrección.</p> <p>No se han presentado incidentes o accidentes en el tiempo del proyecto.</p> <p>El personal hace buen manejo de cargas al omento de descargar materiales y cargar los escombros que vienen empacadps en lonas.</p>	

4.3. Índices												
Valor		Horas Hombre Trabajadas Contratista		Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo		
				CONTRATISTA	INTERVENTORIA							
Total Mensual		27120		108,25	17,50	3136	0	0	0	0		
Total Proyecto		50400		243,85	50,67	8768	3	0	0	0		
4.3.1.Incidentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Condiciones y Acciones Substandar												
4.4.1 Condición Substandar												
No	Descripción					Acción Tomada				La Condición Continúa?		
1	Faltan gafas de seguridad al trabajador ya que esta en demolicion MV-3984					Se reporta a SST de contratista				Resposición del EPP faltante		
2	Al descargar material rueda algo de arena por la vía					Se reporta a SST de contratista				Realizaron Limpieza		

5. Registro Fotográfico

CHARLA DE SEGURIDAD Y RECARGA DE KIT INTERVENTORIA



CHARLA DE SGURIDAD INTERVENTORIA



RECARGA DE KIT - ALCOHOL - TAPABOCA INTERVENTORÍA

VIVIENDA LIBRE DE ESCOMBROS PARA ENTREGA

CHARLAS DE SEGURIDAD - JUAN PABLO



FRENTE SIN ESCOMBROS



MVCB 3803

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



ENTREGA KIT TRABAJADOR MVUN 464



ENTREGA KIT TRABAJADOR MVUN 099

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVUN 469



SEÑALIZACION BIOSEGURIDAD PAC UNIR II

ADECUACIONES DE ZONA DE REUNION INTERVENTORIA EN CB



BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

REGCARGA DE KIT INTERVENTORIA



BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS <u>797 - 2021</u> CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021			REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2021.	104	27120	36,0	0,0		8,00	0,00	100,25	0,00	108,25			0	0					
			14	3136				17,50	0,00	0,00	0,00	17,50			0	0						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
				118	30256	36	0	0,0	25,50	0,00	100,25	0,00	125,75	0	0	0	0			0		

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No.794 - 797 DE 2021	
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO %	58,51%
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO EN EL MES %	96,55%
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	30.256
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	59.168
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. CASOS COVID	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD POR COVID	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	125,75
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	294,52

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	36
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proyecto)	66
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas proyecto)	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Proyecto	0

RELACIÓN DE:
CHARLAS DIARIAS
CAPACITACIONES
SIMULACROS
LECCIONES APRENDIDAS
(Fechas)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTAMINACIÓN POR AEROSIOLES
USO ADECUADO DEL AGUA
TRABAJO EN ALTURA
CAMBIO CLIMATICO
USO ADECUADO EPP
CHARLA ALCOHOL, TABAQUISMO Y DROGAS.



Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre Uso del punto ecológico



INFORME SISO

21 de octubre al 20 noviembre 2021

CONTRATO: 794-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
6	SST	Faltan gafas de seguridad al trabajador ya que esta en demolicion MV-3984	1	1	20/10/2021	21/10/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 
7	AMBIENTAL	Al descargar material rueda algo de arena por la vía	1	1	20/10/2021	20/10/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	   
TOTAL ACCIONES ABIERTAS			2,00					
TOTAL ACCIONES CERRADAS				2,00				



INFORME SISO

21 de octubre al 20 noviembre 2021



CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021	0		FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		0	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		0	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		0	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		0	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
42	EMILIO TIQUE WEPÁ	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		0	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		0	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		0	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		0	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		0	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		0	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		0	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
82	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		0	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		0	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		0	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		0	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		0	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		0	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		0	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		SI	

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
106	ANDRES COBA	3.734.768	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	25/10/2021	26/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	25/10/2021	26/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	25/10/2021	26/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	25/10/2021	26/10/2021		0	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
118	MISAEI PERDOMO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	30/10/2021	2/11/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	30/10/2021	2/11/2021		0	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	30/10/2021	2/11/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	30/10/2021	2/11/2021		SI	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	30/10/2021	2/11/2021		SI	PORVENIR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	5/11/2021	8/11/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	5/11/2021	8/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	5/11/2021	8/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	5/11/2021	8/11/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	96				109	44	



INFORME SISO

21 de octubre al 20 noviembre 2021



CONTRATO: 794-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021			SI			SI	
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021			SI			SI	
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021		SI	SI		SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021			SI			SI	
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021			SI			SI	
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021		SI	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021		SI	SI		SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021		SI	SI		SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021		SI	SI		SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021		SI	SI		SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021			SI			SI	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021		SI	SI		SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021		SI	SI		SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021		SI	SI		SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021			SI			SI	
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021		SI	SI		SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020			SI			SI	
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021			SI			SI	
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021			SI			SI	
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021			SI			SI	
82	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021			SI			SI	

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021			SI			SI	
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021		SI	SI		SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARITIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021			SI			SI	
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021			SI			SI	
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021			SI			SI	
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021		SI	SI		SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021			SI			SI	
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
102	OSCAR ZAUQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021		SI	SI		SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021			SI			SI	
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	29/09/2021		SI	SI		SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	30/09/2021			SI			SI	
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	1/10/2021		SI	SI		SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	2/10/2021		SI	SI		SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	3/10/2021		SI	SI		SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	4/10/2021		SI	SI		SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	5/10/2021		SI	SI		SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	6/10/2021			SI			SI	
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	7/10/2021		SI	SI		SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	8/10/2021		SI	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	9/10/2021		SI	SI		SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	10/10/2021		SI	SI		SI		
118	MISAEAL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021			SI			SI	
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	12/10/2021		SI	SI		SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	13/10/2021		SI	SI		SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	14/10/2021		SI	SI		SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	15/10/2021		SI	SI		SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	16/10/2021		SI	SI		SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	17/10/2021		SI	SI		SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	18/10/2021		SI	SI		SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	19/10/2021		SI	SI		SI		
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	20/10/2021		SI	SI		SI		
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	21/10/2021		SI	SI		SI		
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	22/10/2021		SI	SI		SI		
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	23/10/2021		SI	SI		SI		
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	24/10/2021			SI			SI	
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	25/10/2021			SI			SI	
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	26/10/2021			SI			SI	
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	27/10/2021		SI	SI		SI		
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	28/10/2021		SI	SI		SI		
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	29/10/2021		SI	SI		SI		
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	30/10/2021		SI	SI		SI		
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	31/10/2021			SI			SI	
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	1/11/2021		SI	SI		SI		
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	2/11/2021		SI	SI		SI		
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	3/11/2021		SI	SI		SI		
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	4/11/2021		SI	SI		SI		
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	5/11/2021		SI	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	8/11/2021	6/11/2021		SI	SI		SI		
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	8/11/2021	7/11/2021		SI	SI		SI		
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	8/11/2021	8/11/2021		SI	SI		SI		
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	8/11/2021	9/11/2021		SI	SI		SI		
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	8/11/2021	10/11/2021		SI	SI		SI		
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	8/11/2021	11/11/2021		SI	SI		SI		
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	8/11/2021	12/11/2021			SI			SI	
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	8/11/2021	13/11/2021		SI	SI		SI		
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	8/11/2021	14/11/2021		SI	SI		SI		
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	8/11/2021	15/11/2021		SI	SI		SI		
RESULTADOS:					13	96	153	0	109	44	



INFORME SISO COVID

21 de octubre al 20 noviembre 2021



CONTRATO: 794-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021			SI			SI	
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021			SI			SI	
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021			SI			SI	
42	EMILIO TIQUE WEPÁ	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021		SI	SI		SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021			SI			SI	
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021			SI			SI	
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021		SI	SI		SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021		SI	SI		SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021		SI	SI		SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021		SI	SI		SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021		SI	SI		SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021			SI			SI	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021		SI	SI		SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021		SI	SI		SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021		SI	SI		SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021			SI			SI	
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020			SI			SI	
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021			SI			SI	
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021			SI			SI	
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021			SI			SI	
82	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021			SI			SI	
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021			SI			SI	
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021			SI			SI	
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021		SI	SI		SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021			SI			SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARITZIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021			SI			SI	
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021			SI			SI	
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021			SI			SI	
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021		SI	SI		SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021			SI			SI	
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021			SI			SI	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
102	OSCAR ZAKE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021			SI			SI	
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	29/09/2021		SI			SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	30/09/2021						SI	
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	1/10/2021		SI			SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	2/10/2021		SI			SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	3/10/2021		SI			SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	4/10/2021		SI			SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	5/10/2021		SI			SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	6/10/2021						SI	
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	7/10/2021		SI			SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	8/10/2021		SI			SI		
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	9/10/2021		SI			SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	10/10/2021		SI			SI		
118	MISAEEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021						SI	
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	12/10/2021		SI			SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	13/10/2021		SI			SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	14/10/2021		SI			SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	15/10/2021		SI			SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	16/10/2021		SI			SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	17/10/2021		SI			SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	18/10/2021		SI			SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	19/10/2021		SI			SI		
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	20/10/2021		SI			SI		
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	21/10/2021		SI			SI		
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	22/10/2021		SI			SI		
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	23/10/2021		SI			SI		
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	24/10/2021						SI	
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	25/10/2021						SI	
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	26/10/2021						SI	
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	27/10/2021		SI			SI		
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	28/10/2021		SI			SI		
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	29/10/2021		SI			SI		
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	30/10/2021		SI			SI		
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	31/10/2021						SI	
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	1/11/2021		SI			SI		
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	2/11/2021		SI			SI		
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	3/11/2021		SI			SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	4/11/2021		SI			SI		
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	5/11/2021		SI			SI		
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	8/11/2021	6/11/2021		SI			SI		
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	8/11/2021	7/11/2021		SI			SI		
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	8/11/2021	8/11/2021		SI			SI		
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	8/11/2021	9/11/2021		SI			SI		
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	8/11/2021	10/11/2021		SI			SI		
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	8/11/2021	11/11/2021		SI			SI		
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	8/11/2021	12/11/2021						SI	
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	8/11/2021	13/11/2021		SI			SI		
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	8/11/2021	14/11/2021		SI			SI		
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	8/11/2021	15/11/2021		SI			SI		
RESULTADOS:					13	96	105	0	109	44	

		SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021																									
OBJETIVO:		Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																									
REALIZADO POR		ROBERT ROJAS								FECHA				21 de octubre al 20 noviembre 2021								PERIODO		MES 3			
PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																									
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero					
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22		
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						
				E		E	E	E	E	E	E			E	E	E											
Verificación de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
				E		E	E	E	E	E	E			E	E	E	E										
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																							
				E																							
Elaboración de protocolo de socialización	Contratista			P																							
				E																							
Implementación de protocolo de socialización a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																						
					E																						
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																						
					E																						
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				P																						
					E																						
Inducción a personal Operativo	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
							E	E	E	E	E	E			E	E	E										
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Verificación diaria de los elementos de bioseguridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
							E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			P				P				P				P				P		
						E			E				E				E										
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de síntomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Entrega de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
							E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P		
									E				E				E										
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																										

OBJETIVO:			Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																									
REALIZADO POR			ROBERT ROJAS								FECHA				21 de octubre al 20 noviembre 2021								PERIODO		MES 3			
PLAN DE TRABAJO SG SST			AÑO 2021																									
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero						
		0	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22			
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P			
									E				E				E											
Inspección botiquín	Contratista								P	P			P				P				P				P			
									E	E			E				E											
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
									E		E	E	E	E	E	E	E											
Revisión de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
							E		E	E	E	E	E	E	E	E	E											
(diligenciamiento del formato recogida de escombro(final entrega de vivienda)	Contratista												P				P				P				P			
													E				E											
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
									E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista																											
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista						P								P													
							E								E													
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																												
P	Programado	Actividades programadas		0	0	5	4	9	11	12	17	14	14	13	18	13	14	13	18	13	13	13	18	12	12	12	14	
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas		0	0	5	4	9	11	11	17	13	14	10	15	13	14	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	92.86%	100.00%	76.92%	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%	88.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL		0.00%		100.00%		100.00%		96.55%		96.43%		80.65%		100.00%		93.55%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL		100.00%				97.96%				88.14%				96.55%				0.00%				0.00%				
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO		58.51%																								

SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021					
	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
5	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
6	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
7	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
8	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
10	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
474		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
481		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3703		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3876		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3880		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
4351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
4351		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3822		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3863		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4407		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4929		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUIMIENTO DE KIT DE BENEFICIARIO SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4475		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACIÓN POR AEROSIOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
3822		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACIÓN POR AEROSIOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
3863		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACIÓN POR AEROSIOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
4233		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVUN
299

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

JORNADA ORDEN Y ASEO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVUN
4498

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

JORNADA ORDEN Y ASEO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVJE
180

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:


ENTREGA DE KITS BENEFICIARIO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVJE
224

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

ENTREGA DE KITS BENEFICIARIO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVJE
66

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVCB
4498

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVCB
481

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

REFUERZO CHARLAS DE SEGURIDAD
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021



MVCB
4498

DESCRIPCIÓN Y
FECHA:

REFUERZO CHARLAS DE SEGURIDAD
INFORME SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
99		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
469		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
828		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
837		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE BENEFICIARIOS SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
173		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE BENEFICIARIOS SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
174		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REFUERZO DE CAPACITACIÓN SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
173		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REFUERZO DE CAPACITACIÓN SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021
174		

8. BIOSEGURIDAD

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD

POR PARTE DEL CONTRATISTA

El CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 entrega protocolo de Bioseguridad general y de socializaciones para revisión por parte de la interventoría, se evidencia que cumple con lo solicitado dentro de la resolución 777 de junio de 2021 la cual está vigente.

En la reunión de socialización realizada el 26 de octubre en POTOSÍ, se aplica el protocolo y se verifica que se cumpla lo establecido dentro de la documentación enviada, así mismo se evidencia que aplican las siguientes actividades

- Encuesta de condiciones salud para los beneficiarios asistentes a la reunión.
- Aun cuando no es solicitado dentro de la resolución 777 optaron por hacer toma de Temperatura a Beneficiario, teniendo en cuenta que muchos de los participantes en la reunión son de edad avanzada.
- Desinfección de Sillas al inicio e intermedios de Reuniones.
- Marcado de Silletería.
- Aplicación de alcohol para los beneficiarios a la entrada a la reunión.
- Distanciamiento social.
- Elementos de Bioseguridad.
- Entrega de Refrigerios empacados.
- Instalación de afiches de prevención.

Realizan el proceso de aseo y desinfección en el PAC de Juan Pablo (activo hasta el corte de este mensual) e inicia el proceso del PAC en Unir II, y el PAC en Potosí estos dos últimos sectores con alto riesgo público los cuales han sido notificados por los mismos habitantes.

En los PAC en cuanto a Bioseguridad y SST se refiere, se adecuan las áreas de desinfección dispensador de pedal para Gel antibacterial y los afiches alusivos a distanciamiento, lavado de manos, jabón, toallas de papel, y el punto ecológico.

El contratista registra los elementos utilizados y los kits entregados a beneficiarios y obreros, en los formatos que fueron entregados por el hábitat, de igual manera lo hace la interventoría, en los formatos pertinentes a su alcance, de la misma manera se llevar registro de las reposiciones de elementos del kit inicial.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La empresa Inplayco SAS, dentro de sus obligaciones contractuales y su compromiso con la seguridad del personal y los temas relacionados con Bioseguridad, hizo entrega a la Secretaría del Hábitat del protocolo de Bioseguridad que es aplicado durante la ejecución del contrato 797 de 2021.

Dentro del documento se describen las actividades a realizar además del seguimiento de la aplicación del protocolo del contratista de las cuales se ha diligenciado el respectivo registro


para el control de las partes interesadas.

Las siguientes son las actividades realizadas en el periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2021.

- Reposición de Kits al personal de la interventoría que está en el proyecto.
- Charlas informativas semanales. Algunas de ellas presenciales y otras son referidas a través de medios electrónicos recogiendo las firmas entre los compañeros durante la semana.
- Seguimiento a las entregas de Kits a beneficiario, obreros, personal administrativo por parte del contratista y cumplimiento al plan de trabajo presentado.
- Suministro y reposición de elementos del Kit para los profesionales de interventoría.

1.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

De las 282 actividades programadas (con ajuste) para el proyecto se han ejecutado 165 lo que equivale al 58.51%.

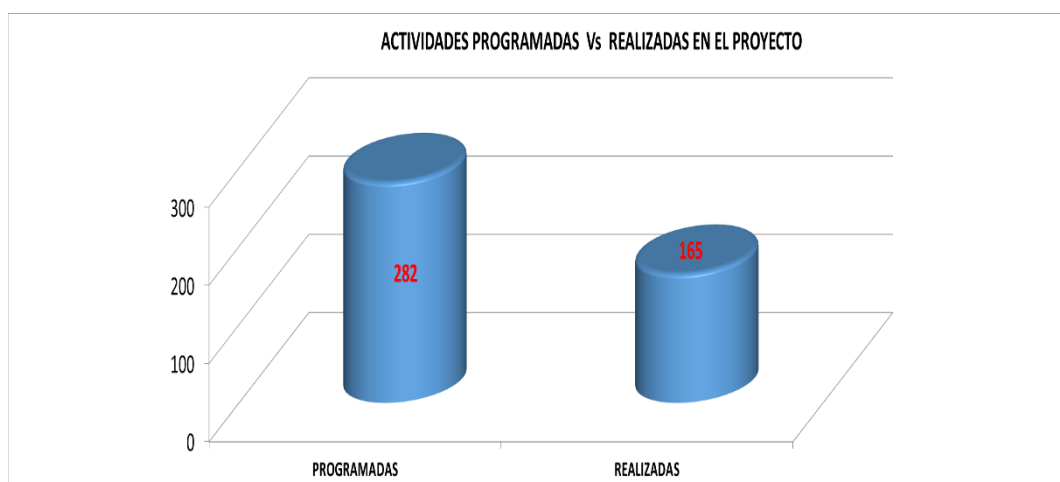


Fuente: SST interventoría

% de cumplimiento del número de actividades del plan de trabajo			
Periodo		proyecto	Porcentaje (%)
N° de actividades programadas	PROGRAMADAS PARA PROYECTO	282	58.51%
N° de actividades realizadas	REALIZADAS A FECHA DE CORTE	165	
META	100%		


Fuente: SST interventoría

La distribución de estas actividades por semana se muestra a continuación:
El periodo inicia en la semana 11 correspondietne al mes de octubre hasta la semana 14, en el mes de noviembre, cumplidas las actividades en los porcentajes relacionados.

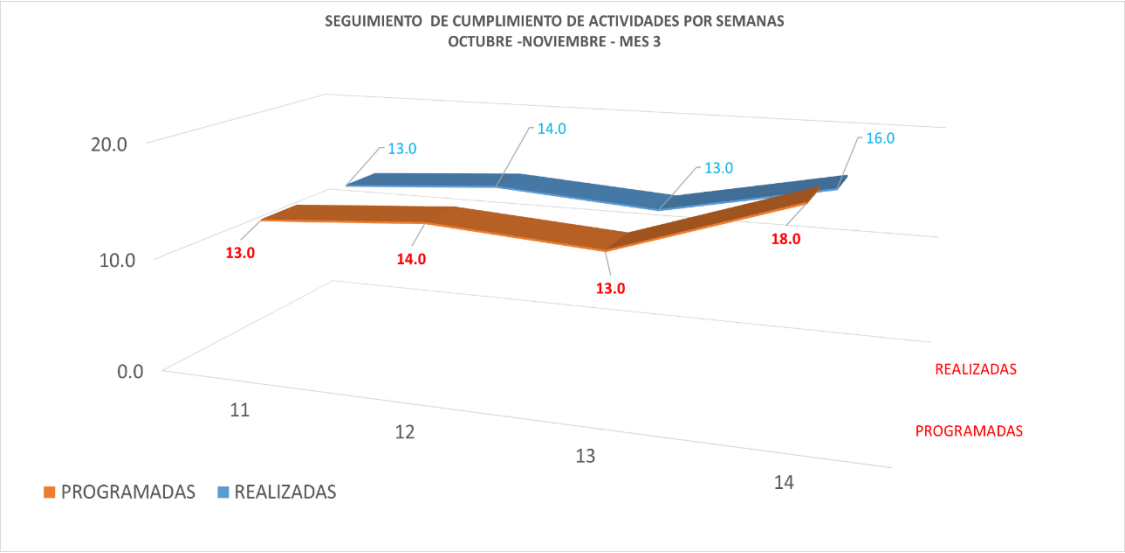

Fuente: SST Interventoría

Para este corte corresponde las semanas 11,12,13,14 del mes de septiembre y octubre de 2021. Se puede evidenciar baja en el porcentaje de cumplimiento y se aclara que este se debe a que en la última semana de este periodo no hubo ingreso de personal ni inducciones, actividades que están proyectadas en todas las semanas.

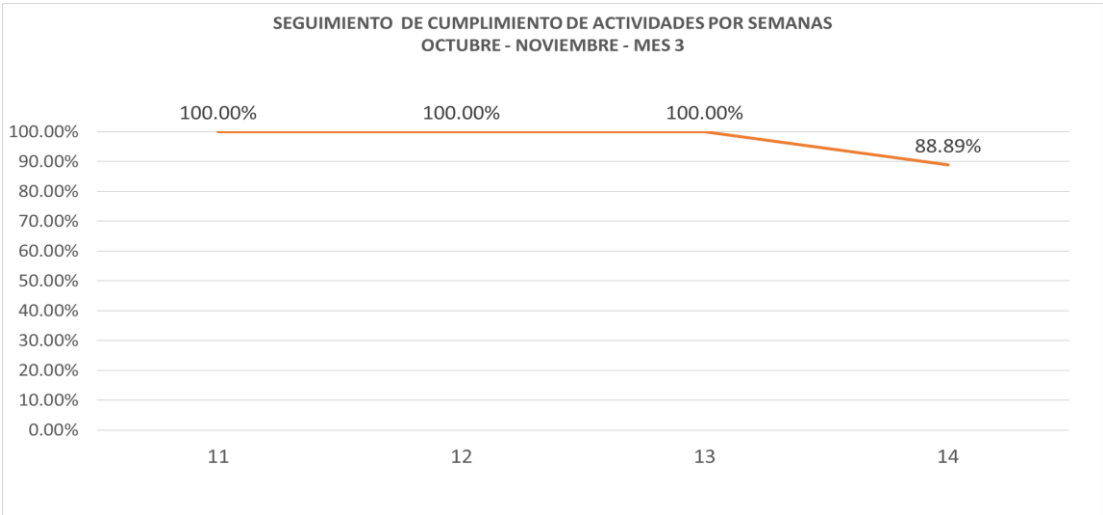

Fuente: SST Interventoría

9. ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA

10. ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA

11. ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA

12. ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA
