

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	7	FECHA:	11	de	OCTUBRE	de	2021			
PERIODO:	DEL 12	de	OCTUBRE	de	2021	AL 11	de	NOVIEMBRE	de	2021
RESOLUCIÓN No:	364	DE	2021							

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE TOBASIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Floresta

INFORMACIÓN GENERAL			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACION DE BOYACA		MUNICIPIO DE FLORESTA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ALEXEY ROJAS CHAPARRO		SAMUEL CELY ALVAREZ	
Teléfono:	7420150	Dirección	Calle 20 # 9-90
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		4/27/2021	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 1,830,272,509.67	\$ 0.00	\$ 0.00	
OBSERVACIÓN: El Departamento de Boyacá, no suscribió convenio con el Municipio de Floresta. El presente informe se realiza de conformidad con la notificación de seguimiento a la resolución 364 de 2021. El aporte por parte del Departamento de Boyacá para la ejecución del proyecto es la suma de \$ 1.830.272.509,67 provenientes de asignaciones directas - SGR, los cuales serán girados de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1942 de 2018.			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No MF-LP-001 DE 2021	5/7/2021
Aviso de Convocatoria o Invitación	5/7/2021
Estudios Previos	5/7/2021
Proyecto de pliego de condiciones	5/7/2021
Pliego de condiciones definitivos	5/9/2021
Acto de adjudicación	9/13/2021
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No CAM-MF-002-2021	7/14/2021
Aviso de Convocatoria o Invitación	7/14/2021
Estudios Previos	7/14/2021
Proyecto de pliego de condiciones	7/14/2021
Pliego de condiciones definitivos	7/26/2021
Acto de adjudicación	9/13/2021


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE FLORESTA	\$ 1,619,079,425.74
OBJETO:	
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE TOBASIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO A Y M / JUAN CAMILO ARENASCARDENAS	
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE FLORESTA	\$ 119,737,453.90
OBJETO:	
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE TOBASIA DEPARTAMENTO DE BOYACA"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA	
Teléfono: Dirección:	Teléfono: 3 Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO (N/A)			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN									
PLAZO INICIAL									
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL									
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

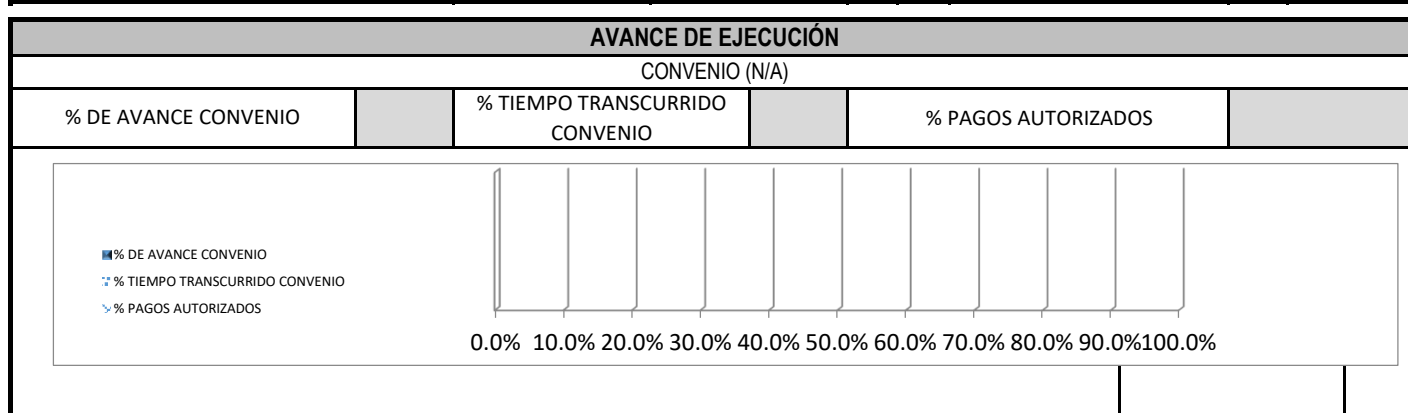

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL PROYECTO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el presente periodo se mantiene el reporte presentado en el informe inmediatamente anterior. El municipio de Floresta a fecha 11 de noviembre no ha enviado el informe correspondiente a la supervisión por lo cual no se pudo hacer trazabilidad de la ejecución de obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO (N/A)				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO (N/A)			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO (N/A)					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA		VALOR	
Desembolso No 1.					
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 0.00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de seguimiento N1	27	4	2021	26	5	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N2	27	5	2021	26	6	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N3	27	6	2021	26	7	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N4	27	7	2021	26	8	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N5	27	8	2021	26	9	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N6	27	9	2021	11	10	2021	Enviado a Sec. Contratación
Informe de seguimiento N7	12	10	2021	11	11	2021	Enviado a Sec. Contratación

OBSERVACIONES:

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapas precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras	YA SE RADICÓ	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICÓ	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	8
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>		

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Supervisor Departamento
NOMBRE:	ALEXEY ROJAS CHAPARRO

