



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022- 011976 - DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., 09 ABR 2022

Señor mayor general
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: informe de acompañamiento Región No. 4 a Mepoy - Decau

En atención a la ejecución del contrato PN DIRAF No. 06-6-10138-19, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" celebrado entre Miroal Ingeniería S.A.S. y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y según el oficio No. GS-2022-004230-REGI4 de 18/03/2022, mediante el cual la señora capitán Anabel Ortega Idrobo, presentó informe de visita realizada al complejo Policial IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 17/03/2022, efectuando seguimiento y verificación del personal en obra, respetuosamente me permito remitir a mi general, los documentos indicados, con el fin de ser gestionados como antecedentes en la carpeta del proceso en cuestión.

Atentamente,

Capitán **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-7-10086-21


Anexo: oficio No. GS-2022-004230-REGI4 de 18/03/2022
copia del acta 003 REGI4 – REINF de 17/03/2022

Elaborado por: CT. Juan David Giraldo Aguirre
Revisado por: MY. Luis Enrique Pérez Páez
TC Ferley Puerto Sánchez
CR. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita
Fecha de elaboración: 07/04/2022
Archivo: Mis documentos/oficios 2021/GUSEP

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 3.1

Popayán, 18 de marzo de 2022

Capitán
JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Analista Seguimiento Proyectos-DIRAF
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: visita seguimiento y verificación al contrato PN DIRAF 06-6-10138-19.

Teniendo en cuenta la visita realizada al complejo Policial "IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 17/03/2022, de seguimiento y verificación del personal en obra del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19, por parte de la Regional de infraestructura No 4, Consorcio interventores CDP CAUCA y la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S.", de manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Capitán, acta 003-REGI4-REINF del 17/03/2022, referente a las actividades realizadas.

Lo anterior para conocimiento de mi Capitán y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
18/03/2022 2:44:29 p. m.

Anexo: si

AVENIDA PANAMERICANA 1N-75
Teléfono: 3207437084
region4.guinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD



Fecha:	Popayán, 17 de marzo del 2022		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	11:00 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA		

ACTA - 003- REGI4 - REINF - 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/03/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, POR PARTE DE LA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No.4.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Temas a tratar.
3. Desarrollo de la agenda.
4. Conclusiones
5. Solicitudes

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

Siendo las 09:00 horas del día 17/03/2022, se realiza recorrido por parte de la Regional de infraestructura No 4, Consorcio interventores CDP CAUCA y la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S., realizando acompañamiento, verificación de personal de obra y actividades programadas.

2. Temas a tratar

Teniendo en cuenta las tareas y compromisos con el mando institucional frente a la ejecución de los recursos destinados para el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, el Comando de Región ha dispuesto realizar verificación física del personal de obra y quienes están ejecutando actividades en cada uno de los frentes de trabajo a fin de informar a la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta los diferentes recorridos realizados por el personal de Infraestructura de la Región de Policía No.4.

3. Desarrollo de la agenda.


BLOQUE 5 – ARMERILLO, ZONA TÉCNICA: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Ingeniero Carlos Guzmán
 Inspector: Arquitecto Jhon Sebastián Martínez
 Siso: Ing. María Fernanda Benavides
 Personal operativo: 9 oficial, 10 Ayudantes, 1 Maestro.

ACTA - 003- REG14 – REINF – 2.35 QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/01/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

Actividades Programadas:

- Mampostería
- Elementos de confinación
- Aplicación de pañete al interior de los muros del armerillo.
- Posos de inspección

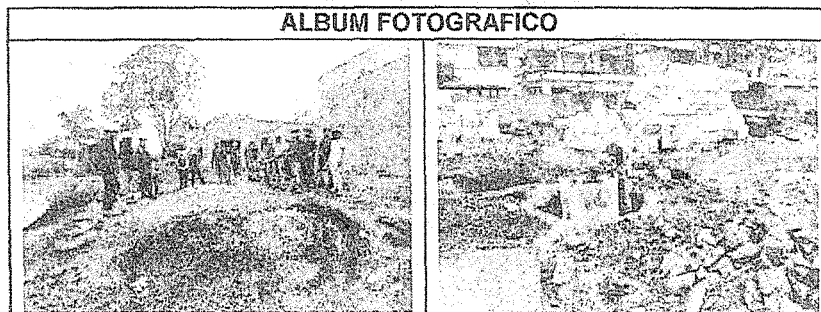

BLOQUE A - CENTRO COMANDO CONTROL: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Arquitecto Frey David Díaz Fierro

Inspector: Ingeniero Julián Lasso

Siso: Ingeniera Evelin Andrea Guzmán

Personal operativo: 4 oficiales 5 ayudantes.

Actividades Programadas:

- Ejecución de pañetes
- Mampostería.

NOTA: Cuenta con materiales, Cuenta con personal.



EDIFICIO B1 – COMEDOR: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: No cuenta con personal profesional

Inspector: Andrés Felipe Certuche

Siso: Ingeniera Rosa del Mar Rodríguez

Personal operativo: 1 oficiales, 2 ayudante.


ACTA - 003- REGI4 - REINF - 2.35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/01/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

Actividades Programadas:

- Instalación de tubería para RCI
- Placas de fibrocemento en culatas.
- Subestación eléctrica
- Estuco y pintura.

NOTA: No cuenta con materiales suficientes, no cuenta con personal suficiente.

ALBUM FOTOGRAFICO

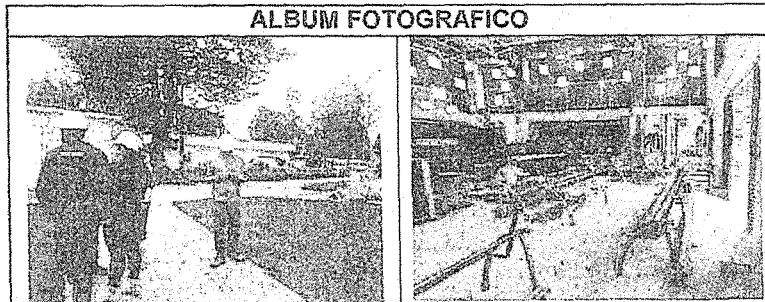

AUDITORIO Y CAPILLA: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Arquitecto Daniel Achinte
 Inspector: Ingeniera Angie Alejandra Arias
 Siso: Ingeniero Rosa del Mar Rodríguez
 Personal Capilla: 2 oficiales 1 ayudante
 Personal Auditorio: 5 oficiales 3 ayudante.

Actividades Programadas:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Auditorio:


- Armado de acero para vigas y columnas

Capilla:

- Detallado de bancas
- Destronque que de pisos

NOTA: No cuenta con materiales suficientes, no cuenta con personal suficiente.

ALBUM FOTOGRAFICO

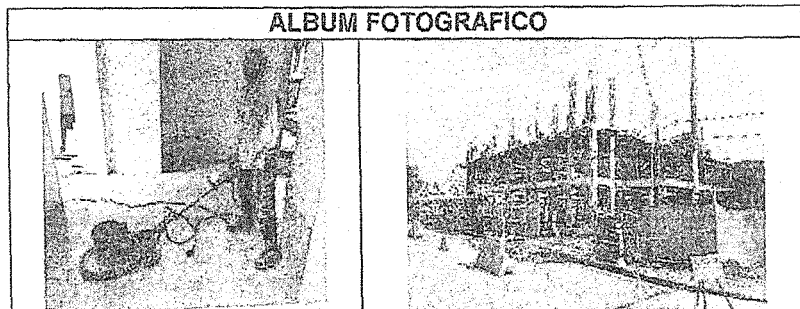

ACTA - 003- REG14 – REINF – 2.35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/01/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

EDIFICIO E – ALOJAMIENTO: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Ingeniera Paola Perafan

Inspector: Arquitecta María Cristina Alvares.

Siso: Ingeniero William Morales


Personal operativo: 1 operador de minicargador, 11 oficiales, 15 ayudantes, 1 Maestro.

Actividades Programadas:

- Ejecución de estucos
- Ejecución de pañetes impermeabilizados
- Andén perimetral, Destronque de pisos
- Instalación de Tubería para RCI.

NOTA: Cuenta con materiales.

ALBUM FOTOGRAFICO



BIENESTAR Y PAISAJISMO: Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Arquitecto Daniel Achinte

Inspector: Arquitecta María Cristina Alvares

Siso: Tecnóloga: María Fernanda Benavides


Personal operativo: No cuenta con personal.

Actividades Programadas:

- Sin actividad

NOTA: No cuenta con personal.

ALBUM FOTOGRAFICO

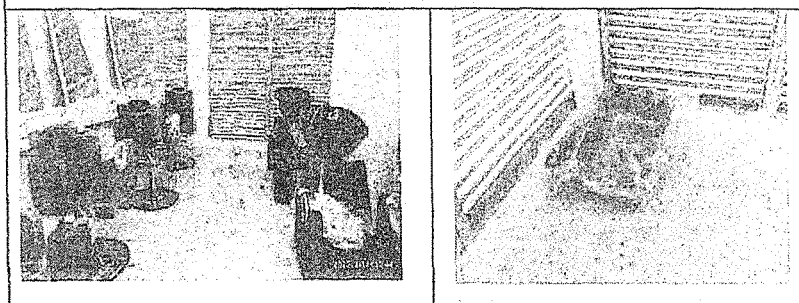

ACTA - 003- REGI4 – REINF – 2.35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/01/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

INGEDELEC: Se encuentra 06 profesionales.

Actividades programadas: Se encuentran adelantando actividades eléctricas en todos los frentes, cableado, ducteria, apantallamiento.

TOPOFORESTAL: se encuentran 02 Ayudantes

Actividades programadas: Se encuentran adelantando actividades de paisajismo en comedor.

4. CONCLUSIONES:


- Incrementar el número de personal en los diferentes frentes de trabajo, actualmente se encuentran un total de 80 trabajadores, 15 personas administrativas.
- Se requiere suministrar suficiente en todos los frentes de trabajo.


5. SOLICITUDES

Teniendo en cuenta e ingreso continuo de camiones y volquetas para el suministro de materiales a los frentes de trabajo de la obra, se evidencia un deterioro de las rejilla del cárcamo de la entrada, lo que esta generando traumatismo para el ingreso de vehículos pequeños, por lo anterior solicito a mi Capitán su colaboración para la adecuación de la rejilla por parte de la empresa, teniendo en cuenta que el 90% de los vehículos pesados que ingresan a las instalaciones son por solicitud de la empresa MIROVAL.



ACTA - 003- REGIA - REINF - 2.35 QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/01/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

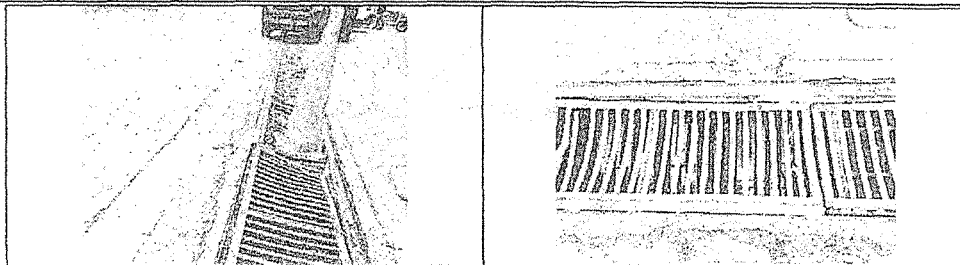


CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
 Jefe Regional de Infraestructura N°4

Anexo: uno (listado de asistentes)

Elaborado por: PT. Jorge Luis Jimenez Estancuon
 Revisado por: CT. Anabel Ortega Idrobo
 Fecha de elaboración: 17-03-2022
 Ubicación: Sitio en que se encuentra alojado el documento electrónico

Avenida Panamericana 1N-75, Popayán (Cauca)
 Teléfono: 3202975042, IP. 50000
region4.quinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD



Fecha:	Popayán, 17 de marzo del 2022	
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización: 11:00 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA	

ACTA - 003- REGIA - REINF - 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 17/03/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, POR PARTE DE LA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No.4.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
	Paula Delgado Zambrano	Interventoria	Paula.zm.27@gmail.com	34560981	32184811818	
	Gerardo Antonio Ochoa	Interventoria	gerardo.ordonez.sst@gmail.com	10308678	3115694631	
	Mirferminda Benavides	MIRAL	ferminda220@gmail.com	34315134	3104754095	
	Carlos A. Guzmán P.	MIRAL	res.ambito5@gmail.com	316726074	3104918910	
	Geoffrey Guzmán	MIRAL	sthuar.popeyana2@gmail.com	1101687935	3402943353	
	Yosha del Mar Roby	MIRAL	sst.popeyana@gmail.com	3015775023	25272753	
	Amorós Felipe Cárdenas	MIRAL	afcartu@1924@gmail.com	1061776171	3022579437	
	Paula Andrea Peraza	MIRAL	jpuerc@yohanes.com	25289361	3106370867	
	Frey David Díaz Sierra	MIRAL	freyaarquitectas@gmail.com	92517277	3108321832	

