



ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA
DOCUMENTOS SOPORTES

CODIGO

SECRETARIA GENERAL

PROCESO: GESTION
CONTRATACION

VERSIÓN:

Página 1 de 8

21 JUN 2022

Hora: 10:20

Quien recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 01

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	265 DE 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PUERTO PINEDA - GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	EMC SERVICIOS SAS NIT. 900.929.066-9
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	CUATRO (04) DE MAYO DE 2022
FECHA DEL PRESENTE ACTA	DIESEIS (16) DE JUNIO DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 41.714.239
VALOR EJECUTADO	\$ 27.813.620
SALDO POR EJECUTAR	\$ 13.900.619

ADICIONAL


ADICIONAL No. 1	\$ 13.900.619
FECHA ADICIONAL	TRES (03) DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 13.900.619
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES

PRORROGA

PRORROGA No.	01
FECHA PRORROGA	TRES (03) DE JUNIO DE 2022
PLAZO AMPLIACIÓN	UN (01) MES

SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA	N/A
FECHA POSIBLE REINICIO	N/A
PLAZO	N/A
FECHA REINICIO	N/A



	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION		Página 2 de 8

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$ 41.714.239
VALOR ACTA No. 002 PARCIAL 01	\$ 27.813.620
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 27.813.620
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 27.813.620
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 13.900.620

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN

La fecha del proceso fue aprobada.

Mostrar detalles

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en REGOP: C01_FGONTR_381644

Versión del contrato: 2

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 22/04/2022 3:37:49 PM

Número del contrato: 216 DE 2022

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VAS PUERTO BOYACA, ILUSTRADO, A FINES DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

Tipo de Contrato: Cero

(Asociado a otro contrato?): Si / No

Duración del contrato: 2 Meses

Fecha de inicio de contrato: 4/05/2022 8:00:00 AM

Fecha de terminación del contrato: 25/04/2022 para terminar

Tiempo adicionales en días: 44.531

Extensión: Si / No

Obligaciones Anteriores: Si / No

Obligaciones por consumo: Si / No

Reversión: Si / No

Información de la Entidad Estatal contratante:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA

Información del Proveedor contratista:

EMC SERVICIOS SAS

Cuenta bancaria del proveedor:

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMC SERVICIOS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor:

Aprobado por: JORGE IVAN LARREA MENDEZ

Fecha de aprobación: 22/04/2022 3:37:49 PM

Aprobador - Entidad Estatal:

Aprobado por: FREDY CASO BLANCO

Fecha de aprobación: 22/04/2022 3:37:49 PM

Contrato Firmado: C01_FGONTR_381644_Firmado

Contrato en ejecución: C01_FGONTR_381644_En ejecución

Información del contrato


Tipo de proceso: Mínima cuantía

Unidad de contratación: Secretaría General y de Servicios Administrativos

Proceso de Contratación: SMC 016 DE 2022

Título de la oferta: SMC 016 DE 2022

Cuanto del contrato: 41.714.239 COP



	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION	Página 3 de 8	

Información general

Catálogos

Plan de pagos

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Volver

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Plan de Pagos

Id de pago

Numero de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor neto de la factura

Valor total de la factura

Valor a pagar

Estado

Balance de pagos y Balance de entregos

	Valor total contrato	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato	41.714.230.00 COP	100%	100%
Valor anticipado	0.00 COP	0%	0%
Valor de los entregos	0.00 COP	0%	0%
Valor facturado	0.00 COP	0%	0%
Valor facturado pendiente de pago	0.00 COP	0%	0%
Valor pagado	0.00 COP	0%	0%
Valor amortizado del anticipo	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de liquidar	41.714.230.00 COP	100%	100%
Valor pendiente de entregar	41.714.230.00 COP	100%	100%

Proceso enmarcado en el proyecto inscrito en el Banco de Proyecto Municipal bajo el código BPIM N° 21-9-15-572-0076, con la disponibilidad presupuestal N.º 2022.CEN.01.040004 de fecha 01 de abril de 2022, con Rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción correspondiente a Gastos operativos Plan vial por valor de \$27.813.620.

Para la contratación se realizó el proceso de SMC 036 -2022, adjudica el contrato no 265 DE 2022, a la cual se presentó como oferente el señor **ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO**, representante legal, en cumplimiento al proceso administrativo y dado de que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo se da como ganador a la empresa **EMC SERVICIOS SAS NIT 900.929.066-9**. el Municipio de Puerto Boyacá como contratante procede a celebrar el contrato N° 265 de 2022 con el objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PUERTO PINEDA - GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.

Una vez allegadas la garantía requerida, a través de la póliza de cumplimiento N° 25-44-101168030, emitidas por la Compañía Seguros del estado S. A, se recibe la aprobación por parte de la Secretaría General Municipal de fecha 25 de abril de 2022, junto con la delegación de supervisión del contrato a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, se procede a suscribir el Acta N° 001 de Inicio fecha 04 de mayo de 2022, y se da comienzo a las actividades y al plazo contractual, el cual describe como forma de pago un 90% como pagos parciales y el 10% restante como un último pago luego de la liquidación del contrato.

PARTE III. RELACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONTRATO

	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
	SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION	Página 4 de 8

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2022
002	PARCIAL 01	16 DE JUNIO DE 2022

PARTE VI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES


ANEXO 0 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S. A	25-44-10168030	04/05/2022	04/01/2022	\$4,171,423.00
Calidad de los Elementos	Seguros del Estado S. A	25-44-10168030	04/05/2022	04/01/2022	\$4,171,423.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Seguros del Estado S. A	25-44-10168030	04/05/2022	03/07/2025	\$4,171,423.00

PARTE VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Administración Municipal, en aras de propender por el bienestar de la comunidad urbana y rural, además de garantizar la seguridad, comodidad, economía y conservación de la infraestructura vial, cuenta con maquinaria amarilla, equipos y vehículos, adscritos a la Secretaria de Obras Públicas, los cuales realizan mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de la malla vial que compone la red de vías terciarias y urbana, sin embargo por el desarrollo de la población y la constante utilización de las vías estas generan cambios en la forma de uso y apropiación del suelo, transformación e impacto en los subsistemas ambientales y ecológicos y, en el mismo sentido aumento del consumo, lo cual requiere para complementar dichas actividades de conservación de las vías, el suministro de materiales, que complementen las acciones y generar soluciones que mitiguen las necesidades de comunicación y transporte de los habitantes del municipio.

Con base en lo anterior, y con el fin de dar atención oportuna al mantenimiento de la malla vial, en el presente informe se mencionan los trabajos realizados por el contratista para el contrato 265 de 2022, el cual tiene como objeto el "SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PUERTO PINEDA - GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ



	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION		Página 5 de 8

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO PINEDA- GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	km	5.4	\$ 3.962.054	\$ 21.395.092
	COSTO DIRECTO				\$ 21.395.092
	ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 5.348.773
	UTILIDAD		2%		\$ 427.902
	IMPREVISTOS		3%		\$ 641.853
	COSTO TOTAL				\$ 27.813.620

La supervisión a cargo de la secretaria Obras Públicas y el representante legal de la empresa Emc servicios sas, el día 03 de junio, requirió ampliar el plazo de ejecución, teniendo en cuenta que, se hace necesario contar con los insumos para realizar el mantenimiento de puntos críticos en el tramo de vía que va desde el cruce puerto romero hasta llegar a las pavitas, partiendo de la vía nacional, puerto Boyacá - Otanche.

Para darle continuidad al mantenimiento del servicio de alumbrado público, por lo cual se hace necesario ampliar el plazo de ejecución por un término de un (01) mes, considerado para el cumplimiento de las actividades del mantenimiento de vías rurales contrato, por lo tanto:

- El día 03 de junio de 2022 se suscribe la Prórroga No. 01 al contrato 265 de 2022, según lo requerido y con base a los argumentos anteriormente citados, quedando como plazo establecido un (01) mes.

A continuación, se relacionan los ítems de la adición y prorroga de dicho contrato.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES A TRAVÉS DE LA Conformación mecánica de la banca y el manejo de las aguas lluvias (ESCARIFICACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN Y CUNETEO DE LA BANCA EXISTENTE)	km	3	\$ 3.564.261,00	\$ 10.692.783
	COSTO DIRECTO				\$ 10.692.783
	ADMINISTRACIÓN 25%			25%	\$ 2.673.196
	IMPREVISTOS 5%			2%	\$ 213.856
	UTILIDAD 2%			3%	\$ 320.784
	COSTO TOTAL				\$ 13.900.619



Puerto Boyacá
Romero!



ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA
DOCUMENTOS SOPORTES

CODIGO

VERSIÓN:

SECRETARIA GENERAL

PROCESO: GESTION
CONTRATACION

Página
6 de 8

A continuación, se describe la movilización de la maquinaria en el periodo del 19 de mayo al 02 de junio de 2022.

ITEM	DESDE	HASTA	MAQUINA TRANSPORTADA
1	PUERTO ROMERO	PUERTO BOYACA	MOVILIZACIÓN DE RETROEXCAVADORA
2	PUERTO BOYACA	PUERTO ROMERO	MOVILIZACIÓN DE MOTONIVELADORA
3	PUERTO BOYACA	PUERTO ROMERO	MOVILIZACIÓN DE VIBRO
4	PUERTO BOYACA	PUERTO ROMERO	MOVILIZACIÓN DE RETROEXCAVADORA
5	REPUESTOS Y OTROS		
6	COMBUSTIBLE		

Se realizó mantenimiento al tramo de vía que va desde Puerto romero - Guanegro Sector de las pavitas, Pineda, el catorce y la ceiba, el mantenimiento se realizó por tramos; debido al mal estado que presenta por las fuertes lluvias que se ha presentado en el sector y ha ocasionado deficiencia como desniveles, huecos y cárcavas sobre la vía, perjudicando el tránsito vehicular, demoras en el tiempo de llegada como de salida de los habitantes que transitan por esta vía. Para ello, con el presente proceso se dio prioridad a un tramo de la vía correspondiente a 5.4 km, como se visualiza en la imagen, lo cual ayudará a mejorar las condiciones para los vehículos y personas del sector que transitan por la misma.



Por consiguiente, se presenta registro fotográfico de los trabajos realizados por el contratista.



Puerto
Boyacá
rimero!

	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES	CODIGO
SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION	VERSIÓN: Página 7 de 8


REGISTRO FOTOGRAFICO

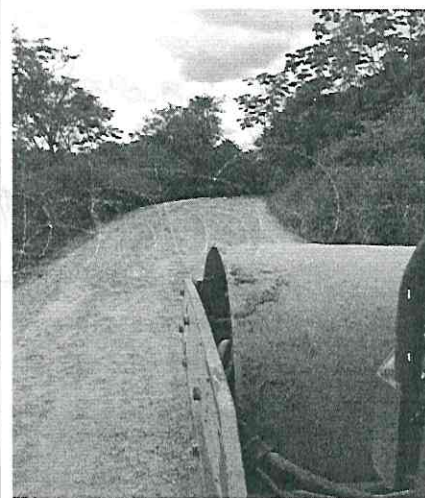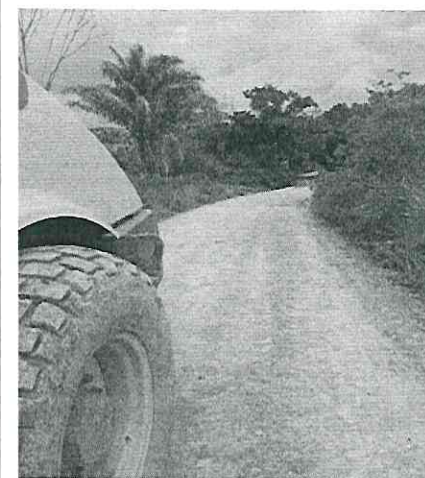

	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
SECRETARIA GENERAL	PROCESO: GESTION CONTRATACION		Página 8 de 8

PARTE VIII. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

El presente informe relaciona el servicio prestado por el contratista en forma parcial y ha satisfacción, cumpliendo con el objeto contractual.



CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS
Secretaria de Obras Públicas Municipal
Supervisor delegado

*Elaboro: Juliana Mosquera
Revisó: Carolina Hernández*
