

Contratación

 Alcaldía de Ciudad Bolívar	CERTIFICADO	 Unidos POR EL DESARROLLO	Código: FC-SO-130
			Versión: 00
			Página 1 de 2

SO-130

**EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD
BOLÍVAR – ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que el día 07 de abril de 2022, se suscribe el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-002-2022, resultante del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-05101003-2022, el cual fue adjudicado mediante Resolución N°. RESOLUCIÓN No. 4598 de 7 de abril de 2022, a la empresa EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S, identificada con Nit 900.307.818-1, cuyo representante legal es el señor ÁLVARO MIGUEL SOLANO ARROYO identificado con la cedula de ciudadanía número 78.762.840 expedida en Sahagún, que tiene por objeto del contrato es "Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia".

Que para firmar el CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-002-2022, la empresa EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S, identificada con Nit 900.307.818-1, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el día 09 de mayo de 2022 se suscribe el acta de inicio y es debidamente firmado por las partes intervinientes

Que de acuerdo al contrato y al lleno de los requisitos se procede a remitir para revisión y autorización de pago, de acuerdo a Factura electrónica FEEQ24 de 18 de julio de 2022, por un valor total de \$199.321.357 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-002-2022, tal como se describe en el informe de supervisión

Que los documentos presentados se reciben a satisfacción por esta dependencia, por lo tanto, se puede proceder a realizar el respectivo pago, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 209.811.955
VALOR Factura electrónica de venta FEEQ24	\$199.321.357
SALDO POR EJECUTAR	\$10.490.598,00

El pago del presente contrato se realiza con cargo al certificado de registro y compromiso presupuestal número 00402 de 07 de abril de 2022 por un valor de \$209.811.955


 Alcaldía de Ciudad Bolívar	CERTIFICADO	 Unidos <small>POR EL DESARROLLO</small>	Código: FC-SO-130
			Versión: 00
			Página 2 de 2

SO-130

Cualquier información adicional puede comunicarse con la SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA, PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN al 8411183 EXT 130 o al correo electrónico oopp@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

Para constancia se firma en el municipio de Ciudad Bolívar a los **19 JUL 2022**

Atentamente;



FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS

Secretario de Obras Públicas, Vivienda, Planeación y Valorización



“EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600013127 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA”

INFORME DE SUPERVISIÓN 1

Que el día 07 de abril de 2022, se suscribe el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-002-2022, resultante del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-05101003-2022, el cual fue adjudicado mediante Resolución N°. RESOLUCIÓN No. 4598 de 7 de abril de 2022, a la empresa EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S, identificada con Nit 900.307.818-1, cuyo representante legal es el señor ÁLVARO MIGUEL SOLANO ARROYO identificado con la cedula de ciudadanía número 78.762.840 expedida en Sahagún

Que el objeto del contrato es “Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.”.

Que el día 07 de abril de 2022, el ordenador del gasto de la Administración Municipal de Ciudad Bolívar, designó como Supervisor al encargado de la dependencia Secretaria de Obras Públicas, Vivienda, Planeación y Valorización acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 83

Que el 27 de abril de 2022 se suscribió el OTROSÍ 001 (Modificatorio) (Modificación CLÁUSULA 18. GARANTÍAS- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, y fue debidamente firmado por las partes intervinientes

Que el día 04 de mayo de 2022, se constituyeron las pólizas de garantía de cubrimiento de riesgo (Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones labores y estabilidad de la obra) N° M-100167460, Anexo 1 de Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A, con NIT 860.037.013-6 y fue publicada por el oferente en la plataforma de SECOP II

Que el día 27 de abril de 2022, se constituyeron las pólizas de garantía de cubrimiento de riesgo (Responsabilidad Civil Extracontractual) Nro. M-100033090, Anexo 0 de Aseguradora Seguros Mundial S.A, con NIT 860.037.013-6 y fue publicada por el oferente en la plataforma de SECOP II

Que el día 05 de mayo de 2022, la entidad territorial de conformidad con lo especificado en la CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021, realizó la VERIFICACIÓN y VALIDACIÓN de garantías contractuales y se emitió la respectiva APROBACIÓN de póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-002-2022, que fue publicada por la entidad territorial en la plataforma de SECOP II

Que el día 09 de mayo de 2022 se suscribe el acta de inicio y es debidamente firmado por las partes intervinientes

Que se suscribe el otrosí 002 (prorroga) del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-002-2022, fue publicada por la entidad territorial en la plataforma de SECOP II y es debidamente firmado por las

partes intervinientes y actualizadas las pólizas de garantía

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. DATOS DEL CONTRATO DE PÚBLICA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA NIT 890.980.330-9
CONTRATISTA:	ÁLVARO MIGUEL SOLANO ARROYO C.C.78.762.840 expedida en Sahagún EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S NIT 900.307.818-1
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$209.811.955)
OBJETO:	Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.
DURACIÓN:	El plazo del contrato será de Un (1) mes y quince (15) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio
OTROSÍ 001 (Modificadorio)	(Modificación CLÁUSULA 18. GARANTÍAS- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OTROSÍ 002 (Prorroga 001)	Treinta (30) días calendario, 24 de junio de 2022
SUPERVISOR DESIGNADO	Secretario de Obras Públicas, Vivienda, Planeación y Valorización
FECHA DE INICIO	09 de mayo de 2022
FECHA TERMINACIÓN:	24 de julio de 2022
PERIODO INFORME	09 de mayo a 24 de junio de 2022

2. CONTROL DE GARANTÍAS

La entidad territorial realizó la respectiva revisión y aprobación de las pólizas del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-002-2022, lo cual se evidencia en las respectivas actas de aprobación



GARANTÍA CUMPLIMIENTO	No.	M-100167460	GARANTÍA RCE	No.	M-100033090
	Anexo	1		Anexo	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	04/05/2022		FECHA EXPEDICIÓN:	27/04/2022
	ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.		ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.
	Nit	860.037.013-6		Nit	860.037.013-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO (INICIAL)					
DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12.)	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato	\$41.983.559,60	07/04/2022	22/11/2022
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.13.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a la vigencia del contrato y tres (3) años mas	\$20.991.799,80	07/04/2022	22/05/2025
Estabilidad y calidad de las obras (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.14.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra	\$20.991.799,80	22/05/2022	22/05/2027
Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.17.)	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1500 SMMLV e inferior a 2500 SMMLV	Deberá ser igual al período de ejecución del contrato.	\$200.000.000	07/04/2022	22/05/2022

Que el día 09 de mayo de 2022 se suscribió el ACTA DE INICIO y el proveedor realizo la respectiva actualización de las pólizas y fue publicada en la plataforma de SECOP II. Para ser verificada por la entidad territorial

GARANTÍA	No.	M-100167460	GARANTÍA	No.	M-100033090
----------	-----	-------------	----------	-----	-------------



CUMPLIMIENTO	Anexo	2	RCE	Anexo	1
	FECHA EXPEDICIÓN:	12/05/2022		FECHA EXPEDICIÓN:	12/05/2022
	ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.		ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.
	Nit	860.037.013-6		Nit	860.037.013-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO (ACTA DE INICIO)

DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12.)	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato	\$41.983.559,60	09/05/2022	24/12/2022
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.13.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a la vigencia del contrato y tres (3) años mas	\$20.991.799,80	09/05/2022	24/06/2025
Estabilidad y calidad de las obras (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.14.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra	\$20.991.799,80	24/06/2022	24/06/2027
Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.17.)	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1500 SMMLV e inferior a 2500 SMMLV	Deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.	\$200.000.000	07/04/2022	24/06/2022

El proveedor, realizo la constitución la póliza de calidad del servicio, sin embargo, en el otrosí 001 (modificatorio) esta no está estipulada por lo tanto no se tendrá en cuenta en la presente aprobación de póliza

Que el día 24 de junio de 2022, se suscribió el otrosí 002 (Prorroga 001) y fue debidamente firmada por las partes intervinientes



GARANTÍA CUMPLIMIENTO	No.	M-100167460	GARANTÍA RCE	No.	M-100033090
	Anexo	3		Anexo	2
	FECHA EXPEDICIÓN:	05/07/2022		FECHA EXPEDICIÓN:	05/07/2022
	ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.		ASEGURADORA:	Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.
	Nit	860.037.013-6		Nit	860.037.013-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO (Otro sí 002)					
DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12.)	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato	\$41.983.559,60	24/06/2022	24/01/2023
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.13.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a la vigencia del contrato y tres (3) años mas	\$20.991.799,80	24/06/2022	24/07/2025
Estabilidad y calidad de las obras (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.14.)	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra	\$20.991.799,80	24/06/2022	24/07/2027
Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual (Amparo que cubrirá los riesgos conforme con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.17.)	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1500 SMMLV e inferior a 2500 SMMLV	Deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.	\$200.000.000	07/04/2022	24/07/2022

Que de conformidad con lo especificado en la CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021, se realizó la VERIFICACIÓN y VALIDACIÓN de garantías contractuales y dicho documento se encuentra en el expediente contractual



3. CONTROL FINANCIERO

A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista y el supervisor han conciliado un total de un (1) acta de avance de obra con los valores que se relacionan a continuación.

Acta de Avance de Obra	Valor Facturado (\$)	Avance (%)
1	\$199.321.357	95
Avance acumulado Facturado	\$199.321.357	95%

Para el periodo motivo del presente informe se tiene un avance financiero de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$199.321.357), lo que representa un 95% de total del presupuesto aprobado a la fecha según CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-002-2022

4. CONTROL DE EJECUCIÓN

Descripción	Plazo	Fecha inicial	Fecha terminación proyectada
Contrato		07/04/2022	
Acta inicio	Un mes (1) y quince (15) días	09/05/2022	24/06/2022
Otrosí 002 prorroga 001	30 días	25/06/2022	24/07/2022
Tiempo total	Un (1) mes y cuarenta y cinco (45) días		24/07/2022

Las actividades contradas según oferta presentada por el proveedor a saber

CANTIDADES CONTRACTUALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
URBANISMO PARQUE					
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA				
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	14.444	\$ 832,00	\$ 12.017.621,00
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	26.100	\$ 585,00	\$ 15.268.500,00
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.450	\$ 34.579,00	\$ 50.139.550,00
2	VIA TERCARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS				
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	15.950	\$ 832,00	\$ 13.270.400,00
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	28.710	\$ 585,00	\$ 16.795.350,00
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.595	\$ 34.579,00	\$ 55.153.505,00

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas según acta 1, desde la fecha 09 de mayo a 24 de junio de 2022, la firma contratista bajo la supervisión y control de la secretaria de obras públicas han ejecutados las siguientes actividades de los ítems del contrato:



- ✓ Conformación de vía departamental Ciudad Bolívar a Betania, vía que presenta un cierre de los bordes por falta de mantenimiento periódico lo que presento un volumen alto de material pantanoso que vía ser retirado de la vía con equipo de cargue.
- ✓ Conformación de Vía Altos de los Jaramillos.
- ✓ Aplicación de Afirmado en ambas vías.
- ✓ Transporte en volqueta de material de afirmado.

CANTIDADES CONTRACTUALES					ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 01		ACTA No.1 y Parcial		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
URBANISMO PARQUE									
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA								
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motorizadora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	14.444	\$ 832,00	\$ 12.017.621,00	15250,00	\$12.688.000	5633,18	\$ 4.686.810,00
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	26.100	\$ 585,00	\$ 15.268.500,00	26100,00	\$15.268.500	26100,00	\$ 15.268.500,00
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.450	\$ 34.579,00	\$ 50.139.550,00	1450,00	\$50.139.550	1450,00	\$ 50.139.550,00
2	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS								
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motorizadora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	15.950	\$ 832,00	\$ 13.270.400,00	15800,00	\$13.145.600	15800,00	\$ 13.145.600,00
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	28.710	\$ 585,00	\$ 16.795.350,00	28440,00	\$16.637.400	28440,00	\$ 16.637.400,00
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.595	\$ 34.579,00	\$ 55.153.505,00	1580,00	\$54.634.820	1580,00	\$ 54.634.820,00

5. CONTROL DE PAGOS CAUSADOS Y/O EFECTUADOS

Durante la ejecución del contrato de obra pública se han causado y/o efectuado los siguientes pagos parciales:

Descripción	Fecha d/m/a Acta	Valor Contrato	Orden de pago	Comprobante de Egreso	Fecha de Pago	Valor Factura	Saldo Disponible
Costo total obra		\$ 209.811.955,00					\$209.811.955,00
Factura electrónica de venta FEEQ24	18/07/2022					\$199.321.357	\$ 10.490.598,00
Saldo disponible		\$209.811.955,00					
TOTAL						\$199.321.357	

El pago del presente contrato se realiza con cargo al certificado de registro y compromiso presupuestal número 00402 de 07 de abril de 2022 por un valor de \$209.811.955

6. SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO COMUNITARIO

a. Seguridad en el trabajo



Según verificación realizada por el supervisor designado el contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos, utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto realizando la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales.

A continuación, se relaciona el personal profesional, administrativo y el personal operativo del proyecto (Ver anexo Seguridad social)

b. Personal en obra

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección personal (EPP) requeridos en el desarrollo de sus labores diarias para realizar de manera segura las actividades que se vayan desarrollando en la ejecución de la obra, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
CASCO	X		X			Maestros, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Maestros, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Maestros, Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE PROTECCIÓN	X		X			Maestros, Oficiales, ayudantes.

7. SEGURIDAD SOCIAL

7.1. PERSONAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-003-2022

El contratista adjuntó las Planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1990 de 06 de diciembre de 2016, artículo 3.2.2.1., dentro de los términos establecidos. E igualmente entrega las afiliaciones del personal referido en obra

Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 en su "Artículo 2.2.4.2.2.13. Pago de la cotización. Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales mes vencido, dentro de los términos previstos por las normas vigentes.

8. ASPECTOS TÉCNICOS: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).

8.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO



Para el periodo motivo del presente informe se tiene un avance financiero de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$199.321.357), lo que representa un 95% de total del presupuesto aprobado a la fecha según CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-002-2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VÍA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLÍVAR - BETANIA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS



8.2. RELACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES (CONTROL BITÁCORA)

- ✓ Bitácora de obra: El contratista de obra entrega en el anexo la bitácora desde el día 09 de mayo de 2021 hasta el 22 de junio de 2022, este registro tiene como finalidad registrar los cambios que se efectúen o tengan que efectuarse y que modifiquen las



registrar los cambios que se efectúen o tengan que efectuarse y que modifiquen las previsiones contenidas en el programa, las especificaciones, el presupuesto y el proyecto en ejecución (ver anexo informe contratista)

9. ASPECTOS AMBIENTALES: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros

Licencia ambiental a nombre de la sociedad CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A – CONITRAC, con Nit 890932730-7 para el proyecto de explotación de materiales de construcción en el rio San Juan, en el corregimiento de Peñalisa (limites entre los municipios de Salgar y Tarso) amparado bajo el contrato de concesión minera de arenas y gravas naturales N° 6768 de 25 de agosto de 2005

10. MAQUINARIA Y EQUIPO (interventoría, contratista): Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

Para la ejecución de las obras y durante este periodo se utilizó la siguiente maquinaria y equipo:

Equipo - Maquinaria	Característica	Cantidad	Estado
Herramienta Menor	Palas, picas, Barras, Coches - pulidora – concretadora	Global	Bueno
Equipo	Motoniveladora, volqueta, vibro compactador y bulldozer, bocat- minicarcador, retro pajarita	Global	Bueno

11. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Para la ejecución de este contrato NO se tuvo en cuenta el pago por concepto de anticipo para el contratista

12. METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA EL CONTRATO

Cumpliendo con las metas municipales de infraestructura que nos trazamos dentro del Plan de Desarrollo “Sigamos Avanzando Unidos por el Desarrollo 2020-2023” que fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 004 de 27 de mayo de 2020, el presente proceso contractual está inmerso dentro del mismo así:

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	UNIDOS POR EL DESARROLLO DE NUESTRA ECONOMÍA
OBJETIVO DE LA LÍNEA	Potenciar el desarrollo económico del municipio de Ciudad Bolívar desde la productividad, el emprendimiento, el empresarismo, fortalecimiento de las economías solidarias, el turismo, las TIC'S, los espacios públicos, equipamientos comunitarios, viviendas y <u>vías, apostando por una movilidad sostenible y segura y la mejora en la calidad de vida de los habitantes.</u>



		INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		
OBJETIVO COMPONENTE	DEL	Fortalecer los espacios, edificios públicos, equipamientos comunitarios y viviendas de las personas del municipio de Ciudad Bolívar		
PROGRAMA 1		Articulación e Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Promover el desarrollo y el bienestar social de los habitantes del municipio a través del mantenimiento y construcción vial en la zona urbana y rural.		
Producto	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta de cuatrienio	Cantidad Proyectada en el Sub proyecto
Mantenimiento y/o construcción de la <u>red vial rural municipal</u>	Vía terciaria rehabilitada	kilómetros	120	2.90
Mantenimiento de vías secundarias intermunicipales		kilómetros	3	3.99

13. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☐	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:			
<ul style="list-style-type: none">✓ Factura electrónica de venta FEEQ24 de 18 de julio de 2022, indicando que el pago se realizara la consignación en la cuenta de ahorros Banco Caja Social N° 24113014444✓ Informe con registro fotográfico debidamente soportado (Acta de obra y memorias de cálculo, Bitácora de obra, copia de la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de la obra)✓ Documentos contractuales			

Para constancia se firma en el municipio de Ciudad Bolívar a los

11 9 JUL 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS

Secretario de Obras Públicas, Vivienda, Planeación y Valorización

**EQUICONSTRUCCION SAS**

NIT: 900307818-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 87 SUR 55 552 CA 2, La Estrella, Antioquia, Colombia

Tel. 3217468334

Email: equiconstruccion.fe@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764019150389 válida desde 2021-10-06 hasta 2022-10-06 rango desde FEEQ10 hasta FEEQ200.

Cliente: Municipio de Ciudad Bolívar
NIT: 890980330
Dirección: Calle 49 # 51-20, Ciudad Bolívar, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8411183
Email: shacienda@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 30/07/2022
Total de Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEEQ24

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:11:32
FECHA FIRMADO: 18/07/2022 11:11:34

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2022	30	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	COSTO DIRECTO Acta de Obra No 001 del contrato # COP-002-2022 Cuyo Objeto es OBJETO: Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.	WSD	1,00	\$154.512.680,00		0,00	\$154.512.680,00
2	002	ADMINISTRACION A=25.00%	WSD	1,00	\$38.628.170,00		0,00	\$38.628.170,00
3	003	UTILIDAD U=4.00%	WSD	1,00	\$6.180.507,00		0,00	\$6.180.507,00

Notas:
Consignar en la Cuenta de Ahorros Banco Caja Social Numero 24113014444 a nombre de EQUICONSTRUCCION S.A.S. con NIT. 900.307.818-1

SON: (ciento noventa y nueve millones trescientos veintinueve mil trescientos cincuenta y siete pesos)

CUFE: 2d2c3cd6687862355a26b03ddeb8ca3d39cd76156c9718df273950bb3a15f40c7e57d42c92fb7fb954cca158ac851043

Subtotal:	\$199.321.357,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$199.321.357,00

Firma Digital:

OYDIQNPALUzqJINIZSEnVYa89qV8kz0d2ID2BHEITGNuApDeplIMrDm5U4chaMBbfbBPUzG1QF8+HbLHXe3ThFraaDOcT7p542A4GdNu158Sjn
KOR2n1RnGoo6zVS78n7SSCo2mwdFZthNoeIdRJRZnUDseyoOKjICRE2rqtGRa/x+N4lpxKYVOLdG7PrldTg41GeBQI5gt05EMz0QRll2wwW9+ykR8n
3MF6ObJOY8nD23ccc8uAaUWryIMX2DwEu8fEGxbWkOBhUhm2LyKWwTaD5/mwwBfIMjd8Qw+MvfeJUhjVikRJs19uKSxZvibiMayKYZV1tWb8EQw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

EQUICONSTRUCCION SAS

Identificado con

NI9003078181

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0218 UNICENTRO MEDELLIN, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	: 24113014444
Fecha de Apertura	: 28 de marzo de 2022
Saldo Disponible	: \$ 200,000.00
Saldo Total a la Fecha	: \$ 200,000.00
Condiciones de Manejo	: Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado	: CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0218 UNICENTRO MEDELLIN de la ciudad de MEDELLIN, el día lunes, 28 de marzo de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:

D2G5G907 - DIEGO LEON GOMEZ GALEANO


FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019150389



(415)7707212489984(8020) 001876401915038 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 0 3 0 7 8 1 8

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
EQUICONSTRUCCION SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

24. Dirección
CL 87 SUR 55 552 CA 2

25. País
Colombia

26. Departamento
Antioquia

27. Municipio
La Estrella

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante




1001. Apellidos y nombres SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 8 7 6 2 8 4 0 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EQUICONSTRUCCION SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1-1 0-0 6/1 4:2 0:2 2

29. Establecimiento								
EQUICONSTRUCCION SAS CL 87 SUR 55 552 CA 2								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEEQ	10	200	12	HABILITACIÓN	2
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

 Alcaldía de Ciudad Bolívar 		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° COP-002-2022								ACTA N° 1 Y PARCIAL			
		OBJETO: Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia								VALOR ACTA: \$ 199.321.357			
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 Y PARCIAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR ADICIÓN:								Doscientos nueve millones ochocientos once mil novecientos cincuenta y cinco pesos (\$209.811.955)			
		ACTAS DE AVANCE DE OBRAS								FECHA: 24 Junio 2022 PLAZO INICIAL: 1.5 meses Plomada 001: 30 días FECHA DE INICIO: 09/05/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/07/2022			
CANTIDADES CONTRACTUALES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
URBANISMO PARQUE													
VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA													
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motorveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	14.444	\$ 832,00	\$ 12.017.621,00	15250,00	\$12.688.000	5633,18	\$ 4.686.810,00	5633,18	\$4.686.810	8811,07	\$7.330.811
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afimado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	26.100	\$ 585,00	\$ 15.268.500,00	26100,00	\$15.268.500	26100,00	\$ 15.268.500,00	26100,00	\$15.268.500	0,00	\$0
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afimado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.450	\$ 34.579,00	\$ 50.139.550,00	1450,00	\$50.139.550	1450,00	\$ 50.139.550,00	1450,00	\$50.139.550	0,00	\$0
VIA TERCERA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS													
1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motorveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	15.950	\$ 832,00	\$ 13.270.400,00	15800,00	\$13.145.600	15800,00	\$ 13.145.600,00	15800,00	\$13.145.600	150,00	\$124.800
2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afimado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	28.710	\$ 585,00	\$ 16.795.350,00	28440,00	\$16.637.400	28440,00	\$ 16.637.400,00	28440,00	\$16.637.400	270,00	\$157.950
3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afimado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.595	\$ 34.579,00	\$ 55.153.505,00	1580,00	\$54.634.820	1580,00	\$ 54.634.820,00	1580,00	\$54.634.820	15,00	\$518.685
COSTO DIRECTO					\$162.644.928	\$162.513.870		\$154.512.680,00		\$154.512.680		\$8.132.246	
A 25,00%					\$40.661.232	\$40.628.468		\$38.628.170		\$38.628.170		\$2.033.062	
U 4,00%					\$6.505.797	\$6.500.555		\$6.180.507		\$6.180.507		\$325.290	
I 0,0%					\$0	\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$209.811.955	\$209.642.892		\$199.321.357		\$199.321.357		\$10.489.597	
VALOR A PAGAR ACTA N° 1 Y PARCIAL								\$199.321.357		95,06%			
Ciento noventa y nueve millones trescientos veinte y un mil trescientos cincuenta y siete pesos M.L.C													
En el municipio de Ciudad Bolívar, se reunieron los señores: MAURICIO MARQUEZ VALENCIA identificado con c.c.8.163.244, quien obra en nombre y representación legal del Municipio de Ciudad Bolívar, - Antioquia, quien obra en nombre y representación legal del Municipio de Ciudad Bolívar - Antioquia, entidad territorial con Nit. 890.980.330-9, JUAN CARLOS RETREPO, en calidad de Supervisor de Secretaría de Obras públicas, ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO representante legal del EQUICONSTRUCCION S.A.S. con NIT. 900.307.818-1 como contratista, con el fin de hacer entrega correspondiente al Acta N° 1 del contrato que tiene por objeto: "Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia".													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO Rep. Legal EQUICONSTRUCCION S.A.S. Contratista </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS Supervisor </div> </div>													





Alcaldía
de Ciudad Bolívar

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

RESPONSABLE:
OOPP CIUDAD BOLIVAR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA 1 DE 1

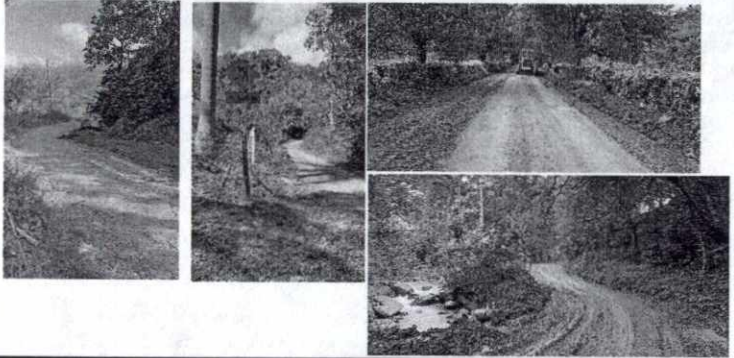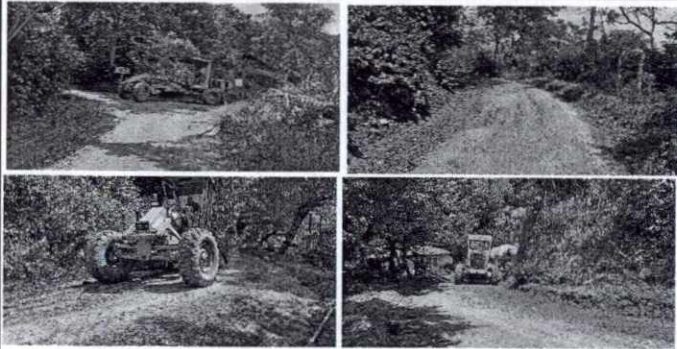
VIA INTERVENIDA	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	FECHA DE CORTE	24/06/2022					
ITEM 1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UND	m2					
		DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL	
			ALTO	LARGO	ANCHO			
		Conformacion de Via Betania		1.126,64	5,00	1,00	5.633,18	
		Nota Falta 2.000 metros de conformacion para liquidacion						
ACTA No 01							5.633,18	
								
ACUMULADO							5.633,18	
TOTAL CONTRACTUAL							14.444	
COBRADO PRESENTE CORTE							5.633	
SALDO POR COBRAR							8.811	
DESPUES								

Fecha

24/06/2022

VoBo Contratista

VoBo Supervision



RESPONSABLE:
OOPP CIUDAD BOLIVAR

PAGINA 1 DE 1

[illegible]

Fecha

24/06/2022

VoBo Contratista


VaBo Supervision

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

RESPONSABLE:
OOPP CIUDAD BOLIVAR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA 1 DE 1

VIA INTERVENIDA	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	FECHA DE CORTE	24/06/2022			
ITEM 1	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UND	m2			
       	DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	Conformacion de Altos de los jaramillos		3.950,00	4,00	1,00	15.800,00
ACTA No 01					15.800,00	
<p>ANTES</p>    						
ACUMULADO					15.800,00	
TOTAL CONTRACTUAL					15.950	
COBRADO PRESENTE CORTE					15.800	
SALDO POR COBRAR					150	
DESPUES						

Fecha

24/06/2022



VoBo Contratista




VoBo Supervision

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

RESPONSABLE:
OOPP CIUDAD BOLIVAR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA 1 DE 1

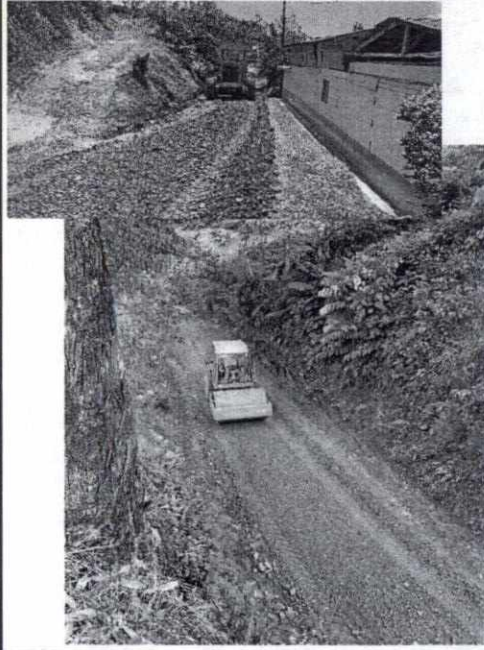VIA INTERVENIDA	VIA TERCARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	FECHA DE CORTE	24/06/2022			
ITEM 1.2	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).			UND	m3-km	
	DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	
		ALTO	LARGO	ANCHO	MEDIDA TOTAL	
	Conformacion de Altos de los jaramillos	0,100	3.950,00	4,00	18,00	28.440,00
	ACTA No 01					28.440,00
						
ACUMULADO					28.440,00	
TOTAL CONTRACTUAL					28.710	
COBRADO PRESENTE CORTE					28.440	
SALDO POR COBRAR					270	
ANTES						
DESPUES						

Fecha

24/06/2022

VoBo Contratista

VoBo Supervision



Alcaldía
de Ciudad Bolívar



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

RESPONSABLE:
OOPP CIUDAD BOLIVAR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA 1 DE 1

VIA INTERVENIDA	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS			FECHA DE CORTE	24/06/2022	
ITEM 1.3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.				UND	m3
	DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	Conformacion de Altos de los jaramillos	0,100	3.950,00	4,00	1,00	1.580,00
ACTA No 01					1.580,00	
						
	ACUMULADO					1.580,00
TOTAL CONTRACTUAL					1.595	
COBRADO PRESENTE CORTE					1.580	
SALDO POR COBRAR					15	
DESPUES						

Fecha

24/06/2022

Alonso S.

VoBo Contratista

[Signature]

VoBo Supervision



La Estrella, junio 2022.

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Asunto: Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que **EQUICONSTRUCCION S.A.S.** con NIT. **900.307.818-1** se encuentra al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, con las Administradoras de Riesgos Profesionales y con los Fondos de Pensiones a los cuales se tienen afiliados los trabajadores. Así mismo, me encuentro a paz y salvo con la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA - e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el FIC en los últimos 6 meses a la fecha de expedición de esta declaración.

Se adjuntan Planillas de soporte de pago de seguridad social.

Atentamente,

ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO

CC.78.762.840 de Sahagún

Representante legal

EquiConstruccion S.A.S.

EquiConstruccion S.A.S

NIT. 900.307.818- 1

Calle 87 sur # 55 – 552 casa 2

Tel: 314 219 55 57

La Estrella - Colombia



La Estrella, julio 2022.

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Asunto: Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que **EQUICONSTRUCCION S.A.S.** con NIT. **900.307.818-1** se encuentra al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, con las Administradoras de Riesgos Profesionales y con los Fondos de Pensiones a los cuales se tienen afiliados los trabajadores. Así mismo, me encuentro a paz y salvo con la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA - e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el FIC en los últimos 6 meses a la fecha de expedición de esta declaración.

Se adjuntan Planillas de soporte de pago de seguridad social.

Atentamente,

ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO

CC.78.762.840 de Sahagún

Representante legal

EquiConstruccion S.A.S.

EquiConstruccion S.A.S

NIT. 900.307.818- 1


Calle 87 sur # 55 – 552 casa 2

Tel: 314 219 55 57

La Estrella - Colombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1017150777	NÚMERO PLANILLA:	7842624233	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN:	DEPARTAMENTO:	TELEFONO:	1234567	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2022/06/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1517663291					2022			
TIPO APORTANTE:	PIRONEGRO	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act															
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	UNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO																		

TOTAL APORTES A PENSION														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO					
230201	230201- PROTECCION		1	\$ 160.000	EMPLEADOR \$ 0	COTIZANTE \$ 0	SOLIDARIDAD \$ 0	SUBSISTENCIA \$ 0	COTIZACIÓN \$ 0	FSP \$ 0	APORTES \$ 160.000	MORA \$ 0	DESCUENTO \$ 0	VALOR PAGADO \$ 160.000
SUBTOTALES:														

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1							\$ 125.000				\$ 125.000			\$ 125.000
SUBTOTALES:										\$ 125.000				\$ 125.000			\$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	
SUBTOTALES:								\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															PENSION										SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															PENSION					APORTES VOLUNTARIOS					INDICADOR TASA ESPECIAL					TOTAL APORTE					ADMIN					SALUD					ARF					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															SUBSISTENCIA					SOLIDARIDAD EMPLEADOR					EMPLEADO					Normal					SUSCRIPCION DE SERVICIO					IBR					CENTRO TRABAJO					TOTAL APORTE					IBR					ADMIN					TOTAL APORTE					TOTAL APORTE					TOTAL APORTE					TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES					TOTAL APORTE					ADMIN					IBR					COTIZACION					VALOR ADRES				

TOTAL \$ 290.300

PAGADO 11/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS	Dirección	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Documento	NI900307818	Teléfono	2608337
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 78762840
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	VST	SLN	SLM	LMA	VAC	AVP	VCT	RFP	Días AFP	Días EPS	Días APO	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1017150777	CINDY JOANA MORALES MONSALVE	59	00																			0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$0	\$0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$0	\$0	6,960	\$1,000,000	\$69,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$0	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,600	\$0	\$69,600

PAGADO 02/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS	Dirección	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Documento	NI900307818	Teléfono	2608337
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 78762840
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	RFP	Días AFP	Días EPS	Días ADP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017150777	CINDY JOANA MORALES MONSALVE	SR	00															0	0	0	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	6.960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 0	\$ 69.600

PAGADO 02/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS	Dirección	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Documento	NI900307818	Teléfono	2608337
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 78762840
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	2		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	CBP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	CCP	Total
CC 78762840	ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO	01	00																														\$ 619.200
CC 92535961	CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS	01	00	X																													\$ 340.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 496.000	\$ 124.000	\$ 215.800	\$ 124.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 959.800	\$ 0	\$ 959.800

PAGADO 11/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS			Dirección	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Documento	NI900307818			Teléfono	2608337
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN			Identificación	CC 78762840
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	5				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	WET	WTA	WMA	VAC	AVP	VCT	IBP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total					
CC 1020452684	DIEGO ALONSO ARANGO BEDOYA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 93.334	\$ 15.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 93.334	\$ 3.800	6.960	\$ 93.334	\$ 6.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 93.334	\$ 3.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.100
CC 1193094154	DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA TABORDA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 33.334	\$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 33.334	\$ 1.400	6.960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 70660518	CARLOS EMILIO VARGAS VARGAS	01	00	X																0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 66.667	\$ 10.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 66.667	\$ 2.700	6.960	\$ 66.667	\$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 66.667	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.800
CC 78762840	ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6.960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 92535661	CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6.960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.693.335	\$ 3.693.335	\$ 3.693.335	\$ 3.693.335	\$ 591.100	\$ 147.900	\$ 257.200	\$ 147.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.144.100	\$ 0	\$ 1.144.100

Medellín, 25 de mayo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de EQUICONSTRUCCION SAS que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 CONSTRUCCION		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %
C92535661	MERCADO SALAS CESAR AUGUSTO	26/05/2022		aD212167	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 16:12:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.249.241.189, 192.230.104.4, 172.16.42.57

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.



Número de Solicitud

6I_7150

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 900307818 EQUICONSTRUCCION SAS
Afiliado	CC 92535661 CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,500,000
Cargo	OTRO
Sucursal	MEDELLIN CL 87 SUR 55 552 CA 2
Fecha de ingreso	25/05/2022
Fecha de radicación	25/05/2022 04:15:56 p.m.
Código de Transacción	139148696
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 06/2022

Fecha de generación

25/05/2022



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **92.535.661**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 25 de Mayo del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

INFORME DE SUPERVISION No 001 Y FINAL
DEL 09 MAYO AL 24 JUNIO DE 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600013127 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JUNIO DE 2022

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	5
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	5
2.3. RESUMEN CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.	6
2.4. CONTROL LABORAL	7
2.4.1. Registro de personal	7
2.4.2. Pagos salariales	8
2.4.3. Seguridad social.....	8
2.4.4. Paz y salvo de trabajadores	8
3. ASPECTOS LEGALES	9
3.1. GARANTÍA UNICA CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022	9
3.1.1. Pólizas iniciales (por legalización del contrato y acta de inicio)	9
3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.....	9
4. ASPECTOS FINANCIEROS.	10
4.1 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.	10
4.1.1. Buen manejo del anticipo.	10
4.1.2. Verificación del A.U contractual.....	10
4.1.3. Actas de cobro.....	10
5. ASPECTOS TÉCNICOS.	12
5.1. ALCANCE DEL PROYECTO	12
5.2. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN	12
5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN	13
5.4. RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS	13
5.5. BALANCE PRESUPUESTAL	13
5.6. CONTROL DE CALIDAD.....	13
5.7. REGISTRO FOTOGRAFICO	14

5.8.	LIBRO DIARIO DE OBRA/BITACORA DE OBRA.....	14
5.9.	CLIMATOLOGÍA	14
5.10.	MANUAL DE MANTENIMIENTO	14
6.	ASPECTOS AMBIENTALES	15
6.1.	MATERIALES DE OBRA.....	15
6.2.	CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	16

1. INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación contiene el informe No 001 de supervisión, correspondiente al período comprendido entre los días 09 de mayo de 2022 al 24 de junio de 2022, en cumplimiento de los artículos 82, 83, 84 y 85 de la ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Es un informe cuyo propósito es dejar consignado en escrito y el Municipio de Ciudad Bolívar a través de Secretaría de obras públicas esté totalmente enterado de la ejecución mes a mes del desarrollo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° COP-002-2022, cuyo objeto es: "EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600013127 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA", con el fin de lograr el cumplimiento de los objetos contractuales.

El informe contiene básicamente los siguientes aspectos conformados por capítulos:

- ✚ Introducción
- ✚ Administrativo
- ✚ Financiero
- ✚ Legal
- ✚ Técnico
- ✚ Ambiental
- ✚ Conclusiones, así:

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El Municipio de Ciudad Bolívar cuenta con una red vial terciaria de 102,7 kilómetros, distribuidos en 24 vías que conducen a sus diferentes Corregimientos y Veredas. Solo una de sus vías terciarias, se encuentra en condiciones aceptables y, el resto de la malla vial terciaria se encuentra en regular o mal estado.

Se realiza mantenimiento mecánico a las vías terciarias VÍA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLÍVAR – BETANIA y VÍA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La vía objeto del proyecto es la referenciada a continuación, tomando como datos de reseña el inventario de la red vial de Antioquia (Circular 9 – Gobernación de Antioquia, Dic/2015) que presenta la siguiente información.

2.1. MANTENIMIENTO EN VIAS								
No.	VIA (georeferenciada)	Código	Longitud total Vía (Km)	Longitud a intervenir (Km)	Descripción P.R. (Abscisa de Inicio)	Descripción P.R. (Abscisa final)	Ancho promedio de la Vía (m)	Tipo de Rodadura (pavimento/afirmado)
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	05091VT20	6.43	2.90	X: 790.953,195 Y: 1.135.550,616	X: 791.458,840 Y: 1.133.685,948	5	TIERRA
2	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	05101VT10	4.3	3.99	X: 785.602,753 Y: 1.131.189,864	X: 786.716,022 Y: 1.130.838,697	4	TIERRA
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR (Km).				6.89				

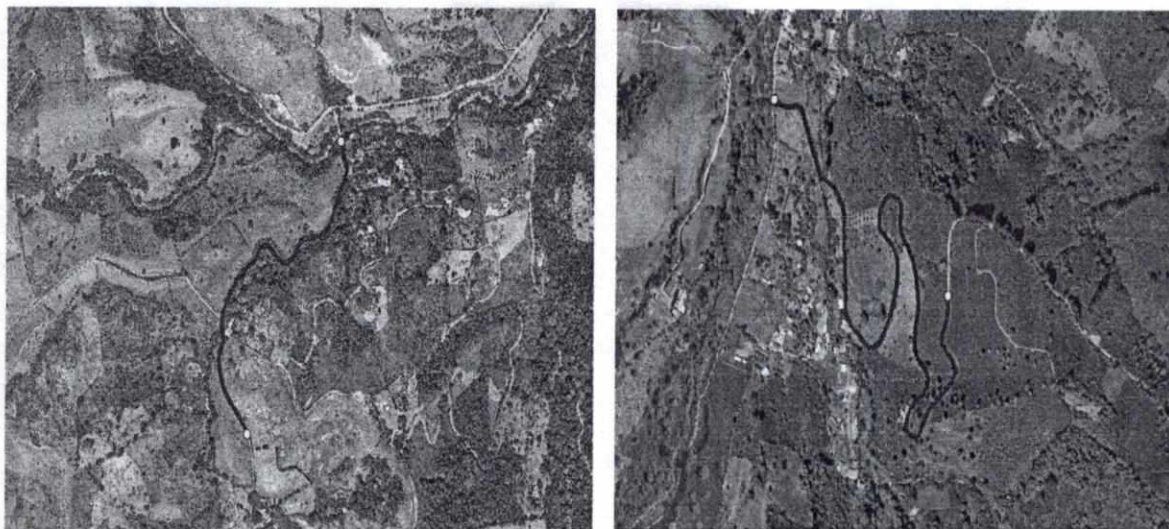

Planimetría tomada información convenio interadministrativo.

2.3. RESUMEN CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.

Contrato que nace a través licitación pública No SA-05101003-2022, mediante resolución y suscripción de acta de inicio el día 09 mayo de 2022. A continuación, se muestra cuadro administrativo:

Tabla 1 Resumen del contrato N° 031 de 2021

CONTRATO No 031 DE 2021	
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE CUIDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA
CONTRATISTA	EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT. 900.307.818-1
DATOS CONTRATISTA	Rep. Legal: ÁLVARO MIGUEL SOLANO ARROYO Tel.: 314 219 55 557 Email: gerencia@equiconstruccion.com
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$209.811.955).

ADICIÓN	No Aplica
PLAZO INICIAL	Un (1) mes y quince (15) días calendario
PRORROGA 1	Adición No 001 – treinta (30) días
FECHA DE INICIO	09-05-2022
SUSPENSIÓN 1	No Aplica
SUSPENSIÓN 2	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	24-07-2022
DÍAS TRANSCURRIDOS	45 días
DÍAS FALTANTES	30 días
ANTICIPO (30%)	No aplica.

2.4. CONTROL LABORAL

2.4.1. Registro de personal

La supervisión realiza diario el registro de asistencia del personal de obra incluyendo el personal profesional, técnico, topógrafos, de maquinarias, obreros y personal derivados de subcontratos de algunas actividades.

CANTIDAD	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	DEDICACIÓN
1	Director de Obra	Ingeniero Civil, Cesar Mercado Salas	50%
1	Residente de Obra	Arquitecto, Alvar Miguel Solano Arroyo	100%
1	SST	Ingeniera Industrial, Cindy Morales	25%

ANEXO 1 CONTROL DIARIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TRABAJADORES.

2.4.2. Pagos salariales

La Supervisión mes a mes recopila y verifica los pagos salariales de todo el personal operativo y administrativo.

ANEXO 2 COPIA DE PAGO DE NOMINA O PAZ Y SALVO SUBCONTRATISTA.

2.4.3. Seguridad social

La supervisión mes a mes recopila y verifica las afiliaciones y pagos de la seguridad social de todo el personal del proyecto de acuerdo a los pagos de nóminas y el control de personal.

ANEXO 3 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

2.4.4. Paz y salvo de trabajadores

La supervisión mes a mes recopila y verifica de acuerdo a los requisitos de ley las liquidaciones que se presentan en la obra.

Se debe adjuntar copia de los soportes de las liquidaciones realizadas en el periodo que se presente con el lleno de los requisitos de ley, con firma y huella del trabajador.

2.4.5. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Para los diferentes frentes de trabajo se realizó la entrega de los elementos de protección personal, los cuales quedan registrados en las planillas del informe PAPSO. También se puede evidenciar el informe de seguimiento al PMT la instalación de señalizaciones provisionales para el cierre de vía.

ANEXO 4. Seguimiento a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1. GARANTÍA UNICA CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022

3.1.1. Pólizas iniciales (por legalización del contrato y acta de inicio)

En cumplimiento de los términos de referencia y con el fin de poder legalizar el contrato de obra No COP-002-2022, el contratista presentó las respectivas pólizas iniciales.

Tabla 5 Pólizas iniciales para legalización.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL	
PÓLIZA No:	M-100167460	ANEXOS: 2	CUMPLIMIENTO
	M-100033090	ANEXO: 1	RCE
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	09-05-2022	24-12-2022	\$ 41.983.599,60
PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	09-05-2022	24-06-2025	\$ 20.991.799,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24-06-2022	24-06-2027	\$ 20.991.799,80
RESPONSABILIDAD CIVIL	07-04-2022	24-06-2022	\$200.000.000

ANEXO 5. PÓLIZAS DEL CONTRATO.

3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.

El contrato No COP-002-2022 presento durante el periodo del contrato presento otro si No 1 aclaratorio en cuanto a los amparos de las pólizas.

ANEXO 6. Otro si # 1.

4. ASPECTOS FINANCIEROS.

4.1 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No COP-002-2022.

4.1.1. Buen manejo del anticipo.

No aplica para este contrato.

4.1.2. Verificación del A.U contractual

La supervisión realiza la verificación de los salarios del personal que el contratista oferto en su propuesta económica de Administración y Utilidad (AU) para lo cual se adjunta el cuadro comparativo de salarios vs afiliación y numero de planilla.

Nombre Profesional	Cargo	Dedicación	Salario AU	IBC	# Planilla
Cesar Mercado Salas	Director de Obra	50%	\$ 1.500.000	\$1.500.000	56283930
Álvaro Miguel Solano Arroyo	Residente de Obra	100%	\$ 1.600.000	\$ 2.000.000	56283930
Cindy Joana Morales Monsalve	SST	25%		\$1.000.000	56283950

4.1.3. Actas de cobro

Tabla 2 Control financiero

Acta N°	Valor a cancelar	Valor total ejecutado	Valor total ejecutado acumulado	Saldos Registros presupuestales
Costo total obra	\$ 209.811.955			
Acta No 01	\$ 199.321.357	\$ 199.321.357	\$ 199.321.357	\$ 10.490.598

5. ASPECTOS TÉCNICOS.

5.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del objeto del presente convenio es el mantenimiento rutinario de las vías priorizadas por el municipio, el cual se agota con la entrega efectiva ejecución de las obras cofinanciadas.

Las actividades comprendidas dentro del alcance del convenio son:

1. Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.
2. Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). "Transporte de material
3. Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado."

5.2. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

La supervisión dentro del proceso de seguimiento, control, análisis y validación de información del proyecto confronta semanalmente el % de avance programado vs el % de avance ejecutado como se presenta a continuación.

Durante el periodo de avance de obra se vienen presentando altos precipitaciones en la zona lo que intervine con el correcto avance del contrato y en la aplicación de afirmado en la vía.

En el desarrollo del contrato se presentaron los siguientes temas relacionados con atrasos del contratista así:

1. Durante el mes de mayo el contratista manifiesta que está presentando problemas en conseguir la maquinaria de la zona Motoniveladora con el fin de iniciar la conformación de vía.
2. Se presentan fuertes lluvias que impiden un buen avance de obra.

5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN

Las actividades realizadas en el periodo del 09 mayo al 24 de junio de 2022 fueron:

1. Conformación de vía departamental Ciudad Bolívar a Betania, vía que presenta un cierre de los bordes por falta de mantenimiento periódico lo que presento un volumen alto de material pantanoso que vía ser retirado de la vía con equipo de cargue.
2. Conformación de Vía Altos de los Jaramillos.
3. Aplicación de Afirmado en ambas vías.
4. Transporte en volqueta de material de afirmado.

5.4. RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

Se realizo una calibración de cantidades del contrato según el presupuesto aprobado y se concluyó que se mantiene el equilibrio económico del contrato, es importante destacar que esta calibración de cantidades se va ir revisando mes a mes para determinar el alcance físico de la obra.

5.5. BALANCE PRESUPUESTAL

La supervisión realiza diario, semanal, mensualmente o cuando se requiera el balance presupuestal de acuerdo a las actividades realizadas, cantidades mayores, cantidades menores y obras extras.

5.6. CONTROL DE CALIDAD

Calidad de los Materiales: Se anexan los certificados de calidad de los siguientes insumos y materiales.

1. Permisos ambientales de canteras.

ANEXO 8. CONTROL DE CALIDAD

5.7. REGISTRO FOTOGRAFICO

La supervisión lleva registro fotográfico del antes, durante y después de las actividades del proyecto.

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO.

5.8. LIBRO DIARIO DE OBRA/BITACORA DE OBRA

La supervisión consigna diariamente en el libro de bitácora de acuerdo al formato exigido por el Municipio de Ciudad Bolívar. Se presenta bitácora de obra debidamente firmada por la supervisión y el Contratista del periodo 09 de mayo de 2022 al 24 junio de 2022.

ANEXO 10. BITACORA DE OBRA

5.9. CLIMATOLOGÍA

La supervisión llena diariamente control de lluvias en la bitácora del proyecto.

5.10. MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se adjunta una vez el proyecto llegue a buen final y es responsabilidad del contratista la elaboración de dicho manual.

Debido al tipo de proyecto y las fuertes lluvias que caen en la región del suroeste antioqueño las recomendaciones del contratista son básicamente dos:

1. Mantener un mantenimiento cada 3 meses de las cunetas existentes limpias a través de limpieza manual realizados por la comunidad o la administración municipal. Así mismo las entradas del agua de las cunetas a las obras existentes esto con el fin de

las aguas lluvias bajen por las cunetas a las obras y no generen surcos en el eje de la vía.

2. Descopar los árboles en las zonas donde no permite los rayos del sol sobre todo en la vía departamental de ciudad Bolívar a Betania desde el K0+000 (puente roto) al K1+000 donde ve mucha presencia de sobra y no permite la estabilidad del afirmado aplicado.

6. ASPECTOS AMBIENTALES

Se hace seguimiento ambiental.

Es de anotar que durante el periodo de ejecución de las actividades y según el artículo 42 de la ley 1523 del 24 de abril de 2012 no se presentan posibles riesgos por eventos naturales sobre la infraestructura expuesta.

6.1. MATERIALES DE OBRA

La supervisión revisa el origen y la buena disposición de los materiales de obra de acuerdo al plan socio ambiental presentado.

6.2. CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA

La supervisión lleva el control de equipos y maquinaria que se presenta en la obra.


ANEXO 11. CONTROL DE EQUIPOS DE OBRA

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el periodo del 09 de mayo al 24 de junio de 2022 se puede concluir y recomendar lo siguiente:

- ❖ **Seguimiento a programación:** El contratista cumplió con el objeto del contrato en el plazo estipulado por el municipio.
- ❖ **Legal:** Con el acta de recibo a satisfacción se actualizaron las pólizas de estabilidad de obra logrando así los 5 años de estabilidad de la misa.
- ❖ **Financiero:** Se presento el acta No 1 por valor de \$199.321.357. El acumulado total facturado a la fecha 24 junio de 2022 es de \$199.321.357 que equivale al 95% del valor del contrato.
- ❖ **Técnico:** las obras realizadas en este periodo presentan buena calidad y fueron supervisadas cumpliendo con los diseños entregados por el Municipio de Ciudad Bolívar.
- ❖ **Ambiental:** en este periodo se cumplió por parte del contratista al PAGA presentado, como se puede evidenciar en el informe ambiental de la interventoría donde se presenta el seguimiento al mismo.
- ❖ **Salud ocupacional:** En este periodo se cumplió por parte del contratista el PAPSO presentado, no se presentaron contagios por COVID-19 ni accidentes de trabajo y se cumplió con las normas de bioseguridad del protocolo aprobado por la ARL del contratista.
- ❖ **PMT:** Se dio aplicación el Plan de Manejo de Transito cumpliendo con el tema de cierres y señalización preventiva provisional.
- ❖ **LIQUIDACION:** con la suscripción del acta de recibo y las actualizaciones de las pólizas se inicia la liquidación del contrato con la entrega de toda la documentación solicitada por el municipio y la gobernación de Antioquia.
- ❖ **Social:** No se presentaron quejas ni observaciones en el tema social por parte de la comunidad.


JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
SUPERVISOR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA


ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO
Rep. Legal EQUICONSTRUCCION S.A.S.
Contratista

BITACORA DE OBRA

Contrato N° COP-002-2022

OBJETO: Mantenimiento Mecánico de la
Red vial que beneficia al Municipio de
Ciudad Bolívar, Antioquia. Convenio
Interadministrativo N° 4600013127

Plazo: 1(mes) 15(días)

Fecha: Inicio: 09 Mayo 2022

Contratista: EquiConstrucción SAS.

Supervisor: Juan Carlos Restrepo
Secretario Obras Públicas.

09 Mayo 22 - Lunes.

Personal obra: Alvaro Hual Gilau
Residente obra = Cesar Hualdo Siles.
AST - Andy Hualdes


Personal Supervision:
Juan Carlos Rueda.

Hogueras:
Yo Xpiron. para el dia.

Actividades:

- Se firma el Acta de Inicio del
Caucho COP-02-2022 con fecha
del 09 Mayo 2022 con un plazo
de 45 dias calendario.

- Se presento personal de Comitecha
a la Supervision.



Supervisor.

Hartes 10 Mayo 2022.

Personal de obra:

Director de obra: Cesar Torrado Siles
 Residente obra: Marco Sandoval
 SST: Cindy Morales

Supervision: Juan Carlos Restrepo

Maquinaria:

No aplica para este dia.

Actividades:

Se realiza recorrido con el Supervisor del contrato donde se determinan las obras a intervenir las cuales son:
 1) Vía cordada Bolivar a Yaguajay de Betania aprox: 4 km.
 Intervenido en la punta y termino

a los 4 km 8 Kms Fin de obra.


2) Vía Altos de los parrillos por la entrada a Vereda Frijoleros son aprox. 3 km desde la Yca = placa policivica.

Se brin coordenados de puntos mas para iniciar en el PPT.

Fin de obra.

Contrato.

Supervision.

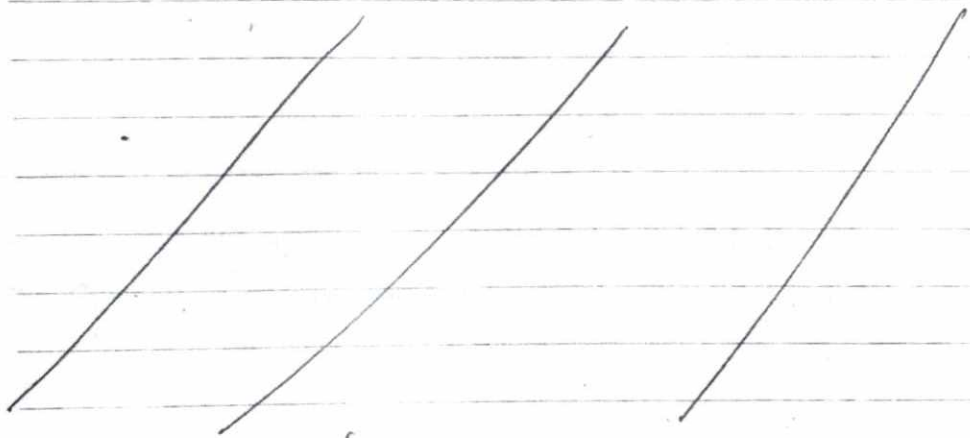

Viernes 11 Mayo 2022.

- Personal de obra.

Director obra: Cesar Hernandez

Residente obra: Henry Salas

SST: Andy Torales

- Supervision: Juan Carlos Bedoya

- Maquinaria.

No aplica para este Dia.

- Actividades:

- Se inicia con la instalación de

la señalización vertical de FMT

en la vía Ciudad Bolívar - Betanico

donde se demarcó la vía por

este vía.

- Re-limpieza de flecos de tablero.

Fin de

Cont. Hoja 5

Fin de

Jueves 12 Mayo 2022.

- Personal obra:

Director obra: Cesar Hernandez

Residente obra: Henry Salas

SST: Andy Torales

- Supervision: Juan Carlos Bedoya

- Maquinaria

No aplica para este día.

- Actividades:

- Se inicia con la instalación de

señalización vertical y flecos de

tablero

Fin de

Cont. Hoja 5.

Supervisión.

Viernes 13 Mayo de 2022

- Personal de Obra:
Director Obra: Cesar Hernandez
Residente obra: Alvaro Salas A.
SST: Cindy Morales

- Supervision: Juan Carlos Restrepo

Atenencia:

- Bulldozer llega a la obra
para iniciar conformacion de
Cunetas.

Actividades:

- Conformacion de una
Cunetas a las derechas lado
izquierdo

Alvaro S.
Contratista

Supervisor.

Lunes 16 Mayo 2022.

- Personal de Obra:
Director de Obra: Cesar Hernandez
Residente Obra: Alvaro Salas A.
SST: Cindy Morales

- Supervision: Juan Carlos Restrepo.

Maquinaria:

* Bulldozer

- Estado clima: lluvias trr l - tarde
No se conformo de
2:00pm a 5pm.


Actividades:

- Conformacion de Vía Cunetas.


Alvaro S.
Contratista.

Supervision 5

Viernes 17 Mayo 2022.

- Personal de obra:
Director obra: Cesar Mercado
Residente obra: Alvaro Salas
SST: Cindy Morales
 - Supervisión: Juan Carlos Restrepo
 - Actividades:
Se Continúa con la Conformación de Vía
 - Maquinaria:
Bulldozer
 - Estado Clima: Se presentan fuertes lluvias No se trabaja 11:00pm a 3:00pm
-  Contratorista
-  Supervisión

Viernes 18 Mayo 2022.

- Personal de obra:
Director: Cesar Mercado
Residente: Alvaro Salas
SST: Cindy Morales
Supervisor: Juan Carlos Restrepo
 - Estado Clima:
Mañana: Lluvias Asoleadas
Tarde: Lluvias.
 - Actividad:
x Conformación de vía.
-  Contratorista
-  Supervision.

lunes 19 Mayo 2022

Personal:

* Director: Cesar Harado

* Resident: Alvaro Salas

* SST: Cindy Waelis

* Supervision: Juan Pablo Restrepo

* Operarios: 1+1

Estad. clima:

Huancas: Alvaros Turiles
Tarek: Alvaros Poma Talle

Huancas:
- Bulldozer

Actividades:

- Conformacion

Via. No se Avanza.

Supervision

Viernes 20 Mayo 2022

Personal de obra:

Director: Cesar Harado

Residente: Alvaro Salas

SST: Cindy Waelis

Supervision: Juan Pablo Restrepo

Operarios: 1 + 1 vibro.

Estad. clima:

Huancas: 5cc
Tarek: 5cc

Huancas:

- Bulldozer

- Vibrocompaction

Actividades:

- Comparacion de Basas de Existencia
- Conformacion. Vig.

Alvaros S.

Contrafrente Supervision.

7

Lunes 23 Mayo 2022

- Personal obra: Cesar Hernandez
- Directa obra: Flavio Salazar
- SST: Cindy Morales
- Supervision: Juan Carlos Restrepo

Hegunaria
- Bulldozer

- Estal. clima
Hegunaria: \$200
Tardi: \$200
- Actividades

- Cont-estacion Pasante existente.
- Cont-estacion
- Cont-estacion
- Cont-estacion
- Supervision.

Martes 24 Mayo 2022

- Personal obra.
- Directa obra: Cesar Hernandez
- Residente obra: Flavio Salazar
- SST: Cindy Morales
- Supervision: Juan Carlos Restrepo

Hegunaria
- Bulldozer

- Estal. clima
Hegunaria: \$200
Tardi: \$200
- Actividades

- No se Avanza en conformidad.
- Supervision.

Wiercoles 25 de Mayo 2022

- Personal obra:
Director de obra: Cesar Mercado
Presidente obra: Alvaro Solano
SST: Cindy Morales.
- Supervision: Juan Carlos Restrepo
- Maquinaria:
* Bulldozer
- Estado clima: No presentan lluvias
dia soleado.
- Actividades:
- Conformación de Calzada
existente
- Acopio de Conformación en sitios
determinados.
- Contabilista. Supervision

Jueves 26 Mayo de 2022.

- Personal obra:
Director obra: Cesar Mercado
Presidente obra: Alvaro Solano
SST: Cindy Morales
- Supervision: Juan Carlos Restrepo.
- Maquinaria:
* Bulldozer
* Camionador Mini
- Estado clima:
Mañana: dia seco.
Tarde:
- Actividades
- Conformación de via y retiro
de material de Bordes Carreteras
- Se recoge material de Concreto con
Mixer para el
- Contabilista Supervision 9

Viernes 27 Mayo 2022

- Personal de obra:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Salas

SST: Cindy Morales

- Supervision: Juan Carlos Restrepo

- Estado clima:

Mañana: Fuertes lluvias

Tarde: Fuertes lluvias

- Maquinaria:

- Bulldozer

- Vibro Compactador

- Volqueta

- Retro

- Actividades:

- Aplicación Afirmado

- Compactación Afirmado

- Nota los días 28, 29 y 30 Mayo 2022

por Acuerdo entre Subcontratista Maquinaria

Se Acuerdo No trabajar por el tema electoral

A hacer S.
Contratista

Supervision

Martes 31 Mayo 2022

- Personal

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Salas

SST: Cindy Morales

Supervision: Juan Carlos Restrepo

- Estado clima:

Mañana: Lluvias

Tarde: Lluvias: Toda tarde.

- Maquinaria:

- Bulldozer

- Vibro compactador

- Volqueta

- Actividades:

- No se pudo adelantar trabajo x fuertes lluvias

- Se logró aplicar Afirmado pero x lluvias no se
Avanzo mas.

A hacer S.
Contratista

Supervision

Hieros 01: Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Hernandez

Presidente: Alvaro Sola

SST: Cindy Morales

Supervisor: Juan Carlos Restrepo

Herramientas:

- Bulldozer

- Volquetes

Estado clima:

Huana: lluvia temprano

Tarde: lluvia

Actividades:

- Se preparan lluvias para trabajo de

Atmado

Herramientas:
Cuchas, etc.

Supervision.

Lunes 02 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Hernandez

Presidente: Alvaro Sola

SST: Cindy Morales

Supervisor: Juan Carlos Restrepo

Herramientas:

- Bulldozer

- Volquetes

Estado clima:

Huana: lluvia aislados

Tarde: Sol *

Actividades:

- Conferencia de Via y Aplicacion otomado

en via Betonia

- Transporte Material Volquete

Herramientas:

Cuchas, etc.

Supervision.

Viernes 03 Junio 2022

- Personal:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Salas

SST: Cindy Morales

Supervision: Juan Carlos Restrepo

- Maquinaria:

- Bulldozer - Vibro compactador

- Volquetes

- Estado clima:

Mañana: Seco

Tarde: Seco.

- Actividades:

- Aplicación Afirmado Vía Betania

- Conformación Cuetas.

A. H. S.

Contratista

Supervision

Sabado 04 Junio 2022

- Personal obra

* Director obra: Cesar Mercado

* Residente obra: Alvaro Salas

* SST: Cindy Morales

- Supervision: Juan Carlos Restrepo

- Maquinaria:

- Bulldozer

- Vibro compactador

- Volquetes

- Reto

- Estado clima:

Mañana: lluvias 7:00am - 11am

Tarde: lluvias aisladas.

- Actividades - 600 - 900 Km.

* Aplicación afirmado en vía Betania

* Compactación de Afirmado Vía Betania

* Transporte Material Penalisa.

A. H. S.

Contratista

Supervision: 12

Domingo 05 Junio 2022

- Personal de obra:

- * Director de obra: Cesar Mercado
- * Residente de obra: Alvaro Solano
- * SST: Cindy Morales
- Supervisión: Juan Carlos Restrepo

- Maquinaria:

- Bulldozer - Vibro compactador
- Volquetes - Botas compactadoras

- Estado clima:

Tarde: Sol ☀

Mañana: lluvias aisladas

- Actividades:

- Aplicación de Afirmado Vía Betún 300-60
- Compactación de Afirmado Vía Betún 300-60
- Transp. Material en Volquete Penalisa.
- Conformación de vía.

A. P. S.
Contratista

Supervisión.

Lunes 06 Junio 2022.

- Personal de obra

- * Director obra: Cesar Mercado
- * Residente: Alvaro Solano
- * SST: Cindy Morales
- * Supervisor: Juan Carlos Restrepo

- Maquinaria

- Bulldozer - Vibro compactador.
- Volquetes - Reto

- Estado clima:

Mañana: lluvias ligeras. Sol

Tarde:

- Actividades:

- Aplicación de Afirmado Vía Betún
Km 0+000 al 0+300
- Compactación de Afirmado
- Transporte en volquete.

A. P. S.
Contratista.

Supervisión. 13

Mayes 07 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Hincado
Residente: Alvaro Solano
SST: Cindy Morales
Supervision: Juan Carlos Restrepo.

- Mayanitas
* Motivadores
* Volquetta
- Vibro compactador

- Estado clima

Mayana: Seco
Tarde: Seco

Actividades:

- Reconformacion con la llegada de los motivadores se reanuda con las y se le da acabado final a la zona Nueva. del km 4+500 hasta el km 4+600.
- Compactacion de Base.
- Aplicacion de la Base.
- Alineamiento.
- Conduccion.

Mayes 08 de Junio

Personal:

Director: Cesar Hincado
Residente: Alvaro Solano
SST: Cindy Morales
Supervision: Juan Carlos Restrepo.

- Mayanitas
* Motivadores
* Volquetta
- Vibro compactador

- Estado clima

Mayana: Seco
Tarde: Seco

Actividades:

- Se continua con la Reconformacion del km 4+400 y se le da acabado final a la zona Nueva. hasta el km 4+500.
- Compactacion de Base.
- Aplicacion de la Base.
- Alineamiento.
- Conduccion.

Generando esto que el Alirado aplico en capa de 30cm se desestabilice por que el Agua no tiene Salida adicional los primeros 500 metros de Vía prototy una zona de Muchos Arboles que no dejan que los Payos del Sol lleguen a dar la Vía, Alcatemos a la Comunidad y transcrip que se realice una poda controlada de la copa de los Arboles ya que este problema es de mucha tiempo! Así tambien la construcción de obra transvercal en esos puntos.

- Aplicacion de Alirado.

H. S. S.

Supervision.

Contratista

Supervision 15

Jueves 09 Junio 2022.

Personal de Obra:
 Director: Cesar Ybarra
 Presidente: Alvaro Salas
 SST: Cindy Ybarra
 Supervision: Juan Carlos

- Mayanina:
 - Niveladora 1206 - Vibro compactadora
 - Estado Clima: Hazy. Peggua lluvia Hazy. Talla: seco

Actividades:
 - Se continua transformación del Lot 000 al K 1+400 rubato y Xingoshore. para los Puntos Lot 500 y 400 se realiza Comité en obra con supervision donde se acuerda dejar cuneta mas profunda lado derecho para hacer que el Agua no dañe la Pasante.

Viermes 090 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Hernandez

Residente: Alvaro Salas

SST: Cindy Morales

Supervision: Juan Carlos Restrepo

- Maquinaria:

- Motozincadora - Libro Guapastolero

- Estado clima: Huaran: soleado
Tarde: soleado

- Actividades:

- Se trasladan equipos para
iniciar el sector el alto de los
jaramillos por el corrimiento
de fallas

- Se da por terminado la
via punta foto a Tablazo
4.5 km intensivos

- Se inicia conformación en
el alto de los jaramillos.

- Se hace entrega de via
Betonia punta foto a
4.5 km a tablazo.

- Se entrega con flama que
los payos 10+400 y 10+
500 de Santa Agnes de

falla en la foto del mismo
lo que hace que la base
aplicada se desestabilice.

- Se recomienda Foto de
arboles en esas zonas
para dejar fe entre la
Luz solar en la una.

Fin

Conchagua Supervisan.

Sábado 11 Junio 2022

Personal:

* Director: Cesar Herrero

* Presidente: Alvaro Salas

* SST: Cindy Torres

* Supervision: Juan Carlos Pacheco

Hagueria:

- Estacioneladora - Libro compacto

- Roto paganda

Estado clima: Hazy en la

Madugada.

Tarde: Seco

Actividades:

- Conferencia de Via en Alto

paramillos

- Compacion de Via

Hueus

Contratista

Supervision

Domingo 12 Junio 2022

Personal:

* Director: Cesar Herrero

* Presidente: Alvaro Salas

* SST: Cindy Torres

* Supervision: Juan Carlos Pacheco

Hagueria:

- Estacioneladora - Libro compacto

- Volquetes

Estado clima: Hazy

Tarde:

Actividades

- Conferencia de Via en Alto de

los paramillos

- Compacion de Via

* pilas de afirmado

Hueus

Contratista

Supervision 17

Lunes 13 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Solano

SST: Cindy Morales

Supervision: Leon Carlos Restrepo

Maquinaria:

- Motoniveladora - Vibrocompactador

Estado del clima: Mañana: Nubias Nos Trabajo
Tarde: Seco

Actividades:

- Conformacion via altos paramillos
- Aplicacion Atimacolo.
- compactacion.

Aprender.
Contratista.

Martes 14 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Solano

SST: Cindy Solano

Supervision: Leon Carlos Restrepo

Maquinaria

- Motoniveladora - Vibrocompactador.

Estado clima: Mañana: Nubias Nos Trabajo
Tarde: Seco.

Actividades:

- Conformacion via altos paramillos
- Aplicacion Atimacolo.
- Compactacion de Atimacolo.

Aprender.
Contratista.

Supervision.

Miércoles 15 Junio /22

Personal:

Director: Cesar Hercedo

Residente: Arturo Salas

SST: Cindy Morales

Supervisor: Juan Carlos Riquelme

Estado: clima: lluvioso: seco

Tarde: seco

Magnanaria
- Motorizadora - Vibracomp

Actividades:

- Información de Via Alta
- Compensación Via Pasante
- Limpieza Cuestas

Alfaro S.
Contratista

Supervisión

Jueves 16 Junio /22.

Personal:

Director: Cesar Hercedo

Residente: Arturo Salas

SST: Cindy Morales

Supervisor: Juan Carlos Riquelme

Estado: clima: lluvioso: lluvioso

Tarde: seco

Magnanaria
- Motorizadora - Vibracomp

Actividades:

- Limpieza de Bordes Via en Altos
- Cuesta con Teclanillos en Altos
- Jaravillas
- Compensación de Via
- Información de Via

Alfaro S.
Contratista

Supervisión

19

Viernes 17 Junio 22

Personal:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Solano

SST: Cindy Morales

Supervision: Juan Carlos Restrepo

Estado clima: Mañana: Lluvias
tarde: Lluvias.

Maquinaria:

- Motoniveladora - Vibro compacta.
- Volquetas. - Retro.

Actividades:

- Se Aplico Xfirmado pero
se Suspendio por lluvias fuertes
la via esta muy Humeda se
suspende 10:00 a 6:00 pm

Contratista

Supervision.

Sabado 18 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Mercado

Residente: Alvaro Solano

SST: Cindy Morales.

Supervision: Juan Carlos Restrepo.

Estado clima: Mañana: Lluvias
tarde: Lluvias.

Maquinaria:

- Motoniveladora
- Volquetes.

- Vibro compactada.

Actividades:

- No se Trabaja por fuertes
lluvias todo el dia.

Contratista

Supervision.

20

Marles 21 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Hecceolo
Residente: Alvaro Solano
SST: Cindy Hanks

Supervision: Juan Carlos Rescheto

Estado: clima: Hecceolo, Luis Hecceolo
Tarea: Saco

Actividades:
- Conferencia Via Altos paramillos
- Aplicacion Ximado
Hecceolo:
- Hecceolo
- Volquetera

Supervision

Miercoles 22 Junio 2022

Personal:

Director: Cesar Mercado
Residente: Hecceolo
SST: Cindy Hanks

Supervision: Juan Carlos Rescheto

Estado: clima: Hecceolo

Tarea: Saco

Hecceolo:
- Hecceolo
- Volquetera

Actividades:
- Conferencia de Via Altos
- Paramillos
- Aplicacion, Hecceolo
- compactacion de Hecceolo

Supervision

Supervision 21



CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA MENSUAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No 001 AL CONTRATO No COP-002-2022.

OBJETO: Ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo 4600013127 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia

FRENTE DE OBRA: VIA A BETANIA Y VIA ALTOS DE LOS JARAMILLOS		may-22																														jun-22																							
ID	EQUIPO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	BULLDOZER					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
2	MOTONIVELADORA																																																						
3	VIBROCOMPACTADOR 120G								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
4	VOLQUETAS																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X					X	X	X								
5	BOCAT - MINICARGADOR																		X																																				
6	RETRO PAJARITA																																																						
7																																																							
17																																																							
18																																																							
19																																																							
20																																																							

FIRMA SUPERVISION

FIRMA CONTRATISTA



CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Cartama Jericó

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

Fecha: 09-nov-2020 12:06 PM Pág: 1

Anexos: 1

Archivar en: 130CI3-2005-3*CONYTRAC

Radicado por: Juan David Montoya Correa



160CA-COI2011-24970

Favor citar este número al responder

Jericó,

Abogada
TATIANA AMAYA GALVIS
Calle 4 Sur No. 43 A - 195 oficina 207
Teléfono 311 87 74
E-mail: gerencia@consultores.co
Medellín, Ant.

Asunto: Respuesta a solicitud de constancia

Cordial saludo, doctora Tatiana.

De manera atenta, hacemos entrega de la constancia solicitada por usted, radicada con el número:

160CA-CON2011-2720 del 09 de noviembre de 2020.

Atentamente,

EDISON ANTONIO RESTREPO RUIZ
Jefe Oficina Territorial Cartama

Anexo: constancia

Copia: Expediente CI3-2005-3

Asignación: CA-20-4907

Respuesta a: 160CA-COE2011-32540

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.



Carrera 3 No. 5-28. Jericó, Ant.
Tel. 57 (4) 852 47 15 – 852 47 16
Cel. 311 705 47 92
www.corantioquia.gov.co
cartama@corantioquia.gov.co



CORANTIOQUIA

Elaboró: Luz Omaira Arias Vélez *LA*
Revisó: Edison Antonio Restrepo Ruiz *ER*

Fecha de elaboración: 05-11-2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.



Carrera 3 No. 5-28. Jericó, Ant.
Tel. 57 (4) 852 47 15 – 852 47 16
Cel. 311 705 47 92
www.corantioquia.gov.co,
cartama@corantioquia.gov.co

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
CONSTANCIA		
CÓDIGO: FT-GIC-06	VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 DE 2

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Cartama Jericó

CONSTANCIA

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

Fecha: 09-nov-2020 11:56 AM Pág: 2

Anexos: ninguno

Archivar en: 130CI3-2005-3*CONYTRAC

Radicado por: Juan David Montoya Correa



160CA-CON2011-2720

Favor citar este número al responder

Jericó,

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL CARTAMA,

HACE CONSTAR:

- 1) Que dentro del expediente **CI3-2005-3**, se otorgó LICENCIA AMBIENTAL, a nombre de la sociedad CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. – CONYTRAC, con NIT 890.932.730-7, para el proyecto de explotación de materiales de construcción del río San Juan, en el corregimiento de Peñalisa (límites entre los municipios de Salgar y Tarso), amparado bajo el contrato de concesión minera de arenas y gravas naturales No. 6768 del 25 de agosto de 2005.
- 2) Que de conformidad con el Artículo 3º de la Resolución 130CA-4405 del 8 de junio de 2006, la Licencia Ambiental se otorgó por el término de treinta (30) años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato de concesión No. 6768, en el Registro Minero Nacional, esto es, a partir del día 13 de septiembre de 2005 - radicado HFQL-11.
- 3) Que la Licencia Ambiental ha sido modificada por medio de las Resoluciones 130CA-5717 del 18-08-2009; 130CA-6281 del 26 de julio de 2010 y 160CA-RES2010-6086 del 29 de octubre de 2020, a través de las cuales se han otorgado permisos de ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, concesión de aguas y vertimientos, para el proyecto referido.
- 4) Que a la fecha, CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Cartama, no se encuentra adelantando ningún trámite sancionatorio ambiental a nombre de la sociedad CONYTRAC S.A., con respecto a las actividades que se desarrollan en el título minero No. 6768, inscrito en

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



Carrera 3 No. 5-28 Jericó, Ant.
Celular 311 705 47 92
Correo electrónico:
cartama@corantioquia.gov.co

 CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI-		
	CONSTANCIA		
	CÓDIGO: FT-GIC-06	VERSIÓN: 04	PÁGINA: 2 DE 2


160CA-CON2011-2720

el Registro Minero Nacional, el día 13 de septiembre de 2005, bajo el radicado HFQL-11.

- 5) Que no existe trámite de caducidad o pérdida de vigencia del instrumento ambiental otorgado dentro del expediente CI3-2005-3, como consecuencia de incumplimiento a las obligaciones ambientales allí impuestas.

La presente constancia se expide a petición de la sociedad CONYTRAC S.A.

Atentamente,



EDISON ANTONIO RESTREPO RUIZ
Jefe Oficina Territorial Cartama

Copia: Expediente CI3-2005-3

Asignación: CA-20-4907

Respuesta a: 160CA-COE2011-32540

Elaboró: Luz Omaira Arias Vélez 

Revisó: Edison Antonio Restrepo Ruiz 

Fecha de Elaboración: 05-11-2020

Medellín, 29 de enero 2021



A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.556.498, obrando en calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA, titular del contrato de concesión minera HFQL-1, me permito certificar que la sociedad TRITURADOS PEÑALISA SA, en calidad de SUBEXPLOTADOR, se encuentra facultado para explotar y comercializar los minerales provenientes del título minero 6768, localizado en los municipios de Salgar, Tarso y Venecia.

Dicha autorización estará vigente de manera indefinida.

Atentamente,

JUAN DIEGO HOYOS
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA

Construcciones y Tractores S.A.

Carrera 48 No. 78C Sur - 71 - Sabaneta (Ant.) Tel.: (4) 3012266 - Fax: (4) 3011068
Nit: 890.932.730 - 7

www.conytrac.com - E-mail: info@conytrac.com

