



Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Electoral, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

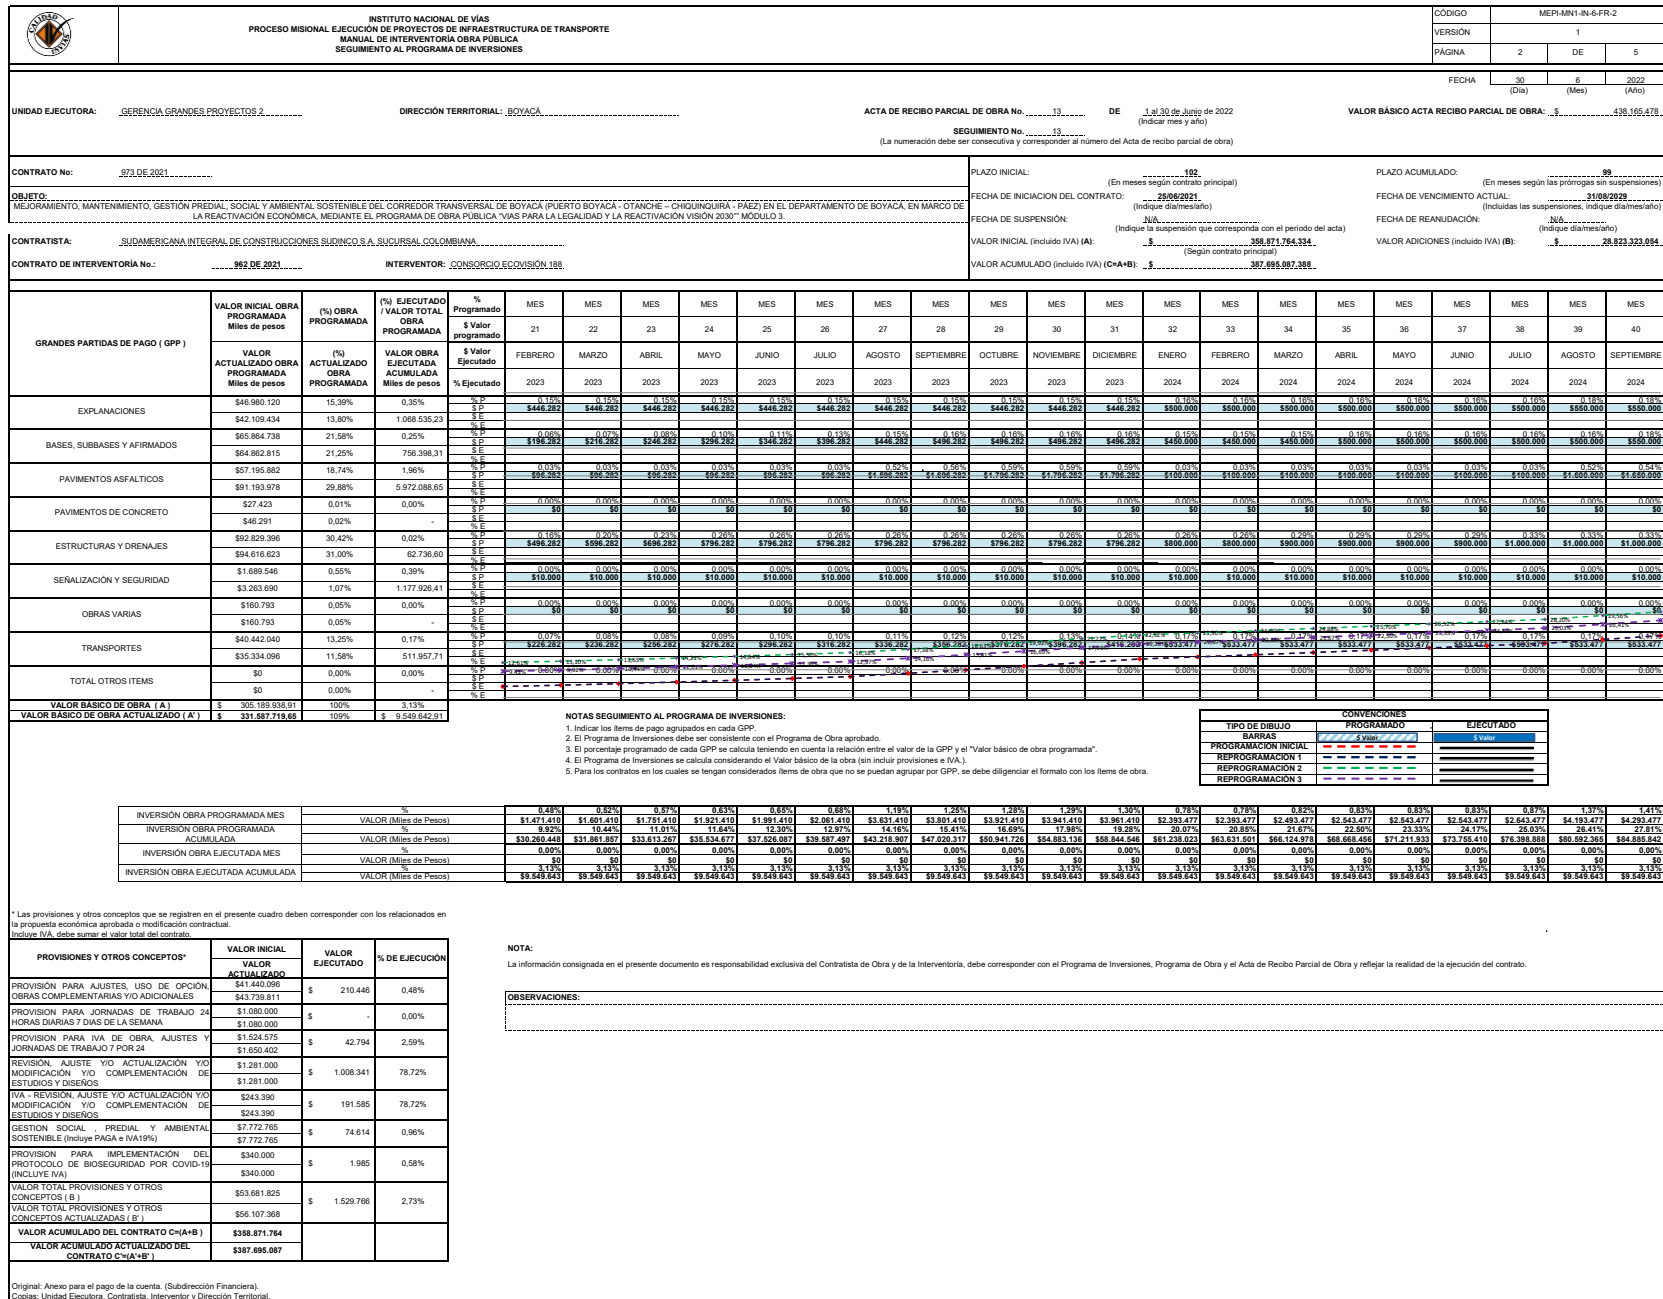

[illegible]

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

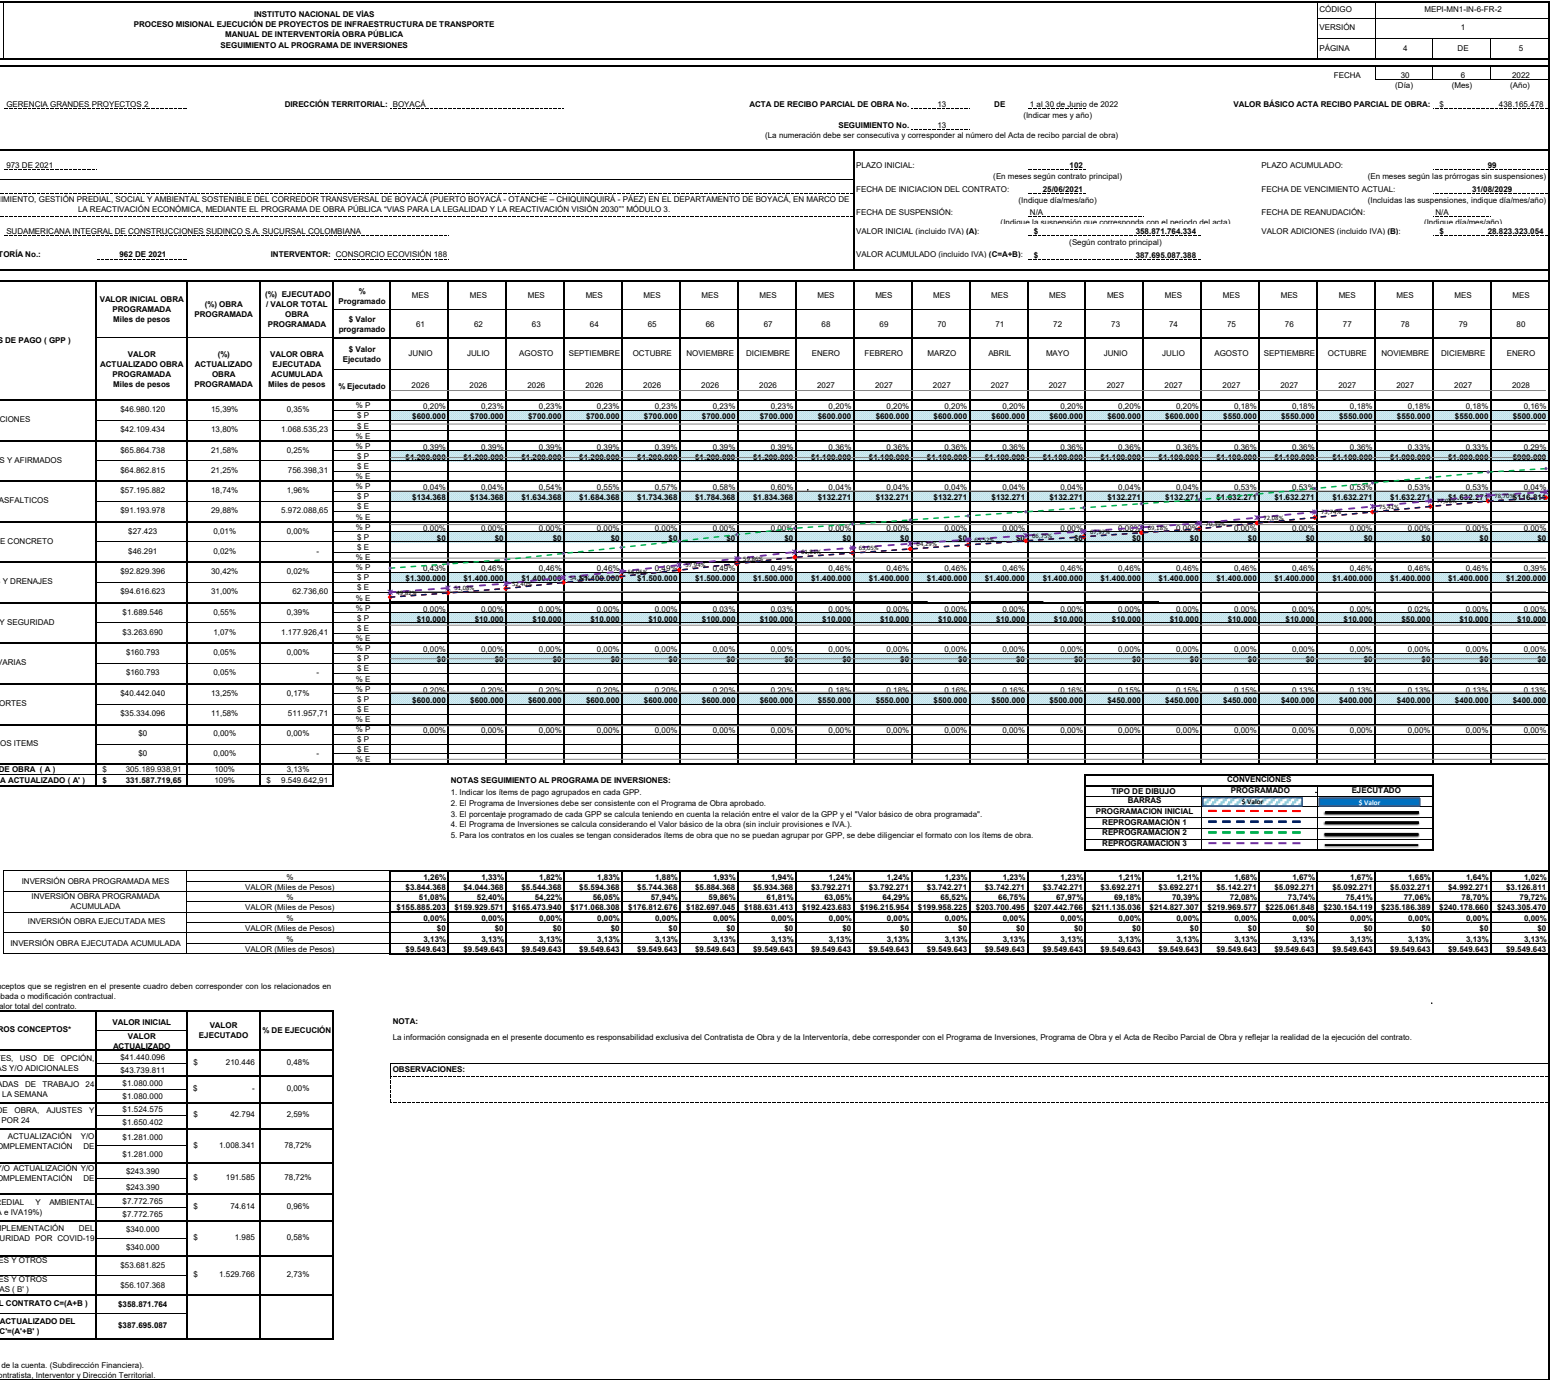

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES																CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		VERSIÓN 1																PÁGINA 5 DE 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		FECHA 30 06 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 DE 1 al 30 de Junio de 2022 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 438.165.578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATO No: 073 DE 2021		PLAZO INICIAL: 192 (En meses según contrato principal)																PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDO TRANSVERSO DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ OTARE - CHALÉ VALPARAISO PASO) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)																FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2022 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 388.871.764																VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.222.694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188																VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 387.695.087.388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	MES 38	MES 39	MES 40	MES 41	MES 42	MES 43	MES 44	MES 45	MES 46	MES 47	MES 48	MES 49	MES 50	MES 51	MES 52	MES 53	MES 54	MES 55	MES 56	MES 57	MES 58	MES 59	MES 60	MES 61	MES 62	MES 63	MES 64	MES 65	MES 66	MES 67	MES 68	MES 69	MES 70	MES 71	MES 72	MES 73	MES 74	MES 75	MES 76	MES 77	MES 78	MES 79	MES 80	MES 81	MES 82	MES 83	MES 84	MES 85	MES 86	MES 87	MES 88	MES 89	MES 90	MES 91	MES 92	MES 93	MES 94	MES 95	MES 96	MES 97	MES 98	MES 99	MES 100	MES 101	MES 102	MES 103	MES 104	MES 105	MES 106	MES 107	MES 108	MES 109	MES 110	MES 111	MES 112	MES 113	MES 114	MES 115	MES 116	MES 117	MES 118	MES 119	MES 120	MES 121	MES 122	MES 123	MES 124	MES 125	MES 126	MES 127	MES 128	MES 129	MES 130	MES 131	MES 132	MES 133	MES 134	MES 135	MES 136	MES 137	MES 138	MES 139	MES 140	MES 141	MES 142	MES 143	MES 144	MES 145	MES 146	MES 147	MES 148	MES 149	MES 150	MES 151	MES 152	MES 153	MES 154	MES 155	MES 156	MES 157	MES 158	MES 159	MES 160	MES 161	MES 162	MES 163	MES 164	MES 165	MES 166	MES 167	MES 168	MES 169	MES 170	MES 171	MES 172	MES 173	MES 174	MES 175	MES 176	MES 177	MES 178	MES 179	MES 180	MES 181	MES 182	MES 183	MES 184	MES 185	MES 186	MES 187	MES 188	MES 189	MES 190	MES 191	MES 192	MES 193	MES 194	MES 195	MES 196	MES 197	MES 198	MES 199	MES 200	MES 201	MES 202	MES 203	MES 204	MES 205	MES 206	MES 207	MES 208	MES 209	MES 210	MES 211	MES 212	MES 213	MES 214	MES 215	MES 216	MES 217	MES 218	MES 219	MES 220	MES 221	MES 222	MES 223	MES 224	MES 225	MES 226	MES 227	MES 228	MES 229	MES 230	MES 231	MES 232	MES 233	MES 234	MES 235	MES 236	MES 237	MES 238	MES 239	MES 240	MES 241	MES 242	MES 243	MES 244	MES 245	MES 246	MES 247	MES 248	MES 249	MES 250	MES 251	MES 252	MES 253	MES 254	MES 255	MES 256	MES 257	MES 258	MES 259	MES 260	MES 261	MES 262	MES 263	MES 264	MES 265	MES 266	MES 267	MES 268	MES 269	MES 270	MES 271	MES 272	MES 273	MES 274	MES 275	MES 276	MES 277	MES 278	MES 279	MES 280	MES 281	MES 282	MES 283	MES 284	MES 285	MES 286	MES 287	MES 288	MES 289	MES 290	MES 291	MES 292	MES 293	MES 294	MES 295	MES 296	MES 297	MES 298	MES 299	MES 300	MES 301	MES 302	MES 303	MES 304	MES 305	MES 306	MES 307	MES 308	MES 309	MES 310	MES 311	MES 312	MES 313	MES 314	MES 315	MES 316	MES 317	MES 318	MES 319	MES 320	MES 321	MES 322	MES 323	MES 324	MES 325	MES 326	MES 327	MES 328	MES 329	MES 330	MES 331	MES 332	MES 333	MES 334	MES 335	MES 336	MES 337	MES 338	MES 339	MES 340	MES 341	MES 342	MES 343	MES 344	MES 345	MES 346	MES 347	MES 348	MES 349	MES 350	MES 351	MES 352	MES 353	MES 354	MES 355	MES 356	MES 357	MES 358	MES 359	MES 360	MES 361	MES 362	MES 363	MES 364	MES 365	MES 366	MES 367	MES 368	MES 369	MES 370	MES 371	MES 372	MES 373	MES 374	MES 375	MES 376	MES 377	MES 378	MES 379	MES 380	MES 381	MES 382	MES 383	MES 384	MES 385	MES 386	MES 387	MES 388	MES 389	MES 390	MES 391	MES 392	MES 393	MES 394	MES 395	MES 396	MES 397	MES 398	MES 399	MES 400	MES 401	MES 402	MES 403	MES 404	MES 405	MES 406	MES 407	MES 408	MES 409	MES 410	MES 411	MES 412	MES 413	MES 414	MES 415	MES 416	MES 417	MES 418	MES 419	MES 420	MES 421	MES 422	MES 423	MES 424	MES 425	MES 426	MES 427	MES 428	MES 429	MES 430	MES 431	MES 432	MES 433	MES 434	MES 435	MES 436	MES 437	MES 438	MES 439	MES 440	MES 441	MES 442	MES 443	MES 444	MES 445	MES 446	MES 447	MES 448	MES 449	MES 450	MES 451	MES 452	MES 453	MES 454	MES 455	MES 456	MES 457	MES 458	MES 459	MES 460	MES 461	MES 462	MES 463	MES 464	MES 465	MES 466	MES 467	MES 468	MES 469	MES 470	MES 471	MES 472	MES 473	MES 474	MES 475	MES 476	MES 477	MES 478	MES 479	MES 480	MES 481	MES 482	MES 483	MES 484	MES 485	MES 486	MES 487	MES 488	MES 489	MES 490	MES 491	MES 492	MES 493	MES 494	MES 495	MES 496	MES 497	MES 498	MES 499	MES 500	MES 501	MES 502	MES 503	MES 504	MES 505	MES 506	MES 507	MES 508	MES 509	MES 510	MES 511	MES 512	MES 513	MES 514	MES 515	MES 516	MES 517	MES 518	MES 519	MES 520	MES 521	MES 522	MES 523	MES 524	MES 525	MES 526	MES 527	MES 528	MES 529	MES 530	MES 531	MES 532	MES 533	MES 534	MES 535	MES 536	MES 537	MES 538	MES 539	MES 540	MES 541	MES 542	MES 543	MES 544	MES 545	MES 546	MES 547	MES 548	MES 549	MES 550	MES 551	MES 552	MES 553	MES 554	MES 555	MES 556	MES 557	MES 558	MES 559	MES 560	MES 561	MES 562	MES 563	MES 564	MES 565	MES 566	MES 567	MES 568	MES 569	MES 570	MES 571	MES 572	MES 573	MES 574	MES 575	MES 576	MES 577	MES 578	MES 579	MES 580	MES 581	MES 582	MES 583	MES 584	MES 585	MES 586	MES 587	MES 588	MES 589	MES 590	MES 591	MES 592	MES 593	MES 594	MES 595	MES 596	MES 597	MES 598	MES 599	MES 600	MES 601	MES 602	MES 603	MES 604	MES 605	MES 606	MES 607	MES 608	MES 609	MES 610	MES 611	MES 612	MES 613	MES 614	MES 615	MES 616	MES 617	MES 618	MES 619	MES 620	MES 621	MES 622	MES 623	MES 624	MES 625	MES 626	MES 627	MES 628	MES 629	MES 630	MES 631	MES 632	MES 633	MES 634	MES 635	MES 636	MES 637	MES 638	MES 639	MES 640	MES 641	MES 642	MES 643	MES 644	MES 645	MES 646	MES 647	MES 648	MES 649	MES 650	MES 651	MES 652	MES 653	MES 654	MES 655	MES 656	MES 657	MES 658	MES 659	MES 660	MES 661	MES 662	MES 663	MES 664	MES 665	MES 666	MES 667	MES 668	MES 669	MES 670	MES 671	MES 672	MES 673	MES 674	MES 675	MES 676	MES 677	MES 678	MES 679	MES 680	MES 681	MES 682	MES 683	MES 684	MES 685	MES 686	MES 687	MES 688	MES 689	MES 690	MES 691	MES 692	MES 693	MES 694	MES 695	MES 696	MES 697	MES 698	MES 699	MES 700	MES 701	MES 702	MES 703	MES 704	MES 705	MES 706	MES 707	MES 708	MES 709	MES 710	MES 711	MES 712	MES 713	MES 714	MES 715	MES 716	MES 717	MES 718	MES 719	MES 720	MES 721	MES 722	MES 723	MES 724	MES 725	MES 726	MES 727	MES 728	MES 729	MES 730	MES 731	MES 732	MES 733	MES 734	MES 735	MES 736	MES 737	MES 738	MES 739	MES 740	MES 741	MES 742	MES 743	MES 744	MES 745	MES 746	MES 747	MES 748	MES 749	MES 750	MES 751	MES 752	MES 753	MES 754	MES 755	MES 756	MES 757	MES 758	MES 759	MES 760	MES 761	MES 762	MES 763	MES 764	MES 765	MES 766	MES 767	MES 768	MES 769	MES 770	MES 771	MES 772	MES 773	MES 774	MES 775	MES 776	MES 777	MES 778	MES 779	MES 780	MES 781	MES 782	MES 783	MES 784	MES 785	MES 786	MES 787	MES 788	MES 789	MES 790	MES 791	MES 792	MES 793	MES 794	MES 795	MES 796	MES 797	MES 798	MES 799	MES 800	MES 801	MES 802	MES 803	MES 804	MES 805	MES 806	MES 807	MES 808	MES 809	MES 810	MES 811	MES 812	MES 813	MES 814	MES 815	MES 816	MES 817	MES 818	MES 819	MES 820	MES 821	MES 822	MES 823	MES 824	MES 825	MES 826	MES 827	MES 828	MES 829	MES 830	MES 831	MES 832	MES 833	MES 834	MES 835	MES 836	MES 837	MES 838	MES 839	MES 840	MES 841	MES 842	MES 843	MES 844	MES 845	MES 846	MES 847	MES 848	MES 849	MES 850	MES 851	MES 852	MES 853	MES 854	MES 855	MES 856	MES 857	MES 858	MES 859	MES 860	MES 861	MES 862	MES 863	MES 864	MES 865	MES 866	MES 867	MES 868	MES 869	MES 870	MES 871	MES 872	MES 873	MES 874	MES 875	MES 876	MES 877	MES 878	MES 879	MES 880	MES 881	MES 882	MES 883	MES 884	MES 885	MES 886	MES 887	MES 888	MES 889	MES 890	MES 891	MES 892	MES 893	MES 894	MES 895	MES 896	MES 897	MES 898	MES 899	MES 900	MES 901	MES 902	MES 903	MES 904	MES 905	MES 906	MES 907	MES 908	MES 909	MES 910	MES 911	MES 912	MES 913	MES 914	MES 915	MES 916	MES 917	MES 918	MES 919	MES 920	MES 921	MES 922	MES 923	MES 924	MES 925	MES 926	MES 927	MES 928	MES 929	MES 930	MES 931	MES 932	MES 933	MES 934	MES 935	MES 936	MES 937	MES 938	MES 939	MES 940	MES 941	MES 942	MES 943	MES 944	MES 945	MES 946	MES 947	MES 948	MES 949	MES 950	MES 951	MES 952	MES 953	MES 954	MES 955	MES 956	MES 957	MES 958	MES 959	MES 960	MES 961	MES 962	MES 963	MES 964	MES 965	MES 966	MES 967	MES 968	MES 969	MES 970	MES 971	MES 972	MES 973	MES 974	MES 975	MES 976	MES 977	MES 978	MES 979	MES 980	MES 981	MES 982	MES 983	MES 984	MES 985	MES 986	MES 987	MES 988	MES 989	MES 990	MES 991	MES 992	MES 993	MES 994	MES 995	MES 996	MES 997	MES 998	MES 999	MES 1000	MES 1001	MES 1002	MES 1003	MES 1004	MES 1005	MES 1006	MES 1007	MES 1008	MES 1009	MES 1010	MES 1011	MES 1012	MES 1013	MES 1014	MES 1015	MES 1016	MES 1017	MES 1018	MES 1019	MES 1020	MES 1021	MES 1022	MES 1023	MES 1024	MES 1025	MES 1026	MES 1027	MES 1028	MES 1029	MES 1030	MES 1031	MES 1032	MES 1033	MES 1034	MES 1035	MES 1036	MES 1037	MES 1038	MES 1039	MES 1040	MES 1041	MES 1042	MES 1043	MES 1044	MES 1045	MES 1046	MES 1047	MES 1048	MES 1049	MES 1050	MES 1051	MES 1052	MES 1053	MES 1054	MES 1055	MES 1056	MES 1057	MES 1058	MES 1059	MES 1060	MES 1061	MES 1062	MES 1063	MES 1064	MES 1065	MES 1066	MES 1067	MES 1068	MES 1069	MES 1070	MES 1071	MES 1072	MES 1073	MES 1074	MES 1075	MES 1076	MES 1077	MES 1078	MES 1079	MES 1080	MES 1081	MES 1082	MES 1083	MES 1084	MES 1085	MES 1086	MES 1087	MES 1088	MES 1089	MES 1090	MES 1091	MES 1092	MES 1093	MES 1094	MES 1095	MES 1096	MES 1097	MES 1098	MES 1099	MES 1100	MES 1101	MES 1102	MES 1103	MES 1104	MES 1105	MES 1106	MES 1107	MES 1108	MES 1109	MES 1110	MES 1111	MES 1112	MES 1113	MES 1114	MES 1115	MES 1116	MES 1117	MES 1118	MES 1119	MES 1120	MES 1121	MES 1122	MES 1123	MES 1124
