

Certificado Bancario

Martes, 16 de noviembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIER identificado(a) con NIT 901008002, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00767586761	2016/10/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

14736626931



(415)7707212489984(8020) 000001473662693 1

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 0 8 0 0 2 | 1

(1 1

27. Fecha expedición

1

36 Ciudad/Municipio

34. Otros nombres

37. Sigla
CONDEIN SAS

0 0 1

0	45. Teléfono 2
---	----------------

3 1 0 4 6 1 2 3 1 6

52. Número
establecimientos

52. Número

establecimientos

[illegible]

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

4. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 01 - 27 / 16 : 03 : 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

Medellín, septiembre 20 de 2022.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito, **GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO**, identificado con cedula de ciudadanía No 71.677.661 de Medellín, actuando como representante legal de **CONDEIN SAS** con Nit 901.008.002 - 1, certifico que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar, así como por concepto de pago de parafiscales.


GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS
C.C. 71.677.661

Bancolombia

2024-09-09 10:00 AM

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

[illegible]

Rionegro, 20 de septiembre de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 22000970 H4 DE 2022

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 20 de septiembre de 2022 presentando por parte del contratista **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA SAS** con NIT 901008002 - 1, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 22000970 H4 de 2022 por el valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$483.998.094), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura N° E-56, que corresponde al periodo del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022, equivalente a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$110.488.228.50).

Por concepto de:


- Acta Parcial N° 1, Factura N° E-56


Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia se firma el 20 de septiembre de 2022



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

		CONDEIN SAS		FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	
MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 01					
CONTRATO No. 22000970 H4 DE 2022		FECHA INICIO: 1/07/2022		SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.	
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO		PLAZO : SIETE MESES O HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022 LO QUE OCURRA PRIMERO		VALOR : \$ 483,998,094	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD			
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha			
UBICACIÓN		DIMENSIONES		TOTAL	
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Area total Aeropuerto zonas de nivelacion, laterales y zonas aledanas a cerramiento.					
Rocería 1					15,00
Rocería 2					15,00
SE TOMARAN MEDIDAS FINALES Y SE DESCONTARA LO PAGADO PARA EL ACTA 2					
					30,00
		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	

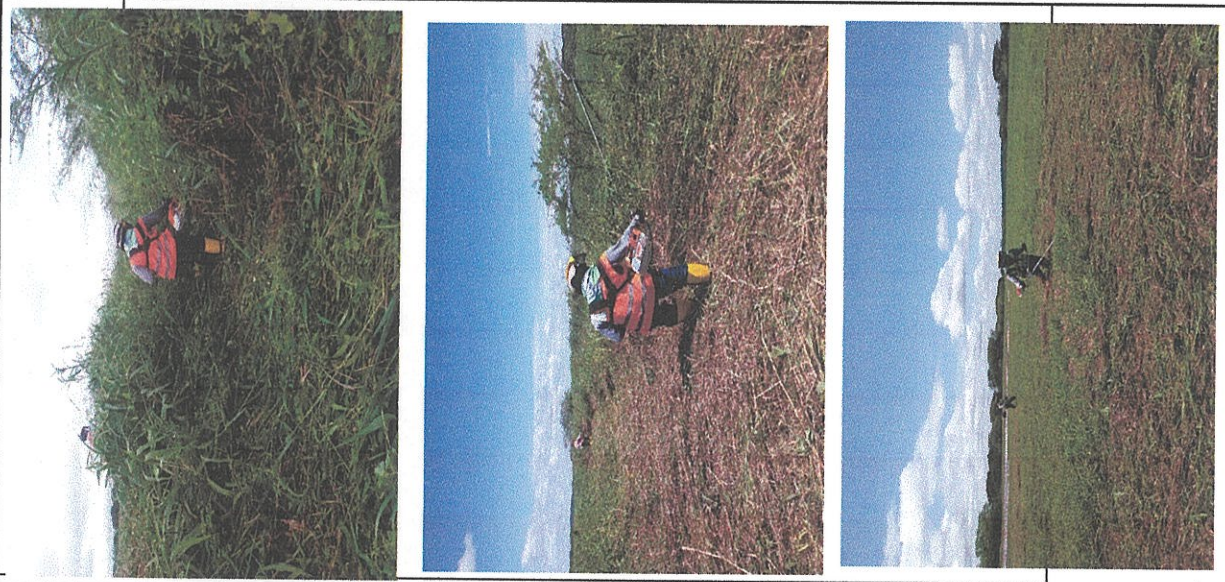



FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

A photograph of a person standing in a field, holding a long pole. The person is wearing a light-colored jacket and dark pants. The field is green and appears to be a rice paddy. In the background, there is a body of water, possibly a pond or a river, and some trees. The sky is blue with white clouds.

SE TOMARAN MEDIDAS FINALES Y SE
DESCONTARÁ LO PAGADO PARA EL ACTA 2

4.000,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

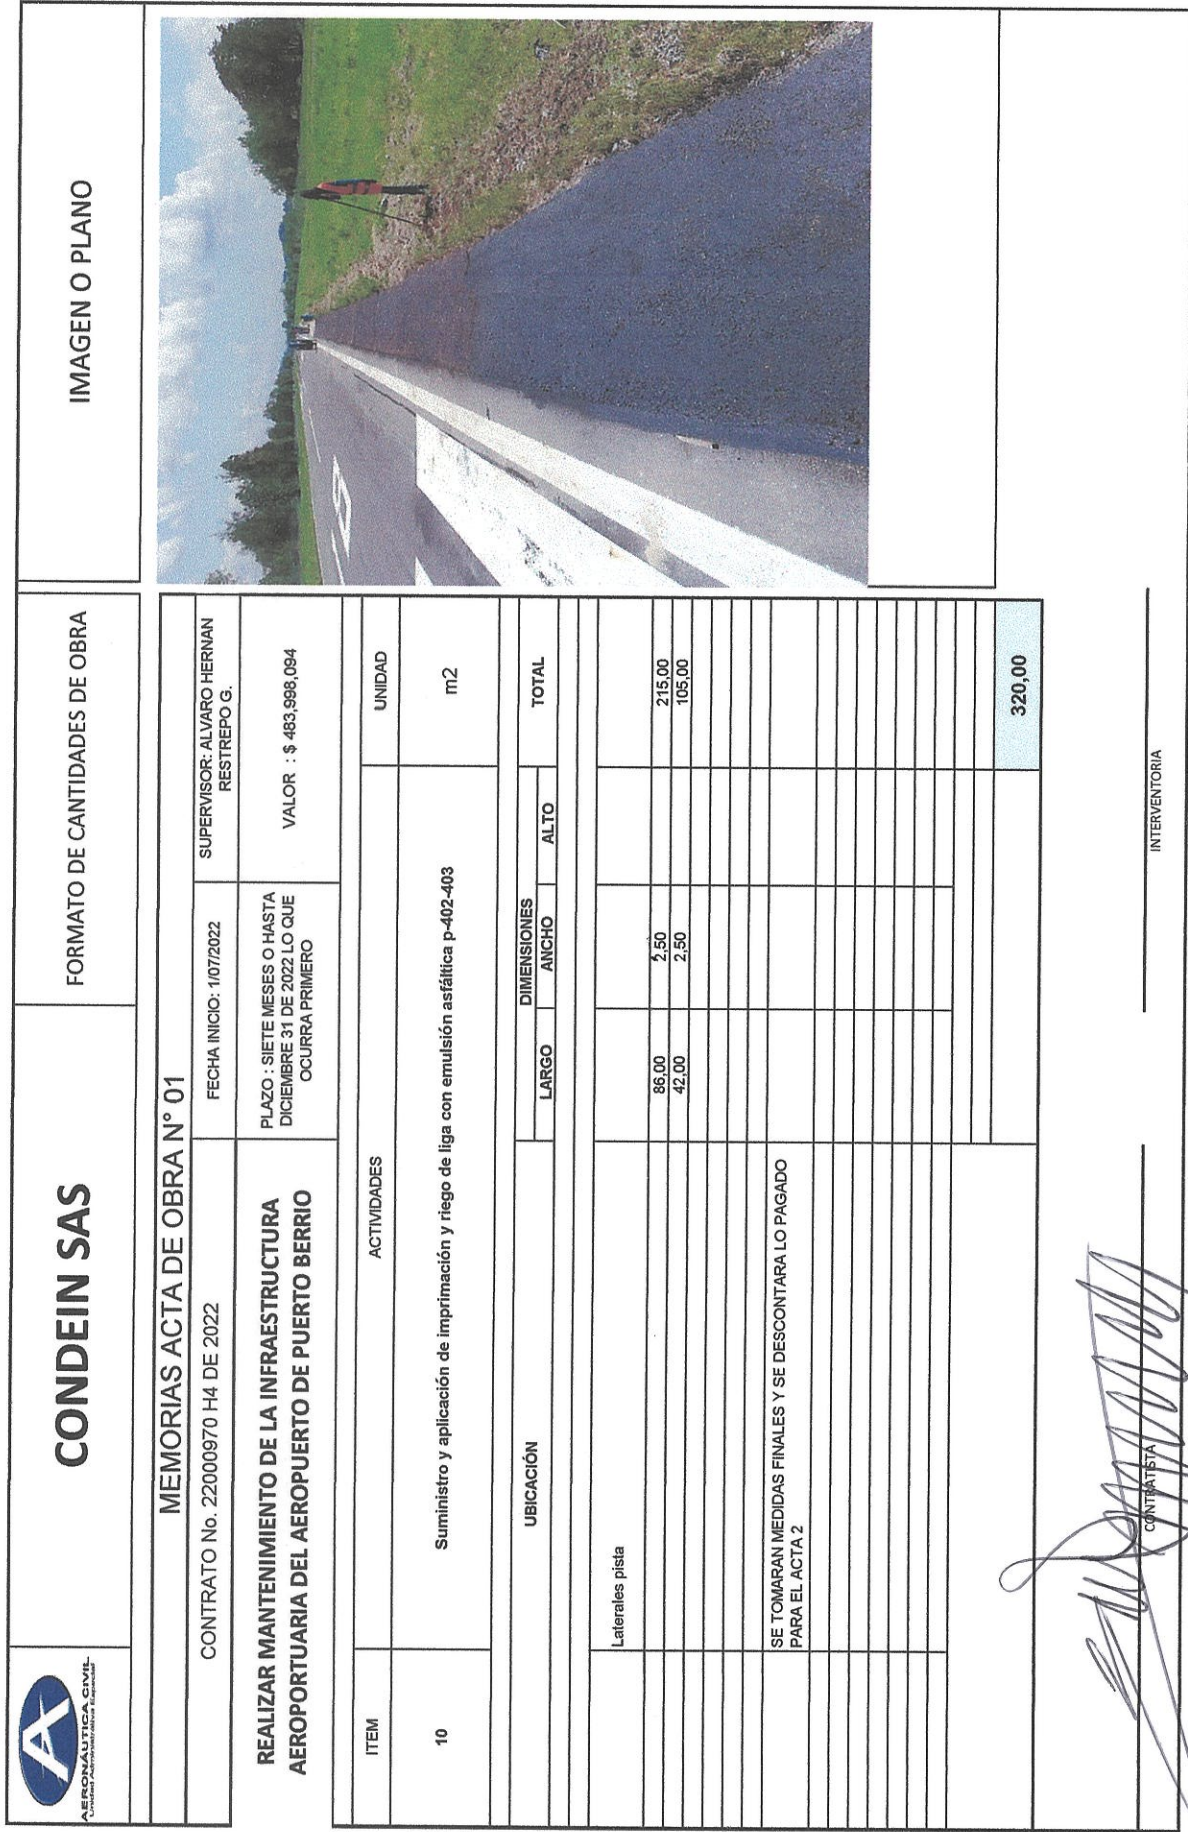




IMAGEN O PLANO

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO No. 22000970 H4 DE 2022

FECHA INICIO: 1/07/2022

**SUPERVISOR: ALVARO HERNAN
RESTREPO G.**

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AFROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO


**PLAZO : SIETE MESES O HASTA
DICIEMBRE 31 DE 2022 LO QUE
OCURRA PRIMERO**


VALOR : \$ 483,998.094


[illegible]


CONTRATISTA


INTERVENTORIA

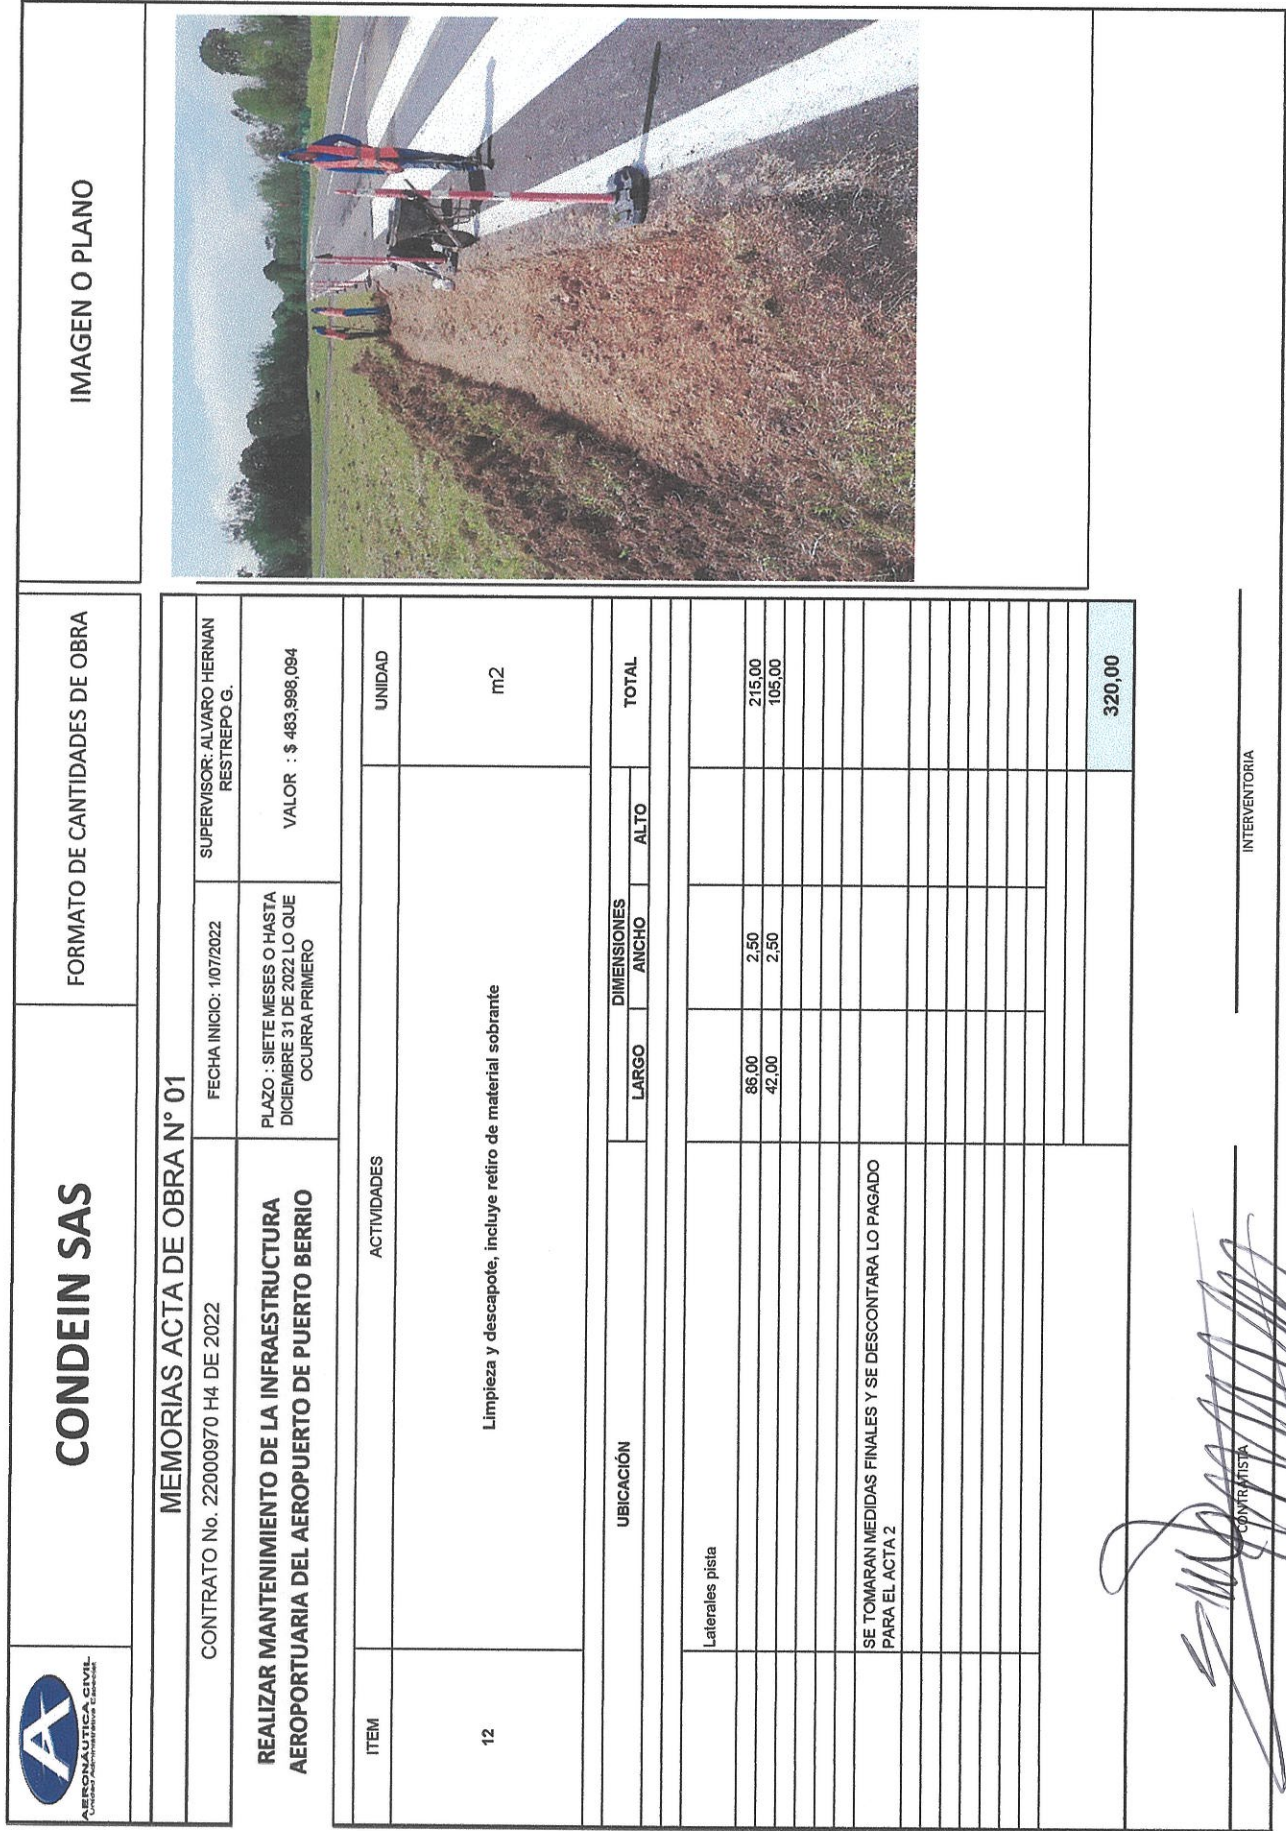


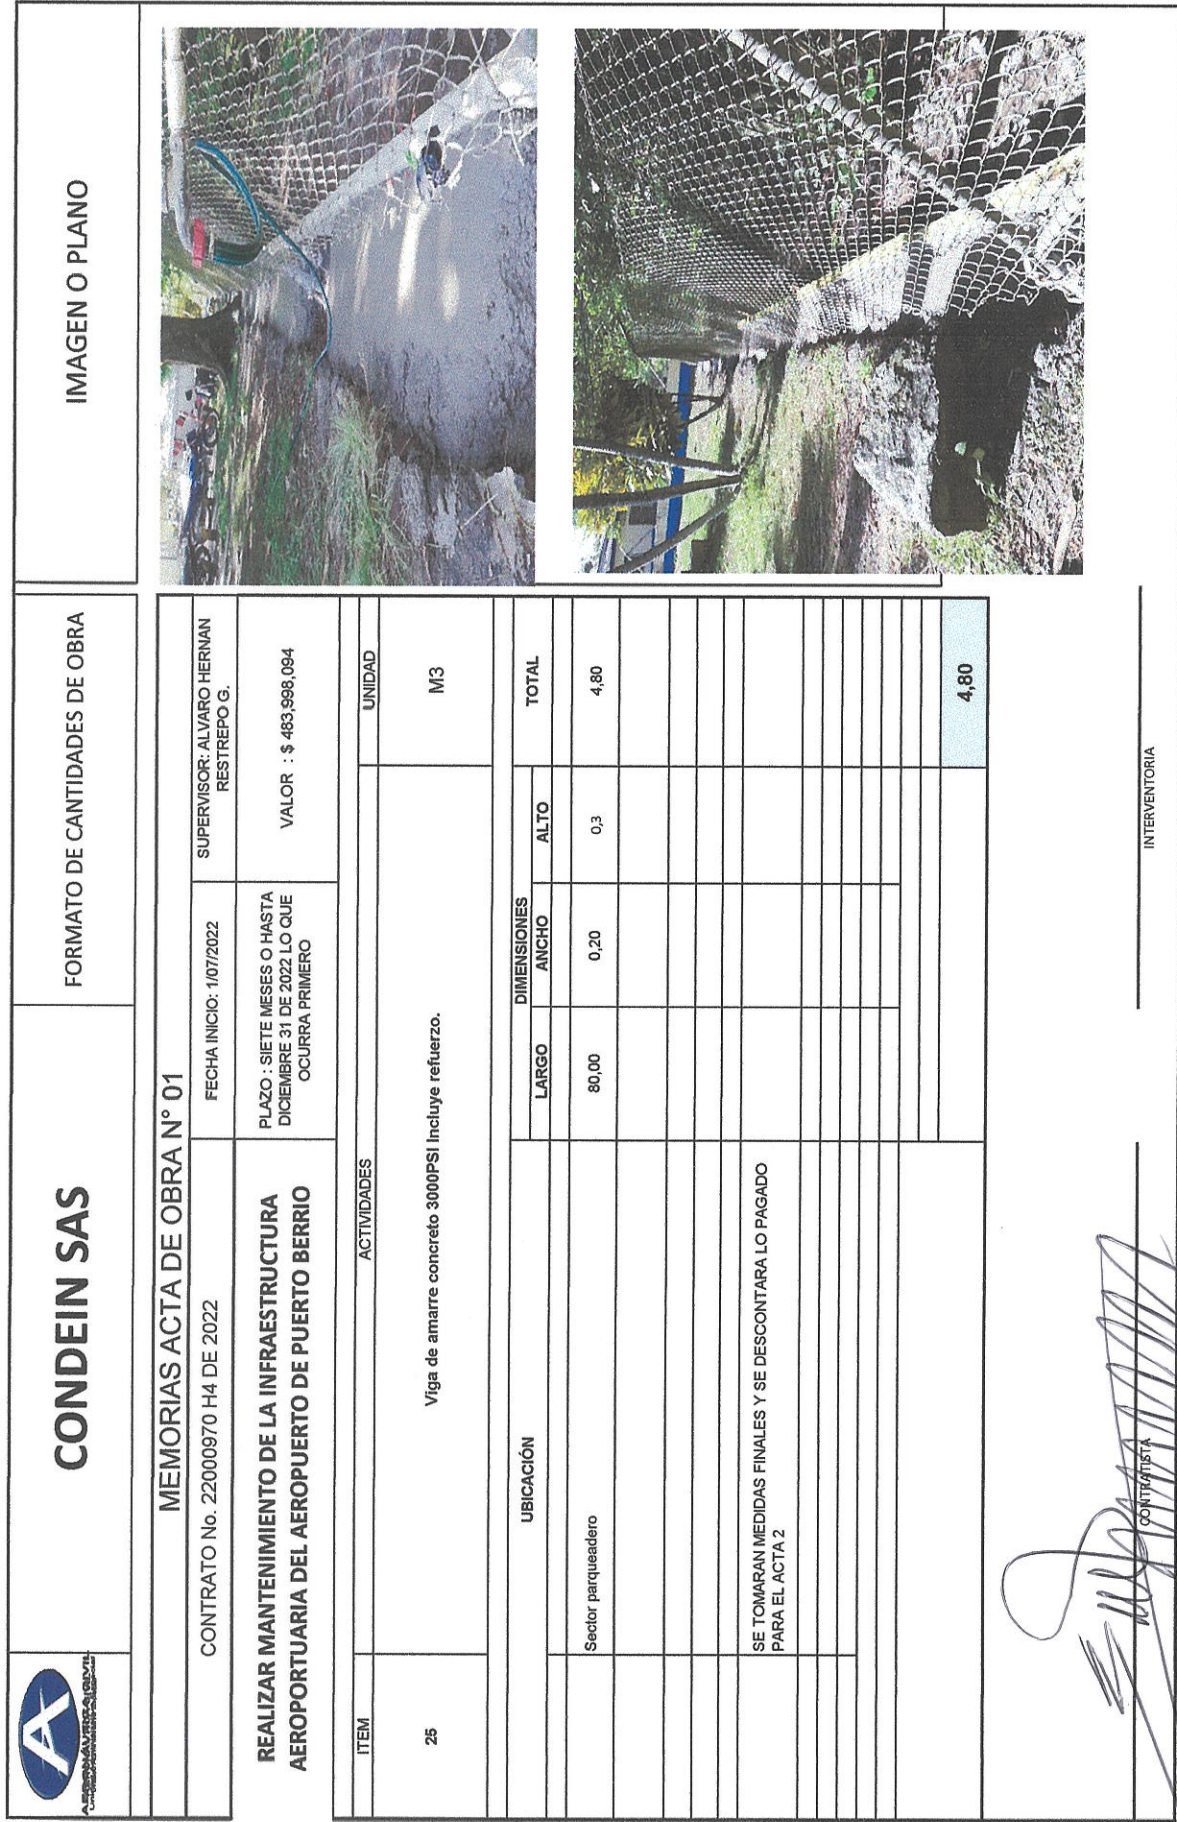

	CONDEIN SAS	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA		IMAGEN O PLANO
MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 01				
CONTRATO No. 22000970 H4 DE 2022		FECHA INICIO: 1/07/2022	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.	
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO		PLAZO : SIETE MESES O HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022 LO QUE OCURRA PRIMERO	VALOR : \$ 483.988.084	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD		
27	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	ml		
UBICACIÓN		DIMENSIONES		TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO
Zona parqueadero				100,00
Zona cerramiento pista				75,00
SE TOMARAN MEDIDAS FINALES Y SE DESCONTARA LO PAGADO PARA EL ACTA 2				
				175,00
				
CONTRATISTA				
INTERVENTORIA				

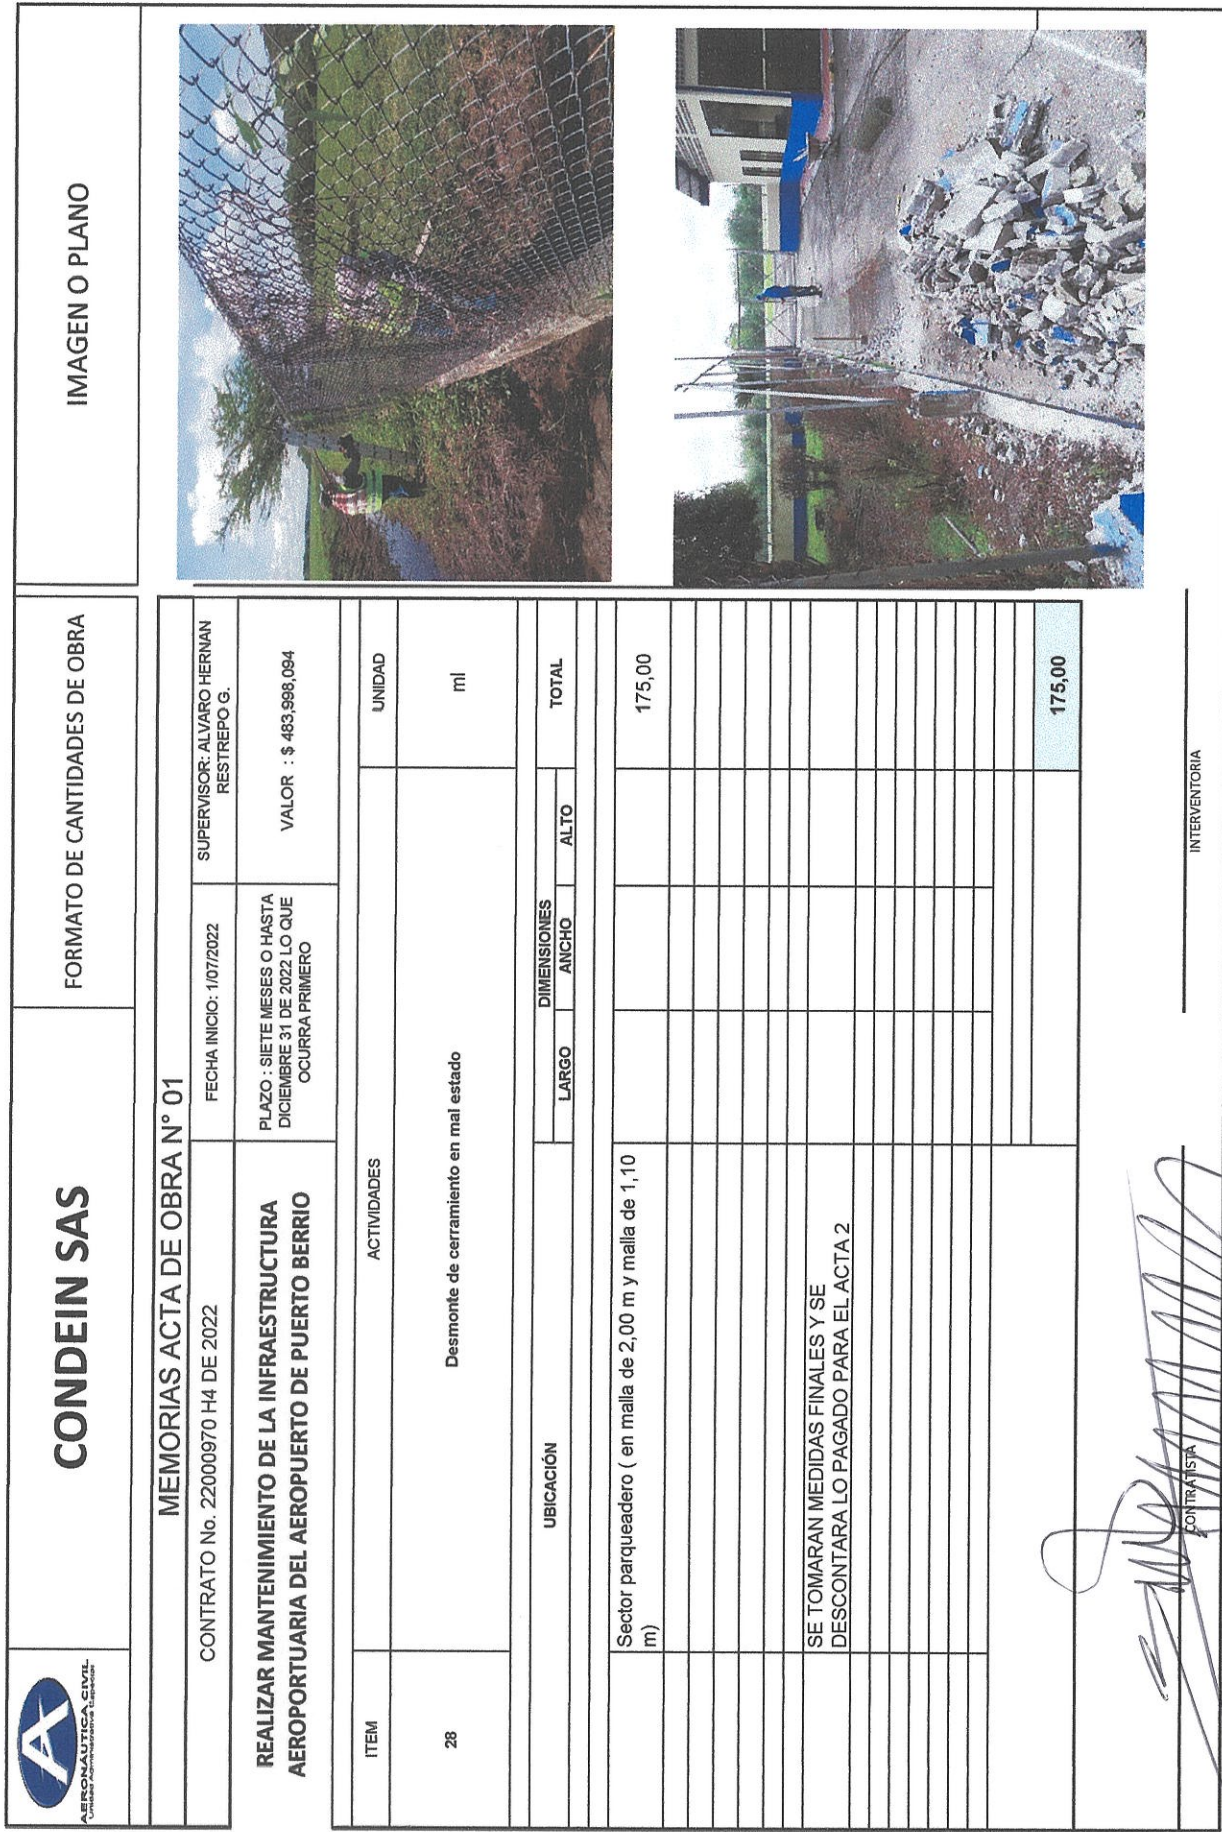

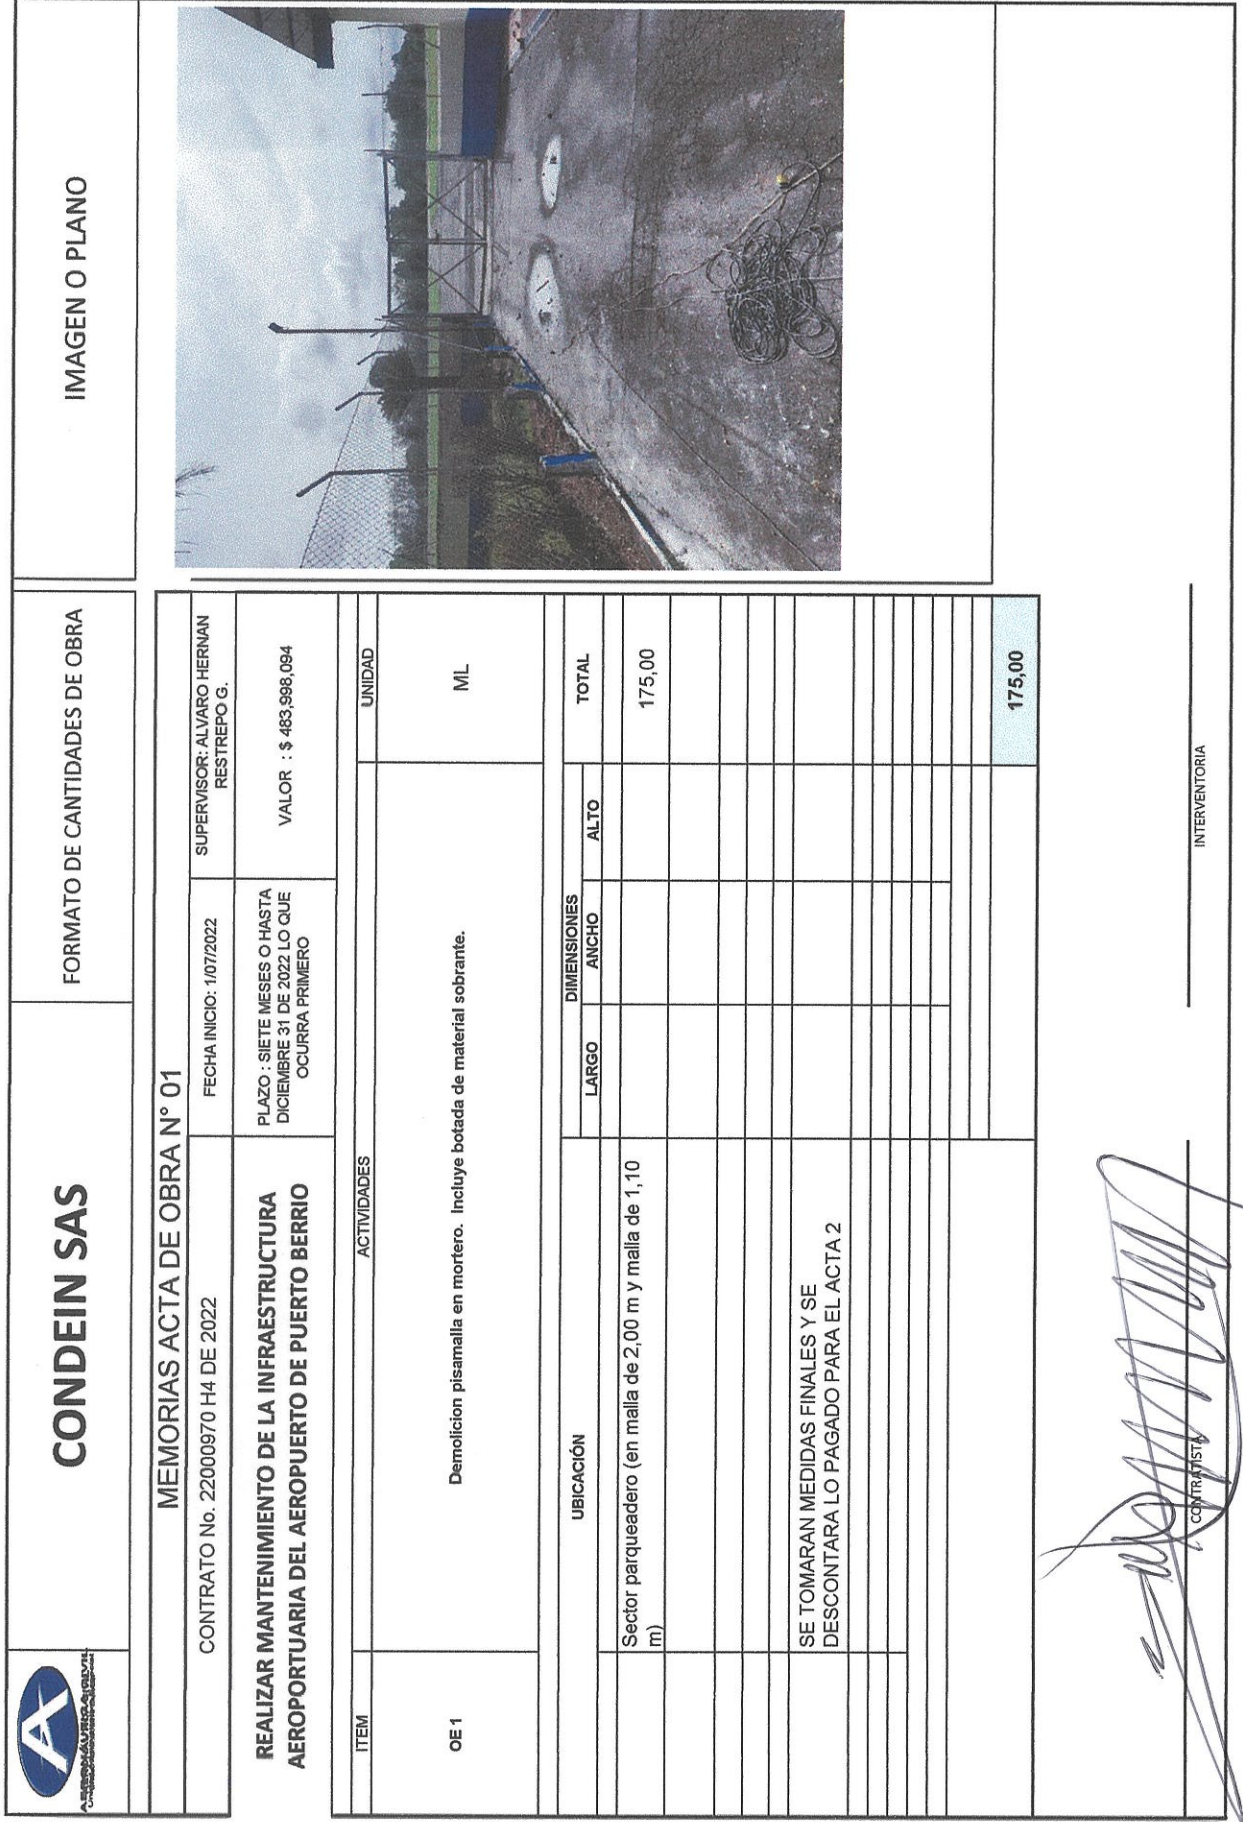

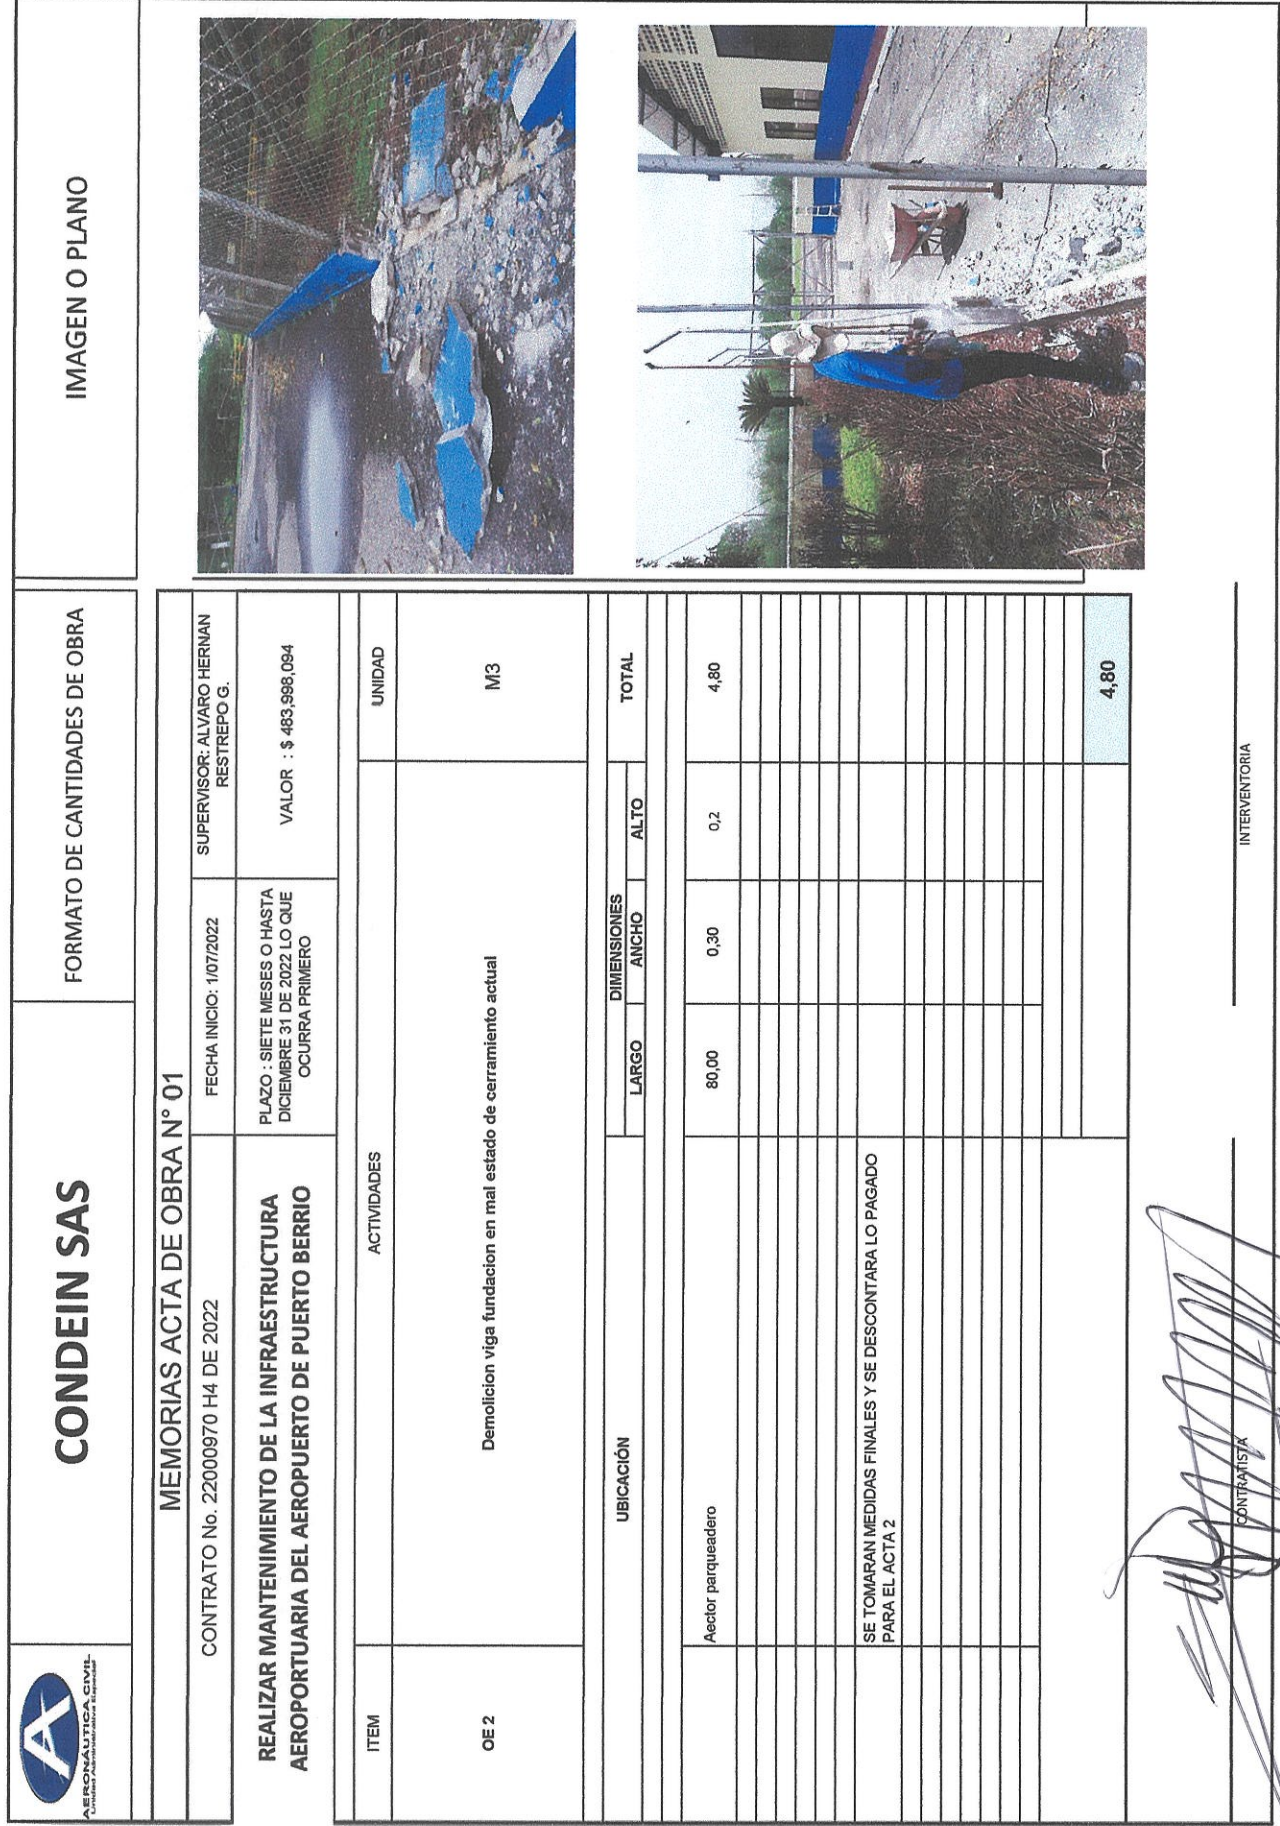



CONTRATANTE: AEROCIVIL

CONTRATO: 22000970 H4 DE 2022

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL
AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO N° 1.

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - ROCERIA

Se realizan actividades de dos rondas de rocería en toda el área del aeropuerto, incluyendo área de zonas de nivelación, laterales y zonas aledañas al cerramiento existente. Se realizó con la utilización de guadaña, herramienta menor como machetes, azadones y hachas, así como fumigadora manual para la aplicación del respectivo herbicida. Se realiza el retiro de material vegetal y se dispone en sitio autorizado.

1.2 LIMPIEZA DE CANALES:

Se realizan actividades dos rondas de limpieza de canales, realizando la conformación del talud deteriorado, así como el retiro de material existente que interrumpía la circulación de agua a través de dichos canales. Se realiza el retiro de material vegetal y se dispone en sitio autorizado.



1.3 LIMPIEZA Y DESCAPOTE.

Se realizan actividades de limpieza y descapote en tramo derecho de lateral pista, con espesor promedio de 20 cm. Se realizó la disposición de material en sitio adecuado.

1.4 LLENOS CON BASE GRANULAR:

Se realizan actividades colocación y compactación de base granular en área excavada para conformar laterales de pista.

1.5 EMULSION ASFALTICA

Se realizan actividades de sello de base granular con la aplicación de emulsión asfáltica en dos capas.

1.6 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO

Se realizan actividades de concreto ciclópeo y viga de fundación para cerramiento en sector parqueadero de terminal de pasajeros.

1.7 DESMONTE DE CERRAMIENTO Y RETIRO PISAMALLA EXISTENTE:

Se realizan actividades de demolición de pisamalla existente en mal estado, así como retiro de cerramiento deteriorado, el cual será reemplazado por malla plastificada con altura 2.00 m y tubería galvanizada.

1.8 DEMOLICION DE VIGAS DE FUNDACION Y MUROS

Se realizan actividades de demolición de vigas de concreto deterioradas y fisuradas, para su reemplazo y mejor alineamiento, Igualmente se realiza demolición de muros en ladrillo y bloque para reemplazarlos por vigas en concreto, que den mejor estabilidad al cerramiento.



1.9 CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERIA GALVANIZADA.

Se realizan actividades de adecuación de cerramiento para colocación de tubería galvanizada y malla plastificada cal 8.

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

2.1 AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2.2 INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

2.3 DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

2.4 SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

2.5 CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.




2.6 REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

3. SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante las lluvias que se han presentado durante varios días de labores.


GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
CONDEIN SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.



Construcción, interventoría y diseño de obras civiles. Medellín
Carrera 78 A N° 32 A 97 Tel 4990417 - 310 4612316 - condeinsas@hotmail.com

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.



Construcción, interventoría y diseño de obras civiles. Medellín
Carrera 78 A N° 32 A 97 Tel 4990417 - 310 4612316 - condeinsas@hotmail.com

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.



Construcción, interventoría y diseño de obras civiles. Medellín
Carrera 78 A N° 32 A 97 Tel 4990417 - 310 4612316 - condeinsas@hotmail.com

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.



Construcción, interventoría y diseño de obras civiles. Medellín
Carrera 78 A N° 32 A 97 Tel 4990417 - 310 4612316 - condeinsas@hotmail.com

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

