

- Mis Consultas
- Mis Planillas de Envió
- Solicitar Anulación
- RADICACIÓN**
- Mis Oficios
- Mis Memorandos
- CARPETA**
- Mis Entrada (0)
- Mis Oficio (0)
- Mis Memorando (0)
- Mis Visto Bueno (0)
- Mis Devolución (0)
- Mis Agendados (0)
- Mis Informados (1)
- Mis Personales (0)



Detalles del radicado 20226810117282

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Radicación:	2022-10-26 14:31 PM
Remitente:	OSCAR JULIAN MORENO C
Destinatario:	ICDD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S
Asunto:	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATOS CON-313-2022 Y CIN-344-2022
Dirección:	CALLE 18 # 4 - 81 OFC 397
E-Mail:	oscar.puentes2021@gmail.com
Folios:	3
Nivel de Seguridad:	PUBLICO
Tipo de Documento:	/ DIAS
Descripción de Anexos:	PDF ZIP

ESTADO

Radicado	Digitalizado	Con respuesta (0)	Planilla dependencia (0)	Planilla CDI (0)	Trámite cerrado (archivado)	Enviado (0)
----------	--------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------	-------------

DOCUMENTOS

DOCUMENTO (Anexo/Asociado):	
Documento Definitivo:	
Documentos Anexos:	COMUNICADO 888 - SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  2022-10-26 Informe de actividades Previas  2022-10-26

HISTÓRICO

Usuario Actual:	HECTOR ENRIQUE ERRA MORENO: Área de Gestión de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe
Usuario Radicador:	MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA: Área de Gestión de Desarrollo Local - CDI Rafael Uribe Uribe
Registro de consultas:	Ver
Registro de préstamos:	Ver

Fecha	Actividad	Usuario Origen	Usuario Destino	Comentario
2022-10-26 15:24:13 PM	Reasignación	662: DIMELZA MENDOZA RUEDA	662: HECTOR ENRIQUE ERRA MORENO	* SE REMITE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATOS CON-313-2022 Y CIN-344-2022, PARA FINES PERTINENTES. Informe de actividades Previas COMUNICADO 888 - SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
2022-10-26 14:32:48 PM	Adjuntar Anexo	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	
2022-10-26 14:32:08 PM	Adjuntar Anexo	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	
2022-10-26 14:31:38 PM	Digitalización			
2022-10-26 14:31:38 PM	Radicado(Asoc. Imagen Web)	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	definitivo
2022-10-26 14:31:08 PM	Radicación	661: MARIA CAROLINA HERNANDEZ POVEDA	662: DIMELZA MENDOZA RUEDA	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATOS CON-313-2022 Y CIN-344-2022

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2022

CE-ICOD-CI-344-008

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Atn: EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO

Alcalde Local

Atn: Ing Fernanda Chavez

Apoyo a la Supervisión

Ciudad

Copia

ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INGENIERIA Y SERVICIOS – APIS SAS

Atn: Ing. ROCIO DEL PILAR MELO MARTINEZ

Representante Legal

Calle 23 a bis No 83-25, oficina 402

Ref: CIN-314-2022 Objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C”

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATOS CON-313-2022 y CIN-314-2022

Cordial saludo,

En virtud al contrato de consultoria No. CON-313-2022 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INGENIERIA Y SERVICIOS – APIS SAS, y en mi condicion de representante legal de la INTERVENTORIA en base a la solicitud empleada por el consultor via virtual el día 25 de octubre de 2022 mediante comunicado CON-313-2022-008 cuyo asunto es solicitud de suspension de, contrato, indica lo siguiente:

“Por medio de la presente se remite comunicado 008 con asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN - CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, cuyo objeto es “REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C”, fundamentada en: El contratista en su facultad como encargado de la ejecución del contrato de consultoría de la referencia, solicita amablemente sea evaluado y aprobado el periodo de suspensión No.1 para el contrato de consultoría (...)”

“El Contratista pone en conocimiento las particularidades que se han presentado en la ejecución del contrato que han imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que generan la necesidad inminente de suspender el contrato. El contratista a la fecha no cuenta con la información de redes existentes y demás trámites necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato, información que fue solicitada ante las empresas de servicios públicos como son: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP, Empresa Gas Natural Vanti, Enel Colombia, empresas de telefonía como , Claro, Movistar, Tigo y Etb, mediante oficio con consecutivos, no se tiene respuesta por dichas Empresas, lo cual retrasa y dificulta el desarrollo de las diferentes actividades que se deben realizar, a continuación se presenta la

evidencia de que el tiempo de respuesta aproximado por parte de dichas empresas es de quince días (15) hábiles, tiempo que no depende del Contratista.”

Por lo anterior, el consultor evidencia mediante la siguiente la imagen, en donde, depende de una entidad externa afectando los tiempos contractuales.



Gracias por contactarnos

Su código único numérico (CUN) es:
4433-22-1017207116

Conserve este número para realizar seguimiento a su PQR

TENGA EN CUENTA

Su petición o queja/reclamo será contestada a más tardar el día **02 de Noviembre de 2022** por el medio de su elección. Si su petición o queja/reclamo no es atendida en la fecha indicada, se entenderá que ha sido resuelta a su favor (Esto se llama silencio administrativo positivo).

Para Movistar es muy importante conocer su opinión respecto a la atención recibida por este canal. Agradecemos su tiempo y disposición para responder [la siguiente encuesta](#)

Aceptar

11/10/22, 15:56 Consulta PQR OnLine

CONSULTA INFORMACIÓN DEL TICKET

Seleccione el Tipo de Consulta
☐ por Nro CUN ☒ por Nro Documento


¿Cuál es el número de su documento de identidad o el de su empresa?

Nro ticket	Nro CUN	Cliente	Tipo Requerimiento	SubTipo	¿Usted quiere presentar una petición,queja/reclamo o recurso?*	Motivo	Fecha Creación	Fecha Estimada
---	4331-22-0000291157	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INGENIERIA Y SERVICIO APIS SAS MELO MARTINEZ	Tigo On Line	Requerimientos Especiales	Petición	Motivo Requerimientos Especiales PQRWEB	2022/10/11/ 03:55:15	2022/11/02

Adicionalmente, el consultor expresa lo siguiente:

“En las últimas semanas en la zona de influencia del proyecto se han presentado fuertes precipitaciones e inadecuadas condiciones climáticas que dificultan realizar cualquier tipo de actividad para de toma de muestras de suelos, lo que retrasa aún más los tiempos de espera de resultados de los mismos, y por ende, el inicio de diseños geotécnicos y estructurales.”

El consultor evidencia mediante el reporte climatico extraido de la siguiente pagina web <https://www.windy.com/4.572/-74.114/meteogram?4.571,-74.114,17,m:dMMad5D>, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

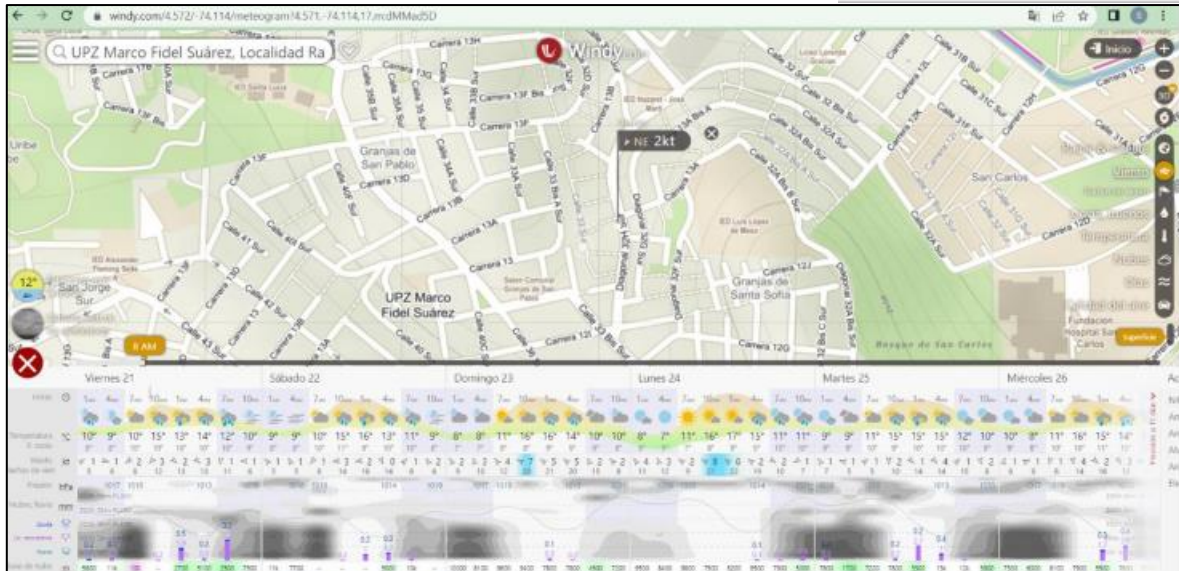

por lo anterior el consultor solicita una suspensión de quince (15) días a partir del 27 de octubre de 2022, con el fin de que lo expuesto a lo largo de este comunicado se logre subsanar y que las condiciones climáticas mejoren para que se pueda realizar una ejecución del proyecto continua, contado con toda la información y autorizaciones requeridas.

Dado que los insumos que expide las entidades de servicios publicos son de gran importancia para la ejecución del mismo tanto en el componente de Geotecnia, hidraulica y espacio publico, se requiere el tiempo de espera de las entidades publicas como lo son acueducto y alcantarilla y demas como se evidencia en el comunicado No. 008 del consultor.

Por lo anterior, se da APROBACION de la solicitud empleada por el consultor, y por lo tanto, la presente interventoria SOLICITA a la entidad contratante una suspensión del contrato de consultoria CON-313-2022 por un termino de quince (15) días calendario a partir del 27 de octubre del 2022 y por consiguiente una suspensión No. 1 al de contrato de interventoria CIN-314-2022 por el mismo termino.

Dado lo anterior, anexamos los soportes emitidos por el consultor y validados por la presente interventoria:

Anexos:

- Comunciado CON-313-2022-008.
- Informe de actividades previas con los respectivos anexos.

Quedamos atentos a su pronta respuesta,

Cordialmente


OSCAR JULIAN MORENO C
REPRESENTANTE LEGAL
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S.

Copia.
Fondo de Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe.
Atn. Hector Erira
Supervision FDLRUU

Calle 18 No. 4-91 oficinas 307 Edificio Los Andes
Bogotá D.C. – Colombia Tels.: 3125861487
jmoreno.icodsas@gmail.com

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2022

Señores:

ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S

Atn: Ing. Oscar Julián Moreno C

Representante Legal

Calle 18 No. 4-91 oficina 307, Bogotá.

La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C”

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite comunicado 008 con asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN - CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022**, cuyo objeto es “REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C”, fundamentada en:

El contratista en su facultad como encargado de la ejecución del contrato de consultoría de la referencia, solicita amablemente sea evaluado y aprobado el periodo de suspensión No.1 para el contrato de consultoría, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Dando alcance a lo establecido en el anexo técnico que hace parte integral del contrato de Consultoría No. CON-313-2022, se definieron los entregables y posibles fechas de entrega de los mismos, fechas establecidas sujetas a entrega de los insumos para la ejecución de los diseños, como lo son el estudio de redes existente, resultados de ensayos y estudios de suelos. Como se describe a continuación:

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
TOPOGRAFÍA.	15/10/2022
ESTUDIO DE REDES EXISTENTES	18/10/2022
SUELOS Y GEOTECNIA.	24/10/2022

El Contratista pone en conocimiento las particularidades que se han presentado en la ejecución del contrato que han imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que generan la necesidad inminente de suspender el contrato.

- El contratista a la fecha no cuenta con la información de redes existentes y demás trámites necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato, información que fue solicitada ante las empresas de servicios públicos como son: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP, Empresa Gas Natural Vanti, Enel Colombia, empresas de telefonía como , Claro, Movistar, Tigo y Etb, mediante oficio con consecutivos, no se tiene respuesta por dichas Empresas, lo cual retrasa y dificulta el desarrollo de las diferentes actividades que se deben realizar, a continuación se presenta la evidencia de que el tiempo de respuesta aproximado por parte de dichas empresas es de quince días (15) hábiles, tiempo que no depende del Contratista.



X

Gracias por contactarnos

Su código único numérico (CUN) es:

4433-22-1017207116

Conserve este número para realizar seguimiento a su PQR

TENGA EN CUENTA

Su petición o queja/reclamo será contestada a más tardar el día **02 de Noviembre de 2022** por el medio de su elección. Si su petición o queja/reclamo no es atendida en la fecha indicada, se entenderá que ha sido resuelta a su favor (Esto se llama silencio administrativo positivo).

Para Movistar es muy importante conocer su opinión respecto a la atención recibida por este canal. Agradecemos su tiempo y disposición para responder

[la siguiente encuesta](#)

Aceptar

11/10/22, 15:56

Consulta PQR OnLine

CONSULTA INFORMACIÓN DEL TICKET

Seleccione el Tipo de Consulta

☐ por Nro CUN ☒ por Nro Documento [Regresar](#)

¿Cuál es el número de su documento de identidad o el de su empresa? * 900411419 [Consultar](#)

Nro ticket	Nro CUN	Cliente	Tipo Requerimiento	SubTipo	¿Usted quiere presentar una petición, queja/reclamo o recurso? *	Motivo	Fecha Creación	Fecha Estimada
---	4331-22-0000291157	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INGENIERIA Y SERVICIO APIS SAS MELO MARTINEZ	Tigo On Line	Requerimientos Especiales	Petición	Motivo Requerimientos Especiales PQRWEB	2022/10/11/ 03:55:15	2022/11/02

De: notificacionespqr@etb.net.co <notificacionespqr@etb.net.co>

Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 2:14 p. m.

Para: apissas@hotmail.com <apissas@hotmail.com>

Asunto: NOTIFICACION ETB



Bogotá, D.C.

Apreciado cliente, reciba un cordial saludo de ETB:


En el transcurso de los siguientes días le contactaremos y/o enviaremos respuesta al correo electrónico que registró en el formulario al momento de interponer la PQR su caso fue direccionado al área correspondiente para dar gestión a su solicitud.

Cordial Saludo,

EQUIPO PORTAL MIETB

DIRECCION EXPERIENCIA PRIMERA INSTANCIA

VP EXPERIENCIA



- En las últimas semanas en la zona de influencia del proyecto se han presentado fuertes precipitaciones e inadecuadas condiciones climáticas que dificultan realizar cualquier tipo de actividad para de toma de muestras de suelos, lo que retrasa aún más los tiempos de espera de resultados de los mismos, y por ende, el inicio de diseños geotécnicos y estructurales.

La siguiente gráfica presenta el reporte climático y pronóstico para los próximos días en el área a intervenir, situación que genera retrasos en las actividades propias del contrato:

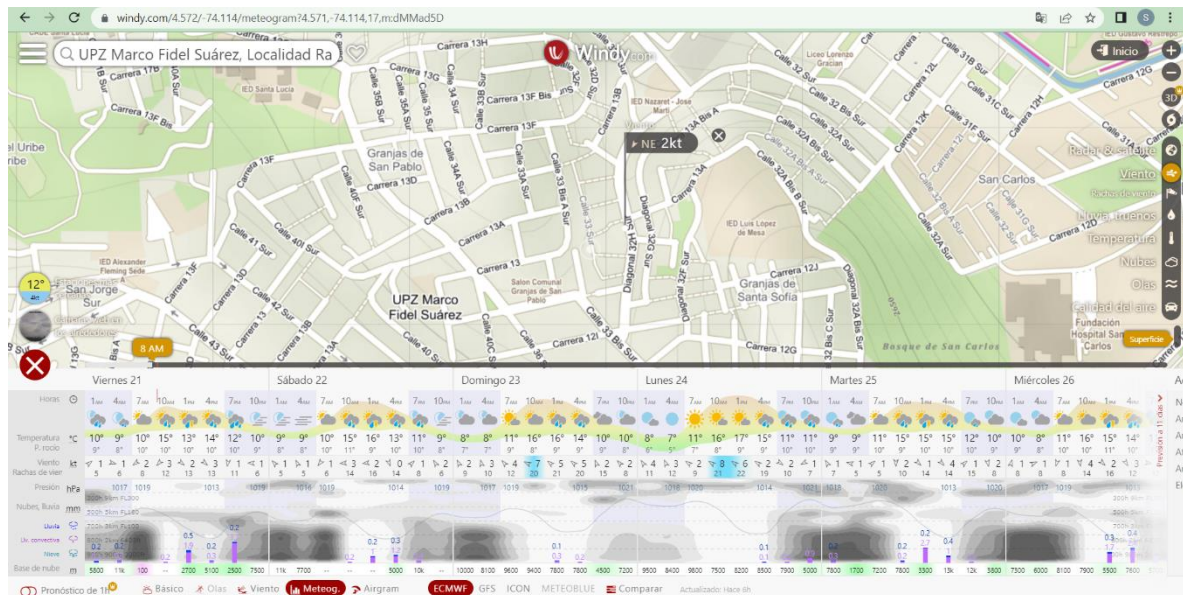


Ilustración 1. Reporte climático zona de influencia del proyecto

Tomada de: <https://www.windy.com/4.572/-74.114/meteogram?4.571,-74.114,17,m:dmMad5D>

Pronóstico para 10 días - Bogotá

A partir de las 8:53 GMT-05:00

vie 21 | Día

19°



72%
NO 13 km/h

Formación de tormentas eléctricas por la tarde. Máxima de 19 C. Vientos del NO de 10 a 15 km/h. 70% probab. de lluvia.



Humedad
76%



Índice UV
Extremo



Amanecer
5:41



Puesta del sol
17:40

vie 21 | Noche

11°



52%
N 5 km/h

Tormentas eléctricas a primera hora. Mínima de 11 C. Vientos del N y variable. 50% probab. de lluvia.



Humedad
95%



Índice UV
0 de 10



Salida de Luna
2:39



Puesta de Luna
15:07

● Cuarto menguante

sáb 22	19°/11°		Tormentas eléctricas	67%	NNO 11 km/h	▼
dom 23	19°/10°		Tormentas eléctricas	67%	ESE 12 km/h	▼
lun 24	19°/11°		Tormentas eléctricas	62%	SE 12 km/h	▼
mar 25	19°/11°		Tormentas eléctricas	64%	NO 13 km/h	▼
mié 26	19°/11°		Tormentas eléctricas	74%	NO 12 km/h	▼
jue 27	19°/11°		Tormentas eléctricas	73%	NNO 11 km/h	▼
vie 28	19°/11°		Tormentas eléctricas	64%	NO 12 km/h	▼
sáb 29	19°/11°		Tormentas eléctricas	60%	NO 14 km/h	▼
dom 30	19°/11°		Tormentas eléctricas	60%	NO 15 km/h	▼
lun 31	19°/10°		Tormentas eléctricas	60%	NO 13 km/h	▼
mar 01	19°/11°		Tormentas eléctricas	60%	NO 12 km/h	▼
mié 02	18°/10°		Tormentas eléctricas	60%	ONO 12 km/h	▼
jue 03	18°/10°		Tormentas eléctricas	60%	NO 13 km/h	▼
vie 04	18°/10°		Tormentas eléctricas	60%	ONO 13 km/h	▼

Ilustración 2. Reporte climático zona de influencia del proyecto

<https://weather.com/es-CO/tiempo/10dias/1/6cc1bcb9db737ac64618018e48406ab8a0486795f49c3d759c70e279cfc72c2a>

En cumplimiento a las obligaciones contractuales descritas en la minuta del CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, cuyo objeto es: “REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C”, y a los entregables estipulados en desarrollo del mismo, en referencia a entrega de informe de ESTUDIO DE REDES EXISTENTES, SUELOS Y GEOTECNIA. Se evidencia que no se cuentan con los insumos necesarios para la culminación de esta Etapa; el trámite con las Empresas de servicios públicos es un trámite que depende de un tercero el cual tiene afectación directa sobre el cronograma y plan de trabajo presentado para la ejecución del proyecto.

A partir de lo anterior, la Asociación de Profesionales y Servicios- APIS SAS, solicita un periodo de suspensión de quince (15) días a partir del 27 de octubre de 2022, con el fin de que lo expuesto a lo largo de este comunicado se logre subsanar y que las condiciones climáticas mejoren para que se pueda realizar una ejecución del proyecto continua, contado con toda la información y autorizaciones requeridas.

El contratista se encuentra altamente comprometido con la correcta ejecución del contrato de consultoría y espera que se logre dar trámite y solución a lo expuesto anteriormente para lograr llevar a feliz término el contrato de la referencia.

Agradezco la atención y colaboración.

Cordialmente,



Pilar Melo Martínez
Representante Legal
