

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00	Página 1 de 4
Fecha:		08	03
		2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Cali, 23-08-2018

AL : Señor Capitán de Corbeta
JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
 Director Agencia Logística Regional Pacífico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta Director Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 012-030-2018 Correspondiente al periodo de 01 agosto de 2018 al 17 de agosto de 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 012-043-2018

CONTRATISTA: TELECOMUNICACIONES WARRIOR SSAS

OBJETO: ADQUISICIONES DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO Y UNIDADES DE NEGOCIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ

VALOR DEL CONTRATO: \$ 37.651.666

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Especificaciones técnicas -aceptac. oferta		Acta de satisfacción								X				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	Página 2 de 4
				Fecha.	08
					





Porcentaje cumplimiento Avance 56.69 %

Demora _____ %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

Oficina Cali

Se instalaron las cámaras nuevas, cambio de video balum, fuente de energía, cableado a las cámaras, instalación de un monitor industrial, instalación de DVR de 16 canales nuevo.

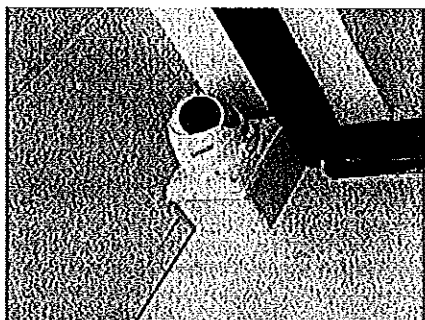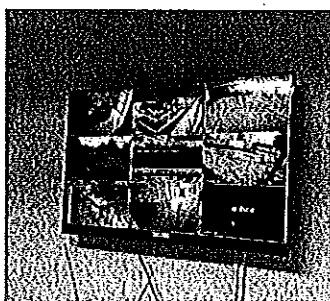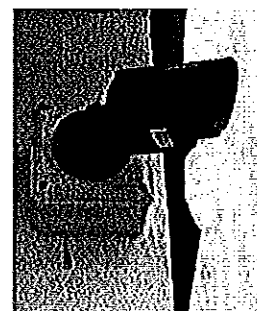

Cad Tumaco

Instalación de las cámaras nuevas cableado a las cámaras, DVR de 16 canales, cambio de video balum, fuente de energía, mantenimiento de alarmas



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00







Página 3 de 4

Fecha.

08

03

2018

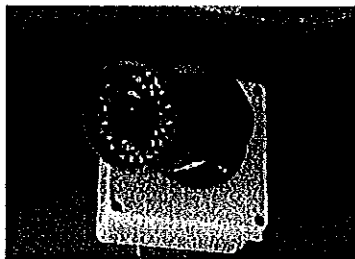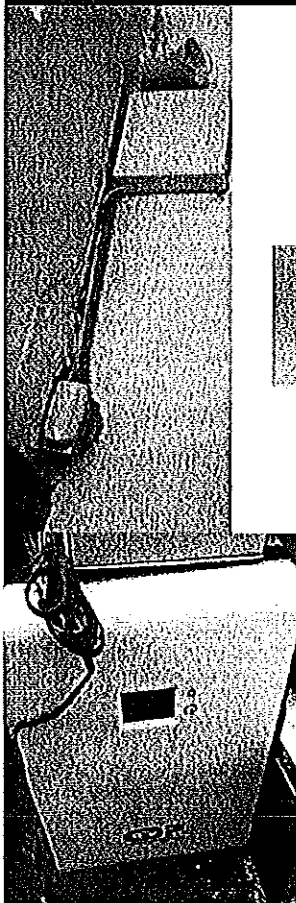

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 4 de 4	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018

4. CONTROL DE PAGOS

Lleve un seguimiento Contable y Financiero respecto de la buena administración de los recursos, llevando un cuadro control de pagos y saldos del contrato que se encuentra a su cargo, facilitando el seguimiento por parte del Ordenador del Gasto.

Informe si este proyecto requiere de sustitución de vigencias presupuestales determinando el valor a sustituir y el nuevo plazo acordado.

Valor Total del contrato		\$37.651.666	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
374	23/08/2018	\$ 16.568.008	\$ 21.083.658
375	23/08/2018	\$ 4.775.669	\$ 16.307.989

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

5. Información fiducias (cuando aplique)

N/A

6. Información personal contratado (cuando aplique)

El contratista cumple con el personal adecuado para las actividades

7. Recomendaciones:

N/A

Atentamente,


 Técnico de Apoyo y Defensa ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
 Supervisor del contrato 012-043-2018
