

[illegible]


|                                     |                        | REPROGRAMACIÓN 4 |          |           |           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                        | 2019             |          |           |           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                     |                        | Enero            |          |           |           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                     |                        | 2019             |          |           |           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES       | %                      | 0,00%            | 0,01%    | 0,03%     | 0,16%     | 0,66%       | 0,39%       | 0,38%       | 0,75%       | 0,70%       | 0,77%        | 0,83%        | 0,34%        | 0,56%        | 0,83%        | 1,15%        | 1,80%        | 3,22%        | 3,94%        | 4,44%        |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$0              | \$27,000 | \$100,000 | \$500,000 | \$197,378   | \$1,187,195 | \$1,170,195 | \$2,302,957 | \$2,322,957 | \$2,342,957  | \$3,575,776  | \$1,204,262  | \$1,298,469  | \$1,704,262  | \$2,520,201  | \$1,434,547  | \$5,666,785  | \$9,859,355  | \$12,026,231 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | %                      | 0,00%            | 0,01%    | 0,05%     | 0,21%     | 0,82%       | 0,66%       | 1,00%       | 2,56%       | 3,26%       | 3,33%        | 3,64%        | 2,73%        | 3,10%        | 3,22%        | 4,55%        | 5,69%        | 7,50%        | 10,77%       | 14,71%       |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$0              | \$27,000 | \$127,000 | \$627,000 | \$1,224,378 | \$2,411,573 | \$3,591,768 | \$6,094,725 | \$8,417,682 | \$10,760,639 | \$14,336,415 | \$15,540,677 | \$16,839,146 | \$18,137,615 | \$19,431,877 | \$21,952,078 | \$27,618,863 | \$37,478,218 | \$51,504,449 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES        | %                      | 0,00%            | 0,01%    | 0,08%     | 0,22%     | 0,68%       | 0,33%       | 0,46%       | 0,30%       | 0,56%       | 0,16%        | 0,47%        | 0,55%        | 0,14%        | 0,42%        | 0,71%        | 0,74%        | 0,60%        | 0,00%        | 0,00%        |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$0              | \$27,529 | \$226,889 | \$694,225 | \$248,011   | \$968,880   | \$1,213,139 | \$990,920   | \$1,145,440 | \$496,871    | \$1,416,521  | \$1,378,008  | \$438,214    | \$1,296,021  | \$2,163,108  | \$2,273,855  | \$0          | \$0          | \$0          |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | %                      | 0,00%            | 0,01%    | 0,09%     | 0,30%     | 0,98%       | 0,71%       | 1,02%       | 1,29%       | 1,75%       | 1,91%        | 2,40%        | 2,95%        | 3,40%        | 3,82%        | 4,53%        | 5,27%        | 5,87%        | 5,87%        | 5,87%        |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$0              | \$27,529 | \$254,418 | \$948,643 | \$1,196,654 | \$2,365,533 | \$3,578,672 | \$4,569,592 | \$5,715,032 | \$6,961,903  | \$8,378,424  | \$9,756,432  | \$10,194,646 | \$11,490,667 | \$13,653,775 | \$15,927,630 | \$16,201,485 | \$16,201,485 | \$16,201,485 |

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*                                                                      | VALOR INICIAL        | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                     | VALOR ACTUALIZADO    |                 |                |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                        | \$41.440.995         | \$ 366.526      | 0,81%          |
|                                                                                                     | \$45.484.103         |                 |                |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS OBRAS Y OBRAS DE LA SEMANA                              | \$1.080.000          | \$ -            | 0,00%          |
|                                                                                                     | \$1.080.000          |                 |                |
| PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24                                  | \$1.524.575          | \$ 68.615       | 3,96%          |
|                                                                                                     | \$1.734.534          |                 |                |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS       | \$1.281.000          | \$ 1.008.341    | 78,72%         |
|                                                                                                     | \$1.281.000          |                 |                |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$243.390            | \$ 191.585      | 78,72%         |
|                                                                                                     | \$243.390            |                 |                |
| GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUDE PAGA A INAPSA)                              | \$7.772.765          | \$ 133.753      | 1,72%          |
|                                                                                                     | \$7.772.765          |                 |                |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUDE IVA)              | \$340.000            | \$ 1.985        | 0,58%          |
|                                                                                                     | \$340.000            |                 |                |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)                                                       | \$53.681.825         | \$ 1.770.804    | 3,06%          |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')                                         | \$57.935.851         |                 |                |
| <b>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</b>                                                         | <b>\$359.871.764</b> |                 |                |
| <b>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</b>                                          | <b>\$406.967.087</b> |                 |                |


**NOTA:**  
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista Interventor y Dirección Territorial.

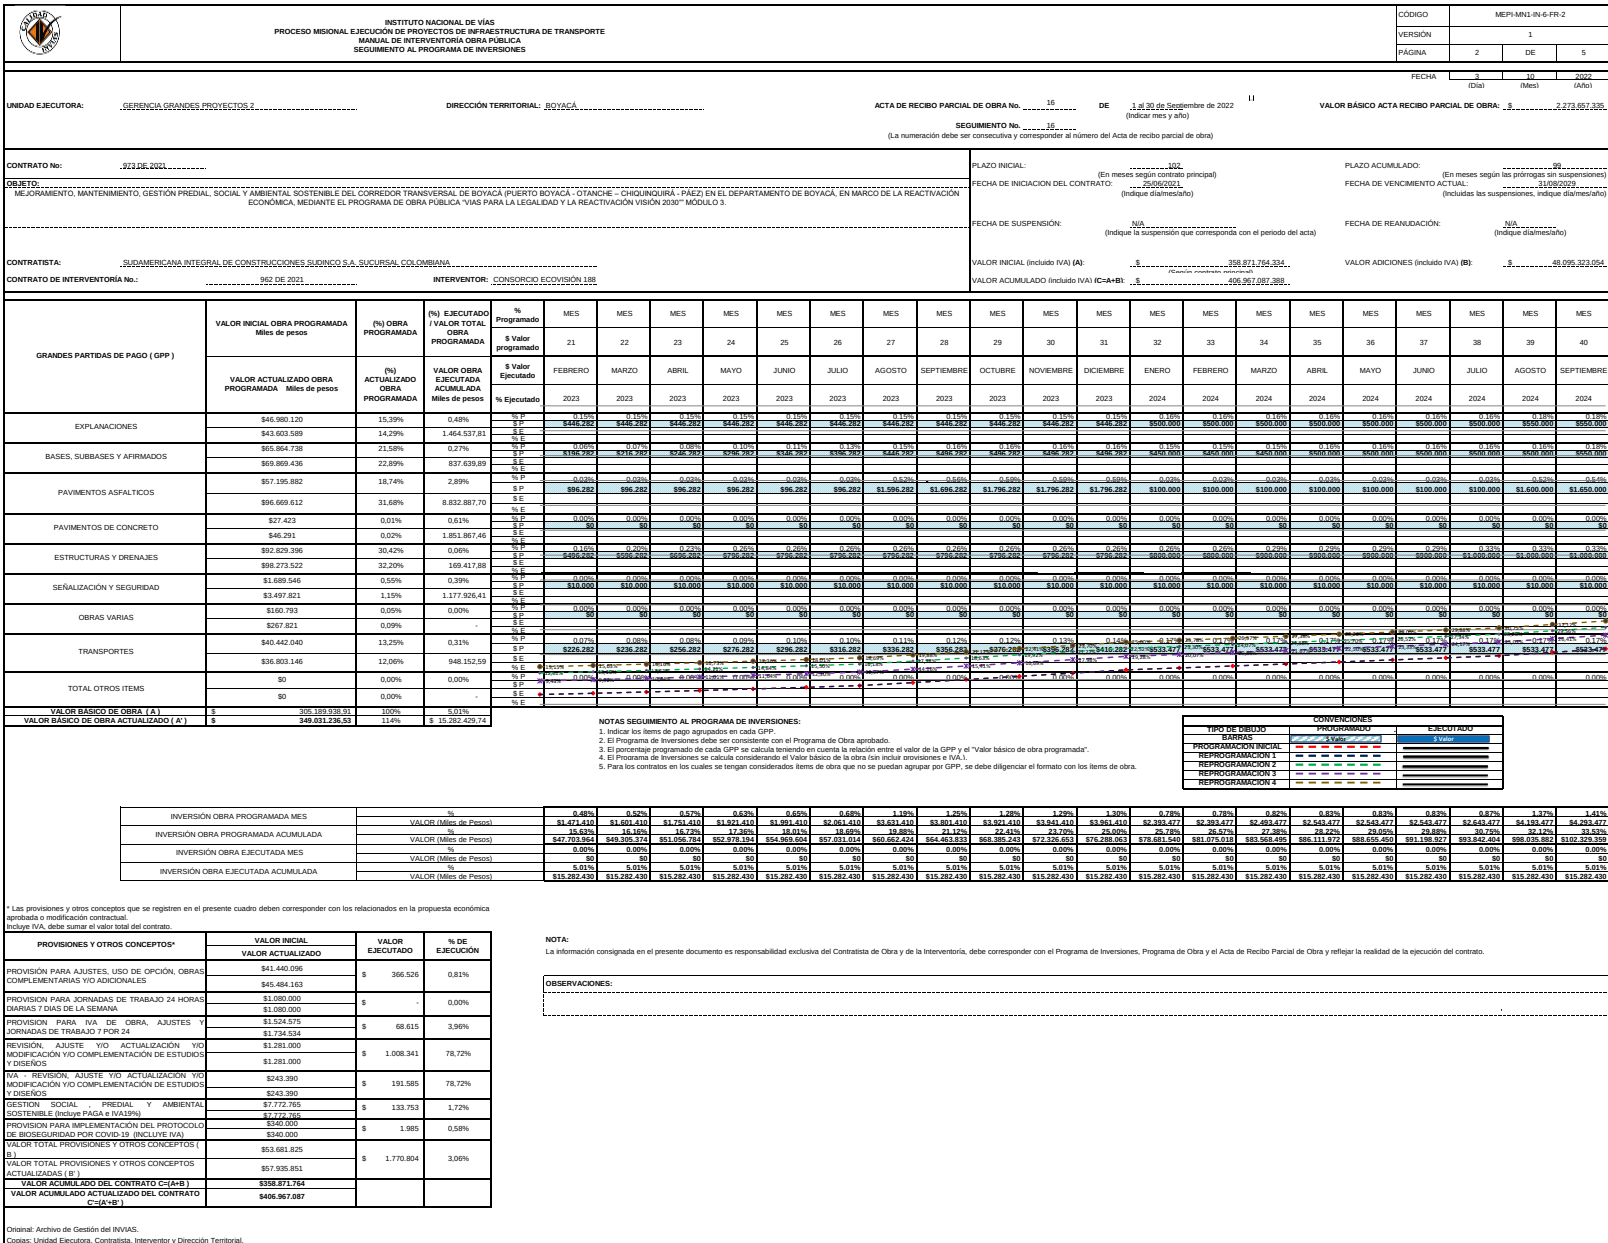





|                   |                              |                        |        |                                       |                                                         |    |                                                            |
|-------------------|------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: | GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACÁ | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 | DE 1 al 30 de Septiembre de 2022<br>(Indicar mes y año) | II | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.273.657.396 |
|-------------------|------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|

|                          |                                                           |                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: 973 DE 2021 | PLAZO INICIAL: 102<br>(En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                                            |  | FECHA DE REANUDACIÓN: |  |
| (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |  | (Indique día/mes/año) |  |

[illegible]

| TITULO PRIMERO DEL MARCO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | P.P. |  | P.P. y P.E. de GPP |  | P.P. y P.E. de NVA      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--------------------|--|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>BARRIO</b>           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>PROGRAMADO</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>EJECUTADO</b>        |  |
| <p>1. Indicar los ítems de pago autorizados en cada GPP.</p> <p>2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de obra relacionado.</p> <p>3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada".</p> <p>4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el "valor básico de obra" (no incluir provisiones o NVA).</p> <p>5. Para los corrales en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan pagar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.</p> |  |  |  |  |  |      |  |                    |  |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>REPROGRAMACIÓN 1</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>REPROGRAMACIÓN 2</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>REPROGRAMACIÓN 3</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |      |  |                    |  | <b>REPROGRAMACIÓN 4</b> |  |

[illegible]

**NOTA:**  
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**NOTA:**  
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

