

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
		Página 1 de 6

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 02 de noviembre de 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
OBJETO	SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C 74.376.933 DE DUITAMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Se llevó a cabo la supervisión a las actividades ejecutadas dentro del contrato de servicios No CSE-20220003, Los sectores intervenidos en este periodo obedecen a una priorización de acuerdo a las afectaciones de la capa de rodadura y niveles de movilidad, avaladas por el secretario de Infraestructura. Para tal fin se ejecutó la intervención Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al 14 de octubre del presente año.

Las cantidades, valores, y aspectos técnicos consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con las que el contratista ejecuto las obras.

ASPECTOS TECNICOS:

De acuerdo a la ejecución de la obra se evidenciaron los siguientes aspectos técnicos:

- El personal empleado en la obra fue el adecuado para la ejecución del contrato
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y demás obligaciones contractuales y legales por parte del contratista
- Para el desarrollo de la obra el contratista ha utilizado el recurso técnico y administrativo idóneo requerido para la cabal ejecución del contrato
- Se realizó el control de la programación física y financiera, velando por que el proyecto se desarrolle según lo programado y presupuestado, enfocado en la parte técnica del mismo.
- Se llevó a cabo el control en la ejecución de las actividades de obra, con el fin de cumplir las condiciones técnicas de cada una.

Los sectores intervenidos fueron los siguientes:

Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al 14 de octubre del presente año.

A la fecha se ha realizado la ejecución de las actividades contratadas y necesarias para la ejecución de obras de parcheo en diferentes sectores del municipio, logrando después del

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Fecha Aprobación: 30-05-2011
		Versión: 0
NIVEL CENTRAL		Página 2 de 6



revisar y efectuar las mediciones en campo así un 97,60 % de ejecución. Las actividades desarrolladas fueron las presentadas a continuación, las cuales se registraron detalladamente en la sabana de cantidades y memoria de cálculo.

ITEM 1. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES (INCLUYE CORTE)

Este ítem se ejecutó con el servicio de mano de obra para la apertura de la caja con retiro de sobrantes, se ha ejecutado previa a la definición de las áreas a intervenir. Se realizó la intervención de la zona centro de la ciudad, principalmente en las áreas definidas en estos sectores: Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al 14 de octubre del presente año.



36

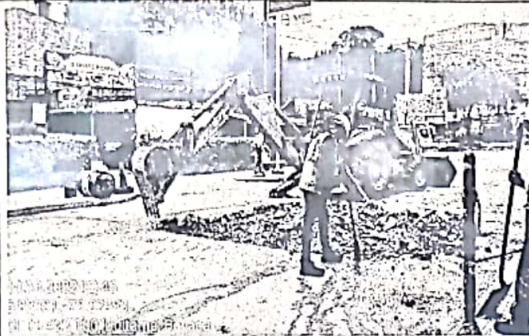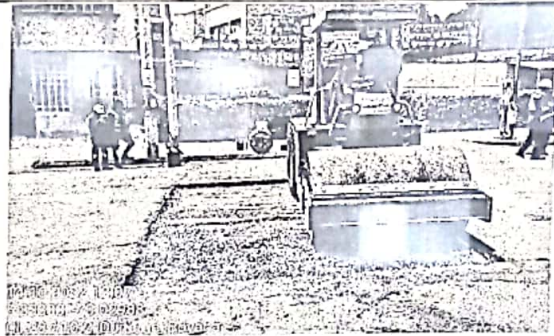


ITEM 2: EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM ()**

En esta acta parcial no se llevó a cabo la ejecución de este ítem.

ITEM 3. IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO

El contratista de obra realizo el servicio para la imprimación en las áreas definidas por esta dependencia, tomando como referencia la afectación de los daños de la capa de rodadura, de acuerdo a su severidad, para posterior instalación de la mezcla asfáltica, con el quipo idóneo y personal exigido para este tipo de actividades, evidenciado a continuación.

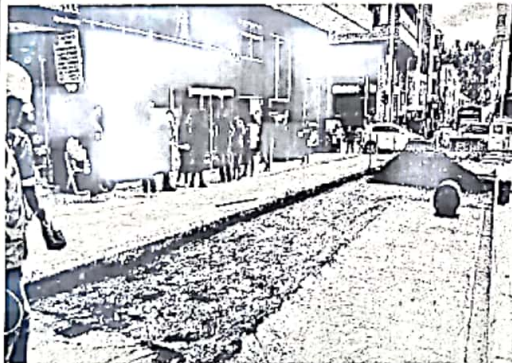


ITEM 4. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO

Se llevó a cabo la recuperación mediante obras de parcheo en los sectores citados al inicio de este informe, una vez culminadas las anteriores actividades y de acuerdo ha visto bueno de parte de la supervisión, se procede a realizar las actividades de extendida y compactación de la mezcla asfáltica suministrada por el municipio. Es decir, una vez se tienen las áreas listas con actividades

de cajeo e imprimación, se procede a realizar la ejecución de la mano de obra para la instalación y compactación de la mezcla asfáltica para las áreas definidas a recuperar con parcheo.



 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: R- GJ-012
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES		Fecha Aprobación: 30-05-2011
			Versión: 0
			Página 5 de 6

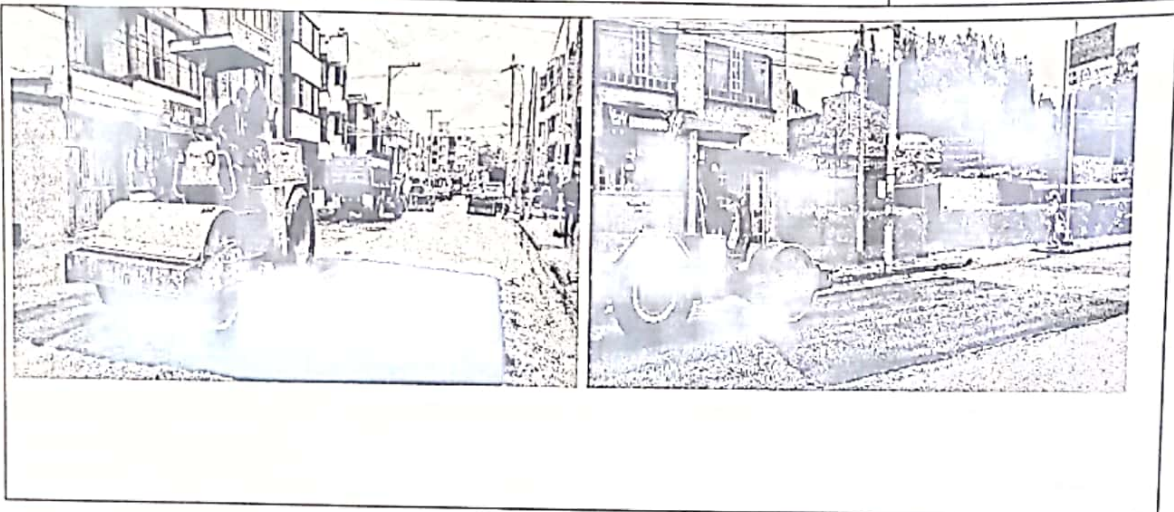

ITEM 5: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA

Se prestó el servicio de transporte de mezcla asfáltica desde el lugar indicado por el contratante, hasta los lugares a intervenir con este contrato mediante obras de parcheo



ITEM 6: TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO).

Para la presente acta no se llevó a cabo la ejecución de este ítem.

ITEM 7. HORAS VIBROCOMPACTADOR

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ítem.

ITEM 8. HORAS RETROEXCAVADORA

Con el fin de llevar a cabo actividades en los diferentes frentes de trabajo que tiene la secretaria de infraestructura, se ejecutaron las cantidades citadas en la sabana anexa al presente informe ✓

ITEM 9. HORAS MOTONIVELADORA

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ítem.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Fecha Aprobación: 30-05-2011
NIVEL CENTRAL		Versión: 0
		Página 6 de 6

ASPECTOS FINANCIEROS:

El contratista de obra a ejecutado a la fecha el 97,60 %.

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$ 408.820.457,67
	* APOORTE ALCALDIA	
	* APOORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	\$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$ 408.820.457,67
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 33.038.145,85
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 365.964.455,00
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	\$ 399.002.600,85
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	\$ 9.817.856,82

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:


Se realizó el respectivo control. Seguimiento y evaluación de las condiciones y procesos relacionados con la ejecución del contrato de obra pública cuyo objeto es "REALIZAR LA SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Así mismo Se Verificó que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encontraran afiliados al sistema de seguridad social y tuvieran las condiciones y los elementos adecuados para la realización de las diferentes actividades. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en el contrato, igualmente se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato verificando principalmente la calidad de los materiales y mano de obra usados en el desarrollo del contrato.

Las cantidades, valores, y aspectos técnicos consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con las que el contratista ejecuto las obras.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS:

- ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION
- INFORME CONTRATISTA
- SABANA DE CANTIDADES
- SEGURIDAD SOCIAL


 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
 TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

CONTRATO CSE-20220003 "SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			ACTA PARCIAL 1			ACTA PARCIAL 2			ACTA PARCIAL 3			ACTA PARCIAL 4			CONDICIONES MODIFICADAS #1			RECIBO FINAL			ACUMULADO		
		UNO	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ABERTURA MECANICA DE CALA Y RETIRO DE SOBRESANTES (INCLUIR CORTE)	M3	1611.00	\$ 88.874.61	\$ 143.178.996.71	1611.00	\$ 143.178.996.71	320.00	\$ 28.439.875.20	1611.00	\$ 143.178.996.71	320.00	\$ 28.439.875.20	1611.00	\$ 143.178.996.71	320.00	\$ 28.439.875.20	1611.00	\$ 143.178.996.71	320.00	\$ 28.439.875.20	1611.00	\$ 143.178.996.71	320.00	\$ 28.439.875.20
2	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA ASPHALTO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 8% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR INCLUIR ACONDICIONAMIENTO DE 3 KM (*)	M3	565.20	\$ 24.354.50	\$ 14.252.253.40	565.20	\$ 14.252.253.40	0.00	\$ 0.00	565.20	\$ 14.252.253.40	0.00	\$ 0.00	565.20	\$ 14.252.253.40	0.00	\$ 0.00	565.20	\$ 14.252.253.40	0.00	\$ 0.00	565.20	\$ 14.252.253.40	0.00	\$ 0.00
3	IMPRESION INCLUIR BARRIDO Y SOPADO	M2	10.740.00	\$ 1.374.98	\$ 14.787.231.50	10.740.00	\$ 14.787.231.50	2.450.00	\$ 3.368.201.00	10.740.00	\$ 14.787.231.50	2.450.00	\$ 3.368.201.00	10.740.00	\$ 14.787.231.50	2.450.00	\$ 3.368.201.00	10.740.00	\$ 14.787.231.50	2.450.00	\$ 3.368.201.00	10.740.00	\$ 14.787.231.50	2.450.00	\$ 3.368.201.00
4	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO	M3	854.00	\$ 108.849.99	\$ 93.420.741.00	854.00	\$ 93.420.741.00	352.00	\$ 38.315.195.46	854.00	\$ 93.420.741.00	352.00	\$ 38.315.195.46	854.00	\$ 93.420.741.00	352.00	\$ 38.315.195.46	854.00	\$ 93.420.741.00	352.00	\$ 38.315.195.46	854.00	\$ 93.420.741.00	352.00	\$ 38.315.195.46
5	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	M3/M	11.184.73	\$ 1.659.41	\$ 18.624.406.11	11.184.73	\$ 18.624.406.11	7.302.00	\$ 12.562.028.72	11.184.73	\$ 18.624.406.11	7.302.00	\$ 12.562.028.72	11.184.73	\$ 18.624.406.11	7.302.00	\$ 12.562.028.72	11.184.73	\$ 18.624.406.11	7.302.00	\$ 12.562.028.72	11.184.73	\$ 18.624.406.11	7.302.00	\$ 12.562.028.72
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ASPHALTO Y GRANULAS DESPUES DE 3 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISEÑO)	M3/M	2.433.3	\$ 1.659.59	\$ 4.155.612.85	2.433.3	\$ 4.155.612.85	0.00	\$ 0.00	2.433.3	\$ 4.155.612.85	0.00	\$ 0.00	2.433.3	\$ 4.155.612.85	0.00	\$ 0.00	2.433.3	\$ 4.155.612.85	0.00	\$ 0.00	2.433.3	\$ 4.155.612.85	0.00	\$ 0.00
7	HORAS VIBROCOMPACTADORA	HR	13.00	\$ 91.150.00	\$ 1.184.950.00	13.00	\$ 1.184.950.00	3.00	\$ 273.450.00	13.00	\$ 1.184.950.00	3.00	\$ 273.450.00	13.00	\$ 1.184.950.00	3.00	\$ 273.450.00	13.00	\$ 1.184.950.00	3.00	\$ 273.450.00	13.00	\$ 1.184.950.00	3.00	\$ 273.450.00
8	HORAS RETROCAMADORA	HR	13.00	\$ 100.500.00	\$ 1.306.500.00	13.00	\$ 1.306.500.00	30.00	\$ 3.015.000.00	13.00	\$ 1.306.500.00	30.00	\$ 3.015.000.00	13.00	\$ 1.306.500.00	30.00	\$ 3.015.000.00	13.00	\$ 1.306.500.00	30.00	\$ 3.015.000.00	13.00	\$ 1.306.500.00	30.00	\$ 3.015.000.00
9	HORAS MOTONIVELADORA	HR	10.00	\$ 150.000.00	\$ 1.500.000.00	10.00	\$ 1.500.000.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 1.500.000.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 1.500.000.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 1.500.000.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 1.500.000.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12		\$ 256.759.124.12
ADMINISTRACION (2%)					\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82
IMPREVISTOS (2%)					\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82		\$ 5.135.182.82
UTILIDAD (1%)					\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24		\$ 2.567.591.24
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28		\$ 74.192.103.28
VALOR COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO					\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40		\$ 330.951.227.40
COMPONENTE AMBIENTAL					\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54		\$ 13.569.302.54
COMPONENTE BIOSSEGURIDAD					\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33		\$ 11.342.314.33
COMPONENTE PUT					\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40		\$ 12.546.323.40
COSTO TOTAL					\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67		\$ 470.929.457.67

HUGO RAMIRO MORALES
C.C. 1.055.218.532
SUPERVISOR

JOSE JULIAN TORRES PERAZOLA
C.C. 74.376.631.96 Duitama
R.L. FERRELL S.A.S. NIT. 900497897-7
CONTRATISTA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DURAMA-BOYACA	7634318	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-10	33796919	9441829221	E	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,868,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$965,400	\$0	\$0	\$965,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$794,700	\$0	\$0	\$0	\$794,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$170,700	\$0	\$0	\$0	\$170,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$420,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$241,400	\$0	\$0	\$0	\$241,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					7	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$2,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$118,700	\$0	\$0	\$0	\$118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL					7	\$1,868,200	\$0	\$0	\$1,868,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DURAMA-BOYACA	7634318	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	33796919	9441829221	E	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,868,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lvt	vjp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA + ICBF	Total Aportes
1	CC	1002457180	AVELLA JUAN																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	SI	\$309,600
2	CC	74370559	MONSALVE JUAN	X																230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	SI	\$309,600
3	CC	1072496924	PINZON EDUAR		X															230301	29	\$966,667	\$154,700	EP5037	29	\$966,667	\$38,700	CCF10	29	\$966,667	\$38,700	14-23	29	\$966,667	\$67,300	29	\$0	\$0	SI	\$299,400
4	CC	1052396486	RANGEL CESAR		X															230201	2	\$66,667	\$10,700	EP5008	2	\$66,667	\$2,700	CCF10	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$4,700	2	\$0	\$0	SI	\$20,800
5	CC	5626301	SOCHA MARCO																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	SI	\$309,600
6	CC	1057603122	SUAREZ JOSE																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	SI	\$309,600
7	CC	4086060	SUAREZ MANUEL																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	SI	\$309,600
Total Afiliados (7)																						\$6,033,334	\$965,400			\$6,033,334	\$241,400			\$6,033,334	\$241,400			\$6,033,334	\$470,000		\$0	\$0		\$1,868,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDNA a RCB
4010047887	7	FERRIZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CALLE 14 15 18 OFICINA 2017	DURANIA-BOYACA	7634318	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2022-11	42919133	9442919133	E	2022/11/24	2022/11/30	BANCO AV VILLAS	6	\$493.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tan	up	usp	vip	cor	vst	sin	lga	lma	vac	arg	vcl	vi	vlg	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEDNA a RUB	Totales Reportes	
1	CC	1002457180	AYELLA JUAN	X																230201	14	\$466.667	\$74.700	EP5041	14	\$466.667	\$18.700	CCF10	14	\$466.667	\$18.700	14-23	14	\$466.667	\$12.500	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1466.600
2	CC	74370559	MOHSALVE JUAN																	230201	30	\$1.000.000	\$160.000	EP5037	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF10	30	\$1.000.000	\$40.000	14-23	30	\$1.000.000	\$40.000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1040.000
3	CC	9426301	DOCHA MARCO	X																230301	14	\$466.667	\$74.700	EP5041	14	\$466.667	\$18.700	CCF10	14	\$466.667	\$18.700	14-23	14	\$466.667	\$12.500	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1046.600
4	CC	1057603122	SUAREZ JOSE	X																230301	14	\$466.667	\$74.700	EP5005	14	\$466.667	\$18.700	CCF10	14	\$466.667	\$18.700	14-23	14	\$466.667	\$12.500	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1046.600
5	CC	4086600	SUAREZ MAURIEL	X																230301	14	\$466.667	\$74.700	EP5037	14	\$466.667	\$18.700	CCF10	14	\$466.667	\$18.700	14-23	14	\$466.667	\$12.500	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1046.600
Total		Afiliados(5)																					\$2.866.668	\$418.800			\$2.866.668	\$114.800			\$2.866.668	\$114.800			\$2.866.668	\$199.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1046.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900497897	7	FERIEL S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2022-10	2022-11	42919133	9442919133	E	2022/11/24	2022/11/30	BANCO AV VILLAS	6	\$893,600	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$458,800	\$2,800	\$0		\$461,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$298,800	\$1,800	\$0		\$300,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$1,000	\$0		\$161,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$199,600	\$1,200	\$0		\$200,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$199,600	\$1,200	\$0		\$200,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$114,800	\$700	\$0		\$115,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$114,800	\$700	\$0		\$115,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$114,800	\$900	\$0		\$115,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$58,700	\$400	\$0		\$59,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$37,400	\$300	\$0		\$37,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$18,700	\$200	\$0		\$18,900	
TOTAL				5	\$888,000	\$5,600	\$0		\$893,600	
