

- Continúa la limpieza de ladrillo, braseo y acopro.
- Continúa el saneamiento de la madera desmontada de los sectores 3, 4 y 5. Posterior braseo y almacenamiento.
- Continúa la instalación de red eléctrica de baja tensión. Provisional.
- Previa autorización de la interventoría, se realiza la liberación de baldosa de cemento decorada verde en espacio 150.
- Liberación de paneles bajo enchape de madera por su mal estado de conservación. en espacios 150 y 149.
- Adecuación de tanque para baños del campamento. (Reutilización de aguas lluvias).
- Liberación de morteros de nivelación y pega en espacio 150.
- Continúa la dilatación de la placa del parqueadero (Espacio 160).

Arq

[Signature]
Ing. Residente Obra.

Viernes 29 Julio de 2022.

SE COORDINA CON LA ARQUITECTA RESIDENTE DE CONSERVACIÓN, EL REGISTRO DE ALGUNOS ELEMENTOS COMO GUARDAESCOBA, QUE NO SE PUEDE CONSERVAR, POR LA IMPOSIBILIDAD DE SU DESMOLTE, ASÍ COMO COMO EL DISEÑO EN MAMPOSTERÍA DEL MURO DEL EJE C, 7-8, EL CUAL HACE PARTE DE UN RETOZAMIENTO ESTRUCTURAL, LO CUAL REQUIERE DESMOLTE POR LA ADECUACIÓN ESPACIAL REQUERIDA, POR OTRO LADO, DE REQUERIRSE, SE INCLUIRAN OTROS ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN QUE MERECEN, PRECIA VALORACIÓN COMPUTA.

[Signature]
JESÚS ROSA L.
RESIDENTE

Arq

[Signature]
Ing. Residente

Clima: Geco - Soleado.

- Continúa la construcción de sobrecubierta en el sector 1.
- Continúa la construcción de campamento exterior, fachada norte. Divisiones en madera reutilizada.
- Continúa saneamiento de elementos de madera desmontados producto de la demolición de los sectores 3, 4 y 5.
- Liberación de morteros de pega y nivelación en el sector 1.

Norma

- Continúa la limpieza de ladrillo recuperado
- Liberación de paneles bajo enchape de madera por su mal estado de conservación.
- Se realiza por parte de topografía, el replanteo de ejes constructivos sobre el sector 1 (conservación).
- Se realiza reunión con los asesores de geotecnia por parte del consultor, interventoría y constructor, con el fin de definir proceso constructivo de la excavación para tanque 1 y cimentaciones del sector 1, definiendo así criterios de intervención, los cuales fueron consignados en acta de reunión. La consultoría se compromete a enviar concepto vía correo electrónico.

Sábado

Arq.



Arq. Residente Obra.


Sábado 30 Julio de 2022.

Clima: Seco - Soleado.

- Continúa la construcción de la sobrecubierta sobre el sector 1.
- Continúa la construcción de campamento exterior - Fachada norte. Aparatos Sanitarios.
- Continúa la limpieza de ladrillo recuperado.
- Continúa la liberación de paneles bajo enchape de madera por su mal estado de conservación.
- Continúa el saneamiento de elementos de madera demolida de los sectores 3, 4 y 5.
- Continúa la construcción de cerramiento exterior (puertas corredizas)
- Continúa la construcción de cerramiento interior para campamento eléctrico e hidráulico.

Arq.




Arq. Residente Obra.

Lunes 01 Agosto de 2022

Clima: Seco

- Continúa construcción de sobrecubierta en sector 1
- Continúan actividades de construcción de campamento exterior sobre fachada norte
- Siguen actividades de saneamiento de elementos

Norma

- de madera desmontada de los sectores 3, 4 y 5
- Liberación de sobrepiso en espacio 147 y 149
 - Se hace liberación de mampostería en bloque de esconia en segundo piso en espacio 257
 - Excavación para zapatas en ejes B.S y 1.2
 - Demolición de concreto ciclopeo en eje B.S/A.1, y e 1.2/A.1, 1.2/C.1 Demolición de sobrecimiento en ladrillo.
 - Continúa el replanteo de ejes con la comisión topográfica
 - Se hace replanteo para cámaras eléctricas que se encuentran ubicadas sobre andenes

APR

JUL

ING RESIDENTE
CONSORCIO IS

Martes 02 Agosto de 2022

Clima: Llovizna moderada de 07:00 a 10:30 a.m.

- Siguen actividades de construcción de sobrecimiento en sector 1
- Siguen las actividades de construcción de campamento en anden fachada norte.
- Continúa demolición de concreto ciclopeo en eje 1.2/C.1.
- Continúa excavación para zapata en eje B.S/C.1 y viga VC001
- Inicia excavación para zapata en eje 2.1/K.S. y 2.4/K.S.
- Se realiza corte y desmonte de listón de madera en entrepiso de espacio 255, para poder realizar el desmonte de las vigas de madera que se encuentran en la ubicación de cruce de columnas
- Inicia excavación mecánica y demolición de cimientos en sector 5 entre ejes 9.1-11.1/A.1-D.1
- Inicia demolición de anden para construcción de cámara eléctrica en costado norte.
- Liberación de pañete de cieloraso en esterilla

de grava en espacio 150, 149, 147, 145

- Corte con pulidora en anden sector 5, para dilatar la demolición de sobrecimiento.
- Liberación de cielo raso drywall en punto fijo piso 2

Arb

INTERVENTORIA

ING RESIDENTE
CONSORCIO IS

Miércoles 03 JUNIO / 2022.

CLIMA: Seco soleado.

- LA INTERVENTORIA RECOMIENDA SEGUN LAS SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS EN CUANTO A LAS ESCRIBIENDO MECANICAS Y MANUALES REALIZADOS, TENER ESPECIAL CUIDADO EN LA EXCAVACION ENTRE EL SECTOR 5 y 1, REALIZAR EL ENTIBADO NECESARIO Y POR TRINCHERAS REALIZAR LA EXCAVACION.
- SE DEBE REALIZAR LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PARA PODER REALIZAR EL RELENO NECESARIO. PARA LA REALIZACION POSTERIOR DE LLENOS DE OBRA.

INTERVENTORIA

• Con relación a la nota de la interventoria sobre la selección del material producto de la excavación, no ha sido posible dicha selección, ya que como se evidencio en sitio conjuntamente con residente de interventoria; el material que se encuentra en la excavación en sector 5, son mezclas de escombros con limas y arcillas, material no apto para realizar rellenos compactos. Por tanto este material se retira de la obra para disponerlo en botadero. A medida que avanza las obras de excavación, se ha ido seleccionando el poco material adecuado para realizar rellenos.

Arb

Norma

Actividades realizadas:

- Continúan actividades de construcción de sobrecubierta, inicia instalación de teja en lámina galvanizada
- Inicia construcción de poceta para curado de las muestras de concreto.
- Continúan actividades de replanteo topográfico
- Continúan excavaciones y demolición de sobrecimiento y concretos ciclopeos encontrados en eje K.5/2.1-24
- Sigue excavación mecánica en sector 5
- Continúan actividades de construcción de campamento
- Sigue liberación de pañete de cielo raso en estera de guadua en espacio 150, 149, 147, 145
- Se hace retiro de material producto de excavación de sector 5, material no apto para realizar rellenos ya que es una mezcla de limos y arcilla
- Se realiza inspección de los elementos de madera de las cerchas en sector 1, para identificar los elementos que están en mal estado, para su posterior reemplazo. Esta inspección se realiza conjuntamente con el arquitecto residente de la interventoría.

[Firma]

[Firma]
INTERVENIENDO

[Firma]

ING RESIDENTE
CONSORCIO IS

Jueves 04 de Agosto de 2022

Clima: Lloviznas leves en horas de la tarde. 2 a 3pm

- Continúan actividades de construcción de sobrecubierta con la instalación de teja en lámina galvanizada.
- Continúa excavación mecánica en sector 5
- Siguen actividades de construcción de campamento sobre fachada norte.
- Continúa excavación para zapatas en eje K.5/2.1 y K.5/24 se hace además la demolición de

concreto ciclopeo hallado en estas áreas de zapata.
 Inicia excavación para zapata en eje C.1/7.8
 Se hace exploración en columna C17 (circular en
 verso), encontrando que es un elemento construido en
 adobe, lo que no corresponde a lo indicado en
 planos. Se socializa con interventora y se solicita
 clarificación del proceso a seguir para realizar el
 reforzamiento estructural.

[Signature]
 INTERVENTORA

[Signature] ING RAMIRO FORERO
 RESIDENTE CONSORCIO IS

[Signature]

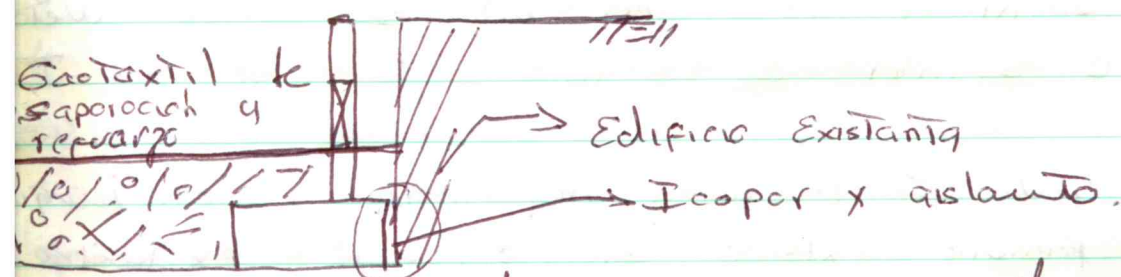
VIERNES 5 DE AGOSTO 2022

EN VISITA DE NUESTRO ASESOR GEOTECNICO
 SE HACE RECORRIDO PARA REVISAR LAS EXCAVACIONES
 Y PROYECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y
 SE CONCEPTEA LO SIGUIENTE:

1. Visita para reconocer las excavaciones para la
 limitación de las estructuras de reforzamiento,
 estructura nueva y tanques, encontrándose de acuerdo a
 establecido en el estudio geotécnico.

2. Las excavaciones de limitación de reforzamiento no presentan
 ninguna novedad y seguir según diseños.

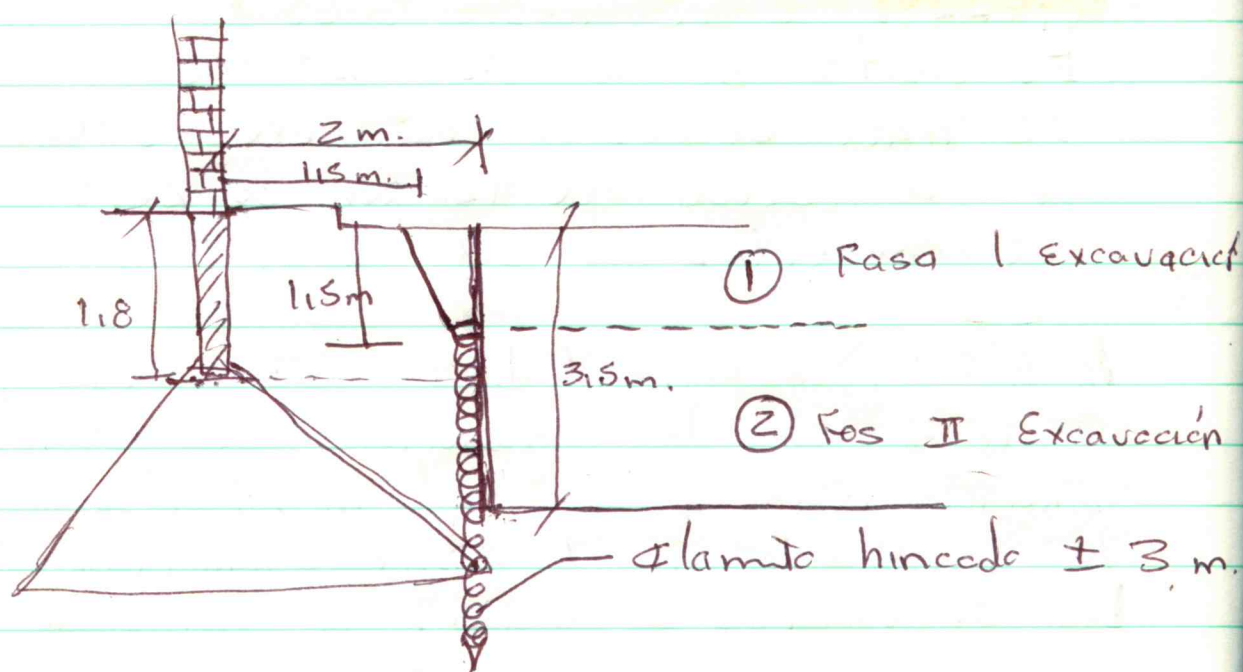
3. Las excavaciones del edificio nuevo se encuentran en
 proceso, el material de limitación se encuentra acorde al
 estudio y no se notan anomalías o sitios blandos
 que requiera aplicar la construcción de los ejes
 10.1 y 10.2 para continuar en el menor tiempo posible
 la limitación del edificio existente, se recomienda.



Una vez fundido el Cinto Continuo se rellena con
 R.C.D. de la obra hasta nivel superior del ~~edificio~~.

del Cimiento y luego hasta el nivel inferior de la Viga de Amarra, se Acumpeña con un Geotextil de Separación y refuerzo y luego se lleve a nivel de Piso arquitectónico con Roca. compactado al 95%.

Una vez Bausado nuevamente las Excavaciones para el Tanque de Agua Potable, se recomienda q' la excavación en lo posible se Aleja ~~mas~~ lo mas posible del Paramento de la Edificación Constructiva, tomando en cuenta q' el nivel de Apoyo de la Cimentación Existente. ~~esta~~ 1.8 m de profundidad se recomienda



el Proceso Constructivo sería.

- 1 Excavación Fosa I
- 2 Hincado de los alambres de madera
- 3 Excavación Fosa II
- 4 Apuntalamiento al Sistema con Tablas.
- 5 Apuntalar el Círculo con ~~una~~ Cacha metálica o similar. c/ 3 m. a lo largo del Tanque.

Igualmente se recomienda impermeabilizar el Tanque en el Perimetro externo con sistemas existentes en el Mercado.

Norma

~~Javier A. Miller J.~~

V.º J.º

Actividades realizadas:

- Siguen actividades de construcción de la sobrecubierta.
- Continua construcción de campamento en fachada norte
- Continua excavación mecánica en sector 5.
- Inicia excavación para zapatas en eje 8.1/C1 y 8.1/C4
- Ingresó a obra material de agregados para mezcla de concretos de limpieza
- Se hace exploración de cimiento de columna C17, encontrando un sillar en piedra.

Arq

RESIDENTE
CONSORCIO IS

Sábado 06 de Agosto de 2022

Clima: lluviosa leve

Actividades desarrolladas:

- Inicia desmonte de teja de fibrocemento en sector 1, para iniciar actividades de estructura de madera para techos, mantenimiento, restauración.
- Inicia excavación para zapata a eje C1/7.1
- Continua excavación mecánica en sector 5
- Continua excavación para viga VC003 en eje 1.2
- Se dispone de personal para realizar ~~limpieza~~ limpieza (aseo) sobre vía
- Continua construcción de campamento en fachada norte

Arq

RESIDENTE
CONSORCIO IS

Lunes 8 de Agosto de 2022

EN VISITA DE NUESTRO Asesor Estructural se inspeccionaron varios Aspectos que tienen que ver con lo encontrado en obra, previamente reportados por el consorcio IS como son: tema de la columna central C17,

Placa entre A.1 y C.1 entre ejes 2.1 y 4.1, Voladizo de acceso y empalmes Madera, de acuerdo a planteamiento de reutilización, y revisión de cercha eje 9 para su desplazamiento.

- Respecto a la columna CT-17 ubicada en el eje E4, se evidencia que la misma está construida en mampostería; esto no concuerda con lo concebido en el diseño estructural.

Acorde a esto se consideran opciones de solución técnica a saber:

- A. Generar un anillo de concreto de mayor espesor al considerado en diseño (Estimado en 15cm), lo que generará un elemento final (Columna) de mayor sección al actual - 45cm (Aprox)
- B. Desmontar los elementos útiles de la columna (Capitel, Anillos) y desarrollar una columna nueva en concreto reforzado previa demolición del elemento de mampostería.

- Para la zona de placa A.1-C.1/2.1-4.1 por el cambio de tipología de entrega encontrado que no coincide con el diseño, se plantea el mantener el sistema de vigas que se desarrolló y evidenciar entre A.1-C.1/4.1-7.1. Los aspectos de reforzamiento a procesos de vigas deben mantenerse acorde a lo planteado en el diseño.

Las vigas de ejes A1 y C1 deben "ampliarse en longitud" hasta las columnas de apoyo desde 4.1 (Continuidad); el refuerzo de dichos vigas corresponderá a continuar el mismo con el que se coincidirán dichos elementos (transversal y longitudinal)

- El voladizo en zona de acceso eje A (Entre 7.1-7.8) se considera desarrollo mediante elementos tipo mensula en concreto anclados en columnas (7.1, 7.3, 7.5 y 7.8) donde se apoyará una placa aligerada armada en una sola dirección; esto con el fin de aligerar la carga y evitar desarrollar el elemento en concreto continuo (dentro de mda)

- Para la cercha de madera (Colata) Eje 8.5 debe evaluarse el alcance visual (Arguedad) con el fin de determinar si se mantiene por la calidad de la colata en mampostería.

Norma

[Firma]

[Firma]

Asesor Estructural
Construido 15

Actividades realizadas

- Continúa la construcción de la sobrecubierta. Instalación de feja de zinc en faldón oriental.
- Fraseo de madera para lugar de acopio.
- Continúa la excavación mecánica del sector 5.
- Continúa la excavación mecánica para tanque de agua 2.
- Ingresa 200 bolsas de cemento a la obra, se realiza acopio en lugar establecido.
- Se inicia construcción cerramiento interno para punto de mercado de concretos y maderos.
- Continúa el desmonte de feja ~~externa~~ fibrocemento en sector 1 faldón occidental.
- Se realiza fraseo de guías y varillas de redistribución a sitio de acopio.
- Continúa la excavación de para amenizaciones del sector 1. eje A.1/A.1 A.1/6.8, C.1/7.1.
- Inicia construcción de caja desarenador para bombeo de aguas de infiltración y/o lluvias en sector 5.
- Se finaliza la inspección de estructura de madera cubierta Sector 1.

Clima: Geco - Golando.

[Firma]

[Firma]
INTERVENTOR

[Firma]
Rendito


Marques 01 Agosto de 2022

Clima: Lluvias leves en la mañana, en la tarde geco-nublado.

Actividades realizadas

- Continúa la construcción de sobrecubierta en el sector 1. Instalación de feja de zinc.
- Continúa la construcción de cerramiento interno para punto de mercado de concretos y maderos.
- Se inicia la liberación de plaza de entropio en los espacios 257 y 258.
- Continúa la excavación mecánica para tanque de agua 2.
- Continúa la excavación mecánica del sector 5.
- Continúa el desmonte de feja de fibrocemento, sector uno (1) faldón occidental.

- Se realiza nivelación de el perímetro de la excavación, información, limpieza de vías.
- Jornada de orden y aseo de obra.
- Continúa la excavación manual para zapatas en el eje A.1/A.1 C.1/7.1 (Sector 1)
- Inicia excavación manual para zapatas en el eje C.1/6.8, C.3/6.5
- Salida de volquetes con material producto de las excavaciones (limos, arcillas)
- Se inicia perforaciones de placa de anclaje para series de columnas de reforzamiento estructural, Sector 1.
- Se realiza replanteo de cimentación en el sector 5 para solado de concreto de limpieza a nivel -1.55 m.
- Se continúa con la construcción de caja para desarenador, bombeo de agua de infiltración y/o lluvia en el sector 5.
- Liberación de manosteria doble en el sector 3 (unión entre 2-3).
- Continúa la excavación para construcción cámara eléctrica cobrado noroccidental.
- Se realiza comité de obra # 12


 Jefe de Obra
 Ing. Residente Res.

Miércoles 10 Agosto de 2022

Clima: Lluvias intensas noche anterior, lluvias leves en el transcurso del día.

Actividades realizadas

- Continúa la construcción de sobrecubierta en el sector 1.
- Inicia la construcción el desmonte de teja de barro, faldón oriental del sector 1.
- Continúa la liberación de placa de concreto del espacio 258.
- Finaliza la construcción de cerramiento interno para punto de mercado de concreto.
- Se ^{inicia} ~~realiza~~ la liberación de enchape cerámico en espacio 263.
- Se inicia el solado de limpieza para zapatas en sector 1 edificio de conservación.
- Se continúa con la excavación de zapata eje 6.8/6.3
- Se continúa con las perforaciones de placa de anclaje para pases de columnas de reforzamiento estructural Sector 1.
- Se suspende actividad de perfilado manual para cimentación

sector 5, debido a las lluvias presentadas la noche anterior y en el transcurso del día.

- Se realiza puerta en cerramiento costado occidental (camara n.a) para ingreso y salida de material, una vez aprobado el PMT (actualización).

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Arg. Ricardo Olan

Jueves 11 Agosto de 2022

Clima: Lluvias leves en la mañana (7:00-9:00) - Goleado en la tarde.

Actividades realizadas:

- Continúa la construcción de sobrecubierta en el sector 1.
- Continúa el desmonte de teja de barro, faldón oriental, sector 1.
- Inicia la excavación manual para zapata en el eje 4.1/C.1
- Se realiza demolición de sobrecimiento y concreto adosado ubicado en zapatas del eje 12.
- Continúa la excavación manual para zapata del eje 5.5/A.1.
- Se realiza liberación de laumano corrido en espacio 144, patio central.
- Continúa el perfilado y replanteo para concreto de limpieza para zapatas. Sector 5.
- Ingresar a obra material agregado para mezcla de góndolas.
- Tránsito de escombros a sitio de acopio.
- Se continúa con la generalización de puntos ecológicos, rendero perimetral.
- Se construye escalera para ingreso a la excavación.
- Continúa la construcción de cámara eléctrica (excavación)

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Arg. Ricardo Olan

Viernes 12 Agosto de 2022

Clima: Seco. soleado.

Actividades realizadas:

- Continúa la construcción de sobrecubierta en el sector 1 y 2.
- Continúa el desmonte de teja de barro, sector 1.

- Continúa el perfilado y replanteo para concreto de limpieza. Sector 1.
- Inicia vaciado de concreto de limpieza en sector 5 y sector 1.
- Se realizan liberación de sobrecimiento y aclopecos en cimentación ubicada en eje. C.4/6.8, C.1/6.8.
- Desmonte de puertas y ventanas espacio 209.
- Ingresar a obra acero de refuerzo para actividades de cimentación en zona de conservación.
- Se continúa con la construcción de banco de acopio para hienos, sector 4.

Arz

[Signature]
Ingeniero

[Signature]
Arq. Residente Olan

Sábado 12 agosto de 2012

Clima: Holognas buen en el transcurso del día.

Actividades realizadas.

- Continúa la construcción de sobrecubierta en sector 1.
- Continúa el perfilado y replanteo para concreto (colado) de limpieza en sector 5 y sector 1.
- Continúa construcción de banco de acopio para hienos del sector 5, 4, 3 en sector 4.
- Ingresar a obra acero de refuerzo para actividades de cimentación en zona de conservación (segundo viaje).
- Continúa la construcción de cámara eléctrica.
- Continúa el desmonte de puertas y ventanas, segundo piso sector 2 para disposición final.
- Trasego de mader

Arz
[Signature]
Ingeniero

[Signature]
Arq. Residente Olan
CORPORACIÓN IS.

Martes 16 agosto

Lunes 16 Agosto de 2012


Clima: Seco soleado

Actividades realizadas.

- Se realiza comite de obra # 13
- Inicia amarrado de refuerzo para cimentación en edificio de conservación en ejes. A.1/1.2 A.1/4.1 y A.1/5.5

Norma

- Continua excavación manual para zapatas en edificio conservación en eje C.1/4.1-5.4
- Se realiza demolición de ciclopeo y sobrecimiento en eje 8.5/C.1-C.4
- Se hace trasiego de material producto de excavación de zapatas en edificio conservación.
- Continúan actividades de construcción de la sobrecubierta.
- Continua fundida de concreto de limpieza (solado) en sector 4 y 5
- Continua construcción de burros de madera para acopio de acero de refuerzo para edificio nuevo.
- Inicia liberación de fachaleta en fachada occidental edificio conservación.
- Ingrese material para las actividades hidrosanitarias (tubería y accesorios)



 Ing. Residente 
 Consorcio IS

Miercoles 17 agosto

Clima: Seco soleado

Actividades realizadas

- Continua fundida de concreto de limpieza (solado) para cimentación sector 5
- Continúan actividades de liberación de fachaleta sobre fachada occidental
- Siguen las actividades de construcción de la sobrecubierta
- Se hace trasiego de material producto de excavación zapatas en edificio conservación
- Se inicia demolición de concreto ciclopeo y el sobrecimiento en eje 6.8/C.1-C.4
- Se hace amarre de refuerzo para zapatas en ejes A.1/6.8, A.1/5.5
- Se funde concreto de limpieza en zapatas sector 1 Ejes C.1/4.1-5.4, A.1/8.5, A.1/8.3
- Inicia el proceso de desmonte de esterica de

- quedará en cielo raso en espacio 147
- Iniciar la aplicación de mortero 1:3 para protección de tatud en área de tanque 2, previa la instalación de malla galvanizada y arclajes
 - Se realiza corte a listón de madera en estrecho de espacio 254 para desmonte de este listón y posterior desmonte de vigas de madera en cruce de columnas
 - Instalación ~~eléctrico~~ tablero eléctrico provisional en sector 3-4
 -
-   Ing Resident 
Consorcio 15

Viernes 18 Agosto de 2022

Clima: Seco soleado.

Se realiza visita de asesoría estructural (Consorcio 15) considerando los siguientes aspectos:

- * La columna CT-A se va a verificar (a nivel de ruschi) con el fin de solucionar mediante la construcción de una columna nueva en concreto reforzado; se procederá con el tema y se va a presentar informe para aprobación
- * Respecto a la verificación de excavaciones en el tanque central se recomienda disminuir sobrecarga en el talud del eje L41; así mismo perfilar y proteger al menor plazo posible. Esta recomendación (protección talud) aplica para el eje paralelo a 7.7 y los demás casos. De igual forma se recomienda controlar los niveles de agua en excavación evitando saturaciones.
- * En la excavación de el eje 9 paralelo a la construcción existente se evidencia sechos de material arcilloso/huerto; se recomienda proteger con ~~pared~~ toda la cara interior de dicho talud y en la zona donde el perfil de material se evidencia a mayor altura (1.80 aprox) proteger hasta dicho nivel (Ejes A12-C Aprox). La protección de base se considera también para el eje A en el talud que se desarrolla. Se recomienda considerar protecciones (pared) en las zonas que muestren material de tipo arcilloso como se indicó,

Norma

 ASesor ESTRUCTURAL
CONSORCIO 15


De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el asesor estructural. y una vez perfilado el terreno. de la excavación del tanque. terminar los pañetes repletos de forma inmediata y verificar de nuevo el comportamiento del terreno la construcción de tableros. sobre el cojido que de la excavación norte que nos da sobre la estructura existente. de conservación y realizar seguimiento permanente. a esta zona de riesgo.

fredy lema
Res. Interventor.


* Actividades realizadas

- Continua solado de limpieza para cimentación sectores 4 y 5.
- Continua demolición de concreto ciclopeo y el sobrecimiento en eje C.1/4.1-5.4
- Sigue el proceso de desmonte de esterilla de guada en cielo raso en espacio 147 y 149
- Continua aplicación de mortero 1:3 para protección de talud en area de tanque 2, con malla galvanizada y anclajes
- Se realiza desmonte de vigas de madera de entrepiso en zona con cruce de estructura de concreto en espacio 254.
- Continúan actividades de construcción de sobrecubierta en sector 2
- Continua liberación de facheta sobre fachada occidental
- Ingresa a obra acero de refuerzo para tanque 1 RCI
- Desmonte de estructura de madera de abiete en sector 1 (cercha 3)

Arq



Interventor

 Ing Resident
Consurio 15

Viernes 19 de Agosto de 2022

Clima seco soleado

* Actividades realizadas

- Inicio desmonte de teja de barro en sector 1 y se dispone en punto de acopio para su posterior lavado.
- Continúa concreto de limpieza para cimentación en sector 1.
- Continúa demolición de sobrecimiento y ciclop en zona de zapatas sector 1
- Ingresan a obra material para instalaciones hidrosanitarias
- Continúa concreto de limpieza para cimentación en sector 5
- Sigue perfilado de talud en excavación para tanque 2
- Continúa desmonte de esterilla de guadua en cielo raso en espacio 147 y 149

[Firma]

[Firma]

[Firma] ING. RESIDUA
CONSORCIO

Sábado 20 Agosto 2022

Se solicita el informe de implantación de los ejes entregados por la topografía de obra, teniendo en cuenta que no coincide la esquadra del eje A2 con los ejes 11 y 12,

[Firma]

INGENIERIA

Sábado 20 Agosto 2022

Clima: lloviznas leves en el transcurso de la jornada.

* Actividades desarrolladas:

- Se realiza concreto de limpieza en eje 8

entre ejes C.1 y C.4

- Se realiza anclaje de refuerzo para zapata en eje C.1/2.1
- Inicia anclaje de refuerzo para zapata en eje A.1/8.5
- Continúan actividades para perfilado de excavación de tanque 2
- Ingresan a obra acero de refuerzo para cimentación de Sector 4 y 5 y cimentación de edificio de conservación sector 2
- Inicia ingreso de equipos para mezclado de concreto en obra.
- Se hace traslado de material producto de excavación hacia punto de acopio para posterior retiro.

[Signature] *[Signature]* Ing. Rosalva
Consejero IS

Vuenees 21 Agosto de 2022.

Día festivo.



Marques 22 Agosto de 2022



Clima: fresco nublado.

Actividades desarrolladas:

- Continúa el desmonte de teja de fibrocemento en el sector 1 y 2.
- Continúa el desmonte de teja de barro en sector 1, posterior acopio.
- Se realiza el desmonte de anillo inferior de columna ubicada en el espacio 100, previa autorización de la interventoría. Se realiza embalaje de protección para su posterior intervención y reintegración.
- Se realiza desmonte de piso de baldosa cemento decorada en espacio 103 para excavación de zapatas.
- Se realiza liberación de mesón de concreto ubicado en el espacio 103.
- Se realiza excavación para zapatas de reforzamiento estructural en eje J.2 entre 2.1/2.4.

- Se continúa con la excavación para concretos de limpieza - sólidos en el sector 4.
- Continúa la excavación manual en tanque de agua 2.
- Se realiza trabajo de material producto excavaciones para giro de acero.
- Se realiza trabajo de escombros para lugar certificado.
- Ingresa a obra acero de refuerzo para tanque de agua N° 2.
- Se inicia con amarrado de acero de refuerzo en eje A.1 entre 83/85 y C1 84.1-5.4
- Se continúa con el amarrado de acero de refuerzo en eje 7.4 / C1.1.
- Se realiza desmonte de enlucido / mortero arena cemento en espacio 103, sector 2.
- Se realiza jornada general de aseo y orden.
- Se realiza generalización general de obra.
- Se continúa con la liberación de sobrecimientos y cimientos (ciclopeos) en sector 1, edificio de conservación.

Marques 23 de Agosto de 2022.

Clima: Seco - Soleado.

Atendidos: Ejecutores.

- Se realiza corte con pulidora para el desmonte de piso en listón de madera. Extracción y desmonte de vigas de entripado para parte de columnas.
- Se continúa con el desmonte de leja de arbolado cemento en sector 2.
- Se continúa con excavación para concretos de limpieza en el sector 4.
- Se continúa con la excavación manual en el tanque de agua 2.
- Se continúa con la liberación de sobrecimientos en ladrillo y cimientos ciclopeos en sector 1, edificio de conservación.

- Se inicia con el armado de refuerzo para zapata C3-6.8 y C1-6.8.
- Se continúa con el armado de refuerzo para zapatas en eje A / A.1-5.4.
- Se continúa con el desmonte de cielo raso en estera de grada. Espacio 103 sector 2.
- Se culmina excavación de la zapata ubicada en el eje J.2 / 2.4 y se realiza solado de limpieza.
- Ingresar material a obra. Acero de refuerzo para cimentación secciones 4 y 5. y tanque de agua 2.
- Se realiza comit' de obra # 14.
- Se realiza retiro de material producto de excavación.
- Se continúa con la instalación de equipos para mezclado de concretos.
- Se continúa con el perfilado de excavación para cimentación, sector 5.
- Continúa el perfilado de taludes y aplicación de manto y malla galvanizada con anclajes para estabilización de talud.

Arpa

Interventoria

Arq. Rendón

Miércoles 24 Agosto / 2022

CUMA: Nublado - Seco

La interventoria solicita al contratista el envío de certificaciones de los materiales que han llegado a la obra como aceros, tuberías, etc.

Se le recuerda al contratista la verificación del replanteo de los ejes antes de empezar el armado de pilas de los apoyos sector 5.

Interventoria

Interventoria

Con respecto a la nota de la interventoria, las certificaciones de los materiales serán anexados al informe mensual #3 correspondiente al mes de agosto. En lo que respecta

a la verificación de ejes, se está verificando la geometría en planimetría para replantear puntos y escuadras del edificio.

Actividades desarrolladas

- Se continúa con el desmonte de hoja de arboledamiento en sector 1.
- Se continúa con el desmonte de estructura de cubierta en madera, sector 1 (sobre azotea principal).
- Se continúa con perfilado de excavación para cimentación en el sector 5.
- Continúa el perfilado de taludes e instalación de malla galvanizada y morteros con anclajes para estabilización de talud.
- Se realiza retiro de material de excavación.
- Continúa la liberación y demolición de sobrecimiento en ladrillo y cimentación ciclopea en sector 1 edificio de conservación.
- Se realiza recorte de ciclopeas en el sector 1.
- Se realiza instalación de vapor para aislamientos de cimentaciones.
- Se continúa con el volado (concreto de limpieza en el sector 5 para cimentaciones).
- Inicia anclaje de refuerzo para zapatas en eje 6.8 entre C.1 y C.4. y zapata en eje J2 / 2.4.
- Continúa anclaje de refuerzo para zapatas en eje C.1 / 4.7-5.4.
- Ingresan material a obra. Acero de refuerzo para edificio nuevo.
- Ingresan material agregados finos para mezclado de concretos.

[Firma]


[Firma]
 Arq. Residente.

Jueves 25 Agosto de 2022

Clima: Seco - Nublado.

Actividades desarrolladas:

- Continúa el desmonte de tipo de reforzamiento en sector 1. Zona vestíbulo.
- Continúa el desmonte de estructura de cubierta en madera en sector 1. Zona norte.
- Se continúa con perfilado de excavación para cimentación en el sector 5.
- Se continúa con el perfilado de taludes e instalación de malla galvanizada y maderos con anclajes para estabilización del talud.
- Se realiza retiro de material de excavación.
- Se realiza recorte de ciclopeos en el sector 1.
- Se realiza instalación de icopor para aislamiento de cimentaciones.
- Se continúa con el golado (concreto de limpieza) sector 5 para cimentaciones.
- Inicia excavación para cimentación eje j2 / 2.1 sector 2.
- Inicia amarrado de refuerzo para zapatas en eje j2 / 2.4 sector 2. y eje K5 / 2.1-2.4.
- Continúa amarrado de refuerzo para zapatas y usga de cimentación (balanceo) eje 6.8 / 6.1-6.3. y eje C1 / 4.1-K5.4.
- Continúa la liberación y demolición de sobrecimiento en ladrillo y cimentación ciclopea en sector 1. (Edificio de conservación).
- Se realiza desmonte de baldosa de cemento decorada para la excavación de zapatas, espacio 103 sector 2.
- Se continúa con el desmonte de estera de guano en espacio 148, sector 1. (pintores).
- Ingresar material a obra. Acero de refuerzo para edificio nuevo (sectores 4 y 5).
- Ingresar material agregados pétreos para mezclado de concretos.

Arq. 
 Ing. Per. Civ. 

Viernes 26 Agosto de 2011

Clima: Hecó Holendo.

Actividades Realizadas

- Continúa el desmonte de teja de asbesto cemento en sector 1. (zona norte).
- Continúa el desmonte de la estructura de madera cubierta sector 1 zona norte.
- Se continúa con perfilado de baldes e instalación de malla galvanizada y morteros con anclaje para estabilización de baldes.
- Se inicia solado (concreto pobre) en zona de banco 2.
- Se continúa con solado (concreto pobre) en sector 4 y 5 para cimentaciones.
- Se inicia el proceso de usando alas barras de refuerzo donde se implementará el uso de conectores mecánicos para empalmes como indica el proyecto estructural.
- Se continúa con el perfilado y demolición de sobrecimientos y cimientos entre el edificio nuevo y conservación para construcción.
- Continúa el desmonte de estalla de grada (asbesto) en el espacio 103.
- Continúa amarrado de refuerzo para cimentación eje 6.8/ci-c3 y eje ci /4.1-5.4.
- Continúa amarrado de refuerzo para zapatas en eje j.2/2.4 y eje KS /2.1-2.4.
- Continúa la liberación y demolición de sobrecimientos en ladrillo y cimentación ciclopea en sector 1 costado norte edificio de conservación.
- Se inicia con fundida de zapatas en sector 1 edificio de conservación, previa autorización de la interventoría.
- Se toman muestras de concreto (cilindros).
- Se realiza revisión de ejes y niveles por parte de la misión topográfica consorcio J.S.
- Se realiza comité de participación en el colegio San Francisco - sede actual, con la participación de la comunidad.

Norma

[Firma]

[Firma]
Arq. Fernando

Sábado 27 Agosto de 2022.

Clima: Seco soleado.

Actividades Realizadas:

- Continúa el demanto de estructura de madera en cubierta sector 1, zona norte.
- Continúa el colado (concreto pobre) en sector banco de arena.
- Se continúa con el proceso de rosado a las barras de refuerzo, donde se implementará el uso de conexiones mecánicas para empalmes como indica el proyecto estructural.
- Continúa el perfilado y demolición de sobrecimientos y cimientos ~~entre~~ en el sector 2, espacio 103.
- Continúa amase de refuerzo para cimentación eje J2/2.1-24.
- Se finaliza la demolición de sobrecimientos y ciclopeos en eje 9 (unión entre el edificio de conservación y el nuevo).
- Continúa la revisión de ejes y replanteo por parte de la misión topográfica consorcio IS.
- Continúa el transporte de material a sitio de acopio, producto de excavaciones y demoliciones.
- Se realiza demolición de sobrecimiento y ciclopeo en eje ~~61~~ 8.5-8.1 para preparación de cimiento num. (sector 1)
- Se desmoldan muestras de concreto tomadas el día de ayer y se disponen en la probeta para curado y posterior envío a laboratorio.

[Firma]
Ing. Residente O.

Lunes 29 Agosto de 2022

Clima: Seco, nublado

Actividades realizadas por la comisión de topografía para hacer entrega a la interventoría al topógrafo responsable Ivan Pinilla de parte del topógrafo constructor ~~de~~ Freddy Güiza.


1. Se realiza chequeo sobre eje 2 y referencia a muros sobre ejes A1 y C. evidenciando una diferencia de 38 cm, la cual fue aclarada

con los ingenieros residentes tanto de construcción como interventoría,


2. Chequeo escuadra entre los ejes A2 y eje 11, recibido a satisfacción por la interventoría.

3. Chequeo entre ejes A2 y A3 para verificar la equidistancia entre los muros, para ser recibidos a satisfacción por la interventoría, con las distancias entre 10 y


4. Chequeo ejes de referencia tanque se hizo el traslado del eje del tanque con las referencias de los ejes 10 y 11 garantizando la perpendicularidad de los ejes del tanque así mismo se verifica el nivel de la cimentación, recibido a satisfacción por la interventoría haciendo la salvedad que 3cm por debajo del nivel de diseño.



Fredy Sosa
Firmante Propaganda Responsable
Constructor



INTERVENTORIA



Interventoría



Actividades:

- * Continúa amarrado de refuerzo para zapatas eje 32/2.1-2.4.
- * Se realiza encofrado para viga de balanceo VC002
- * Inicia excavación para zapata T20 Eje A1/S2 a 5.4
- * Continúa demolición de sobrecimiento y ciclopeo en zona de construcción de zapatas nuevas

- * Sigue el proceso de desmonte de estructura de madera en abierta sector 1
- * Inicia amarre de refuerzo para cimentación en sector 5.
- * Continúa el proceso de roscado de barras de refuerzo, para instalación de conectores mecánicos
- * Siguen las actividades de perfilado para solado de tanque 2.
- * Continúa trasiego de material producto de excavación hacia punto de acopio

Apal

RESIDENTE
CONSORCIO IS
