

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
		Página 1 de 5

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 22 de Marzo de 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No CDS-20220005
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ C.C. 4.211.190 DE PESCA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS

Las actividades desarrolladas en el contrato mencionado obedecieron al suministro de materiales de construcción para el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial en el municipio de Duitama así como también la construcción de obras en pavimento articulado, la solicitud de los materiales lo realiza la comunidad y se ejecutan las obras a través de la figura de obra concertada en donde la Secretaría de Infraestructura aporta los materiales y la maquinaria y la comunidad aporta la mano de obra calificada.

El suministro fue realizado por parte del contratista disponiéndolo en el sitio de las obras en cada uno de los sectores intervenidos. La Supervisión verifico en sitio la cantidad y calidad de los materiales suministrados.

Dentro de los sectores en donde se suministraron los materiales se encuentran: Barrio el Libertador, Barrio Colombia, Barrio Juan Grande, Barrio Colombia carrera 5D entre calles 14 y 14D, vereda la parroquia, Barrio el Progreso Sector Guadalupe, San Antonio Norte, entre otros.

OBRAS REALIZADAS: Obras en pavimento articulado en los Barrios Colombia y Libertador, construcción de andenes en el barrio el Progreso Sector Guadalupe y Juan Grande, Placa Huella San Antonio Norte, Construcción de filtro en la Vereda la Parroquia.

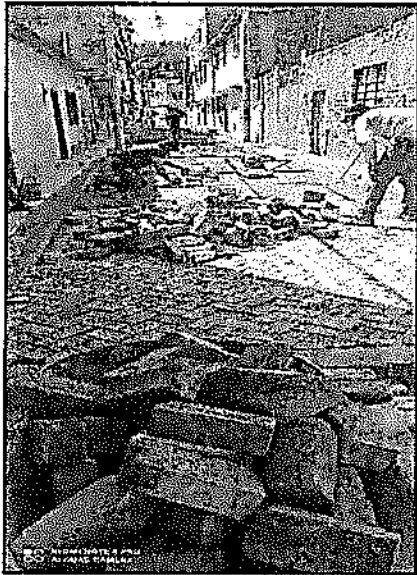




Imagen 1. Adoquín Barrio Colombia y reconstrucción de algunos andenes

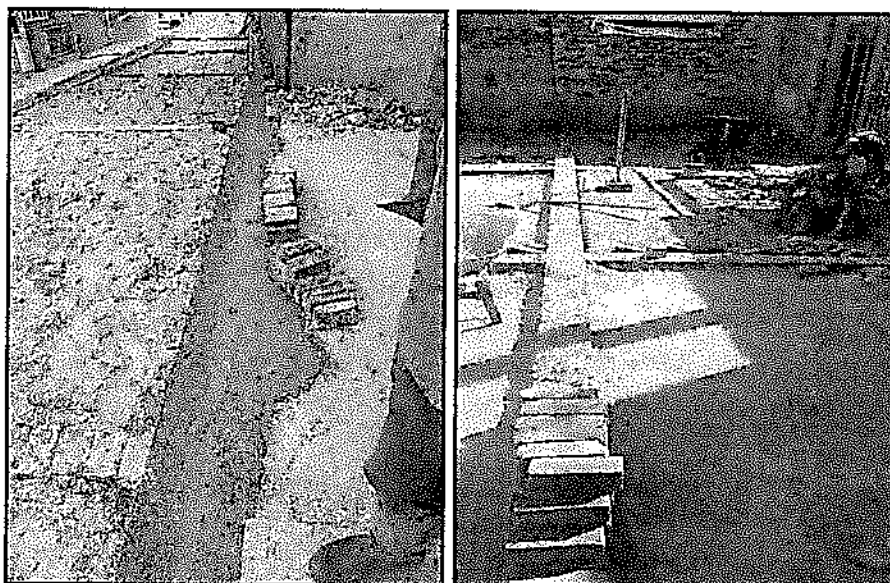
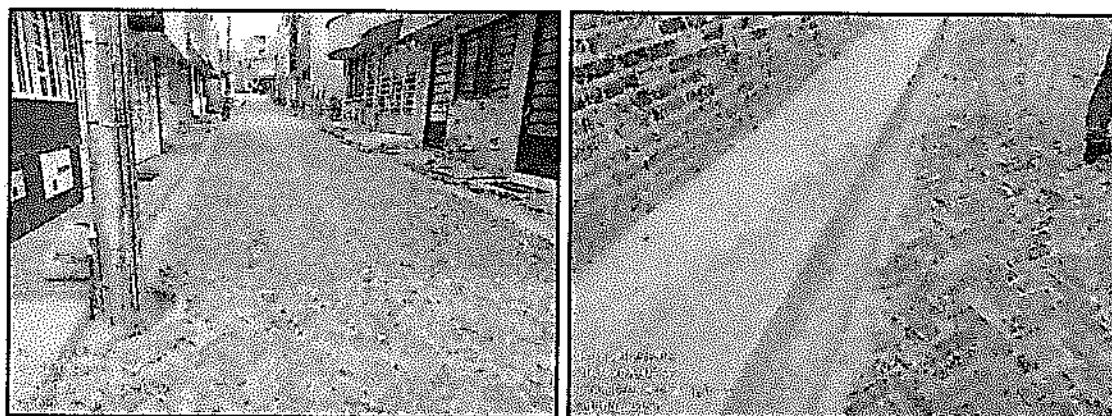


Imagen 2. Adoquín Barrio el Libertador y reconstrucción de andenes.

22-03-23

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 28 de Diciembre de 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No CDS-20220005
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ✓
CONTRATISTA	JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ C.C. 4.211.190 DE PESCA ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ ✓

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:


ASPECTOS TECNICOS

Las actividades desarrolladas en el contrato mencionado obedecieron al suministro de materiales de construcción para el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial en el municipio de Duitama así como también la construcción de obras en pavimento articulado, la solicitud de los materiales lo realiza la comunidad y se ejecutan las obras a través de la figura de obra concertada en donde la Secretaría de infraestructura aporta los materiales y la maquinaria y la comunidad aporta la mano de obra calificada.

El suministro fue realizado por parte del contratista disponiéndolo en el sitio de las obras en cada uno de los sectores intervenidos. La Supervisión verifico en sitio la cantidad y calidad de los materiales suministrados.

Dentro de las sectores en donde se suministraron los materiales se encuentran: Barrio el Libertador, Barrio Colombia, Barrio Juan Grande, Barrio Colombia carrera 5D entre calles 14 y 14D, vereda la parroquia, Barrio el Progreso Sector Guadalupe, San Antonio Norte, entre otros.

OBRAS REALIZADAS: Obras en pavimento articulado en los Barrios Colombia y Libertador, construcción de andenes en el barrio el Progreso Sector Guadalupe y Juan Grande, Placa Huella San Antonio Norte, Construcción de filtro en la Vereda la Parroquia.

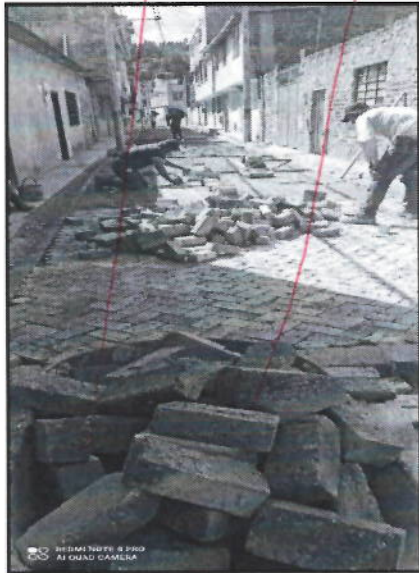

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
		Página 3 de 5
NIVEL CENTRAL		

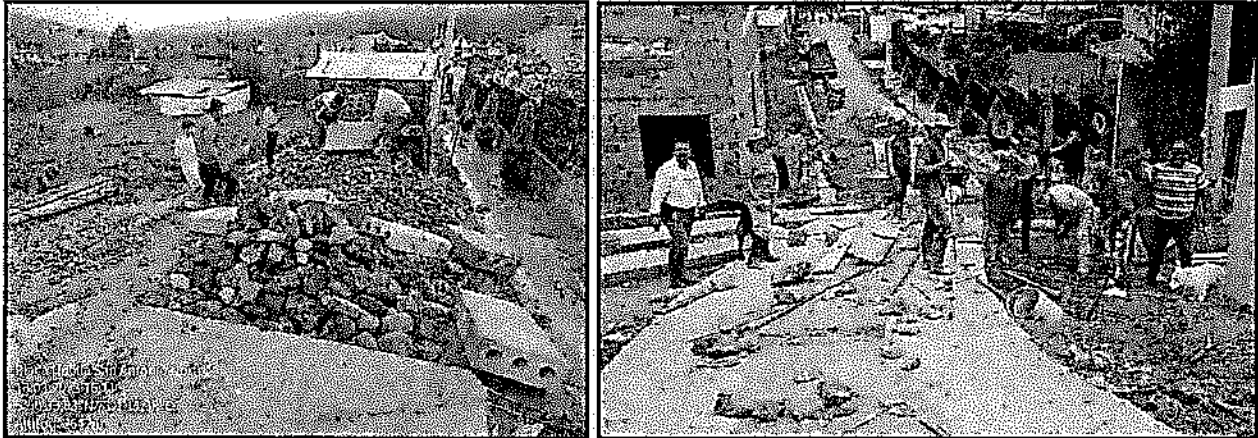
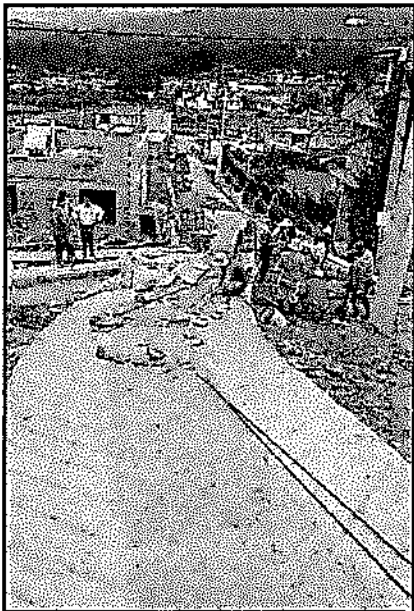


Imagen 3. Construcción Placa Huella San Antonio Norte

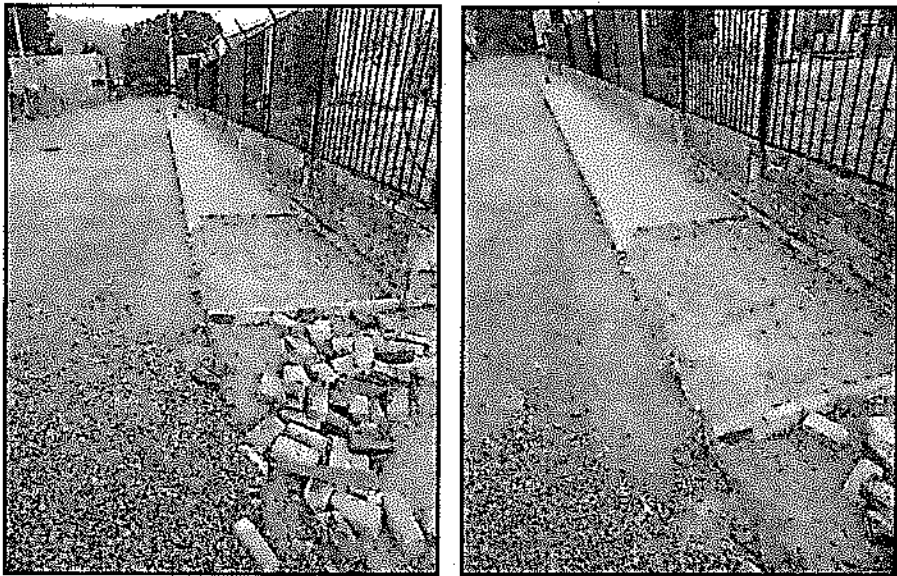


Imagen 4. Conformación de Anden Barrio Juan Grande

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: R- GJ-012
			Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES		Versión: 0
			Página 4 de 5



Imagen 5. Construcción de filtro la Párroquia

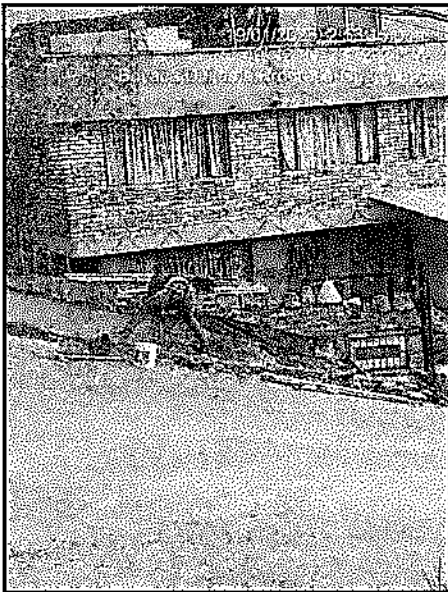
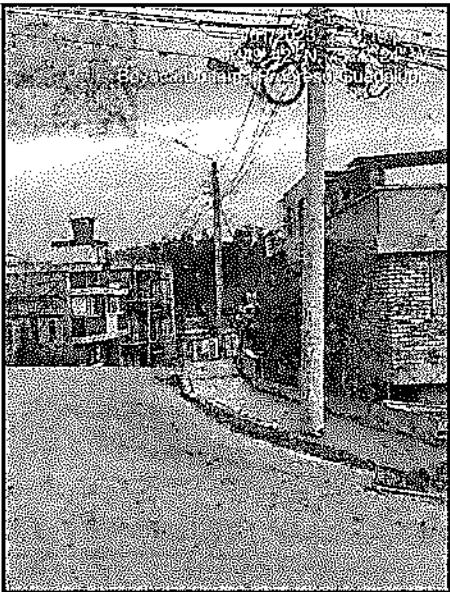
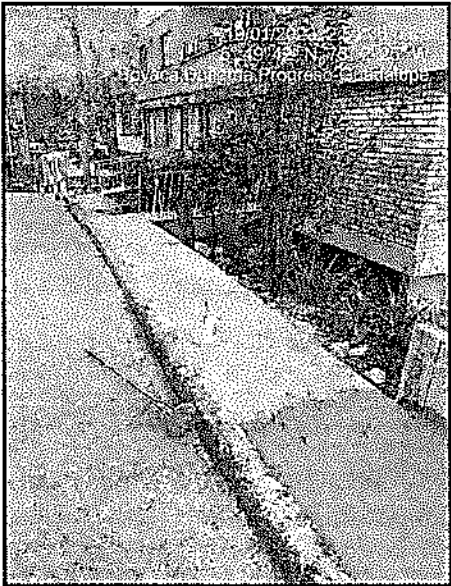


Imagen 6. Construcción de andén el Progreso Sector Guadalupe

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
		Página 5 de 5
NIVEL CENTRAL		

Las cantidades ejecutadas se relacionaron en la Sabana final adjunta al presente informe.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : SE EFECTUARON CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIAL EN LOS SITIOS DE OBRA. EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL. EL MATERIAL ES ENTREGADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DONDE LA COMUNIDAD LO SOLICITO Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DE ACUERDO AL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO Y LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO. LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CORRECTA UTILIZACION DE ESTOS MATERIALES FUE CONTROLADA DESDE LA PARTE TECNICA A TRAVES DE LA SUPERVISON DESIGNADA PARA EL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.			
DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 149.819.596		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 149.819.554,15	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 41,85	
VALOR PAGADO			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 149.819.554,15
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 41,85
TOTALES (SUMAS IGUALES)	\$ 149.819.596	\$ 149.819.596	\$ 149.819.596

OBSEVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: Se anexa Balance final de obra.



DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ
 C.C. 46.671.770 Duitama.
 SUPERVISORA

BALANCE DEL CONTRATO



CONTRATO No : CDS-20220005

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

CONTRATISTA: JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ

SUPERVISORA: ING. DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ.

CONDICIONES ORIGINALES SUMINISTRO DE MATERIALES ALCANTARILLADO						CONDICIONES		ACTA RECIBO FINAL		
ITEM	ACTIVIDAD Y DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	May(+)	Men (-)	CANTIDAD EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	GEOTEXTIL	ML	20	\$ 33.311,00	\$ 666,220			20	\$ 33.311,00	\$ 666,220
2	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO II DE 50 KG	BTO	500	\$ 42,404,00	\$ 21,202,000			500	\$ 42,404,00	\$ 21,202,000
3	GRAVILLA DE 1" A 5 MM	M3	122	\$ 131,054,00	\$ 15,988,588			122	\$ 131,054,00	\$ 15,988,546
4	LADRILLO MACIZO COMUN	UND	19985	\$ 977,00	\$ 19,525,345			19985	\$ 977,00	\$ 19,525,345
5	BORDILLO RECTANGULAR A-80 DE 20*35*80	UND	420	\$ 42,655,00	\$ 17,915,100			420	\$ 42,655,00	\$ 17,915,100
6	BORDILLO DE CEMENTO DE 20*40*80	UND	320	\$ 51,934,00	\$ 16,618,880			320	\$ 51,934,00	\$ 16,618,880
7	SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 20*50*80	UND	426	\$ 57,051,00	\$ 24,303,726			426	\$ 57,051,00	\$ 24,303,726
8	RECEBO MATERIAL DE CORTE	M3	320	\$ 70,814,00	\$ 22,660,480			320	\$ 70,814,00	\$ 22,660,480
9	PIEDRA RAJON (PARA PLACA HUELLA)	M3	120	\$ 80,299,00	\$ 9,635,880			120	\$ 80,299,00	\$ 9,635,880
10	ACERO DE REFUEZO 4200 KGL (60.000 PSI)	KG	76	\$ 12,112,00	\$ 920,512			76	\$ 12,112,00	\$ 920,512
11	ALAMBRE NEGRO	KILO	35	\$ 10,939,00	\$ 382,865			35	\$ 10,939,00	\$ 382,865
SUBTOTAL					\$149,819,596					\$ 149,819,554,15

JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ
NIT. 4211780-1
C.C No. 4.211.190 de Pesca

DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ
C.C No 46.671.770 de Duitama
SUPERVISOR

