

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, noviembre 17 de 2022
JCO-072-2022



Al contestar cite este número
202214000107872 17-NOV-2022 04:35
Anexos9. Folios:1
Origen: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL – C.R.A
Atn. Dr. Jesús León Insignares
Director General
notificaciones@crautonomia.gov.co
recepcion@crautonomia.gov.co
Ciudad.

Ref: Contrato de Obra No. EDU-561-2021 – Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

Asunto: Cumplimiento obligaciones Resolución No. 685 de octubre 31 de 2022 por medio del cual se concede una prórroga de ocupación de cauce sobre la Ciénaga Mallorquín objeto del contrato de la referencia.

Cordial saludo.

Adjuntamos:

- Cronograma de ejecución del proyecto.
- Publicación aviso de prensa Diario La Libertad, por medio del cual se publica la parte resolutive de la Resolución No. 685 de octubre 31 de 2022.
- Informe cumplimiento obligaciones impuestas en la Resolución No. 641 de 2021.

Lo anterior, da cumplimiento a lo requerido en los artículos segundo y quinto de la Resolución No. 685 de octubre 31 de 2022.

Atentamente.

ING. ADALBERTO DE JESÚS VIVERO CORONEL
Representante Legal

Copia: Archivo
Anexo: Lo enunciado



EDUBAR SA
CONTRATO N°

ACTIVIDAD	UNIDAD	COMIENZO	TERMINO	FECHA
CRONOGRAMA PROYECTO INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE URB. DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PROYECTO 1				
INICIO PROYECTO	0 dias	mié 1/09/21	mié 1/09/21	
PERMISOS POR PARTE DE ANI	0 dias	lun 1/08/22	lun 1/08/22	
LLEGADA PIOTES MADERA	0 dias	lun 6/12/21	lun 6/12/21	
OBRAS PRELIMINARES	510 dias	lun 6/12/21	dom 30/04/23	
MOVIMIENTOS DE TIERRA	80 dias	mié 1/08/22	mié 19/10/22	
PILOTAJE EN MADERA	380 dias	lun 3/01/22	mié 18/01/23	
PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	340 dias	lun 25/04/22	sáb 8/04/21	
BARANDAS EN MADERA	228 dias	mié 14/09/22	dom 30/04/23	
EDIFICACIONES EN MADERA	208 dias	lun 3/10/22	sáb 23/04/23	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	252 dias	sáb 28/08/22	sáb 23/04/23	
MAESTRERIA Y ACABADOS	130 dias	mar 22/11/22	vie 31/03/23	
PISOS Y ENCHAPES	105 dias	mié 21/12/22	mié 5/04/23	
CIELOS BAJOS	15 dias	mar 21/09/23	mié 5/04/23	
PAVIMENTOS Y ANDENES	39 dias	mié 16/11/22	dom 25/12/22	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	35 dias	vie 24/03/23	vie 25/04/23	
URBANISMO Y EXTERIORES	15 dias	mar 11/04/23	mar 25/04/23	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACI	50 dias	lun 26/02/23	lun 18/04/23	
INSTALACIONES ELECTRICAS	80 dias	sáb 21/01/23	lun 10/04/23	
INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	20 dias	sáb 18/03/23	jue 6/04/21	
INSTALACIONES VOZ Y DATOS	15 dias	lun 27/05/23	lun 18/04/23	
PRESUPUESTO SEÑALIZACION	10 dias	mar 11/04/23	jue 26/04/23	
PROVISIONES	363 dias	mar 3/05/22	sáb 23/04/23	
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	103 dias	lun 6/12/21	sáb 19/03/22	
FIN PROYECTO	0 dias	dom 30/04/23	dom 30/04/23	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2

PUBLICACIÓN AVISO DE PRENSA DIARIO LA LIBERTAD **Viernes 11 de noviembre de 2022**

EDICTOS

Barranquilla, Viernes 11 de Noviembre del 2022 **7B**

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

AVISO DE PRENSA
El Consorcio JCO Mallorquín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, publica el presente aviso de prensa en el diario La Libertad, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los actos de gestión que se están realizando en el marco de la ejecución del proyecto de ocupación de la zona sobre la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico.

LIMITADOS

TEMPOACTIVA ESTAS

Aviso que el día 12 de septiembre de 2022 falleció el señor GUILLERMO DAVID BUEÑO GUZMAN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 92.125.996 de Majagual, quien se encontraba laborando para la empresa TEMPOACTIVA ESTAS, ubicada en LA CALLE 47 # 43 - 57 Piso 2. Quien se crea con derecho para reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en nuestros oficinas para hacerlos valer.

SEGUNDO AVISO

COOPERATIVA MUEBLERA COOPACOM

Aviso que el día 24 de octubre de 2022 falleció el señor OSCAR ENRIQUE SALCEDO SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.712.245 quien se encontraba asociado a COOPACOM, ubicada en LA CALLE 47 # 43 - 57 Piso 2. Quien se crea con derecho para reclamar sus aportes favor presentarse en nuestras oficinas para hacerlos valer.

PRIMER AVISO

AVISO

Vital Moreno y sucesores, informa que su empleado Fidel Coronado CC 8.760.197, falleció el 2 de Noviembre de 2022, las personas que se consideren con derechos a reclamar la liquidación de Salarios y Prestaciones sociales, deben exhibir al correo electrónico vitalmoreno@gmail.com dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Datos del interesado:
NOMBRE: MARTÍN C. TORRES
Cédula de Ciudadanía: 90.060.130.787
Número del Cheque: 309776
Fecha de Giro: 2022.10.14
Datos para notificación: Oficina que emitió a giro el título:
Número de la oficina: Buenavista 2
Dirección de la oficina: CB 52.531.197

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

RESOLUCION No. 685 DE 2022

Octubre 31

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE A LA PROPRIOA DE OCUPACION DE CAUCE SOBRE LA ZONA MALLORQUIN AL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, IDENTIFICADO CON NIT 901.501.273-2, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADALBERTO VACCINO GOMEZ, PROYECTO DENOMINADO "LA CAJITA DE LA ZONA MALLORQUIN", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, AUTORIZADA POR LA RESOLUCION No. 641 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO CON LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVIDENTE."

En mérito a lo expuesto,

RESUELTO:

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR

la ejecución de la obra de construcción de la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, por medio del señor ADALBERTO VACCINO GOMEZ, representante legal del Consorcio JCO Mallorquín, identificado con NIT 901.501.273-2, representado legalmente por el señor ADALBERTO VACCINO GOMEZ, proyecto denominado "LA CAJITA DE LA ZONA MALLORQUIN", ubicado en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico, autorizada por la Resolución No. 641 del 19 de noviembre de 2021, de acuerdo con la parte motiva de este providente.

ARTICULO SEGUNDO. EL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT 901.501.273-2, debe presentar un plan mayor a sesenta (60) días calendario, un cronograma de ejecución del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 641 del 2021.

ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 641 del 19 de noviembre de 2021, que autoriza el instrumento ambiental teniendo que en firme.

ARTICULO CUARTO. La Corporación Autónoma del Atlántico (C.A.A.), supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente Acto Administrativo, cualquier desvío de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la Ley.

ARTICULO QUINTO. EL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT 901.501.273-2, deberá publicar la parte resolutoria del presente providente en un periodo de amplia circulación en los 60 días del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 y en conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Dicha publicación deberá realizarse en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, y remitir copia a la Subdirección de Gestión Ambiental del presente Acto Administrativo, la Subdirección de Gestión Ambiental, procederá a realizar la correspondiente publicación en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

EDICTO

DE INSCRIPCION DE TRAMITE DE LA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

de los 15 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO.

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Datos del interesado:

NOMBRE: MARTÍN C. TORRES

Cédula de Ciudadanía: 90.060.130.787

Número del Cheque: 309776

Fecha de Giro: 2022.10.14

Datos para notificación: Oficina que emitió a giro el título:

Número de la oficina: Buenavista 2

Dirección de la oficina: CB 52.531.197

Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periodo de amplia circulación Nacional.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

RESOLUCION No. 685 DE 2022

Octubre 31

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE A LA PROPRIOA DE OCUPACION DE CAUCE SOBRE LA ZONA MALLORQUIN AL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, IDENTIFICADO CON NIT 901.501.273-2, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADALBERTO VACCINO GOMEZ, PROYECTO DENOMINADO "LA CAJITA DE LA ZONA MALLORQUIN", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, AUTORIZADA POR LA RESOLUCION No. 641 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO CON LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVIDENTE."

En mérito a lo expuesto,

RESUELTO:

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR

la ejecución de la obra de construcción de la zona de Mallorquín, en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, por medio del señor ADALBERTO VACCINO GOMEZ, representante legal del Consorcio JCO Mallorquín, identificado con NIT 901.501.273-2, representado legalmente por el señor ADALBERTO VACCINO GOMEZ, proyecto denominado "LA CAJITA DE LA ZONA MALLORQUIN", ubicado en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico, autorizada por la Resolución No. 641 del 19 de noviembre de 2021, de acuerdo con la parte motiva de este providente.

ARTICULO SEGUNDO. EL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT 901.501.273-2, debe presentar un plan mayor a sesenta (60) días calendario, un cronograma de ejecución del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 641 del 2021.

ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 641 del 19 de noviembre de 2021, que autoriza el instrumento ambiental teniendo que en firme.

ARTICULO CUARTO. La Corporación Autónoma del Atlántico (C.A.A.), supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente Acto Administrativo, cualquier desvío de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la Ley.

ARTICULO QUINTO. EL CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT 901.501.273-2, deberá publicar la parte resolutoria del presente providente en un periodo de amplia circulación en los 60 días del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 y en conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Dicha publicación deberá realizarse en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, y remitir copia a la Subdirección de Gestión Ambiental del presente Acto Administrativo, la Subdirección de Gestión Ambiental, procederá a realizar la correspondiente publicación en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

EDICTO

DE INSCRIPCION DE TRAMITE DE LA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

NOTARIAJENADO BARRANQUILLA

QUEDACION DE LA SOCIEDAD

**INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN No.
641 DE 2021.**

ARTICULO SEGUNDO: La Ocupación de Cauce autorizada en la presente resolución sobre la Ciénaga de Mallorcaín al **CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**, identificado con NiT. 901.501.273-2, se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales a partir de la ejecutoria de este proveído:

1. Presentar en un término no mayor a sesenta (60) días calendario y antes de iniciar las obras un Programa de manejo ambiental en donde se contemplen las distintas medidas de manejo para prevenir, corregir, mitigar o compensar cada una de las actividades proyectadas a realizar en el desarrollo del proyecto en las distintas etapas del mismo (Construcción y Operación).

Cumplimiento:

Mediante Radicado CRA número 202214000087262 enviamos el Programa de Manejo Ambiental.

2. Presentar semestralmente (junio y enero) durante la etapa de construcción y posteriormente anualmente (enero) durante la operación del proyecto Ecoparque Ciénaga de Mallorcaín, Caracterización Fisicoquímica, microbiológica e Hidrobiológica en la Ciénaga de Mallorcaín, en el área de influencia del proyecto, en la que se tenga en cuenta como mínimo los siguientes parámetros: PH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto, Salinidad, DBO5, Solidos Suspendidos Totales, Nitratos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, Ortofosfato, Fosforo Total, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Fitoplancton, Zooplancton, Macroinvertebrados Bentonicos.

Cumplimiento:

En el anexo 01 adjunto, presentamos informe de caracterización.

3. Supervisar de forma permanente los equipos y mantenimientos a realizar con el objeto de detectar la contaminación al cuerpo de agua por el aporte de residuos sólidos, grasas o aceites entre otros y adoptar las medidas correspondientes para la mitigación de estos impactos.

Cumplimiento:

Diariamente el equipo ambiental, salud y seguridad del trabajo, realizan inspecciones a cada frente de trabajo.

4. En caso de requerir realizar cambios en los sitios o diseños autorizados, deberá informar a esta entidad para su respectiva evaluación.

Cumplimiento:

A la fecha los diseños definitivos presentados en primera instancia no han sido modificado.

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**

NIT: 901.501.273-2

5. No se permite la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua.

Cumplimiento:

Las labores constructivas no disponen residuos de construcción y demolición, ni materiales de construcción.

6. Se prohíbe el lavado de la maquinaria y equipo en el cuerpo de agua, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de este.

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control, la prohibición de lavado de equipo y maquinaria en el cuerpo de agua.

7. No se deberá disponer ningún residuo líquido en el cuerpo de agua.

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control, la prohibición de disposición de residuos líquidos en el cuerpo de agua.

8. No se deberá disponer en el cuerpo de agua ni en sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales.

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control, la prohibición de disponer algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales en el cuerpo de agua.

9. En caso de contingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza inmediatamente y tomar las correcciones apropiadas.

Cumplimiento:

En el anexo 2, presentamos reporte de investigación de accidentes por derrames de sustancias químicas a la fecha.

10. Una vez terminado el trabajo debe presentar ante la C.R.A. un informe de actividades que muestre el antes, durante y el después de la construcción de las obras.

Cumplimiento:

No aplica.



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

11. Implementar medidas apropiadas para controlar y mitigar los efectos que puedan generarse por inundaciones e incendios Forestales sobre el área donde se proyectan las actividades.

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control, para controlar y mitigar los efectos que puedan generarse por inundaciones e incendios Forestales sobre el área donde se proyectan las actividades.

12. Implementar las medidas necesarias para la protección y aislamiento del cuerpo de agua con el objeto de evitar el aporte de materiales.

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control para la protección y aislamiento del cuerpo de agua con el objeto de evitar el aporte de materiales en el cuerpo de agua.

13. Informar a la C.R.A., el inicio de actividades.

Cumplimiento:

Mediante Radicado CRA número 202114000111332 informamos a la CRA la apertura de las actividades constructivas del contrato de la referencia.

14. Cumplir con lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones".

Cumplimiento:

A la fecha los residuos generados en las actividades constructivas son reutilizados o reciclados.

15. La utilización de otros predios aledaños al proyecto, estarán sujetos a las respectivas servidumbres y serán responsabilidad del Consorcio JCO Mallorca para lo cual deberán informar a la C.R.A., y presentar las respectivas autorizaciones antes de iniciar las obras.

Cumplimiento:

A la fecha no se han usados predios que requieran servidumbre u otro tipo de autorización.

16. Cualquier intervención relacionada con el uso de los recursos naturales (Mangle), deberán contar con un permiso previamente otorgado por la Autoridad Ambiental (CRA).

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**

NIT: 901.501.273-2

Cumplimiento:

A la fecha no se ha requerido el uso de otro recurso natural.

17. No se podrá realizar ni adelantar acciones que puedan provocar quemas en la zona de parches de mangle, en el área de bien de uso público.

Cumplimiento:

Los procesos constructivos no implementan métodos o materias primas que provoquen quemas en la zona de parches de mangle, en el área de bien de uso público.

18. En el momento que se pretenda adelantar alguna ocupación temporal o permanente de la zona Marina, se deberá contar con un permiso por parte de la DIMAR.

Cumplimiento:

A la fecha no se ha requerido la ocupación temporal o permanente de la zona Marina, que deba contar con un permiso por parte de la DIMAR.

19. Deberá tramitar ante la C.R.A. antes de iniciar la operación del proyecto una concesión de aguas superficiales para el uso de la piscina proyectada y presentar en la misma, la descripción de proceso de tratamiento propuesto y descarga al cuerpo de agua teniendo en cuenta que en las caracterizaciones presentadas se observa unas aguas no aptas para dichos usos, por la contaminación microbiológica por Coliformes Totales y Fecales presentes.

Cumplimiento:

No aplica.

20. En caso de requerir el aprovechamiento de otros recursos naturales deberá realizar el respectivo trámite ante esta Corporación o la autoridad competente.

Cumplimiento:

A la fecha no se ha requerido el uso de otro recurso natural.

21. El área del proyecto de interés se encuentra ubicado en zonas categorizadas como determinante ambiental identificadas y compiladas por la C.R.A., por lo tanto, deberán tenerse en cuenta todos los usos y alcances, así como las recomendaciones y/o medidas descritas para el desarrollo de cualquier proyecto, obra o actividad.

22. Garantizar la preservación de los individuos de mangle presentes al inicio de las actividades observando los usos permitidos.



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Cumplimiento:

Dentro el Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de la referencia, contempla como medida de mitigación y control, garantizar la preservación de los individuos de mangle presentes al inicio de las actividades observando los usos permitidos.

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

ANEXO No. 4

Acta Comité Ambiental



ACTA DE COMITE DE OBRAS No.

Pág 1 de

CÓDIGO
FP-504-03
(01/09/2021)

OBJETO CONTRATO:

Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA:

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Barranquilla

FECHA:

Feb. 15/2021

EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
Carlos D. Dossan		Amb.
Christian Benavides		UBA
Liliana Gallardo	eq. Amb.	CP

II. OBJETO DE COMITE

Hacer recibido por la obra.

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

RESPONSABLE

CUMPLE/NO CUMPLE

NA.		

IV. ORDEN DEL DIA

1. Recibido

2. Compromiso

Se realiza el recorrido por la obra en donde se observa manejo inadecuado de los residuos sólidos domésticos y de obra.

Se solicita al Contratista colocar dos puntas ecológicas e iniciar limpieza de embalses y cajas de cartón.


Igualmente se evidencia que no cuentan con kit antidecayente en el frente de obra del lap.

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA
Puntos Ecológicos	Contratista	24/02/2023
limpieza en la obra	Contratista	24/02/2023
167 Antiterremoto		25/02/2023
VI. PRÓXIMA REUNIÓN		
FECHA _____		
DIA MES AÑO		

ANEXO 6

COMITÉS DE OBRA

- DE LAS GARANTIAS PARA LA ANI EN EL DESARROLLO DEL CARRIL DE DESACELERACION Y LA INCLUSION DENTRO DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL DE UNA COMPENSACION A LA COMUNIDAD DE PESCADORES DE LA ZONA.
- 2) PROGRAMACION CARNAVALES: EL CONTRATISTA INFORMA QUE NO SE TRABAJARA SABADO Y DOMINGO PERO SI SE LABORA LOS DIAS LUNES Y MARTES.
- 3) DETALLES ALCORQUES: EL CONTRATISTA SOLICITA A EDUAR ESTABLECER ORDEN CUANTO SE DEBEN CONSTRUIR LOS ALCORQUES YA QUE EN PLANOS SOLO ESTA EL DETALLE Y ADENAS ESTABLECER SI SON O NO NECESARIOS LOS PUCOS QUE ALLI APARECEN.
- 4) PARQUEADERO: EDUAR INFORMA QUE EL PROXIMO MARTES ENTREGARA AL CONTRATISTA LA COTAS DEFINITIVAS DE LA ZONA DE PARQUEADERO
- 5) BALANCE DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA INFORMA QUE REALIZARA BALANCE DEL CONTRATO EL LUNES 13 DE FEBRERO, INCLUYE PRESUPUESTO HIDROSANITARIO Y LA VERSION DE UDZ Y DATOS CON LA ACTUAL PREVISION Y CON EL VALOR DE TODO EL COMPONENTE PROPOSTO.
- 6) PINTURA MADERA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR CUANTO ANTES PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS EN MADERA PARA EVITAR DETERIORO. EL CONTRATISTA SOLICITA QUE ESTE TRABAJO SE CANCELE POR APARTE PORQUE NO ESTA EN EL APO, PERO LA INTERVENTORIA ACLARA QUE ESA ACTIVIDAD SI ESTA INCLUIDA EN LAS ESPECIFICACIONES Y DEBIA SER INCLUIDA EN SU APO. LA INTERVENTORIA INSISTE EN QUE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER REALIZADA POR EL CONTRATISTA:
- 7) TOMA DE DETALLES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA TOMA DE

	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 38 Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)
---	--	-------------------------------------

DETALLES PENDIENTES EN LOS MODULOS PARA RECEPCION DE OBRA, LA INTERVENCIÓN

ENTREGARÁ INVENTARIO DE PENDIENTES POR MODULO

8) PROROGA: EL CONTRATISTA INFORMA QUE LA PROXIMA SEMANA PRESENTARA

EDUCATIVO DE PROROGA

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA <u>21</u> <u>03</u> <u>23</u> DIA MES AÑO

ANEXO 7

INDICADORES DE CALIDAD

CONSOLIDADO INDICADORES DE PROCESOS/PROYECTOS

PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UPI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

[illegible]

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

MEDICION INDICADOR :

1 al 28 de
Febrero de 2023

PROYECTO:

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	ACTIVIDAD	APLICA SI/NO	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACION
1	Control sobre los documentos contractuales (polizas, contratos, otro si, etc)	SI	X		
2	Revisión y aprobación de las actas de obra	SI	X		
3	Seguimiento al Programa de Inversiones	SI	X		
4	Revisión y aprobación de análisis de precios no previstos	SI	X		
5	Control del personal asignado por el ejecutor	SI	X		
6	Control estado diario del tiempo	SI	X		
7	Control a equipos y dispositivos de medición	SI	X		
8	Registro fotografico de los avances y eventos diarios de la obra	SI	X		
9	Seguimiento y control al avance de obra (Ejecutado Vs. Programado)	SI	X		
10	Exigencias al contratante de la documentación (Diseños, Planos, etc) que se generen durante el desarrollo del proyecto	SI	X		
11	Seguimiento y control sobre los pagos de aportes parafiscales y seguridad social del contratista	SI	X		
12	Control sobre los metodos constructivos empleados en cada una de las actividades	SI	X		
13	Verificación de medidas y cuantificación de cantidades de obra	SI	X		
14	Control Topografico del proyecto (verificación de trazados y nivelación)	SI	X		
15	Verificación de la calidad de los materiales	SI	X		
16	Reuniones de Comité de Obra	SI	X		
17	Seguimiento a la Matriz de Planificación del Servicio	SI	X		
18	Elaboración Informe Mensual de Interventoria	SI	X		
19	Reuniones de Calidad	N.A.			En Comité de Obra
20	Encuesta de Retroalimentación del cliente	N.A.			
21	Auditorias interna de Calidad	N.A.			
22	Auditorias Externa	N.A.			
23	Evaluación de desempeño de personal interventoria	N.A.			
TOTAL			X		

PERIODO		
1 al 28 de Febrero de 2023	18	ACTIVIDADES
No. Actividades que aplican en el periodo	18	
No. Actividades que cumplieron en el periodo	18	
No. Actividades que no cumplieron en el periodo	0	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

META 90%

100,00%

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR: ACT. EJECUTADAS / ACT. PROGRAMADAS

PROCESO / PROYECTO:

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

PERIODO: 1 al 28 de Febrero de 2023



Resultado del indicador en el periodo:

100,00%

Comparación del resultado con la meta:

90%

Se dio cumplimiento al indicador

Comparación del resultado con el histórico:

Se mantiene

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

No aplica

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

No aplica

MEDICION INDICADOR: 1 al 28 de Febrero de 2023
PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES INTERVENTORIA Y/O ESTUDIO

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
PROYECTO: EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA
 DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	INFORME	CUMPLIO	FECHA ENTREGADA	FECHA ESPERADA	OBSERVACION
1	Informe Semanal No. 74	SI	8/02/2023	8/02/2023	
2	Informe Semanal No. 75	SI	15/02/2023	15/02/2023	
3	Informe Semanal No. 76	SI	23/02/2023	23/02/2023	
4	Informe Semanal No. 77	SI	1/03/2023	1/03/2023	
5	Informe Mensual No. 18	SI	16/03/2023	16/03/2023	

PERIODO	
1 al 28 de Febrero de 2023	
No. Informes presentados en el periodo	5
No. Informes entregados a tiempo	5
No. Informes atrasados	0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META 90%	
	100%

MEDICION INDICADOR
 PRESENTACIÓN OPORTUNA
 DE INFORMES INTERVENTORIA
 Y/O ESTUDIO
 PARA LAS INTERVENCIONES
 NECESARIAS PARA LA
 EJECUCION DE LOS PROYECTOS
 ECOPARQUE UF1 DISTRITO
 FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
 RECUPERACION INTEGRAL DE LA
 CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
 CIUDAD DE BARRANQUILLA.

PERIODO

No. Informes presentados en el periodo	5
No. Informes entregados a tiempo	5
No. Informes atrasados	0

1 al 28 de Febrero de 2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR: CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCESO / PROYECTO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

PERIODO: 1 al 28 de Febrero de 2023

100%


Resultado del indicador en el periodo:

0

Comparación del resultado con la meta:

0%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)


NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE QUEJAS

PROCESO / PROYECTO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

PERIODO: 1 al 28 de Febrero de 2023

NÚMERO DE QUEJAS POR MES



Resultado del indicador en el período:

0

Comparación del resultado con la meta:

0

Se da cumplimiento sin novedad

Comparación del resultado con el histórico:

Se cumple con el indicador

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

ANEXO 8

GESTIÓN SOCIAL

FP-34-00
(24/04/2013)

Proyecto No. 1. Atención Comunitaria						
OBJETIVO DEL PROYECTO						
Este programa permite mantener un contacto directo con todas las personas de la zona de influencia directa.						
TIPO DE MEDIDA						
Control	X	Prevención	X	Mitigación		
ACTIVIDADES DEL MES						

- El contratista mantiene un Profesional Social para la atención comunitaria.
- Se adecuó un correo electrónico para recepción de quejas, reclamos y/o sugerencias. - resocialmallorquin@gmail.com; para el periodo, no se han evidenciados recepción de quejas o reclamos por este medio.
- El horario de atención comunitaria es de Lunes a Viernes desde las 8.30 a.m. Hasta las 5.00 p.m.
- Para el periodo, el contratista no reporta PQRS referentes al proyecto.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Cumplir con la atención de quejas y reclamos	No. de PQRS recibidas/ No. PQRS atendidas	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 2. Comunicación y Divulgación
OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener informada a la comunidad con respecto a todo lo relacionado con el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	
---------	---	------------	---	------------	--

ACTIVIDADES DEL MES

Reuniones informativas

No aplica para el periodo

Piezas Divulgativas

Para el periodo, se realizo entrega de pieza divulgativa en la cual se informo respecto al avance de obra en el mes de febrero. Ver anexo 1. listado


SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Cumplir con las convocatorias y reuniones programadas	No. de reuniones programadas/ No. reuniones realizadas	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos
OBJETIVO DEL PROYECTO
TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	
---------	---	------------	---	------------	--

ACTIVIDADES DEL MES

- No aplica

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Elaboración de actas de vecindad si el caso lo amerita	No. de actas de vecindad iniciales/actas de vecindad de cierre	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 4 Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria
TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	
---------	---	------------	---	------------	--

ACTIVIDADES DEL MES

Pare el periodo, el contratista realizo dos talleres educativos de gestión ambiental, estos fueron dirigidos a niños entre los 3 y 13 años del sector del barrio Las Flores


SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Realizar jornadas de educación ambiental	No. de talleres programados/No. De talleres realizados	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 5. Generación de Empleo
OBJETIVO DEL PROYECTO

Dar prioridad a la contratación de mano de obra no calificada MONC, y mano de obra calificada, MOC, proveniente del AID del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	
---------	---	------------	---	------------	--

ACTIVIDADES DEL MES

El contratista informa que para el mes de febrero del 2023 no se realizaron nuevas contrataciones laborales.


Hasta la fecha, no han sido entregadas las certificaciones por parte del centro de Oportunidades.

Se dio inicio al proceso de reclutamiento de hojas de vida de mujeres cabeza de hogar, esto con el fin de incorporar a dos personas, como brigadistas ambientales, esto se concretaría para el mes de marzo.

GENERACION DE EMPLEO	
Personal Mano de Obra Calificada	6
Personal Mano de Obra No Calificada	74
Total, Personal	80


PERSONAL POR SEXO

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

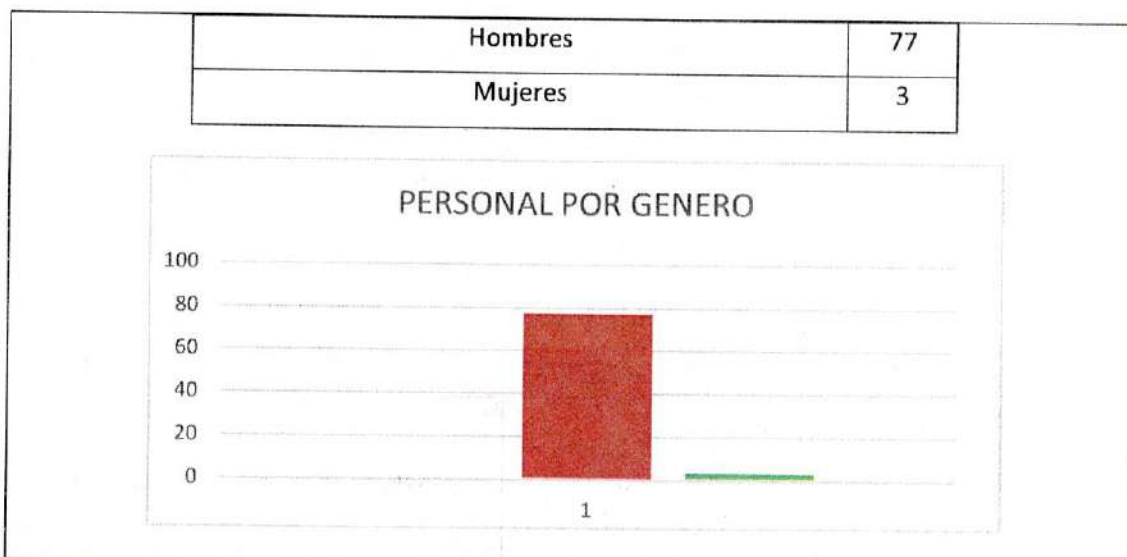


SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Realizar la contratación de mano de obra local	No. De convocatorias/No. de contrataciones	Mensual	Informe Mensual Entrega de la certificación del Centro de Oportunidades

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Elaboración de informes mensuales
- Visitas de obra, dos veces por semana y gestionar actividades comunitarias con las personas de la zona de influencia directa del proyecto-

FIRMA:



NOMBRE: MARIELA VILORIA MARTINEZ

Anexo 1
Listado - Entrega de Pieza Divulgativa

 CONSORCIO JOO MALLORQUÍN NTT: 901.501.275-2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO:FAM VERSION:1 FECHA: 12/02/22
---	---	--

PROYECTO: Parque Maiborquin Unidad Funcional 1.

LUGAR: Corregimiento la playa / zona iglesia y cas de police

FECHA: 9/02/23 HORA DE INICIO: 8:30 Am HORA FIN: 10:42 Am

[illegible]

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

Anexo 2
Evidencias Talleres Pedagógicos



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 13 de febrero de 2023
JCO-068-2022

Señores
ING INGENIERIA DE PROYECTOS

Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Barranquilla, Colombia.

REF: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS.

Por medio de la presente notifico que yo Carlos Angulo pte de JAC de las Flores notifico ser testigo y receptor del taller medio ambiental realizado por la psicóloga social Isabella Monterroza Vásquez identificada con el número de cedula 100 568 0047 donde se trataron temas como tipos de mangle, cuidado, vives de mangle y conservación del mangle donde los principales receptores del taller fueron niños del jardín infantil Las Florecitas del barrio las flores.

Carlos Angulo Lozano



**INFORME TECNICO
PROFESIONAL Y/O
ESPECIALISTAS**

FP-34-00
(24/04/2013)



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 07 de febrero de 2023
JCO-068-2022

Señores
ING INGENIERIA DE PROYECTOS

Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Barranquilla, Colombia.

REF: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Por medio de la presente notifico que yo Rosa Bravo identificado con el número de cedula 3. 747.738 notifico ser testigo y receptor del taller medio ambiental realizado por la psicóloga social Isabella Monterroza Vásquez identificada con el número de cedula 100 568 0047 donde se trataron temas como tipos de mangle, cuidado, vives de mangle y conservación del mangle donde los principales receptores del taller fueron niños del jardín infantil Las Florecitas del barrio las flores.

Rosa Bravo

Cedula de. 3. 747.738

ANEXO 9

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 10

BITÁCORA

Módulo 13 : Instalación de piso deck, frisos y viguetas

Módulo 34: Instalación de vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote (66c)

Módulo 41: Trasiego e instalación de riostras.

Actividades Estación 3

- Retiro de retazos de pilotes

Agustina Villegas

Residente de Interventoría

Alfonso Olguín

Residente de Obra

1 DE FEBRERO DE 2023 - MIÉRCOLES

clima : seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal Frentes Tierra

1 - Topógrafo

1 - Cadenero

1 - Inspector

1 - Operador

1 - Torrero

3 - Maestros de Obra.

1 - Vigilante

30 - Ayudantes

10 - Oficiales

Personal Estación 3

1- Maestro de Obra

2- Ayudantes

1- Vigilante

Equipos Frentes Tierra

1- Nivel - 0 horas

3- Plantas Electricas - 0 horas

6- Taladros - 0 horas

2- Cortadores ^{1bueno} ^{1malo} - 7 horas

2- Motosierras ^{1bueno} ^{1malo} - 7 horas

1- Sierra de Mano - 7 horas

35- Herramientas Menores - 7 horas

1- Cabria - 7 horas

Equipos Estación 3

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8 - Instalación de pie de amigos

Módulo 11 - Instalación de Piso Deck

Módulo 13 - Instalación de Piso Deck

Módulo 12 - Armado e instalación de cenefas, trasiego de piso deck y vigas laminadas.

Módulo 35 : Corte de pilotes.

Módulo 36 : Trazado de niveles.

Módulo 41 : Instalación de riostras. • Las riostras se encuentran sin geomembranas y los pilotes también.

Módulo 40 : NO se realizan actividades de izado por daños en la motosierra.

Actividades Estación 3

- Llegada, descargue y distribución de materiales

Reguetia Vallegos

ghmm/luugua

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

2 DE FEBRERO DE 2023 - JUEVES

clima: Seco

Se inician actividades a las 8 am.

PERSONAL FRENTE TIERRA

1- Topógrafo

1- Cadenero

1- Inspector

1- Torrero

3- Maestro de Obra

1- Operador

33- Ayudantes

9- Oficiales

Equipos Frente Tierra

1- Nivel - 0 horas

3- Plantas Electricas - 7 horas

6- Taladros - 7 horas

2- Cortadores - 7 horas

2- Motosierras - 7 horas

1- Sierra de mano - 7 horas

32- Herramientas menores - 7 horas

1- Cabria - 7 horas

Actividades Frenes Tierra

Módulo 8 : Instalación de barandas y parales en la parte interna.

Módulo 11 : Instalación de piso Deck.

PERSONAL ESTACIÓN 3

1- Maestro de Obra

2- Ayudantes

1- Vigilante

Equipos Estación 3

1- Planta Electrica - 7 horas

1- Cortador - 5 horas

3- Taladros - 7 horas

5- Herramientas menores - 5h

VIENE DE LIBRO N.º 1.

2 DE febrero de 2023 JUEVES

Módulo 13: Instalación de DECK Y DE CENEFAS, Trasiego de materiales.

Módulo 35: Instalación de vigas laminadas.

Módulo 38: Corte e instalación de tacos.

Módulo 40: Izado de pilotes (B66 - B65 - C65 - B64)

Módulo 41: Instalación de Riestras.

Actividades Estación 3

- Pre - armado de muros.

Lynethia Velasco

Residente de Interventoría

Juan Diego
Residente de Obra.**3 DE febrero de 2023 VIERNES**

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE TIERRA**PERSONAL ESTACIÓN 3**

28- Ayudantes

1- maestro de obra

1- Topografo

2- Ayudantes

1- Cadenero

1- Vigilante

1- Torrero

1- Operador

1- Inspector

1- Soldador

10- Oficiales

3- Maestros de Obra

Equipos Frente Tierra**Equipos Estación 3**

1- Nivel - 0 horas

1- planta electrica - 6 horas

3- Plantas Electricas - 7 horas

3- Taladros - 6 horas

6- Taladros - 7 horas

1- cortador - 4 horas

2- Cortadores - 7 horas

5- Herramientas menores

2- Moto sierras - 7 horas

- 4 horas.

1- Sierra de Mano - 7 horas

33- Herramientas menores - 7 horas

1- Cabria - 6 horas

Actividades Frente Tierra

Módulo 9: Instalación de parales de barandas.

Módulo 11: Instalación de piso Deck

Módulo 12: Instalación piso Deck

Módulo 13: Instalación piso Deck y armado e instalación de cenefas

Módulo 35: Instalación de vigas laminadas

Módulo 36: Trasiego de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos de pilotes

Módulo 40: Izado de pilotes (C-64, C-63, B-63, C-62)

Actividades Estación 3

Pre armado de muros y distribución para instalación.

Luzmila Velasco

Residente de Interventoría

Alfonso Luna
Residente de Obra.4 DE FEBRERO DE 2023 SABADO

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL Frente Tierra

1- Topografo

1- Cadenero

1- Operador

1- Torrero

1- Inspector

3- Maestros de Obra

1- Soldador

6- Oficiales

24- Ayudantes

Equipos Frente Tierra

1- Nivel - 6 horas

3- Plantas electricas - 6 horas

6- Taladros - 6 horas

2- Cortadores - 6 horas

2- Motosierras - 6 horas

1- Sierra de mano - 6 horas

33 - Herramientas menores - 6 horas

1 - Cabria - 6 horas

Actividades Frentes Tierra

Módulo 12 : Instalación de piso Deck

Módulo 13 : Instalación de amarre inferior de muro y vigas aéreas de 13 x 50.

Módulo 36 : Instalación de vigas laminadas.

Módulo 40 : Izado de piloto C-61

• El personal que faltó en el día de hoy estaba realizando curso de alturas.

• En Estación 3 no se realizó ninguna actividad.

Lyettia Ulloa

Residente de Interventoría

Alfonso Luna

Residente de Obra.

5 de Febrero de 2023 Domingo

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DÍA DE HOY

Lyettia Ulloa

Residente de Interventoría

Alfonso Luna

Residente de Obra.

6 de Febrero de 2023 Lunes

Clima : Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes Tierra

EQUIPOS FRENTES TIERRA

1- Maestro de Obra

4- Plantas eléctricas - 7 horas

1- Operador

2- Motosierras - 6 horas

1- Inspector

1- Cabria - 7 horas

1- Topografo

7- taladros - 5 horas

1- Cadenero

50- Herramientas menores-8h

5- Oficiales

2- cuerpos de andamios

18- Ayudantes

- 5 horas

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8: Instalación de parales de Baranda

Módulo 12: Instalación de piso Deck

Módulo 13: Instalación de viga aérea (13×50)

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 40: Nivelación de pilotes para izado, preparación de cabria e izado de pilotes.

Módulo 41: Perforación de pilotes

Lynethia VelazquezAlfredo Luna

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

7 DE FEBRERO DE 2023 Mañes

Clima: SECO

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes TierraEquipos Frentes tierra

1- Vigilante

4- Plantas electricas - 8 hor

2- Maestros de obra

3- Cuerpos de Andamios - 8h

8- Oficiales

10- Taladros - 8 horas

25- Ayudantes

50- Herramientas menores

1- Inspector

1- Cabria - 7 horas

1- Operador Cabria

2- Motosierras - 5 horas

1- Cadenero

1- Topografo

Actividades Frentes tierra

Módulo 12: Instalación de piso Deck

Módulo 13: Instalación de vigas de 13×50 , Deck y muros exteriores.

Módulo 34: Instalación de pernos

Módulo 37: Corte e instalación de vigas laminadas.

Módulo 40: Se izaron 4 pilotes.

Módulo 48: Perforación de pilotes para muros

Lynethia VelazquezAlfredo Luna

Residente de Interventoria

Residente de obra

8 de febrero de 2023 Miércoles

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes Tierra

3- maestros de obra

1- Inspector

1- Operador

8- Oficiales

24- Ayudantes

1- Cadenero

1- topografo

1- Vigilante

1- Siso

Equipos Frentes Tierra

4- Plantas electricas - 6 horas

2- Motosierras - 5 horas

1- Cabria - 6 horas

10- Taladros - 6.3 horas

50- Herramientas menores - 6hr

3- Cuerpos de Andamio - 6hr

Actividades Frentes tierra:

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 12: Instalación de pisos deck

Módulo 13: Instalación de muros, pisos deck y 3 vigas aereas

Módulo 34: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos y cortes de pilotes.

Lyettia Velazquez

Residente de Interventoria

Alfonso Luna

Residente de obra.

9 de febrero de 2023 Jueves

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal Frentes tierra

1- vigilante

2- Topografos

2- Cadeneros

4- Maestros de Obra

8- Oficiales

Equipos Frentes tierra.

5- Plantas electricas - 8 horas

10- Taladros - 8 horas

4- Sierra electrica - 8hr

45- Herramientas menores - 8hr

1- Nivel - 4 horas

líder=

23- Ayudantes

1- Siso

3- Cuerpos de Andamios - 8 horas

2- Motosierras - 6 horas

1- Cabria - 7 horas

Actividades Frenes Tierra:

Módulo 9: Instalación de barandas.

Módulo 10: Instalación de parales para baranda

Módulo 11: Instalación de parales para baranda

Módulo 12: Instalación pisos deck.

Módulo 13: Instalación pisos deck y de muros.

Módulo 14: Pre armado de muros para ser instalados en m3.

Módulo 35: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos

Módulo 39: Instalación de riostras

Módulo 40: Izado de pilote

Regina Villegas

Residente de Interventoria

Alfonso Luna

Residente de obra.

10 de Febrero de 2023 Viernes

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal frenes tierra

4- maestros de obra

1- Operador

1- Inspector

8- Oficiales

23- Ayudantes

1- Topografo

1- Cadenero

1- Vigilante

1- Siso

Equipos frenes tierra

5- plantas electricas - 8 horas

11- Taladros - 8 horas

2- Motosierras - 6 horas

1- Cabria - 8 horas

48- Herramientas Menores - 8h

4- Sierras electricas - 8h

3- Cuerpos de andamios - 8h

Actividades frenes tierra

Módulo 11: Instalación de parales

Módulo 12: Instalación de pisos deck

Módulo 13 : Instalación pisos deck y muros

Módulo 35 : Instalación de pernos en vigas.

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de vigas laminadas y de tacos.

Módulo 39: Instalación de riostras

Módulo 40: Izado de pilotes y trasiego de materiales.

Módulo 41: Instalación de tacos.

Regentia Velaz

Alonso Luna

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

11 de Febrero de 2023 Sanado

clima : Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes Tierra

Equipos Frentes Tierra

4 - maestros de obra.

5 - plantas electricas - 8 horas

1 - Operador

9 - Taladros - 8 horas

1 - Inspector

2 - Motosierras - 5 horas

7 - Oficiales

1 - Cabria - 8 horas

20 - Ayudantes

42 - Herramientas Menores - 7h

1 - Topografo

2 - Cortadores electricos - 4h

1 - Cadenero

1 - Vigilante

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8 : Instalación de barandas

Módulo 13: Corte en trazado de segundo cubiculo e instalación de dinteles de puertas locales.

Módulo 37: Trasiago de materiales y pernos de vigas L.

Módulo 38: Instalación de vigas laminadas.

Módulo 39: Instalación de tacos

Módulo 40: Izado de pilotes.

Regentia Velaz

Alonso Luna

Residente de Interventoría

Residente de obra.

12 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

Cynthia Villegas

Residente de Interventoría

Juan Luis

Residente de Obra

13 de Febrero de 2023 Lunes

clima: Seco

Se inician las actividades a los 8:00 am.

Actividades Frente tierra (Módulos 10, 13)

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación piso deck en area interna de locales y trasiego de material para muro armado.

Personal (modulo 10, 13)

Equipos (modulo 10, 13)

2- maestros de obra

1- Planta electrica - 8 horas

2- Oficiales

1- Cortador - 8 horas

10- Ayudantes

19- Herramientas menores - 8h

Actividades Frente Tierra (Módulos 37, 38, 36, 40, 48)

Módulo 36: Corte de pilotes en gradas, perforación de tacos entre vigas laminadas y trasiego de material

Módulo 37: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 40: Tzado de pilotes.

Módulo 48: Perforación de pilotes para rostras.

Personal (M 37, 38, 36, 40, 48)

Equipos (m 36, 37, 38, 40, 48)

3- maestros de obra

3- Plantas electricas - 7h

1- Operador

6- Taladros - 7 horas

1- Inspector

2- Molosieras - 5 horas

7- Oficiales

1- Cabria - 8 horas

16- Ayudantes

32- Herramientas menores - 8h

1- Topografo

Cynthia Villegas

Residente de Interventoría

Juan Luis

Residente de Obra

14 de Febrero de 2023 Martes

clima: seco

Se iniciaron actividades a las 8:00 am.

Actividades Frentes Tierra (Módulos 10, 13-33)

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación de piso deck, armado de muros y armado e instalación de cenefas para refuerzo en área interna de locales.

Módulos 14 - 33: levantamiento topográfico de piso deck.

Personal (10, 13-33)

Equipos (10, 13-33)

2- maestros de obra

1- Planta eléctrica - 8h

2- Oficiales

1- Cortador - 8h

10 - ayudantes

19 - Herramientas menores - 8h

1- Topógrafo

1- Cadenero

Actividades Frentes Tierra en módulos 34, 36, 37, 38, 40, 48

Módulo 34: Instalación de tacos de pilotes entre viga laminadas

Módulo 36: Corte de pilotes en gradas y trasiego de materiales

Módulo 37: Corte de pilotes en gradas y trasiego de materiales.

Módulo 38: Instalación de pernos entre viga laminadas

Módulo 40: Izado de pilotes

Módulo 48: Perforación de pilotes para riostras

Personal m 34, 36, 37, 38, 40, 48

EQUIPOS m 34, 36, 37, 38, 40, 48

3- maestros de obra

4- Plantas eléctricas - 8h

1- Inspector

6- Taladros - 7 horas

1- Operador

2- Motosierras - 6h

1- Soldador

1- Cabria - 7 horas

7 - Oficiales

32 - Herramientas menores - 8h

15 Ayudantes

Synthia Villegas

ghmm (1) lug 11

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

lider=

15 de Febrero de 2023, miércoles

Clima: Seco

Se iniciaron actividades a las 8:00 am.

Actividades Frente Tierra (módulos 8, 10, 11, 13)

Módulo 8: Instalación de pie de omigos

Módulo 10: Instalación de barandas y paraleles

Módulo 11: Instalación de paraleles

Módulo 13: Trazado escalones tierra, instalación de muros y de piso deck

Personal (m 8, 10, 11, 13)

Equipos (m 8, 10, 11, 13)

1-vigilante

1-Planta electrica - 8 horas

1- Siso

4-Taladros - 8 horas

2- Maestros

1-Cortadora - 8 horas

2- Oficiales

12- Herramientas menores- 8h

8- Ayudantes

Actividades Frente Tierra (módulos 34, 35, 36, 40, 41, 48)

Módulo 34: Instalación de cenefas y viguetas

Módulo 35: Instalación de tacos de pilotes entre viguetas

Módulo 36: Corte de tacos de pilotes e instalación de tacos de pilotes entre viguetas

Módulo 40: Izado de pilotes

Módulo 41: Enderezado de pilotes

Módulo 48: Instalación de riostras

Personal

Equipos

2-maestros de obra

4- Plantas electricas - 8 h

1- Operador

6-Taladros - 8 h

1- Soldador

2- Motosierras - 5h

7- Oficiales

1- Cabria - 8 h

16 - Ayudantes

32- Herramientas menores- 8

1 - Cadenero

1- Topografo

Cynthia Velasco A.

Juan Manuel Lopez

Residente de Interventoría

Residente de Obra

16 de Febrero de 2023 Jueves

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frenes Tierra (módulos 11, 13)

Módulo 11: Instalación de parales de baranda y barandas.

Módulo 13: Excavación para instalación de vigas laminadas y de vigas internas en cubículos. Instalación de piso deck y de amarre superior de muros.

Personal

Equipos

2- maestros

2- Sierras de mano - 7h

11- Ayudantes

3- Taladros - 6h

2- oficiales

1- Sierra de mano - 7h

2- Plantas eléctricas - 7h

Actividades Frenes tierra en módulos (34, 35, 37, 38, 40, 41, 42)

Módulo 34: Instalación de viguetas.

Módulo 35: Instalación de cenefas.

Módulo 37: Instalación de tacos entre vigas laminadas.

Módulo 38: Instalación de tacos entre vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote

Módulo 41: Corte de pilotes.

Módulo 42: Instalación de riostras.

Personal

Equipos

2- maestros de obra

4- Plantas eléctricas - 7 horas

2- operadores

6- Taladros - 8 horas

1- Inspector

2- Motosierras - 7h

7- Oficiales

1- Cuerpo de Andamio - 6h

16- Ayudantes

1- Cabria - 8h

1- Cadenero

32- Herramientas menores - 8h

1- Topógrafo

Agustín Ulloa

Alfonso Ulloa

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

17 de Febrero de 2023 Viernes

Clima: Seco

Se iniciaron actividades a las 8:00 am.

Actividades en frentes Tierra (Módulos 8, 11, 13, 14)

Módulo 8: Instalación pie de amigos

Módulo 11: Instalación de parales de baranda.

Módulo 13: Armado de marcos internos e instalación remate del piso dock.

Módulo 14: Instalación de acometidas para alumbrado.

Personal (m-8, 11, 13, 14)

Equipos (m-8, 11, 13, 14)

3- maestros de obra

3- Taladros - 7h

8- Ayudantes

2- Plantas electricas - 7h

2- Oficiales

2- Sierras de mesa - 6h

Actividades Frentes tierra (Módulos 34, 35, 40, 41, 48)

Módulo 40: Tzado de pilotes

Módulo 34: Instalación de frisos

Módulo 35: Instalación de viguetas

Módulo 41: Corte y emparejado de pilotes para vigas laminadas.

Módulo 48: Instalación de nostras.

Personal (m 34, 35, 40, 41, 48)

Equipos (m 34, 35, 40, 41)

2- maestros de obra

3- Plantas electricas 7 horas

1- Inspector

4- Taladros 5 horas

2- Operadores

2- Motosierras

1- Soldador

1- Cuerpo de andamia

17- Ayudantes

1- Cabria

7- Oficiales

32- Herramientas menore

1- Topografo

1- Cadonero

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

18 de Febrero de 2023 Sábado

No se realizaron actividades en el día de hoy

Legitima Ullego A.

Residente de Interventoria

Shumilugil

Residente de Obra.

19 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

Legitima Ullego A.

Residente de Interventoria

Shumilugil

Residente de Obra

20 de Febrero de 2023 Lunes

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes Tierra (módulos 12 y 13)

Módulo 12: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación de marcos en área interna de locales

Personal (m 12, 13)

Equipos (m 12, 13)

3 - maestros de obra

1 - Planta eléctrica - 6h

7 - Ayudantes

1 - Cortador - 6h

1 - Vigilante

20 - Herramientas menores - 6h

Observaciones: En el módulo #26 se presentó daño en barandas por caída de árboles adyacentes a la pasarela.

Actividades Frentes tierra (módulos 34 y 35)

Módulo 34: Trasiego de materiales e instalación de cenefas

Módulo 35: Instalación de frisos y de viguetas

Personal

Equipos

5 - oficiales

3 - Plantas eléctricas - 7h

2 - maestros de obra

2 - motosierras - 2h

10 - Ayudantes

1 - Cobria - 0h

1 - Herramienta menor - 1h

Legitima Ullego

Residente de Interventoria

Shumilugil

Residente de Obra

21 de Febrero de 2023 Martes

Clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes Tierra (módulo 13)

Módulo 13: Instalación de parales para barandas, de piso deck en area interna de baños y vigas laminadas para gradiente. Corte de piso deck para remates de módulo y armado de marcos en area interna de locales.

Personal (módulo 13)

3- maestro de obra

1- Oficial

12- Ayudantes

1- Vigilante

Equipos (módulo 13)

1- Planta electrica - 6 horas

2- Cortadoras - 6 horas

28- Herramientas Menores - 6h

2- Cuerpos de Andamios - 6h

Actividades Frentes Tierra (módulo 34, 38, 39, 40)

Módulo 34: Instalación de tacos entre viguetas. Instalación de frisos.

Módulo 38: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 39: Instalación de pernos en vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote e instalación de vigas laminadas

Personal

5- Oficiales

2- Maestros de Obra

15- Ayudantes

1- Operador

1- Torrero

1- Cadenero

1- Inspector

Leopoldo Velasco

Residente de Interventoria

Equipos

3- Plantas electricas - 7h

4- Taladros - 6h

1- Motosierra - 5h

1- Cabria - 5h

35- Herramientas - 6h

Juan Luis

Residente de Obra.

22 de Febrero de 2023 Miércoles

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frentes Tierra (módulo 35, 39, 40, 48)

Módulo 35: Instalación de frisos y armado de cenefas

Módulo 39: Instalación de tacos

Módulo 40: Izado de pilote (3)

Módulo 48: Arriostramento

Personal (m 35, 39, 40, 48)

1- maestro de obra

6- Oficiales

11- Ayudantes

1- Topografo

1- Cadenero

Equipos (m 35, 39, 40, 48)

3- Plantas electricas - 7h

4- Taladros - 5h

1- Cabria - 5h

35- Herramientas menores - 5h

1- Moto sierra - 5h

1- Cortadora de mano - 5h

1- Cortadora de mesa - 5h

1- Nivel de precisión - 1h

Actividades Frentes Tierra (módulo 9, 11, 13)

Módulo 9: Instalación de pie de amigos

Módulo 11: Instalación de barandas, piso deck remate

Módulo 13: Instalación de vigas laminadas en gradena,

vigas aereas en area interna de locales e instalación de piso deck en area de baños.

Personal (m 9, 11, 13)

3- Maestros de obra

11- Ayudantes

2- Oficiales

1- Vigilante

Equipos (m 9, 11, 13)

2- Sierra de mano - 6h

2- Sierra de mesa - 6h

28- Herramientas menores - 6h

1- Planta electrica - 5h

4- Taladros - 4h

Legitimé Ullay

Residente de Interventoria

Juan Diego

Residente de Obra

23 de Febrero de 2023 Jueves

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes Tierra (módulo 35, 36, 39, 40, 48)

módulo 35: Instalación de viguetas

módulo 36: Instalación de viguetas

módulo 39: Instalación de tacos

módulo 40: Se izaron 4 pilotes.

Módulo 48: Instalación de nostras, corte de tacos de pilotes y trasiego de materiales.

Personal

2 - maestros de obra

1 - Inspector

1 - Soldador

1 - Operador

6 - Oficiales

14 - Ayudantes

1 - topografo

1 - Cadenero

Equipos

3 - Plantas electricas - 8h

2 - Motosierras - 7h

6 - Taladros - 7h

1 - Cuerpo de Andamio - 5h

1 - Cabria - 8h

32 - Herramientas menores - 8h

Actividades Frentes tierra (m 9, 11, 13)

módulo 9: Instalación pie de amigo

módulo 11: Instalación remate de piso deck

módulo 13: Construcción de peldaños, instalación de piso deck en area baños. Instalación de tornilleria en vigas de locales.

Personal

3 - maestros de obra

2 - Oficiales

12 - Ayudantes

1 - Vigilante

Equipos

2 - Sierras de mano - 6h

2 - Sierras de mesa - 6h

28 - Herramientas menores - 6h

1 - Planta electrica - 5h

4 - Taladros - 5h

Agustina Villegas

Residente de Interventoria

Juan Luis

Residente de Obra

24 de Febrero de 2023 - Viernes

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes tierra (módulos 17, 36, 39, 40, 46)

Módulo 17: Instalación de tuberías y cajas de paso para iluminación

Módulo 36: Instalación de viguetas y corte de tacos de pilotes

Módulo 39: Instalación de tacos de pilotes

Módulo 40: Tzado de pilotes (3)

Módulo 46: Perforación y tratado de arriestramiento

Personal

2 - Maestros de obra

1 - Inspector

1 - Operador

1 - Soldador

6 - Oficiales

16 - Ayudantes

Equipos

3 - Plantas eléctricas - 8h

2 - Motosierras - 7h

2 - Cuerpos de andamios - 6h

1 - Cabria - 6h

32 - Herramientas menores - 8h

Observaciones: se finalizó tzado de Pilotes

Actividades Frenes tierra (módulos 10 y 13)

módulo 10: Instalación de pie de amigos.

módulo 13: Instalación de piso deck, armado de muros internos en area de baños y armado de gradierias.

Personal

3 maestros de obra

2 - Oficiales

9 - Ayudantes

1 - Vigilantes

Regina Villegas A.

Residente de Interventoría

Equipos

1 - Planta eléctrica - 6h

2 - Sierras de mesa - 6h

2 - Sierras de mano - 6h

4 - Taladros - 6h

Alfonso Lugo V.

Residente de obra.

25 de Febrero de 2023, Sábado

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frenes tierra (módulo # 13)

módulo 13 : Armado de muros internos en area de baños

Personal

1 vigilante

1 Maestro

Equipos

2 plantas eléctricas - 4h

4 taladros - 4h

líder=

4 - Ayudantes

2 - Cortadores eléctricos - 4h

Actividades Frenes tierra (módulos 22, 23, 24, 34, 35, 36, 40, 46)

módulo 22: Puesta de tornillería faltante en deck

módulo 23: Puesta de tornillería faltante en deck

módulo 24: Puesta de tornillería faltante en deck.

módulo 34: Instalación piso deck

Módulo 35: Instalación deck, Frisos y viguetas en curvas

Módulo 36: Instalación de frisos.

Módulo 40: Instalación de planchas en izado

Módulo 46: Instalación de nostras.

PersonalEquipos

2 - maestros de obra

4 - Plantas eléctricas - 7h

1 - Inspector

2 - Motosierras - 5h

2 - Operadores

1 - Cuerpo de Andamia - 5h

1 - Soldador

1 - Cubria - 5h

7 - Oficiales

32 - Herramientas menores - 6h

20 - Ayudantes

1 - Topografo

1 - Cadenario

*Cynthia Velasco A.**Alfredo Lugo*

Residente de Interventoría

Residente de Obra

26 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

*Cynthia Velasco A.**Alfredo Lugo*

Residente de Interventoría

Residente de Obra

27 de Febrero de 2023 Lunes

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frenes tierra en módulos 13Módulo 13: Instalación de tornillos en piso deck,
soporte de cubierta y toma de niveles para armado en

Personal	Equipos
1 - Vigilante	2 - Plantas electricas - 8h
2 - Oficiales	2 - Cortadoras electricas - 8h
8 - Ayudantes	4 - taladros - 8h
	12 - Herramientas menores - 8h
<u>Actividades Frente Tierra (módulos 35, 36, 39, 40, 48)</u>	
módulo 35: Instalación de deck	
módulo 36: Instalación de viguetas y cenefas.	
módulo 39: Instalación de vigas laminadas y movimiento de carga	
Módulo 40: Instalación de platinas en izado.	
Módulo 48: Instalación de rastreos.	
Personal	Equipos
2 - maestros de obra	4 - Plantas electricas - 8h
1 - Inspector	2 - Motosierras - 5h
2 - Operadores	1 - Cuerpo de Andamio - 7h
1 - Soldador	1 - Cabria - 7h
7 - Oficiales	32 - Herramientas menores - 8h
16 - Ayudantes	
1 - Topografo	
1 - Cadenero	
<i>Leopoldo Villalba</i>	<i>Alfonso Limón</i>
Residente de Interventoria	Residente de Obra
<u>28 de febrero de 2013 Martes</u>	
clima: seco	
Se inician actividades a las 8:00 am.	
<u>Actividades Frente Tierra (módulos 11, 12, 13, 29)</u>	
módulo 11: Instalación de barandas.	
Módulo 12: Instalación de barandas y corte de punta de viga laminada.	
Módulo 13: Instalación de piso deck, cubiertas, armado de gradearias y de angulos de vigas aereas.	
Módulo 29: Instalación de tornilleria.	

<u>Personal</u>	<u>Equipos</u>
1 vigilante	3 Plantas electricas - 8h
1 maestro de obra	2 Cortadores electricos - 8h
3 oficiales	6 Taladros - 8h
11 Ayudantes	15 Herramientas menores - 8h
	1 Motosierra - 2h
<u>Actividades Frenes Tierra (módulo 34, 35, 39, 40, 42, 48)</u>	
módulo 34: Instalación de piso deck	
módulo 35: Instalación de piso deck.	
módulo 39: Instalación de vigas laminadas	
módulo 40: Instalación de platinas de izado	
módulo 42: Instalación de geomembranas.	
módulo 48: Instalación de riostras y trasiego de material	
<u>Personal</u>	<u>Equipos</u>
2 - maestros de obra	4 - plantas electricas - 8h
6 - Oficiales	1 - Cuerpo de Andamio - 4h
14 - Ayudantes	2 - Motosierras - 5h
1 - Topografo	32 - Herramientas menores - 8h
1 - Cadenero	
1 - Oficios varios	
<i>Ignatius Vellego</i>	<i>Ignatius Vellego</i>
Residente de Interventoria	Residente de obra.

ANEXO 11

INFORME Y ASPECTOS SST

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

**FECHA O
PERIODO:
PROYECTO:**

FEBRERO DE 2023

CONTRATO EDU - 566 – 2021 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ESPECIALIDAD: SST

**PROFESIONAL/
ESPECIALISTA:** CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 28 de febrero del 2023, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exija. De igual manera estos anexos soportan la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. INDUCCIÓN RE-INDUCCIÓN.

Para el periodo reportado el Contratista no realizó inducciones, no hay registros de asistencia, no han presentado el informe correspondiente al mes de febrero de 2023.

Las inducciones deben ser encaminadas a conocer los temas relevantes del sistema de gesto de seguridad y salud desarrollado para el proyecto, dentro de los cuales se debe hacer referencia a: Políticas SST, Políticas de alcohol y Drogas, Objetivos y Metas, Responsabilidades en el sistema, Reglamento

Interno, COPASST, Emergencias, Brigada, etc. Dentro de los temas de la inducción se debe incluir lo referente al protocolo de bioseguridad y las medidas para la prevención de COVID-19, sus variantes y medidas para prevenir su propagación.

2. EXÁMENES OCUPACIONALES

Para el desarrollo del programa de medicina preventiva y del trabajo el contratista de obra realiza al personal que ingresa a laborar los respectivos exámenes ocupacionales de ingreso dando así cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

El objetivo de este programa es conocer el estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales empleados, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano y un ambiente laboral sano, para poder desempeñar las actividades que le sean asignadas, los exámenes ocupacionales se deben realizar de acuerdo a un profesiograma el cual es un documento técnico - administrativo que organiza la interrelación, interacción e interdependencia de un puesto de trabajo desde los puntos de vista: de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores.

Dentro de los beneficios que tiene la implementación de un profesiograma es en cuanto a la contratación de personas que ocuparan puestos vacantes:

- Permite la inducción y contratación adecuada.
- Clasifica los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico – administrativa.
- Permite la actualización de manera periódica de la GTH.
- Permite que las personas contratadas y no contratadas no se vean perjudicadas.
- Sirve como herramienta para obtener los índices de SST, de manera especial los índices proactivos.
- Cumple con la normativa legal.

El Contratista reporto ingreso durante el periodo.

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDY JOSE VENERA MUÑOZ	1001852990	AYUDANTE DE OBRA
KENER JOSE FLOREZ BARRANCO	1044434115	CONTROLADOR DE ACCESO
DEIVIS MANUEL HERRERA MARIMON	72280980	AYUDANTE DE OBRA
ISABELLA STEFANIA MONTEROZA VASQUEZ	1005680047	TRABAJADORA SOCIAL
JASSIR ENRIQUE MERENCO ROJANO	1007187391	AYUDANTE DE OBRA
JOSE GREGORIO ATENCIO SIERRA	72340503	AYUDANTE DE OBRA
JOSE LUIS REALES OROZCO	1007200553	AYUDANTE DE OBRA
LUIS ALBERTO NUÑEZ HERNANDEZ	72215192	AYUDANTE
MELISSA RAMIREZ AHUMADA	1140888631	INGENIERA ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD

Fuente: Autor

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se presentaron los siguientes equipos durante el periodo

EQUIPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR
CABRIA En zona loop de aves	Artefacto utilizado para el izaje de pilotes	Albeiro Llerena
TELEHANDLER CAT TH103	Levantamiento de carga	Carlos Manuel Pertuz Cabarcas

Fuente: Autor

4. VEHÍCULOS

El contratista cuenta con un vehículo para la logística y apoyo del proyecto.

5. ACTIVIDADES DE INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS

Capacitaciones y Charlas

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores en las actividades de dragado, teniendo como resultado, trabajadores sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. Durante el periodo de febrero de 2023 se reportaron temas de sensibilización y prevención referente a temas de SST.

FECHA	TEMA
02-02-2023	Peligros y Riesgos en trabajo en Alturas
03-02-2023	Inducción
06-02-2023	Actividad de Alto Riesgo
09-02-2023	Orden y Aseo en los Puestos de Trabajo
14-02-2023	Cuidado de Manos
17-02-2023	Yo me cuido y te cuido (Autocuidado)
21-02-2023	Uso obligatorio de EPP
24-02-2023	Peligros y Riesgos
28-02-2023	Peligros y Riesgos en Actividades de Izaje
28-02-2023	Taller Cuidado de Manos

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

6. PERSONAL ACTIVO EN EL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo trabajado se contó con el siguiente personal que se registra a continuación:

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
1	7.693.002	CARLOS LEONARDO DUSSAN GARCIA	INGENIERO AMBIENTAL
2	1.143.130.109	DEIVIS RICARDO ZUÑIGA CASTRO	CONDUCTOR
3	8.706.660	JAVIER ENRIQUE VELEZ CAMARGO	DIRECTOR DE OBRA
4	1.123.991.100	JHORVIS JOVAN DE LUQUE ARIZA	INGENIERO RESIDENTE
5	72.340.503	JOSE GREGORIO ATENCIO SIERRA	OFICIOS VARIOS
6	72.215.192	LUIS ALBERTO NUÑEZ HERNANDEZ	OFICIOS VARIOS
7	1.140.888.631	MELISSA RAMIREZ AHUMADA	INGENIERA ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
8	1.098.648.986	DIANA MARCELA DAZA BECERRA	SST
9	1.005.680.047	ISABELLA STEFANIA MONTERROZA VASQUEZ	PSICÓLOGA SOCIAL
10	1.134.190.011	NERIO ARTURO GONZALEZ	OFICIOS VARIOS
11	79.244.484	PEDRO PAMPLONA SUAREZ	MAESTRO
12	1.020.825.448	FRANCISCO JULIAN PAMPLONA LEAL	OFICIAL DE OBRA

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

13	1.122.627.267	JOSE HERLEY RODRIGUEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
14	11.444.618	JUAN CARLOS BERMUDEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
15	80.470.077	NEVARDO MENDIVELSO	OFICIAL DE OBRA
16	85.487.023	DAIRO ALBERTO ALVAREZ VEGA	OFICIAL DE OBRA
17	12.448.524	JESUS ENRIQUE FREYLE ALTAHONA	AYUDANTE DE OBRA
18	1.044.433.834	GERMAN JUNIOR ECHEVERRIA BARRAZA	AYUDANTE DE OBRA
19	1.083.432.476	MARLON RAFAEL MERINO HERAZO	AYUDANTE DE OBRA
20	12.623.242	CARLOS ARTURO FERNANDEZ PEÑA	ALMACENISTA
21	1.001.916.650	JESUS ANTONIO JULIO JINETE	AYUDANTE DE OBRA
22	8.485.250	HADER JOSE TOLEDO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
23	3.747.881	ENERGIO ECHEVERRIA MARRIAGA	AYUDANTE DE OBRA
24	85.127.978	RONALD DARIO MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
25	72.310.604	EUGENIO ENRIQUE DE LA HOZ ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
26	72.228.891	DARWUIN JOSE ECHEVERRIA BLANCO	OFICIAL DE OBRA
27	72.295.835	LUIS ALBERTO POLO ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
28	85.126.442	JULIO CESAR MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
29	72.311.012	ONACIS ENRIQUE TORRES SOLANO	AYUDANTE DE OBRA
30	73.430.296	DIOMAR BUELVAS BUELVAS	AYUDANTE DE OBRA
31	4.993.994	ENOT GREGORIO SALAMANCA SANJUANELO	AYUDANTE DE OBRA
32	1.007.199.359	GEOVANNY OROZCO CHAMORRO	AYUDANTE DE OBRA
33	1.066.521.696	JASIER JAVIER ANAYA VILORIA	AYUDANTE DE OBRA
34	72.433.726	LUIS CARLOS CANTILLO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA
35	1.045.713.541	MARLON ORLANDO DISCUVICHE SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA
36	1.003.563.945	OMAR DANIEL MEJIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA
37	1.044.433.379	MOISES DAVID PANTOJA FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA
38	72.309.785	ARTURO ENRIQUE ALBARRACIN ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
39	72.009.190	LUIS GABRIEL MENDOZA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
40	1.081.785.769	JOAQUIN GUILLERMO COLON BOLAÑO	AYUDANTE DE OBRA
41	1.045.765.840	VICTOR MANUEL GONZALEZ IBAÑEZ	OFICIAL DE CARPINTERIA
42	72.169.174	EVER ENRIQUE MARTINEZ ORELLANO	OFICIAL DE CARPINTERIA

43	1.007.608.013	RONYS MANUEL RAMOS MARTINEZ	
44	1.045.690.629	CESAR ARTURO DE LA HOZ OJEDA	
45	3.747.867	JAIRO RAFAEL ORTIZ LOAIZA	
46	3.738.714	JHON JANER DE LA TORRE GONZALEZ	
47	80.470.112	LUIS ENRIQUE PULIDO MORENO	MAESTRO
48	1.073.602.814	OSCAR ARLEY POVEDA JULA	AYUDANTE
49	1.108.834.062	MOISES CHICO ACOSTA	AYUDANTE
50	1.002.014.046	JOSE MANUEL GUTIERREZ RIPOLL	AYUDANTE
51	1.002.012.955	EDGAR GEOVANNY VARGAS SANPEDRO	AYUDANTE
52		ROBERTH VASQUEZ GONZALEZ	AYUDANTE
53	1.045.712.951	JUAN DAVID MERCADO MANJARRES	CONTROL DE ACCESO
54	1.082.046.159	VICTOR MANUEL PASION DE VILLA	AYUDANTE
55	1.002.156.723	KENER JOSE FLOREZ BARRANCO	CONTROL DE ACCESO
56	1.002.156.723	JOSE MANUEL MORENO ACOSTA	CONTROL DE ACCESO
57	1.001.852.990	ANDY JOSE VENERA MUÑOZ	AYUDANTE
58	7.595.499	CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS	OPERADOR
59	73.126.027	ANDRES BELTRAN ARTEAGA	GERENETE
60	73.269.466	ALBEIRO ALFONSO LLERENA OSPINO	OPERADOR
61	92.275.796	JOSE FULGENCIO CONTRERAS MONTERROZA	INSPECTOR DE OBRA
62	1.002.235.350	RUBEN DARIO GUERRERO VILLANUEVA	
63	1.080.013.243	ALEXANDER LLANOS RODRIGUEZ	
64	72.180.928	HENRY CABRERA MONTES	CONDUCTOR
65	72.145.959	JOSE MIGUEL SALAS ORTIZ	SOLDADOR
66	1.007.187.391	JASSIR ENRIQUE MARENCO ROJANO	
67	73.268.775	ELIECER RAFAEL JIMENEZ TORRES	
68	17.973.819	SILVIO ELIAS DIAZ MARTINEZ	AYUDANTE
69	1143264518	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO	
70	9.160.527	ROGER ALVARADO RODRIGUEZ	
71	73100355	JAIME GOMEZ CARDOLE	
72	12687835	JOSE FRANCISCO MORALES	
73	1.080.010.237	OMAR YOVANY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
74	72.280.980	DEIVIS MANUEL HERRERA MARIMON	AYUDANTE

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

75	1.143.264.518	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO	
76	1.081.904.268	SANTANDER DE JESUS RONCALLO MEDINA	
77	1.140.886.622	JOSE ANGEL TABORDA DE LA CRUZ	
78	1.007.200.553	JOSE LUIS REALES OROZCO	
79	1.128.150.609	ANDRES CARRANCEDO MARBELLO	
80	1.143.264.518	DEISY SALAS ASTILLO	SISO
81	72.168.118	ARLEY ISAAC OLASCOAGA CAFIEL	CONSERJE
82	1.045.743.508	JULIO MARIO SANTOMINGO PEREZ	CONSERJE
83	73.560.926	EDILBERTO ENRIQUE MELENDEZ CABALLERO	CONSERJE
84	1.129.503.887	MAURICIO ENRIQUE BOHORQUEZ RODRIGUEZ	CONSERJE
85	1002184557	IVAN RAFAEL OSPINO BELTRAN	CONSERJE
86		KEVIN SILVERA	CONSERJE
87		HENRY CANTILLO PADILLA	CONSERJE
88	72.195.871	MIGUEL OSORIO YALI	CONSERJE
89	1.140.871.628	JORGE GAMEZ GRANADOS	CONSERJE
90	1043116562	ANTONIO GONZALEZ	CONSERJE
91	1.143.426.441	JAIME DE JESUS ATENCIO SIERRA	CADENERO
92	1.558.983	ARNOVIS DE JESUS DE LA CRUZ OROZCO	TOPOGRAFO
93	1.050.007.512	IVAN JOSE PINO CASTILLO	AUXILIAR ELECTRICO
94	73.475.513	EVER JARAMILLO NAVARRO	AUXILIAR ELECTRICO
95	72.055.954	LUIS RAPALINO	OFICIAL ELECTRICO
96	8.755.766	JAIME RAPALINO	OFICIAL ELECTRICO
97		HELMO SANTAMARIA	AUXILIAR ELECTRICO
98	1.234.089.220	ANDRES GONZALEZ	
99	10.944.156	HELMUTH DE LA VICTORIA VARGAS	AUXILIAR ELECTRICO
100	1.050.004.374	ROBERTO ROJANO	ALMACENISTA

Fuente: Autor

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A la fecha se evidencio personal laborando en actividades los cuales han contado con el suministro de los EPP y dotación requerida para realizar de forma normal y segura sus actividades en el proyecto, el Contratista ha mostrado la entrega de los mismos se evidenciaron en los respectivos registros presentado en el informe mensual.

De igual forma el tema de los guantes deteriorados se suministraron y la Interventoría evidencio en oportunidades el suministro de los consumibles, la Interventoría evidencio en varias ocasiones personal sin EPP o estos deteriorados, no se evidencio el seguimiento por parte del responsable hasta que Interventoría evidencio estas faltas, el personal de obra se ha evidenciado sin el uso de guantes en la realización de las actividades y hay trabajadores nuevos que no tienen la dotación completa.

8. INSPECCIONES

Durante la ejecución de las actividades del proyecto se realizó inspección a los equipos que se tienen en los frentes de trabajo. Se evidencio extintores, camilla, botiquín, se ha solicitado al Contratista realizar inspecciones pre-operacionales de todos los equipos que se tengan en los frentes de trabajo para validar su estado operativo y sus próximos mantenimientos, garantizando su estado operativo.

9. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

De igual manera la Interventoría realizó la supervisión del personal y sus actividades en el periodo el Contratista no ha completado las afiliaciones del nuevo personal y planillas de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

El Contratista cuenta con un procedimiento y la matriz para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos los cuales se presentan por las actividades desarrolladas en el proyecto, por consiguiente, es necesario aplicar los controles necesarios para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

11. ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el periodo ejecutado se presentaron tres accidentes laborales.

El trabajador Energio Echeverria Marriaga el pasado 7 de febrero de 2023 aproximadamente a las 2:30pm, el trabajador se encontraba trasladando unas vigas, las crucetas se doblaron y las vigas se cayeron inclinadas golpeándolo en el hombro derecho ocasionándole un fuerte dolor, inmediatamente se le realizo los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

El pasado 09 de febrero de 2023 siendo aproximadamente las 2:30pm el señor Víctor Pasi3n Dávila siendo aproximadamente a las 2:30 pm, se encontraba trasladando una baranda de madera en el módulo 40 y se le queda incrustada la bota en el barro picándole en el pie derecho un agua mala inmediatamente se reportó el accidente y se direcciono al trabajador a la Clínica Porto Azul.

En la fecha del 15 de febrero de 2023 siendo aproximadamente las 10:30 am el señor Andy José Venera Muñoz se encontraba buscando unas herramientas para encender los pilotes, cuando se iba a regresar al punto de trabajo se le hundi3 el bota en el barro y una la raíz de un mangle atravesó la suela de la bota provocando una fisura en la planta del pie derecho, inmediatamente se le realizo los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha van diez (10) accidentes de trabajo reportados con treinta y cuatro (34) días perdidos a causa de las incapacidades.

12. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Durante la ejecución de las actividades se pueden presentar situaciones de emergencias a las cuales se les debe prestar el apoyo con el suministro de elementos para su atención oportuna, el Contratista describe sus planes operativos normalizados en los siguientes:

- ✓ Procedimiento en caso de emergencia
- ✓ Procedimiento en caso de huracanes y tornados
- ✓ Procedimiento en caso de vendavales
- ✓ Procedimiento en caso de atentado terrorista

- ✓ Procedimiento en caso de colapso estructural
- ✓ Procedimiento en caso mordedura de incendio
- ✓ Procedimiento en caso de evacuación
- ✓ Procedimiento en caso de lesiones y primeros auxilios
- ✓ Procedimiento en caso de accidente de tránsito y vehículos
- ✓ Procedimiento en caso de sismo

13. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

De acuerdo al virus que se ha presentado a nivel mundial el Contratista estable unas medidas para la prevención y propagación del COVID-19 las cuales son:

- Entrega de Tapabocas al personal, no se cumple
- Campañas de limpieza en los equipos, no se cumple
- Socialización de protocolos de actuación frente al COVID 19, no se ha evidenciado esta sensibilización.
- Adecuación de los puntos de lavados de manos, no se tienen puntos de lavado.
- Manejo de los residuos
- Temas de prevención, no se evidenciaron estos temas.

Durante el tiempo de ejecución de actividades se retiraron los puntos de lavado de manos, se ha evidenciado la instalación de infografías referentes a la prevención de COVID-19.



Se evidencio la instalación de señalización al ingreso del campamento donde se prohíbe el ingreso a personas ajenas al proyecto.



Se evidencio trabajadores eléctricos sin el uso correcto de los EPP en la ejecución de las actividades.

	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)
---	--	--------------------------

ANEXO 1

Accidentes laborales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Versión: 0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 21/02/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACCIDENTE				
TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opción):	LESIÓN	X	DAÑO	ACCIDENTE AMBIENTAL
FECHA DEL ACCIDENTE	CIUDAD	LUGAR	LABOR QUE DESEMPEÑA	CONTRATO ASIGNADO
07/02/2023	BARRANQUILLA	ECO PARQUE MALLORQUIN	TRASLADO DE MATERIALES	JCO MALLORQUIN
INFORMACIÓN DEL INVOLUCRADO				
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EDAD	
3.747.881	ECHVERRIA MARRIAGA ENEROJO	AYUDANTE DE OBRA	49 AÑOS	
FECHA DE INGRESO	EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL	TURNO	DÍA DE TURNO	
23/05/2022	1 AÑO	DIURNO	MARTES	

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
FRACTURA	HERIDA	GOLPE	X	QUEMADURA	ESGUINCE	LUXACION	CORTADURA
ELECTROCUCIÓN	APLASTAMIENTO	INTOXICACION		ASFIXIA	LESION EN OJO	CUERPO EXTRAÑO EN OJO	OTROS
TIPO DE DAÑO (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
INSTALACIONES	VEHICULOS	EQUIPOS		MAQUINARIA	MATERIALES	EQUIPO DE OFICINA	OTROS
ACCIDENTE AMBIENTAL (MARQUE CON UNA X EL COMPONENTE AFECTADO, SI APLICA)							
FLORA		FAUNA		SUELO		AGUA	AIRE

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
CABEZA	OJOS	MIEMBROS SUPERIORES	X	MANOS	TRONCO	MIEMBROS INFERIORES	PIES
ABDOMEN	CUELLO	TORAX		UBICACIONES MULTIPLES	LESIONES GENERALES	OIDO	OTROS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE			
CAIDA AL MISMO NIVEL		CAIDA EN ALTURA	CAIDA DE OBJETO
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS		ATRAPAMIENTO	PIRADAS, GOLPES O CHOQUES
SOBREESFUERZO O FALSOS MOVIMIENTOS		ESPACIOS CONFINADOS	OTROS

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)				
MAQUINARIA Y/O EQUIPO		MEDIO DE TRANSPORTE	HERRAMIENTAS	MATERIALES
AMBIENTE DE TRABAJO		ANIMALES	SUSTANCIAS QUIMICAS	OTROS

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
El día 07 de febrero de 2023, el Sr. Energia Echeverria, Siendo las 2:30 pm se encontraba trasladando unas vigas, las crucetas se doblaron y las vigas se cayeron inclinadas golpeándolo en el hombro derecho.

TESTIGOS (SI HUBO)			
TESTIGOS	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
TESTIGO 1	NO HUBO	N/A	N/A
TESTIGO 2	NO HUBO	N/A	N/A

ANÁLISIS DE CAUSAS	
CAUSAS INMEDIATAS 19. El trabajador utilizó para hacer el traslado de los vigas un cuerpo de andamio convencional, sabiendo que un andamio no es una herramienta o equipo adecuado para realizar el transporte de vigas de madera que tienen un peso aproximado de 55 KG. 10. Levantar y transportar cargas (vigas de madera) con equipos no apropiados para la actividad.	CAUSAS BÁSICAS 8. No se evidencia supervisión constante en campo respecto actividades de alto riesgo a las cuales se van expuestos los trabajadores. 9.2 No se tiene en cuenta la utilización de ayudas mecánicas adecuadas para el transporte, levantamiento y manejo de cargas al interior del proyecto, en este accidente se evidencia que la ayuda mecánica fue construida por el mismo trabajador a través de un cuerpo de andamio con ruedas. 9.6 No existe un control adecuado respecto al levantamiento y transporte de cargas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0
RESUMEN DE CAUSAS (Las causas listadas, colocarlas en sus respectivos campos)		
CAUSAS INMEDIATAS		
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR	
19. Herramienta, equipo o material defectuoso	10. Levantamiento inadecuado	
CAUSAS BÁSICAS		
FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES	
8. Liderazgo o supervisión inadecuada		
9.2. Consideración inadecuada de factores ergonómicos / humanos		
9.6. Controles inadecuados		

ANÁLISIS DE CAUSAS-METODOLOGÍA 5 POR QUÉ.

1	¿Por qué?	1. Se produce golpe en el hombro derecho.							
2	¿Por qué?	2. Mientras trasladaba 4 vigas en un cuerpo de andamio convencional con liantas, las crucetas de asta se doblaron ocasionando la caída de las vigas.							
3	¿Por qué?	3. La ayuda mecánica utilizada no es la idonea para el traslado de cargas.							
4	¿Por qué?	4. No se cuenta con ayudas mecánicas estandarizadas para el transporte de materiales al interior del frente de trabajo.							
ACCIONES CORRECTIVAS									
ACCIONES	JERARQUÍA DE CONTROLES						FECHA EJECUCIÓN	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	ELIMINAR	SUSTITUIR	REVISAR	SEPARAR	ADMINISTRATIVO	EPP			
1. Divulgación de la lección aprendida del accidente laboral. * Autocuidado * Levantamiento y transporte de cargas. * Percepción del riesgo					X		25/02/2023	TEMPOCOLSA	
2. Se recomienda utilizar ayudas mecánicas estandarizadas para el levantamiento y transporte de cargas al interior del proyecto.					X		31/03/2023	JCO MALLORQUIN	
3. Se recomienda documentar e implementar un procedimiento de trabajo seguro respecto al levantamiento y transporte de cargas, en el cual se contemplen las ayudas mecánicas con las cuales cuenta el trabajador, las medidas de seguridad a tener en cuenta, recomendaciones al respecto, el cual deberá ser divulgado a todos los trabajadores con su respectiva evaluación de efectividad.					X		31/03/2023	JCO MALLORQUIN	
3. Se recomienda aumentar la supervisión en campo por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de validar actos y condiciones inseguras por parte de los trabajadores y tomar las medidas de control de manera inmediata.					X		10/03/2023	JCO MALLORQUIN	

R-0101

Versión: 0

CALIDAD	S.S.T.	☒	GESTIÓN HUMANA	OPERATIVA	AMBIENTAL
CHARLA	ENTRENAMIENTO OPERATIVO			DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO	
OTROS	CAPACITACIÓN	☒	DIURNO	☒	NOCTURNO
ASEOCOLBA	TEMPOCOLBA	☒	TRANSCOLBA	VIGICOLBA	

FECHA: 25-02-23

DURACIÓN: 1 hora

DURACIÓN: 1 hora

DURACIÓN: 1 hora

Permisos y Transporte de Cargas, Recaudos,
Percepción del ingreso

OBJETIVO: Capacitar al personal en la técnica aprendida del
cuento Barroto para la prevención de situaciones de riesgo

NO.	NOMBRE	CARGO / CONTRATO	FIRMA
1	VICTOR PACION DE AVILA	AYUDANTE	VICTOR PACION
2	Jose Harley Rodriguez R.	Oficial	~~Jose~~
3	Julian Taploun	Oficial	Julian P.
4	Cam Nunez	ayudante	Cam
5	VICTOR GONZALEZ	Oficial	VICTOR G
6	Quirico Andres Nolas	ayudante	Quirico
7	And. Venetia	AYUDANTE	And. Venetia
8	ERSON. 017 A HOZ	AYUDANTES	ERSON G
9	Quirico E. Torres S	ayudante	~~Quirico~~
10	Edu. Rios	Ayudante	~~Edu. Rios~~
11	Alfonso Alvarado	Oficial	~~Alfonso~~
12	Jose R. Becerra	Maestro	Jose R. Becerra
13	Josier Anaya	Auxiliar	~~Josier~~
14	Energio Echeverria M.	Ayudante	Energio E.
15			

Los suscritos firmantes del presente documento hacemos constar que hemos recibido instrucción formal y además comprendiendo el (los) tema (s) relacionados anteriormente y nos comprometemos a aplicarlo (s) cada vez que se requiera

OBSERVACIONES:

INSTRUCTOR

RESPONSABLE DE PROCESO/ AREA

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | SURA

EPS a la que está afiliado ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS Código EPS 048 ARL a la que está afiliado ARL SURA Código ARL 40
AFP a la que está afiliado PROTECCION Código AFP 002

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral ☒ Empleado ☐ Contratante ☐ Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS CON EL FIN DE REEMPLAZAR A EMPLEADOS O SUPLEMENTAR TEMPORALMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, CUANDO EL PERSONAL SUMINISTRADO ES EMPLEADO DE LAS PROPIAS AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL. LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE SUS EMPLEADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS CLIENTES

Nombre o razón social

SERV TEMPO COLOMBIA TEMPOCOLBA SAS

Tipo de identificación ☒ NI ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA Número 802010216

Dirección CR 50 72 - 61 Teléfono 3158750881 Fax

Correo electrónico SST.BQ@GRUPOCOLBA.COM Departamento ATLANTICO Municipio BARRANQUILLA Zona ☒ U ☐ R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? ☒ Si ☐ No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo Código de la actividad económica del centro de trabajo 5411101

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS,

Dirección CR 50 # 72 - 61 Teléfono 6053185373 Fax

Departamento ATLANTICO Municipio BARRANQUILLA Zona ☒ U ☐ R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación ☒ Planta ☐ Misión ☐ Cooperado ☐ Estudiante o aprendiz ☐ Independiente Código

Primer apellido ECHEVERRIA Segundo apellido MARRIAGA Nombres ENERGIO

Tipo de identificación ☐ NI ☒ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA Número 3747881 Fecha de nacimiento 21091974 Sexo ☒ M ☐ F

Dirección CRA 10 CON CALLE 10 # 8 - 62 Teléfono 6053185373 Fax

Departamento ATLANTICO Municipio BARRANQUILLA Zona ☒ U ☐ R Cargo AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente 8:18

Fecha de ingreso a la empresa 23052022 Salario u honorarios (mensual) 1160000 Jornada de trabajo habitual ☒ Diurna ☐ Nocturna ☐ Mixto ☐ Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente 07022023 14:30:00 Estaba dentro de la empresa? S Día de la semana en el que ocurrió el accidente Martes

Jornada en que sucede ☒ Normal ☐ Extra ¿Estaba realizando su labor habitual? ☒ Si ☐ No ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador? ☐ Si ☒ No Departamento del accidente ATLANTICO Municipio del accidente BARRANQUILLA Zona donde ocurrió el accidente ☒ U ☐ R

Total tiempo laborado previo al accidente 5:0 Tipo de accidente ☐ Violencia ☐ Tránsito ☐ Deportivo ☐ Recreativo o cultural ☒ Propios del trabajo

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 1 de 2

Lugar donde ocurrió el accidente

☒ Dentro de la empresa

☐ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ☐ Almacenes o depósitos
- ☒ Áreas de producción
- ☐ Áreas recreativas o deportivas
- ☐ Corredores o pasillos
- ☐ Escaleras
- ☐ Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ☐ Oficinas
- ☐ Otras áreas comunes
- ☐ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ☐ Cabeza
- ☐ Ojo
- ☐ Cuello
- ☐ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- ☐ Tórax
- ☐ Abdomen
- ☒ Miembros superiores
- ☐ Manos
- ☐ Miembros inferiores
- ☐ Pies
- ☐ Ubicaciones múltiples
- ☐ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ☐ Fractura
- ☐ Luxación
- ☐ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ☐ Conmoción o trauma interno
- ☐ Amputación o enucleación
- ☐ Herida
- ☐ Trauma superficial
- ☒ Golpe contusión o aplastamiento

- ☐ Quemadura
- ☐ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ☐ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ☐ Asfixia
- ☐ Efecto de la electricidad
- ☐ Efecto nocivo de la radiación
- ☐ Lesiones múltiples
- ☐ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ☐ Máquinas y/o equipos
- ☐ Medios de transporte
- ☐ Aparatos
- ☐ Herramientas, implementos o utensilios
- ☒ Materiales o sustancias
- ☐ Radiaciones
- ☐ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ☐ Otros agentes no clasificados
- ☐ Animales (vivos o productos animales)
- ☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ☐ Caída de personas
- ☐ Caída de objetos
- ☐ Pisadas, choques o golpes
- ☐ Atrapamientos
- ☐ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ☐ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ☐ Exposición o contacto con la electricidad
- ☐ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ☒ Golpes por o contra objetos
- ☐ Otro

Descripción del accidente

MANIFIESTA EL SEÑOR ENERGIO ECHEVERRÍA QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 2:30 PM SE ENCONTRABA TRASLADANDO UNAS VIGAS, LAS CRUCETAS SE DOBLARON Y LAS VIGAS SE CAYERON INCLINADAS GOLPEÁNDOLO EN EL HOMBRO DERECHO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente?

☐ Si

☒ No

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA

No.

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA

No.

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres

Cargo

THALIENS CARDONA KRIST

ANALISTA SSTA

Documento de identidad

☒ CC ☐ TI ☐ CE ☐ NU ☐ PA

No.

1140850990

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | SURA

10-02-2023 11:04:34

10-02-2023 11:04:34

RECIBIDO

Fecha Impresión

10-02-2023 11:04:42


ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 2 de 2

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

GOLPE EN HOMBRO DERECHO

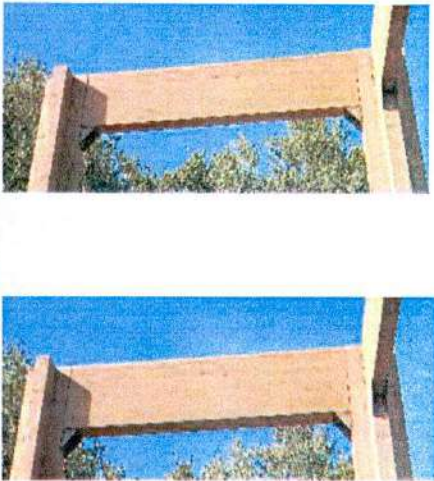¿QUÉ PASÓ?		
Fecha: 07/02/2023	Hora: 02:30 AM	Contrato: JCO MALLORQUIN
UEN: BARRANQUILLA	Ciudad: BARRANQUILLA	Lugar: PLATAFORMA
Descripción: El día 07 de febrero de 2023, el Sr. Energía Echeverría, Siendo las 2:30 pm se encontraba trasladando unas vigas, las crucetas se doblaron y las vigas se cayeron inclinadas golpeándolo en el hombro derecho.		
		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

¿POR QUÉ PASÓ?

El trabajador se dispone a movilizar unas vigas de madera en un andamio de un cuerpo, al momento de transitar por la plataforma las crucetas se doblan y se caen las vigas ocasionando golpe en hombro.

¿QUÉ APRENDIMOS?

- Los andamios convencionales de un solo cuerpo no están diseñados para transportar o levantar cargas.
- ¿Que son las ayudas mecánicas? Son los equipos o máquinas que permiten el desplazamiento o movilización de grandes volúmenes de mercancía, garantizar que las ayudas mecánicas que se utilicen sean las más adecuadas y eficientes.
- Riesgo Biomecánico: Se define como la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por ciertos "factores de riesgo biomecánico".
- Siempre que se tenga que levantar o transportar algún equipo y herramienta, solicitar la ayuda de uno o mas compañeros para realizar este tipo de procedimientos.
- Evaluar los peligros que pueden estar presente en tu área de trabajo antes de tomar decisiones que te puedan conllevar a que un evento no deseado se materialice.
- La seguridad y salud en el trabajo al igual que el autocuidado, son disciplinas que nos permiten prevenir sucesos no deseados en el ámbito laboral, por lo tanto, se deben cumplir las normas, procedimientos y estándares que estén establecidos por la organización para la prevención de accidentes o incidentes en el ámbito laboral.

¡Recordemos! que: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Aprender de los eventos, evita que nos vuelva a pasar

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | SURA

EPS a la que está afiliado

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

Código EPS

002

ARL a la que está afiliado

ARL SURA

Código ARL

40

AFP a la que está afiliado

PROTECCION

Código AFP

002

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral

☒ Empleador☐ Contratante☐ Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS CON EL FIN DE REEMPLAZAR A EMPLEADOS O SUPLEMENTAR TEMPORALMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, CUANDO EL PERSONAL SUMINISTRADO ES EMPLEADO DE LAS PROPIAS AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL. LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE SUS EMPLEADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS CLIENTES.

Nombre o razón social

SERV TEMPO COLOMBIA TEMPOCOLBA SAS

Tipo de identificación

☒ NI☐ CC☐ CE☐ NU☐ PA

Número

802010216

Dirección

CR 50 72 - 61

Teléfono

3158750881

Fax

Correo electrónico

SST.BQ@GRUPOCOLBA.COM

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Zona

☒ U ☐ R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal?

☒ Si☐ No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo

Código de la actividad económica del centro de trabajo

5411101

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS,

Dirección

CR 50 # 72 - 61

Teléfono

6053185373

Fax

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Zona

☒ U ☐ R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación

☒ Planta☐ Misión☐ Cooperado☐ Estudiante o aprendiz☐ Independiente

Código

Primer apellido

PASION

Segundo apellido

DE AVILA

Nombres

VICTOR

Tipo de identificación

☐ NI☒ CC☐ CE☐ NU☐ PA

Número

1082046159

Fecha de nacimiento

13071995

Sexo

☒ M☐ F

Dirección

CR 50 # 72 - 61

Teléfono

6053185373

Fax

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Zona

☒ U ☐ R

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS

Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente

0:10

Fecha de ingreso a la empresa

01022023

Salario u honorarios (mensual)

1160000

Jornada de trabajo habitual

☒ Diurna☐ Nocturna☐ Mixto☐ Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente

09022023 14:30:00

Estaba dentro de la empresa?

S

Día de la semana en el que ocurrió el accidente

Jueves

Jornada en que sucede

☒ Normal☐ Extra

¿Estaba realizando su labor habitual?

☒ Si☐ No

¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?

☐ Si☒ No

Departamento del accidente

ATLANTICO

Municipio del accidente

BARRANQUILLA

Zona donde ocurrió el accidente

☒ U ☐ R

Total tiempo laborado previo al accidente

5:0

Tipo de accidente

☐ Violencia☐ Tránsito☐ Deportivo☐ Recreativo o cultural☒ Propios del trabajo

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 1 de 2

Lugar donde ocurrió el accidente

☒ Dentro de la empresa

☐ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ☐ Almacenes o depósitos
☒ Áreas de producción
☐ Áreas recreativas o deportivas
☐ Corredores o pasillos
☐ Escaleras
☐ Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
☐ Oficinas
☐ Otras áreas comunes
☐ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ☐ Cabeza
☐ Ojo
☐ Cuello
☐ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
☐ Tórax
☐ Abdomen
☐ Miembros superiores
☐ Manos
☐ Miembros inferiores
☒ Pies
☐ Ubicaciones múltiples
☐ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ☐ Fractura
☐ Luxación
☐ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
☐ Conmoción o trauma interno
☐ Amputación o enucleación
☐ Herida
☐ Trauma superficial
☐ Golpe contusión o aplastamiento

- ☐ Quemadura
☐ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
☐ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
☐ Asfixia
☐ Efecto de la electricidad
☐ Efecto nocivo de la radiación
☐ Lesiones múltiples
☒ Otro
PICADURA DE ANIMAL DESCONOCIDO

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ☐ Máquinas y/o equipos
☐ Medios de transporte
☐ Aparatos
☐ Herramientas, implementos o utensilios
☐ Materiales o sustancias
☐ Radiaciones
☒ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
☐ Otros agentes no clasificados
☐ Animales (vivos o productos animales)
☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ☐ Caída de personas
☐ Caída de objetos
☐ Pisadas, choques o golpes
☐ Atrapamientos
☐ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
☐ Exposición o contacto con temperatura extrema
☐ Exposición o contacto con la electricidad
☐ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
☐ Golpes por o contra objetos
☒ Otro

Descripción del accidente

COLABORADOR SE ENCONTRABA TRANSPORTANDO MATERIAL EN EL AGUA CUANDO SINTIÓ LA PICADURA EN EL PIE DE UN ANIMAL DESCONOCIDO.

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente?

☐ Si

☒ No

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC

TI

CE

NU

PA

No.

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC

TI

CE

NU

PA

No.

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres

Cargo

THALIENS CARDONA KRIST

ANALISTA SSTA

Documento de identidad

☒ CC

☐ TI

☐ CE

☐ NU

☐ PA

No.

1140850960

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL SURA

11-02-2023 12:10:50

11-02-2023 12:10:50

RECIBIDO

Fecha Impresión

11-02-2023 12:11:05

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 2 de 2

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 22/02/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACCIDENTE				
TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opción):	LESIÓN	X	DAÑO	ACCIDENTE AMBIENTAL
FECHA DEL ACCIDENTE	CIUDAD	LUGAR	LABOR QUE DESEMPEÑABA	CONTRATO ASIGNADO
9/02/2023	BARRANQUILLA	CENAGA DE MALLORQUIN	TRANSPORTE DE PLANTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INFORMACIÓN DEL INVOLUCRADO				
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EDAD	
1.082.048.159	PASION DE AVILA VICTOR	AYUDANTE DE OBRA	28 AÑOS	
FECHA DE INGRESO	EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL	TURNO	DÍA DE TURNO	
1/02/2023	6 MESES	DIURNO	JUEVES	

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
FRACTURA	HERIDA	GOLPE	QUEMADURA	ESGUINCE	LUXACION	CORTADURA	
ELECTROCUCION	APLASTAMIENTO	INTOXICACION	ASFIXIA	ESION EN OJO	CUERPO EXTRANO EN OJO	OTROS	X
TIPO DE DANO (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
INSTALACIONES	VEHICULOS	EQUIPOS	MAQUINARIA	MATERIALES	EQUIPO DE OFICINA	OTROS	
ACCIDENTE AMBIENTAL (MARQUE CON UNA X EL COMPONENTE AFECTADO, SI APLICA)							
FLORA	FAUNA	SUELO	AGUA	AIRE			

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES, SI APLICA)							
CABEZA	OJOS	MIEMBROS SUPERIORES	MANOS	TRONCO	MIEMBROS INFERIORES	PIES	X
ABDOMEN	CUELLO	TORAX	UBICACIONES MULTIPLES	LESIONES GENERALES	OIDO	OTROS	

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE			
CAIDA AL MISMO NIVEL	CAIDA EN ALTURA	CAIDA DE OBJETO	
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS	ATRAPAMIENTO	PISADAS, GOLPES O CHOQUES	
SORREESFUERZO O FALSOS MOVIMIENTOS	ESPACIOS CONFINADOS	OTROS	X

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)			
MAQUINARIA Y/O EQUIPO	MEDIO DE TRANSPORTE	HERRAMIENTAS	MATERIALES
AMBIENTE DE TRABAJO	X ANIMALES	SUSTANCIAS QUIMICAS	OTROS

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
El día 09 de febrero de 2023, el Sr. Victor Pasion, se encontraba transportando una planta eléctrica en el agua, se le salió la bota y siguió caminando, en ese momento sintió la picadura en el pie de un animal desconocido.

TESTIGOS (SI HUBO)			
TESTIGOS	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
TESTIGO 1	NO HUBO	N/A	N/A
TESTIGO 2	NO HUBO	N/A	N/A

ANÁLISIS DE CAUSAS	
CAUSAS INMEDIATAS	CAUSAS BÁSICAS
29. Los trabajadores se encuentran expuestos diariamente a condiciones húmedas, animales ponzoñosos nativos de la zona, residuos de basura debido a que deben atravesar la cienaga a pie para llegar a su lugar de trabajo. 8. La movilización de la planta eléctrica fue realizada entre 4 personas, el cual sobrepasa la capacidad permitida por persona, sumado a esto que el traslado lo realizaron dentro del agua (cienaga) en donde las condiciones propias de estas dificultan el traslado.	9.2 No se tienen en cuenta la utilización de ayuda mecánica adecuada para el transporte, levantamiento y manejo de cargas al interior del proyecto. Dinamemente trasladan la planta eléctrica sobre los hombros de los trabajadores al otro lado de la orilla de la cienaga. 12.1. No se cuenta con una evaluación adecuada de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, por lo tanto no se han tomado medidas de prevención. 6.2. Continuar la marcha sin el uso de las botas pantaneras por la rapidez de llegar a la orilla con la planta eléctrica.

RESUMEN DE CAUSAS (Las causas listadas, colocarlas en sus respectivos campos)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0
CAUSAS INMEDIATAS		
CONDICIÓN SUBESTANDAR		ACTOS SUBESTANDAR
29. Condiciones ambientales peligrosas		8. Carga inadecuada
CAUSAS BÁSICAS		
FACTORES DE TRABAJO		FACTORES PERSONALES
9.2 Consideración inadecuada de factores ergonómicos / humanos.		6.2 Práctica insuficiente.
12.1. Evaluación deficiente de necesidades y riesgos		

ANÁLISIS DE CAUSAS-METODOLOGÍA 5 POR QUÉ.

1	¿Por qué?	1. Se produce picadura de animal en pie derecho							
2	¿Por qué?	2. Se encontraba trasladando en el hombro una planta eléctrica dentro de la ciénaga descalzo.							
3	¿Por qué?	3. Mientras caminaba por la ciénaga la bota pantanera quedó incrustada en el fondo del terreno fangoso y para evitar que se cayera la planta siguió caminando descalzo.							
4	¿Por qué?	4. Porque no cuentan con un medio de transporte para trasladar los equipos e insumos por la ciénaga.							
ACCIONES CORRECTIVAS									
ACCIONES	JERARQUÍA DE CONTROLES						FECHA EJECUCIÓN	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	ELIMINAR	SUSTITUIR	REDISEÑAR	SEPARAR	ADMINISTRAR	EPP			
1. Divulgación de la lección aprendida del accidente laboral * Autocuidado * Uso adecuado de EPP * Riesgo Biológico					X		21/02/2023	TEMPOCOLBA	
2. Gestionar un medio de transporte que les permita a los trabajadores expuestos y al material que transportan no entrar en contacto directo con el agua de la ciénaga (Balza o canoa que soporte el peso)					X		30/03/2023	JCO MALLORQUIN	
3. Realizar taller de prevención del riesgo biológico por parte de profesional en medicina especialista en seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en el manejo de animales ponzoñosos.					X		20/03/2023	TEMPOCOLBA/JCO MALLORQUIN	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Versión: 0

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
VICTOR PACION DE ALVIA	AYUDANTE	VICTOR PACION
Diana Rosa Becerra	Residente JST	[Signature]
Melina Montero	Copias	[Signature]
Wendy Diaz	ANALISTA JST	[Signature]

ANEXOS (FOTOGRAFÍAS, PLANOS, DIAGRAMAS)

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				R-0101			
		REGISTRO DE ENTRENAMIENTO, CAPACITACIONES Y CHARLAS				Versión: 0			
CALIDAD	☐	S.S.T.	☒	GESTIÓN HUMANA	☐	OPERATIVA	☐	AMBIENTAL	☐
CHARLA	☐	ENTRENAMIENTO OPERATIVO			☐	DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO			☐
OTROS	☐	CAPACITACIÓN		☒	DIURNO	☒	NOCTURNO		☐
ASEOCOLBA	☐	TEMPOCOLBA		☒	TRANSCOLBA	☐	VIGICOLBA		☐

LUGAR: Plataforma Ecoparque.FECHA: 21-02-2023CONTRATO: Geo McAllarquin.INSTRUCTOR: Fernando Melendez A.DURACIÓN: 1 hora.TEMAS: Disculgación lección aprendida Ar Victor Pasion.Autocuidado, Uso adecuado de elementos de protección personal, Riego Biológico.OBJETIVO: Capacitar al personal en la lección aprendida del evento ocurrido para la prevención de eventos no deseados.

No	NOMBRE	CARGO / CONTRATO	FIRMA
1	VICTOR PACION DE AVILA	AYUDANTE	VICTOR PACION
2	José Hely Rodríguez R.	Oficial	José Hely
3	Julian Pangelon	Oficial	Julian P.
4	Carla Melendez	ayudante	Carla
5	VICTOR GONZALEZ	Oficial	VICTOR G
6	Quirina María Nidia	ayudante	Quirina
7	Paula Veneta	AYUDANTE	Paula Veneta
8	ERENIO DIAZ HINOJOS	AYUDANTES	ERENIO
9	Quirina E. Torres	ayudante	Quirina
10	Elva Alvar	ayudante	Elva
11	Fernando Melendez	Oficial	Fernando
12	Steen Bermudez	Maestro	Steen Bermudez
13	Jasier Anaya	Auxiliar	Jasier Anaya
14	Energio Echeverria M.	Ayudante	Energio E.
15			

Los suscritos firmantes del presente documento hacemos constar que hemos recibido instrucción formal y además comprendiendo el (los) tema (s) relacionados anteriormente y nos comprometemos a aplicarlo (s) cada vez que se requiera

OBSERVACIONES:


INSTRUCTOR

RESPONSABLE DE PROCESO/ÁREA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

PICADURA DE ANIMAL

¿QUÉ PASÓ?		
Fecha: 09/02/2023	Hora: 02:30 PM	Contrato: JCO MALLORQUIN
UEN: BARRANQUILLA	Ciudad: BARRANQUILLA	Lugar: CIENAGA MALLORQUIN
Descripción: El día 09 de febrero de 2023, el Sr. Víctor Pasión, se encontraba transportando una planta eléctrica en el agua, se le salió la bota y siguió caminando, en ese momento sintió la picadura en el pie de un animal desconocido.		

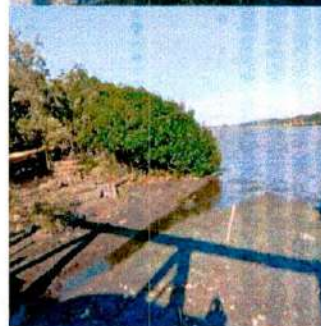

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

¿POR QUÉ PASÓ?

El trabajador se encontraba cargando una planta eléctrica en compañía de varios compañeros, al momento de transitar por la ciénaga "la playita" la bota se le queda atrapada con el barro, sigue caminando y siente que lo pica un animal desconocido.

¿QUÉ APRENDIMOS?

- Siempre que se realice la maniobra de izaje de la planta eléctrica, se debe contar con las botas de seguridad pantaneras para así minimizar picaduras por animales ponzoñosos.
- Adecuar el ambiente de trabajo con balsas que sirvan como fuente de mitigación del riesgo de entrar en contacto directo con el agua y así prevenir lesiones que puedan ser ocasionadas por su exposición directa.
- La prisa agota nuestro potencial de estar alerta a situaciones o condiciones de peligro. La rapidez, consecuencia de hacer las cosas a prisa, se convierte en una virtud que genera un vicio, que puede concluir en accidentes laborales.
- Se define el Riesgo Biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral.
- Evaluar los peligros que pueden estar presente en tu área de trabajo antes de tomar decisiones que te puedan conllevar a que un evento no deseado se materialice.
- La seguridad y salud en el trabajo al igual que el autocuidado, son disciplinas que nos permiten prevenir sucesos no deseados en el ámbito laboral, por lo tanto, se deben cumplir las normas, procedimientos y estándares que estén establecidos por la organización para la prevención de accidentes o incidentes en el ámbito laboral.

¡Recordemos! que: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Aprender de los eventos, evita que nos vuelva a pasar

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE TRABAJO

CÓDIGO: FSO-04
VERSIÓN: 0
FECHA: 05/05/2019

DATOS DE LA EMPRESA											
NOMBRE: <u>TEMPOCOLBA SAS</u>						NIT: <u>802010216</u>					
DIRECCIÓN: <u>CARRERA 50 No. 72 - 61</u>						TELÉFONOS: <u>(57) (5) 3185373</u>					
ACTIVIDAD ECONÓMICA: <u>ACTIVIDADES DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES</u>											
REPRESENTANTE LEGAL: <u>LEYLA ATIQUE JASSIR</u>											
ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL: <u>HERNAN BUSTOS</u>											
DATOS DEL EMPLEADO DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE											
NOMBRE (S): <u>ANDY JOSÉ</u>				APELLIDOS: <u>VERENA MUÑOZ</u>							
IDENTIFICACIÓN: <u>1.001.852.990</u>				FECHA DE NACIMIENTO: <u>5/02/1990</u>				EDAD: <u>33</u>			
SEXO: <u>MASCULINO</u>		DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: <u>CRA 15B No. 43A -62</u>									
TELÉFONO (S): <u>3116406998</u>		DEPARTAMENTO: <u>ATLÁNTICO</u>		MUNICIPIO: <u>BARRANQUILLA</u>							
CARGO: <u>AYUDANTE</u>				FECHA DE INGRESO: <u>5/09/2022</u>							
HORARIO DE TRABAJO: <u>07:00 H. L. a 12:00 H. L. - 13:00 H. L. a 17:00 H. L.</u>				TIEMPO DE EXPERIENCIA: <u>SIETE AÑOS</u>							
DATOS DEL ACCIDENTE											
PROYECTO, OBRA O PLANTA: <u>INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA</u>											
DEPARTAMENTO: <u>ATLÁNTICO</u>				MUNICIPIO: <u>BARRANQUILLA</u>							
FECHA DEL INCIDENTE: <u>15/02/2023</u>				DÍA: <u>MIÉRCOLES</u>		HORA: <u>10:30 H. L.</u>					
SITIO DE OCURRENCIA: <u>CIENAGA DE MALLORQUÍN</u>				ZONA: <u>URBANA</u>							
TIEMPO LABORADO PREVIO AL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE: <u>2:30</u>				TIPO DE INCIDENTE: <u>PROPIO DEL TRABAJO</u>							
OCUPACIÓN HABITUAL: <u>AYUDANTE</u>				ACTIVIDAD REALIZADA AL MOMENTO DEL INCIDENTE: <u>BUSCANDO UNAS HERRAMIENTAS</u>							
GÉNERO INCAPACIDAD: <u>NO</u>		DÍAS: <u></u>		MUERTE: <u>NO</u>							
ANÁLISIS DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE											
DAÑOS O PERDIDAS: <u></u>											
EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: <u>NO</u>		CUÁL: <u></u>									
MÁQUINAS: <u>NO</u>		CUÁL: <u></u>									
VEHÍCULOS: <u>NO</u>		CUÁL: <u></u>									
AMBIENTAL: <u>NO</u>		CUÁL: <u></u>									
DE INSUMO O MATERIALES: <u>NO</u>		CUÁL: <u></u>									
INTERRUPCIÓN EN LABORES: <u>NO</u>		ESPECIFIQUE: <u></u>									
USABA LOS EPP AL MOMENTO DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE: <u>SI</u> CUÁLES: <u>DOTACIÓN, CASCO, GAFAS, GUANTES Y BOTAS PANTANERAS</u>											
ANTECEDENTES DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES: <u>NO</u> FECHAS: <u></u>											
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO: <u>SI</u> TEMAS: <u>INDUCCIÓN, PELIGROS Y RIESGOS EN TRABAJO EN ALTURAS, ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO, ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CUIDADO DE MANOS.</u>											
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: <u>El día 15 de febrero de 2023, el Sr. Andy José Venera Muñoz siendo aproximadamente a las 10:30 am, se encontraba buscando unas herramientas para encender los pilotes, cuando me iba a regresar al punto de trabajo se me hundió la bota en el barro y la raíz de un mangle atravesó la suela de la bota provocando una fisura en la planta del pie derecho, inmediatamente se le realizó los primeros auxilios y se direccionó a la Clínica Porto Azul.</u>											
TIPO DE LESIÓN:											
☒ Otras heridas		☐ Traumatismo superficial		☐ Fracturas		☐ Luxaciones		☐ Esguinces - Torceduras		☐ Conmociones y traumatismos internos	
☐ Exposición al frío y de otros estados conexos		☐ Efectos de la electricidad		☐ Contusiones o aplastamiento		☐ Quemaduras		☐ Envenenamiento agudo o intoxicación aguda		☐ Amputaciones - Enucleaciones	
☐ Especifique: <u>Golpe</u>		☐ Efectos de la radiación		☐ Lesiones múltiples		☐ Otros traumatismos y traumatismos mal definidos		☐ Asfixias		☐	
ANÁLISIS DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE (CONTINUACIÓN)											
PARTE DEL CUERPO AFECTADA:											
☐ Cabeza		☐ Ojo		☐ Oreja		☐ Boca		☐ Nariz		☐ Cara	
☐ Cuello		☐ Espalda		☐ Tórax		☐ Abdomen		☐ Pevis		☐ Tronco ubicaciones múltiples	
☐ Antebrazo		☐ Muñeca		☐ Mano		☐ Dedos		☐ Miembro superior		☐ Hombro	
☐ Codo		☐ Brazo		☐ Clavícula		☐ Rodilla		☐ Pierna		☐ Tobillo	
☒ Pie		☐ Dedos del pie		☐ Ubicaciones múltiples		☐ Lesiones generales		☐ Aparato circulatorio		☐ Aparato respiratorio	
☐ Aparato nervioso		☐ Aparato digestivo		☐		☐		☐		☐	
AGENTE DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE:											
☐ Maquina generadora de energía		☐ Maquina de vapor		☐ Maquina de combustión		☒ X		☐ Otras		☐	
☐ Sistemas de transmisión		☐ Correas, cables, poleas cadenas, engranajes		☐ Prensa mecánica		☐ Torno		☐ Fresadoras		☐ Rectificadora y muelas	
☐ Cilindros		☐ Forjadoras		☐ Laminadoras		☐ Sierra circular		☐ Maquina de molidura		☐ Cepilladoras	
☐ Maquinas de rozar		☐ Otras maquinas no clasificadas		☐ Maquinas para desmonte, excavaciones etc.		☐ Medios de transporte y de manipulación		☐		☐	
☐ Aparatos de izar		☐ Grúas		☐ Ascensores, montacargas		☐ Cabrestantes		☐ Poleas		☐ Medio de transporte por vía férrea	
☐ Otros		☐		☐		☐		☐		☐	
☐ Medio de transporte rodante		☐ Tractores		☐ Camiones		☐ Carretillas motorizadas		☐ Vehículos motorizados		☐ Vehículo de tracción animal	
☐ Vehículo accionado por la fuerza humana		☐ Medio de transporte por aire		☐ Medio de transporte acuático		☐ Medio de transporte por agua con motor		☐ Medio de transporte por agua sin motor		☐ Otro medio de transporte	
☐ Transportadores mecánicos		☐ Recipientes de presión		☐ Calderas		☐ Recipientes de presión sin fogón		☐ Cañerías y accesorios de presión		☐	
☐ Cilindros de gas		☐ Cajones de aire comprimido		☐ Hornos, fogones, estufas		☐ Altos hornos		☐ Hornos de refinación		☐ Otros hornos	
☐ Plantas refrigeradoras		☐ Instalaciones eléctricas		☐ Maquinas giratorias		☐ Conductores y cables eléctricos		☐ Transformadores		☐ Aparatos de mando y de control	
☐ Herramientas eléctricas manuales		☐ Herramientas, implementos y utensilios manuales		☐ Herramientas manuales accionadas mecánicamente		☐ Herramientas manuales no accionadas mecánicamente		☐		☐ Otras herramientas	

 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NT: 90.1.501.273.2		INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE TRABAJO										CÓDIGO: FSO-04 VERSIÓN: 0 FECHA: 05/05/2019	
Escaleras, rampas móviles		Andamios		Otros aparatos no clasificados		Explosivos		Polvos, gases, líquidos y productos químicos		Polvos		Gases, vapores líquidos a excepción de explosivos	
Gases, vapores y humos		Líquidos no clasificados		Productos químicos no clasificados		Fragmentos, volantes		Radiaciones ionizantes		Radiaciones de otro tipo		Otros materiales y sustancias no clasificados	
Ambiente de trabajo		Condiciones climáticas		Superficie de trabajo		Agua		Pisos		Espacios exigüos		Escaleras	
Aberturas en el suelo		Factores que crean el ambiente (alumbrado, ventilación, temperatura, ruidos, etc.)						Subterráneos		Tejados, revestimiento de galerías, de túneles etc.		Pisos de galerías, de túneles, etc.	
Frentes de minas, túneles		Pozos de minas		Fuego		Otros agentes no clasificados		Animales vivos		Productos de animales		X Agente no clasificado por falta de datos	
MECANISMO O FORMA DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE:													
Desplome de edificios, viviendas				Pisadas sobre objetos				Choques contra objetos inmóviles		Choques contra objetos móviles		Golpes por objetos móviles	
Atrapado entre dos objetos móviles				Esfuerzo excesivo falso movimiento				Esfuerzo físico excesivo al levantar objetos		Esfuerzo físico excesivo al empujar o tirar objetos		Esfuerzo físico excesivo al manejar o lanzar objetos	
Falso movimiento				Exposición o contacto con temperatura extrema				Exposición al calor		Exposición al frío		Contacto con sustancias u objetos ardientes	
Exposición o contacto con la corriente eléctrica				Exposición o contacto con sustancia nociva o radiaciones				Contacto por inhalación, gestión o absorción de sustancia nociva		Exposición a radiaciones ionizantes			
Exposición a otras radiaciones				Otras formas de accidente no clasificada por falta de datos									
CAUSAS BÁSICAS													
FACTORES PERSONALES						CÓDIGO		FACTORES DEL TRABAJO				CÓDIGO	
Rutina, monotonía, tarea realizada periódicamente durante la labor diaria						1304							
Baja percepción del riesgo por las condiciones locativas													
CAUSAS INMEDIATAS													
ACTOS SUBESTANDAR						CÓDIGO		CONDICIONES SUBESTANDAR				CÓDIGO	
DATOS ANEXOS													
SE PRESENTARON TESTIGOS DEL ACCIDENTE:						NO		POR QUE:					
VERSIÓN TESTIGO 1:													
VERSIÓN TESTIGO 2:													
MÉTODOS Y CONTROLES HALLADOS:													
FUENTE:													
MEDIO: Área con buena iluminación													
TRABAJADOR: Trabajador con siete años de experiencia en la labor que realizaba, sin antecedentes anteriores, al momento del evento utilizaba la dotación y los elementos de protección personal suministrados por la empresa													
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS (RECOMENDACIONES):													
FUENTE						Al realizar los recorridos visualizar los peligros y riesgos en los que están expuestos							
MEDIO													
TRABAJADOR: capacitar a los trabajadores en sobre percepción del riesgo en los frentes de trabajo													
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN													
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN		CARGO				FIRMA	
DIANA DAZA BECERRA						1098648986		ING. RESIDENTE SST					
FECHA DE LA INVESTIGACIÓN:						21/02/2023		DÍA:		Martes		HORA INICIO:	
HORA FINAL:						12:30 H. L.							
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES:													
NOMBRES Y APELLIDOS:						DIANA DAZA BECERRA		CARGO:		RESIDENTE SST			
NOMBRES Y APELLIDOS:								CARGO:					
NOMBRES Y APELLIDOS:								CARGO:					
FECHA DE VERIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES:						13/03/2023							



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

LECCIÓN APRENDIDA

No. 17

000178

INCIDENTE DE TRABAJO



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

1. ¿QUE SUCEDIÓ ?

El día 15 de febrero de 2023, el Sr. Andy José Venera Muñoz siendo aproximadamente a las 10:30 am, se encontraba buscando unas herramientas para encender los pilotes, cuando me iba a regresar al punto de trabajo se me hundió la bota en el barro y la raíz de un mangle atravesó la suela de la bota provocando una fisura en la planta del pie derecho, inmediatamente se le realizó los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

Fisura en la planta del pie
derecho.

2. Cuales fueron las causas para que se presentara este incidente?



- 1. Exceso de confianza**
- 2. Baja percepción del riesgo por las condiciones locativas**



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

000179

3. ¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PODEMOS IMPLEMENTAR PARA EVITAR ESTA CLASE DE INCIDENTES?

**"PRESTE ATENCIÓN A INPECCIONAR EL ÁREA DE
TRABAJO ANTES DE INICIAR LABORES"**

- 1. Revisión preventiva del área de trabajo antes de realizar cualquier actividad.**



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

4. PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE

PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LABORES

ACCIONES	OBSERVACIÓN
1. Divulgación de la lección aprendida del incidente	Ejecución el 17 de marzo del 2023
2. Divulgación al personal de realizar inspecciones preventivas del área de trabajo.	Ejecución el 17 de marzo del 2023
3. Capacitación en autocuidado y percepción del riesgo.	Ejecución el 17 de marzo del 2023



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2
