


Proyecto: PD CTO IDU-1712-2  ING. FERNEY LEANDRO VEGA DIRECTOR DE OBRA	Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duracion		solo el comienzo		Hito externo		División critica	
	División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		Progreso	
	Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas criticas		Progreso manual	
Página 1  ING. GUSTAVO ADOLFO VELANDIA RODRIGUEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA														

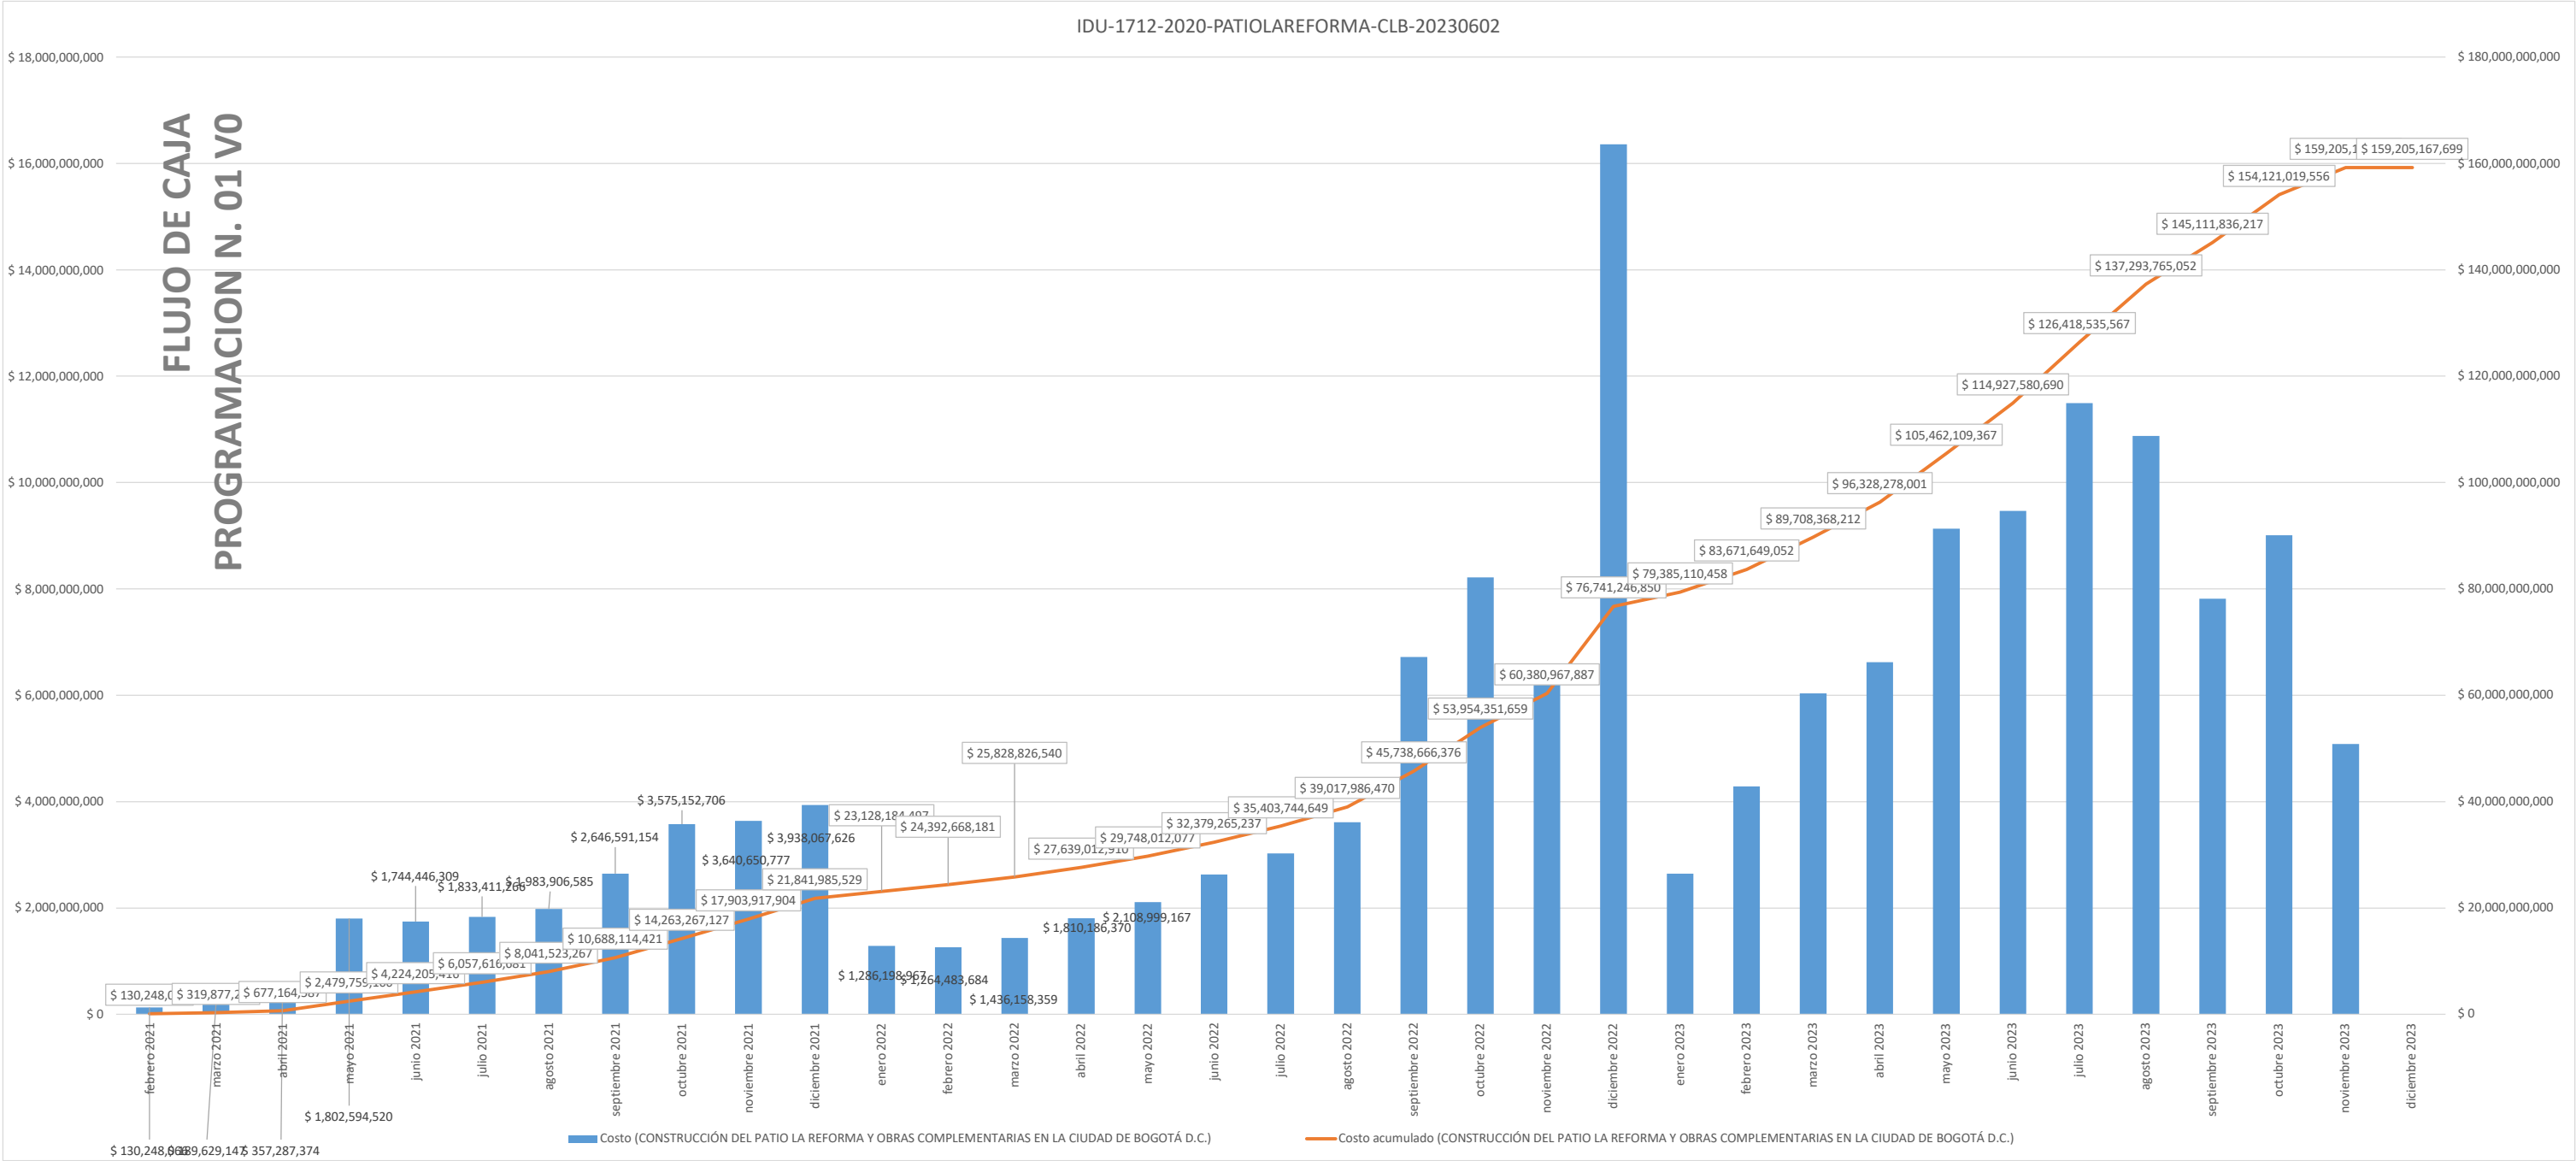

Id	Nombre	Costo	Costo real	Costo restante	CPTP
1	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 159,205,167,699	\$ 0	\$ 159,205,167,699	\$ 89,708,368,212
2	Acta de Inicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	FASE DE PRELIMINARES	\$ 236,669,471	\$ 0	\$ 236,669,471	\$ 236,669,471
214	FASE PRELIMINARES - OBRA	\$ 96,983,404	\$ 0	\$ 96,983,404	\$ 96,983,404
219	FASE DE EJECUCIÓN	\$ 158,871,514,824	\$ 0	\$ 158,871,514,824	\$ 89,374,715,337
484	FIN CONTRATO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
