

2023

## INF. MENSUAL DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC

### OBJETO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

### RESUMEN GENERAL

| Versión | Fecha      | Cambios Realizados |
|---------|------------|--------------------|
| V0      | 07/06/2023 | Documento Original |
|         |            |                    |

## Contenido

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>2. Generalidades .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| a. Datos generales del contrato.....                                 | 4         |
| b. Amparos, vigencias y valores asegurados .....                     | 4         |
| c. Resumen de pagos .....                                            | 5         |
| d. Cuadro resumen de proyectos adjudicados .....                     | 5         |
| e. Avance físico de obra y financiero.....                           | 6         |
| <b>3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES.....</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1 Componente técnico general.....                                  | 7         |
| a. Resumen general de actividades ejecutadas .....                   | 7         |
| b. Registro fotográfico.....                                         | 8         |
| c. Resultados de ensayos materiales y/o otros.....                   | 13        |
| <b>4. Componente administrativo y financiero .....</b>               | <b>13</b> |
| a. Resumen financiero, programación y presupuesto.....               | 13        |
| b. Porcentaje de avance por capítulos representativos .....          | 14        |
| <b>5. Control de calidad, planes y programas.....</b>                | <b>14</b> |
| a. Control de calidad.....                                           | 14        |
| b. Control planes de calidad .....                                   | 14        |
| c. Control de calidad en obra (aplicativo para todas las sedes)..... | 15        |



## INF. MENSUAL DE OBRA No. 5

COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO

CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC

Código: GMACS\_C01

Versión: C001

Fecha:31/01/2023

### Índice de Tablas

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1 Datos generales del contrato.....             | 4 |
| Tabla 2 Amparos, vigencias y valores asegurados ..... | 4 |
| Tabla 3 Resumen de Pagos.....                         | 5 |
| Tabla 4 Proyectos adjudicados .....                   | 5 |

### Índice de ilustraciones

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Ilustración 1 Avance general del proyecto ..... | 6 |
|-------------------------------------------------|---|

|                                                                                   |                                                            |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>INF. MENSUAL DE OBRA No. 5</b>                          |  | Código: GMACS_C01 |
|                                                                                   | COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO                     |  | Versión: C001     |
|                                                                                   | <b>CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC</b> |  | Fecha:31/01/2023  |

## 1. Introducción

Este documento contiene la información mensual correspondiente al INFORME DE OBRA No. 5, comprendido entre el 01 de mayo y 31 de mayo de 2023; de conformidad con lo estipulado en el contrato Prestación de servicio No. CO22000261-GAC, en el pliego de condiciones y sus anexos. Se cumple a cabalidad con el objeto contractual, ejecutando las actividades de acuerdo con los documentos y especificaciones entregados por el contratante de forma integral y acorde con los planes, programas, programación de obra y condiciones contractuales.

A través de este informe se presenta la información general del Contrato y la descripción técnica de las actividades técnicas representativas en cada frente de Obra, las actividades administrativas, ambientales y financieras desarrolladas durante la fase de ejecución del contrato.

## 2. Generalidades

### a. Datos generales del contrato

Tabla 1 Datos generales del contrato

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                      | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL</b> |
| <b>CONTRATO No.:</b>               | <b>CO22000261-GAC</b>                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATISTA</b>                 | <b>GMA CONSTRUCCIONES SAS</b>                                                                                                                            |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN:</b>          | <b>28 DE DICIEMBRE DE 2022</b>                                                                                                                           |
| <b>PLAZO EJECUCIÓN:</b>            | <b>DOCE (12) MESES</b>                                                                                                                                   |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>       | <b>28 DE DICIEMBRE DE 2022</b>                                                                                                                           |
| <b>FECHA TERMINACIÓN PREVISTA:</b> | <b>30 DE DICIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                           |
| <b>PLAZO TRANSCURRIDO:</b>         | <b>5 MESES</b>                                                                                                                                           |
| <b>VALOR INICIAL:</b>              | <b>\$ 532.751.384,00</b>                                                                                                                                 |
| <b>VALOR EJECUTADO:</b>            | <b>\$ 439.734.814,00</b>                                                                                                                                 |
| <b>% EJECUTADO:</b>                | <b>82,54%</b>                                                                                                                                            |
| <b>VALOR ACUMULADO ANTERIOR:</b>   | <b>\$ 365.636.590,00</b>                                                                                                                                 |
| <b>% ACUMULADO ANTERIOR:</b>       | <b>68,63%</b>                                                                                                                                            |
| <b>VALOR POR EJECUTAR:</b>         | <b>\$ 93.016.570,00</b>                                                                                                                                  |
| <b>% POR EJECUTAR:</b>             | <b>17,46%</b>                                                                                                                                            |

### b. Amparos, vigencias y valores asegurados

Tabla 2 Amparos, vigencias y valores asegurados

| NO. PÓLIZA      | FECHA DE EXPEDICIÓN | RIESGOS                       | AMPARO                                            | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA/ACTUAL |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 96-44-101178187 | 26/12/2022          | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                         | 30/06/2024     | \$106.550.276         |
|                 |                     | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E | 30/12/2026     | \$26.637.569          |

|                                                                                   |                                                     |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>INF. MENSUAL DE OBRA No. 5</b>                   |  | Código: GMACS_C01 |
|                                                                                   | COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO              |  | Versión: C001     |
|                                                                                   | CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC |  | Fecha:31/01/2023  |

|                             |                   |                                          |                                             |                   |                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                             |                   |                                          | <b>INDEMNIZACIONES<br/>LABORALES</b>        |                   |                      |
|                             |                   | <b>CONSTRUCCION DE<br/>OBRAS CIVILES</b> | <b>ESTABILIDAD Y<br/>CALIDAD DE LA OBRA</b> | <b>30/06/2024</b> | <b>\$266.375.692</b> |
| <b>96-40-<br/>101062956</b> | <b>26/12/2022</b> | <b>CONSTRUCCION DE<br/>OBRAS CIVILES</b> | <b>RESPONSABILIDAD<br/>CIVIL</b>            | <b>30/12/2023</b> | <b>\$200.000.000</b> |

### c. Resumen de pagos

Tabla 3Resumen de Pagos

| CONTRATO DE OBRA            |               |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| CONCEPTO                    | FECHA DE PAGO | VALOR                    |
| Acta Parcial de obra No. 01 | 17/03/2023    | \$ 95.729.714,00         |
| Acta Parcial de obra No. 02 | 18/04/2023    | \$ 72.836.766,00         |
| Acta Parcial de obra No. 03 | 31/4/2023     | \$ 100.299.532,00        |
| Acta Parcial de obra No. 04 | SIN           | \$ 96.770.578,00         |
| Acta Parcial de obra No. 05 | SIN           | \$ 74.098.224,00         |
| <b>Total</b>                |               | <b>\$ 439.734.814,00</b> |
| <b>% Facturado</b>          |               | <b>82,54%</b>            |

### d. Cuadro resumen de proyectos adjudicados

CASUR, observando de manera general las condiciones y necesidades de la INFRAESTRUCTURA, determinó realizar las intervenciones en los siguientes frentes ubicados en Bogotá, Cundinamarca y el Tolima, priorizando la contratación, hasta agotar recursos asignados, de esta manera:

Tabla 4Proyectos adjudicados

| No. | DIRECCIÓN                                                | UBICACIÓN    |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | CRA 7 No. 12B - 27 EDIFICIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | BOGOTÁ       |
| 2   | CRA 7 No. 12B - 41 EDIFICIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  | BOGOTÁ       |
| 3   | CRA 7 No. 12B - 52 EDFICIO SIMON BOLIVAR                 | BOGOTÁ       |
| 4   | CRA 7 No. 12B - 58 EDFICIO CASUR                         | BOGOTÁ       |
| 5   | CLL 118 No. 15A-63                                       | BOGOTÁ       |
| 6   | CRA 9 No. 6B - 19                                        | BOGOTÁ       |
| 7   | CRA 22 No. 80-91 CASA DEL POLO                           | BOGOTÁ       |
| 8   | CLL 33 No. 6 - 20 PARQUEADERO - BODEGA                   | BOGOTÁ       |
| 9   | CENTRO VACACIONAL APULO                                  | CUNDINAMARCA |
| 10  | CENTRO VACACIONAL MELGAR                                 | TOLIMA       |

e. Avance físico de obra y financiero.

| BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO CASUR |                                            | MAYO                 | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| PROYECTO                              | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES | PRESUPUESTO          | \$ 532.751.384,00              |
|                                       |                                            | TOTAL, AVANCE MES 05 | \$ 439.734.814,00              |
|                                       | UBICACIÓN: Bogotá                          | AVANCE FINANCIERO:   | 82,54%                         |

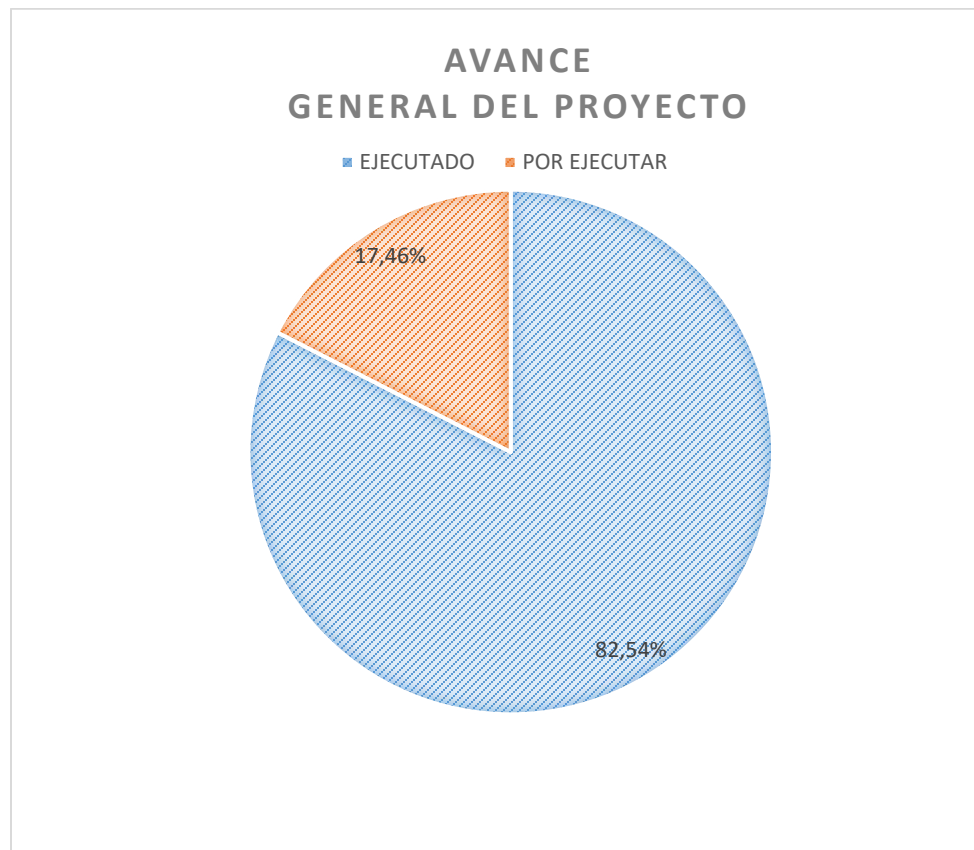


Ilustración 1 Avance general del proyecto

|                                                                                   |                                                     |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>INF. MENSUAL DE OBRA No. 5</b>                   |  | Código: GMACS_C01 |
|                                                                                   | COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO              |  | Versión: C001     |
|                                                                                   | CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC |  | Fecha:31/01/2023  |

### 3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES

#### 3.1 Componente técnico general

##### a. Resumen general de actividades ejecutadas

##### • Mantenimiento Infraestructura

EDF. 27 - Se realizó instalación de manto asfáltico con Foil de aluminio sobre terraza del piso 3 y se atendió emergencia en cubierta del vacío ubicada en el piso 3 del CAYBA.

EDF. 27 – Se realizó la pintura a totalidad del piso 9 contemplando oficinas 905 y 905A al igual que pasillos de circulación de ascensores.

EDF. 27 – Se realizó pintura de muro del local comercial de ZATY subiendo al segundo piso donde se encontró filtración de agua.

EDF. 52/58 – Se realizó pintura de oficinas del piso 10 a nivel de muros, los techos no se intervienen en estos espacios ya que previamente se habían pintado., adicional a estos espacios se realizó pintura de auditorio en la totalidad de sus muros.

EDF. 52 – Se realizó intervención con pintura de oficina 611 y 612.

EDF 27 – Se realizó desmote de cielo raso en local comercial de ZATY que estaba afectado por la humedad.

EDF. 27 – Se realizó cubrimiento con lamina de super board a una cara en cuarto de equipos sobre cubierta.

EDF. 27 – Se instalo lamina de super board para recubrimiento de columna donde se debió realizar intervención para instalación de uniones dresser.

##### • Mantenimiento de instalaciones sanitarias

Casa Polo – Se realizó instalación de tanque de almacenamiento de 500Lt en cubierta de Casa Polo.

##### • Mantenimiento y recarga de extintores

No aplica para el periodo de Informe.

##### • Mantenimiento de instalaciones eléctricas e iluminación

EDF 27 - Se realizó instalación panel rectangular de 120x30 y 60x60 en espacios solicitados por la supervisión como pasillo de circulación, oficina 905 y 905ª.

EDF. 52 – Se realizó instalación de panel rectangular de 120x30 en espacios solicitados por la supervisión como pasillo de circulación, oficina 611 y 612.

##### • Mantenimiento de equipos electromecánicas, de bombeo, planta eléctrica y maquinaria en Apulo

EDF 52 - Se realizó mantenimiento de equipo eyector de agua en sótano.

EDF.58 – Se realizó mantenimiento de equipo eyector de agua en sótano.

EDF.27 – Se realizó mantenimiento de equipo eyector de agua en sótano.

##### • Mantenimientos varios

EDF 58. Se realizó instalación de vidrio en división de la oficina GMS que se encontraba fisurada.

EDF 27. Se realizó instalación de vidrios en basculantes y montantes del piso 9 que se encontraban rotos.

- **No Previstos**

EDF 27 - Se realizó retiro de manto asfáltico sobre áreas del piso 3 (CAYBA) de intervención de acuerdo con lo revisado y aprobado por la supervisión del contrato.

EDF 27 - Se realizó aplicación de mortero tipo MaxSeal sobre placas del piso 3 (CAYBA) como componente adicional a la intervención de impermeabilización realizada sobre cubiertas.

EDF 52/58 – Se realizó mantenimiento de equipo elevador de agua ubicado en el sótano.

EDF 27 – Se realizó construcción de media caña en cubierta donde se ejecutó la intervención de manto asfáltico.

b. Registro fotográfico

**Actividad: Desmonte e instalación de tanque de almacenamiento en Casa Polo**



**Actividad: Instalación y llenado de tanque de almacenamiento en Casa Polo**



**Actividad: Instalación de lamina en superboard para cubrir cuarto de maquinas**



**Actividad: Instalación de cielo raso de en local de Zaty**




**Actividad: Instalación de lámparas en oficinas**



6/6/2023 11:41 a. m.  
6-99 Calle 12b  
La Candelaria  
Bogotá

6/6/2023 11:42 a. m.  
6-99 Calle 12b  
La Candelaria  
Bogotá



**Actividad: Instalación de lámina en superbord para cubrir cuarto de maquinas**

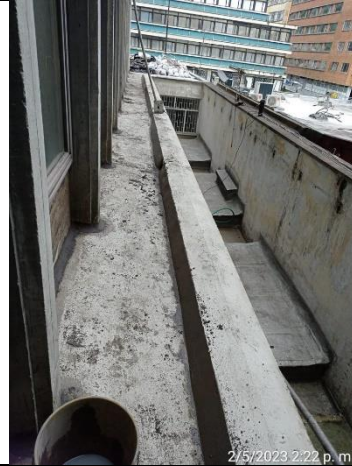

**Actividad: Recubrimiento de columnas en Superboard**



**Actividad: Pintura de oficinas piso 10**

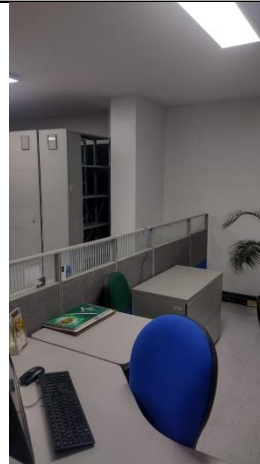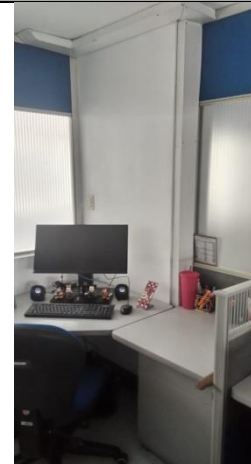

**Actividad: Instalación de lámina en superboard para cubrir cuarto de maquinas**



**Actividad: Instalación de cielo raso de en local de Zaty**



**Actividad: Instalación de lámparas en oficinas**



**Actividad: Instalación y aplicación de pintura bituminosa sobre empalmes de manto**



**Actividad: Instalación y aplicación de pintura bituminosa sobre empalmes de manto**



**Actividad: Instalación y aplicación de pintura bituminosa sobre empalmes de manto**



#### Actividad: Instalación y aplicación de pintura bituminosa sobre empalmes de manto



#### c. Resultados de ensayos materiales y/o otros.

En este periodo no se realizaron ensayos, por lo tanto, no aplica para el presente informe (Ver **Carpeta Anexos\_01. Resultados Ensayos**).


| ACTIVIDAD | TIPO DE ENSAYO | UBICACIÓN | CUMPLE |    |     | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|-----------|--------|----|-----|---------------|
|           |                |           | SI     | NO | N.A |               |
| N/A       | N/A            | N/A       |        |    | X   | N/A           |

## 4. Componente administrativo y financiero

### a. Resumen financiero, programación y presupuesto.

- ✓ Al final del periodo de Informe se inicia el proceso de gestión del quinto pago parcial por concepto de ejecución de obra, dado que a la fecha las labores iniciadas pueden ser facturadas como está definido en el contrato de obra.
- ✓ Las actividades e ítems contractuales de obra se han ido ajustando de acuerdo con las necesidades de la institución. En el caso de presentarse precios unitarios no pactados, se remitirá oportunamente el APU's de dichos ítems para la correspondiente revisión por parte de la supervisión y aprobación por parte de la entidad CASUR.
- ✓ Durante el desarrollo de la Obra se realiza el seguimiento conjuntamente con la supervisión de las actividades a ejecutar verificando el cumplimiento de estos y tomando las medidas pertinentes de manera oportuna para evitar retrasos en la entrega final.
- ✓ De manera conjunta entre el Residente de Obra y supervisión se realizan las mediciones y reportes de avance semanal para cada una de las actividades ejecutadas en el periodo de Informe.
- ✓ Durante el periodo de informe se realizan las mesas de trabajo conjuntas entre Profesionales de CASUR, y Contratista de Obra para la presentación de los ajustes y complementaciones al Presupuesto General de Obra correspondiente a la Solicitud de Adición en Valor y Tiempo al Contrato.

#### b. Porcentaje de avance por capítulos representativos

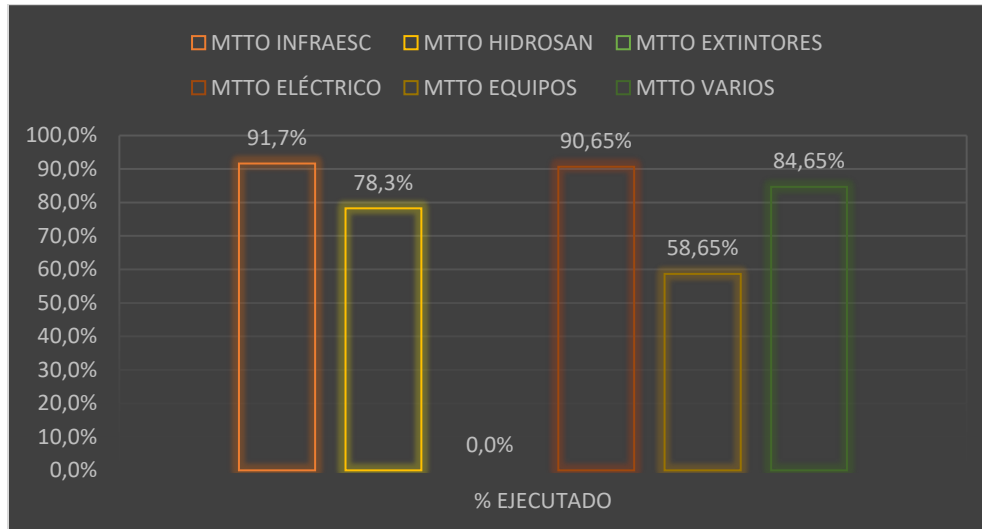

## 5. Control de calidad, planes y programas

#### a. Control de calidad

La construcción de la obra se desarrolla de acuerdo con los parámetros técnicos y especificaciones particulares del proyecto. Para efectos de verificación y aprobación por parte de la Interventoría, se entregaron los siguientes documentos: (Ver **Carpeta Anexos\_03. Fichas y Certificados**)

- Ficha técnica MaxSeal
- Ficha técnica Cemento Cemex UG
- Ficha técnica Mapelátex
- Ficha técnica Emulsión Asfáltica
- Ficha técnica Manto Asfáltico
- Ficha técnica Vinilo Tipo I
- Ficha técnica Supermastick
- Ficha técnica yeso
- Ficha técnica uniones Dresser
- Ficha técnica tubería PVC-S/P

#### b. Control planes de calidad

| ASPECTO              | CUMPLE |    | OBSERVACIONES                                                                                                         |
|----------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | SI     | NO |                                                                                                                       |
| ADMINISTRATIVO       | X      |    | Entregado la documentación contractual previa a la firma del acta de inicio.                                          |
| TÉCNICO              | X      |    | Se han entregado hojas de vida del equipo de trabajo mínimo.                                                          |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL | X      |    | Se ha entregado los EPP y demás consumibles de acuerdo con los requerimientos del SG-SST y Protocolos de Bioseguridad |

|                                                                                   |                                                     |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------|
|  | <b>INF. MENSUAL DE OBRA No. 5</b>                   |  |  | Código: GMACS_C01 |
|                                                                                   | COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO              |  |  | Versión: C001     |
|                                                                                   | CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC |  |  | Fecha:31/01/2023  |

|                              |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |  | Se ha entregado los soportes de Pago y Afiliación de Seguridad Social del personal de Obra.<br>Se realizan las actividades de seguimiento y control a cada una de las actividades constructivas realizando la debida implementación de las medidas de prevención del riesgo. |
| <b>SALUD OCUPACIONAL</b>     | <b>X</b> |  | Se han desarrollado las actividades con los equipos adecuados y necesarios para cada actividad. Del mismo modo las capacitaciones e inducciones pertinentes.                                                                                                                 |
| <b>AMBIENTAL Y SOCIAL</b>    | <b>X</b> |  | Se cumplen con las actividades y recomendaciones de los Planes de Manejo Ambiental, Plan de Manejo RCD y Plan de Gestión Social.                                                                                                                                             |
| <b>FINANCIERO Y CONTABLE</b> | <b>X</b> |  | Se gestiona el corte de obra No. 04, para cuarto pago.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JURÍDICO</b>              | <b>X</b> |  | Se realiza y radica la actualización de pólizas contractuales de acuerdo con el acta de Inicio.                                                                                                                                                                              |
| <b>ACTA DE INICIO</b>        | <b>X</b> |  | Se realizó firma de acta de inicio para proceder con la intervención del frente                                                                                                                                                                                              |

c. Control de calidad en obra (aplicativo para todas las sedes)

| ACTIVIDAD                                                                       | CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE   |    |          | OBSERVACIONES             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|---------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI       | NO | N.A      |                           |
| <b>CERRAMIENTO</b>                                                              | El fin de esto es servir de protección exterior a la obra y de esta forma minimizar los riesgos que se puedan presentar en la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>X</b> |    |          |                           |
| <b>MATERIALES PETROS</b>                                                        | Los materiales provienen de canteras debidamente autorizadas que cuenten con las Licencias y Certificados Mineros pertinentes. Los materiales cumplen con los ensayos y/o caracterizaciones propias del tipo de agregado.                                                                                                                                                                                                                               | <b>X</b> |    |          |                           |
| <b>BASES Y CONCRETOS</b>                                                        | Compactación exclusivamente con medios mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |
|                                                                                 | Compactación del 95% del Proctor modificado, o que garantice que no se presentarán asentamientos o hundimientos de la estructura que soportará el suelo existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |
|                                                                                 | El contratista deberá demostrar a la Interventoría y/o Supervisión la compactación de la subrasante (CBR=95%) mediante ensayos de laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |
|                                                                                 | El cemento que se usará para concretos, morteros y lechadas será de fabricación Nacional Tipo Portland. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se suministre en sacos, estos deberán ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. | <b>X</b> |    |          | No aplica en este periodo |
| <b>BASES Y CONCRETOS CIMENTACION Y ESTRUCTURA ACERO DE REFUERZO MAMPOSTERIA</b> | Los agregados gruesos y finos para la fabricación de concreto, deberán conformarse con las especificaciones C-33 de la ASTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>X</b> |    |          |                           |
|                                                                                 | No se permitirán concretos con exceso de agua o si en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites especificados, será rechazado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |
|                                                                                 | Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciéndola constante durante un tiempo nunca inferior a diez (10) días. Se cubrirá con agua procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar los agrietamientos.                                                                                                                                             |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |
|                                                                                 | Toma de muestras de Cilindros para pruebas de resistencia a compresión. Toma de cono de Asentamiento de cada Mixer a la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    | <b>X</b> | No aplica en este periodo |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |   |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------|
|                                               | <p>para verificar la manejabilidad del concreto y el tiempo máximo de vaciado.</p> <p>Seguimiento del proceso constructivo idóneo, entregado a la STI. Utilización de Formaletería metálica en óptimas condiciones que garantizan la configuración dimensional adecuada de cada uno de los elementos a fundir.</p> <p>Supervisión continua del personal Profesional de Obra para garantizar la debida ejecución de acuerdo con los diseños aprobados. Acompañamiento constante y conjunto de la Interventoría de Obra en cada una de las fases constructivas, realizado la verificación de cada uno de los componentes previo a su ejecución.</p> |   |  |   |                           |
|                                               | <p>Los materiales provienen de siderúrgicas debidamente certificadas, con procesos certificados de Calidad para la producción, extrusión, corte y figurado del Acero.</p> <p>Cuenta con las certificaciones de cumplimiento de las normas NTC vigentes y requerimientos de la NSR asociados.</p> <p>Verificación y supervisión conjunta entre Contratista e Interventoría sobre el posicionamiento, ubicación y dimensiones generales de los armados previo a las fundiciones de cada elemento.</p>                                                                                                                                               |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | Al momento de colocarse las unidades de mampostería deben estar limpias y libres de imperfecciones que afecten las propiedades físicas o mecánicas del muro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | El mortero de pega debe cumplir con lo establecido en el Título D NSR-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>               | Los muros deberán ser cuidadosamente trazados de acuerdo a los planos y deberán estar plomados y nivelados en sus hiladas. Deberá cumplirse con la pega del mortero tanto en la pega vertical como horizontal en cada hilada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>PAÑETES</b>                                | Se realizó el mortero en las proporciones convenidas en el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |  |   | No aplica en este periodo |
| <b>MAMPOSTERIA ACABADO PARA MUROS Y PISOS</b> | Se efectúa la actividad de acuerdo con los correctos procedimientos técnicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | Los materiales que se lleven a la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen en los cuales deberán almacenarse hasta su utilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | La superficie que se vaya a pintar se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la grasa y el mortero excedente que pueda tener, resanando las imperfecciones que presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>                   | Todo el material para emplear será de buena calidad y deberá ir correctamente protegido con anticorrosivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | Se construirán en material de primera calidad, en perfecto estado, y no se aceptarán añadiduras ni remiendos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>               | Emplean materiales de primera calidad conforme lo indica la NTC 2050 y el RETIE. Las luminarias suministradas cumplen con el RETILAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                               | El contratista entrega oportunamente los protocolos y certificados de calidad de los materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>          | El contratista utiliza materiales idóneos, de primera calidad y debidamente certificados para la ejecución de las redes hidrosanitarias interiores y exteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X |  |   | No aplica en este periodo |
|                                               | Se realiza la verificación previa de ubicación, posicionamiento y dimensiones generales de las redes, cajas, colectores, cruces y niveles que puedan estar involucrados en la construcción de estas redes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |   |                           |

|                                                                                   |                                                            |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
|  | <b>INF. MENSUAL DE OBRA No. 5</b>                          |  |  | Código: GMACS_C01 |
|                                                                                   | COMPONENTE JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO                     |  |  | Versión: C001     |
|                                                                                   | <b>CONTRATO- PRESTACIÓN DE SERVICIO No. CO22000261-GAC</b> |  |  | Fecha:31/01/2023  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |   |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CUBIERTAS</b> | Cumplimiento de los requerimientos de materiales y ejecución de la NTC 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |                           |
|                                                | Las tuberías deben enterrarse a una profundidad mínima de 60 cm, en una cama de material Libre de piedras o elementos agudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Los Sifones deben ser en forma de "U" que mantiene el sello de agua que impide la salida de los Gases de la instalación sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Las tuberías de desagüe y ventilación se probarán por piso, separadamente, llenándolas con Agua y verificando en la instalación que no se presenten filtraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Toda la tubería y accesorios de pvc y cpvc presión Utilizados para la conducción de agua potable deberán tener el Certificado de conformidad con la norma técnica colombiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Se realizó la prueba hidráulica de la red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Las estructuras para soportar la cubierta serán de acero de procedencia nacional que cumplan con las normas aprobadas por el ICONTEC y encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido accidentes mecánicos o químicos antes, después o durante el montaje de la obra o cualquier dobladura o imperfecto fuerte que pueda sufrir variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual deberá sustituirse. |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | El Contratista suministrará todos los materiales y aplicará los sistemas de impermeabilización que sean necesarios para evitar infiltraciones y garantizar estanqueidad absoluta y mantenimiento adecuado en toda la construcción.                                                                                                                                                                                                                                                | X |  |   |                           |
|                                                | Las placas de concreto de cubierta deberán estar afinada, recubierta y pendienteado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  | X | No aplica en este periodo |
|                                                | Se utilizará materiales de primera calidad los cuales deberán tener previamente el visto bueno del supervisor y/o interventor de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | X | No aplica en este periodo |
| <b>CUBIERTAS</b>                               | El Contratista propondrá, para consideración del Supervisor y/o Interventoría, los equipos más apropiados para las operaciones por realizar, los cuales no deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la zona de los trabajos; y deberán garantizar el avance físico y permitiendo el correcto desarrollo de las etapas constructivas siguientes.                                                                                                                     | X |  |   |                           |

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá DC, a los 07 días del mes de junio de 2023.

| Elaboró y Validó                                                                                                                                                                                                         | Apoyó y Revisó                                                                                                                       | Aprobó                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ARQ. CHRISTIAN CAMILO FALLA ROJAS</b><br><b>Residente de Obra</b><br><b>GMA CONSTRUCCIONES SAS</b><br><b>Fecha: 07/06/2023</b> | <b>ARQ. IVAN DARIO BOTERO ORÓZCO</b><br><b>Coordinador de Proyectos</b><br><b>GMA CONSTRUCCIONES SAS</b><br><b>Fecha: 07/06/2023</b> | <b>ING. AUGUSTO JOSÉ GARCÍA PÉREZ</b><br><b>Representante Legal</b><br><b>GMA CONSTRUCCIONES SAS</b><br><b>Fecha: 07/06/2023</b> |
