


Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
1		DURACION TOTAL DEL PROYECTO	82 días	\$ 627.075.100,...	jue 03/08/23	dom 05/11/23											
2		ACTA INCIO	0 días	\$ 0,00	mié 23/08/23	mié 23/08/23											
3		PRELIMINARES	20 días	\$ 24.925.183,00	mié 23/08/23	jue 14/09/23											
4	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	10 días	\$ 3.533.600,00	mié 23/08/23	sáb 02/09/23											
5	1.2	DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10 días	\$ 323.433,00	mié 23/08/23	sáb 02/09/23											
6	1.3	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10 días	\$ 9.583.200,00	mar 29/08/23	vie 08/09/23											
7	1.4	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,30, INCLUYE	2 días	\$ 62.254,00	lun 04/09/23	mar 05/09/23											
8	1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	4 días	\$ 4.931.550,00	lun 04/09/23	jue 07/09/23											
9	1.6	DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA H:3,0 A 4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL	10 días	\$ 5.712.300,00	lun 04/09/23	jue 14/09/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
10	1.7	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAJAS, TUBERÍA PVC, EMT, IMC, CABLEADO, SALIDAS ELÉCTRICAS, APARATOS ELÉCTRICOS CON ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS EXISTENTES EN EL ÁREA A INTERVENIR, ESTOS	3 días	\$ 778.846,00	lun 04/09/23	mié 06/09/23											
11		ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	10 días	\$ 13.684.770,00	vie 15/09/23	mar 26/09/23											
12	2.1	PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN	10 días	\$ 3.275.580,00	vie 15/09/23	mar 26/09/23											
13	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL	10 días	\$ 10.409.190,00	vie 15/09/23	mar 26/09/23											
14		PAÑETES	15 días	\$ 10.841.350,00	sáb 09/09/23	mar 26/09/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE

Fecha: dom 27/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
15	3.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	15 días	\$ 6.671.200,00	sáb 09/09/23	mar 26/09/23											
16	3.2	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	12 días	\$ 4.170.150,00	sáb 09/09/23	vie 22/09/23											
17		CIELO RASO	25 días	\$ 41.229.140,00	vie 08/09/23	vie 06/10/23											
18	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	25 días	\$ 34.671.240,00	vie 08/09/23	vie 06/10/23											
19	4.2	COLOCACION DE MALLA SOBRE LAS CERCHAS BAJO LA CUBIERTA DESDE PISO 0-15m EN NYLON COMERCIALPATTY-18 INSTALADA CON AMARRAS PLASTICAS SOBRE CERCHA	10 días	\$ 6.557.900,00	jue 14/09/23	lun 25/09/23											
20		ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPE	22 días	\$ 37.380.354,02	sáb 23/09/23	mié 18/10/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
21	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	15 días	\$ 14.517.154,02	sáb 23/09/23	mar 10/10/23											
22	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	14 días	\$ 22.863.200,00	mar 03/10/23	mié 18/10/23											
23		ESTRUCTURA	49 días	\$ 171.873.000,...	sáb 09/09/23	sáb 04/11/23											
24	6.1	DESMONTE DE BARRA EN ACERO LISO DE DIAMETRO 3/8 - 5/8 CORRESPONDIENTE A LOS VIENTOS DE CUBIERTA	5 días	\$ 1.092.500,00	sáb 09/09/23	jue 14/09/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
25	6.2	INSTALACIÓN DE VARILLAS LISAS EN ACERO DE 5/8 PARA VIENTOS DE CUBIERTA. INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO ROJO, AUTOIMPRIMANTE INTERMEDIO Y ACABADO EN POLIURETANO, CONFORMACIÓN DE ROSCA CON TERRAJA EN EXTREMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS,	18 días	\$ 11.529.200,00	sáb 09/09/23	vie 29/09/23											
26	6.3	LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE PERFILES METÁLICOS EN TODAS SUS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD.	5 días	\$ 13.244.400,00	sáb 09/09/23	jue 14/09/23											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
27	6.4	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE SSPC-SP11 Y SSPC-SP1 SEGÚN LA STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA PERFILES METÁLICOS EN TODAS SUS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA	20 días	\$ 20.983.200,00	vie 15/09/23	sáb 07/10/23											
28	6.5	APLICACIÓN DE UNA CAPA DEL PRODUCTO DE DOS COMPONENTES, CON BASE EN RESINAS EPÓXICAS CON PIGMENTOS ACTIVOS A BASE DE FOSFATO DE CINC, CATALIZADOR POLIAMINOAMIDA, BASE DE MANNICH, TIPO SIKAPERMACOR SERIE 82 HS O SIMILAR A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 10.	25 días	\$ 37.798.200,00	sáb 23/09/23	sáb 21/10/23											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
29	6.6	APLICACIÓN DE UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, POLIMÉRICO, TIPO ACRILURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, ESMALTE URETANO SERIE 36 O SIMILAR, A UN ESPESOR POR CAPA DE PELÍCULA SECA DE (3.0 MILS A 4 MILS) MÁXIMO, PARA PERFILES	22 días	\$ 24.373.200,00	mié 11/10/23	sáb 04/11/23											
30	6.7	REEMPLAZO ELEMENTOS CON ALTO DETERIORO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE, APLICACION DE AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS O SIMILAR A UN ESPESOR DE PE	30 días	\$ 62.852.300,00	lun 02/10/23	sáb 04/11/23											
31		INSTALACIONES ELECTRICAS	40 días	\$ 45.606.053,00	jue 07/09/23	lun 23/10/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: dom 27/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
32	7.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3/4 INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	5 días	\$ 5.471.700,00	jue 07/09/23	mar 12/09/23											
33	7.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA LED HIGHBAY 150W CW GC350 60D, 100-240V, 5700K, 18700 LM, INCLUYE TOMA, CLAVIJA, SALIDA EN 2 NO. 10 CUXTHWNXAWG FASES + 1 NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, (TC, PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓ	18 días	\$ 8.878.320,00	mié 13/09/23	mar 03/10/23											

--

<div> <div>Proyecto: PROGRAMACION DE</div> <div>Fecha: dom 27/08/23</div> </div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
34	7.2.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA I	5 días	\$ 2.799.252,00	mar 19/09/23	sáb 23/09/23											
35	7.2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION INTERNA, INCLUYE BOTONERA (ON/OFF) CONTACTORES E INTERRUPTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA	5 días	\$ 2.831.490,00	mar 26/09/23	sáb 30/09/23											

Proyecto: PROGRAMACION DE

Fecha: dom 27/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
36	7.3.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO, MEDIANTE DRENADOR DE SOBRETENSIONES POR DISPERSIÓN (DSD), A TRAVÉS DE UN POZO DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90KG, EL CUAL INCLUYE, 6 BOLSAS DE SUELO ARTIFIC	8 días	\$ 10.687.576,00	lun 02/10/23	mar 10/10/23											
37	7.3.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS MEDIANTE UNA (01) PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XØ 1/2, INCLUYE AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLE	20 días	\$ 3.026.025,00	mar 19/09/23	mié 11/10/23											

<div> <div>Proyecto: PROGRAMACION DE</div> <div>Fecha: dom 27/08/23</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
38	7.3.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	10 días	\$ 4.998.370,00	mar 19/09/23	vie 29/09/23											
39	7.3.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INCLUYE, AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, TUBERÍA IMC, CONECTOR BIMETÁLICO Y TODO LO N	20 días	\$ 6.913.320,00	sáb 30/09/23	lun 23/10/23											
40		CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	5 días	\$ 4.012.380,00	jue 12/10/23	mar 17/10/23											

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
41	8.1	SIPS BARANDA EN ACERO INOXIDABLE 2" (INCLUYE PARALES, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	5 días	\$ 4.012.380,00	jue 12/10/23	mar 17/10/23											
42		CUBIERTAS	15 días	\$ 269.534.420,...	jue 19/10/23	sáb 04/11/23											
43	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIONE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38KG/M3, CARA EXTERNA EN CALIBRE 24 E E INTERNA EN CALIBRE 24 EN ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. ANCHO UTIL 1M, ESPESOR 10MM, ES	15 días	\$ 255.956.000,00	jue 19/10/23	sáb 04/11/23											


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	5 jun '23		02 jul '23		09 jul '23		16 jul '23		23 jul '23		30 jul '23
							L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	
44	9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARACUBIERTA TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38KG/M3, CARA EXTERNA EN CALIBRE 24 E E INTERNA EN CALIBRE 24 EN ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. ANCHO UTIL 1M,	15 días	\$ 13.578.420,00	jue 19/10/23	sáb 04/11/23											
45		ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	4 días	\$ 7.988.450,00	mié 01/11/23	sáb 04/11/23											
46	10.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	4 días	\$ 4.973.600,00	mié 01/11/23	sáb 04/11/23											
47	10.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	4 días	\$ 3.014.850,00	mié 01/11/23	sáb 04/11/23											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

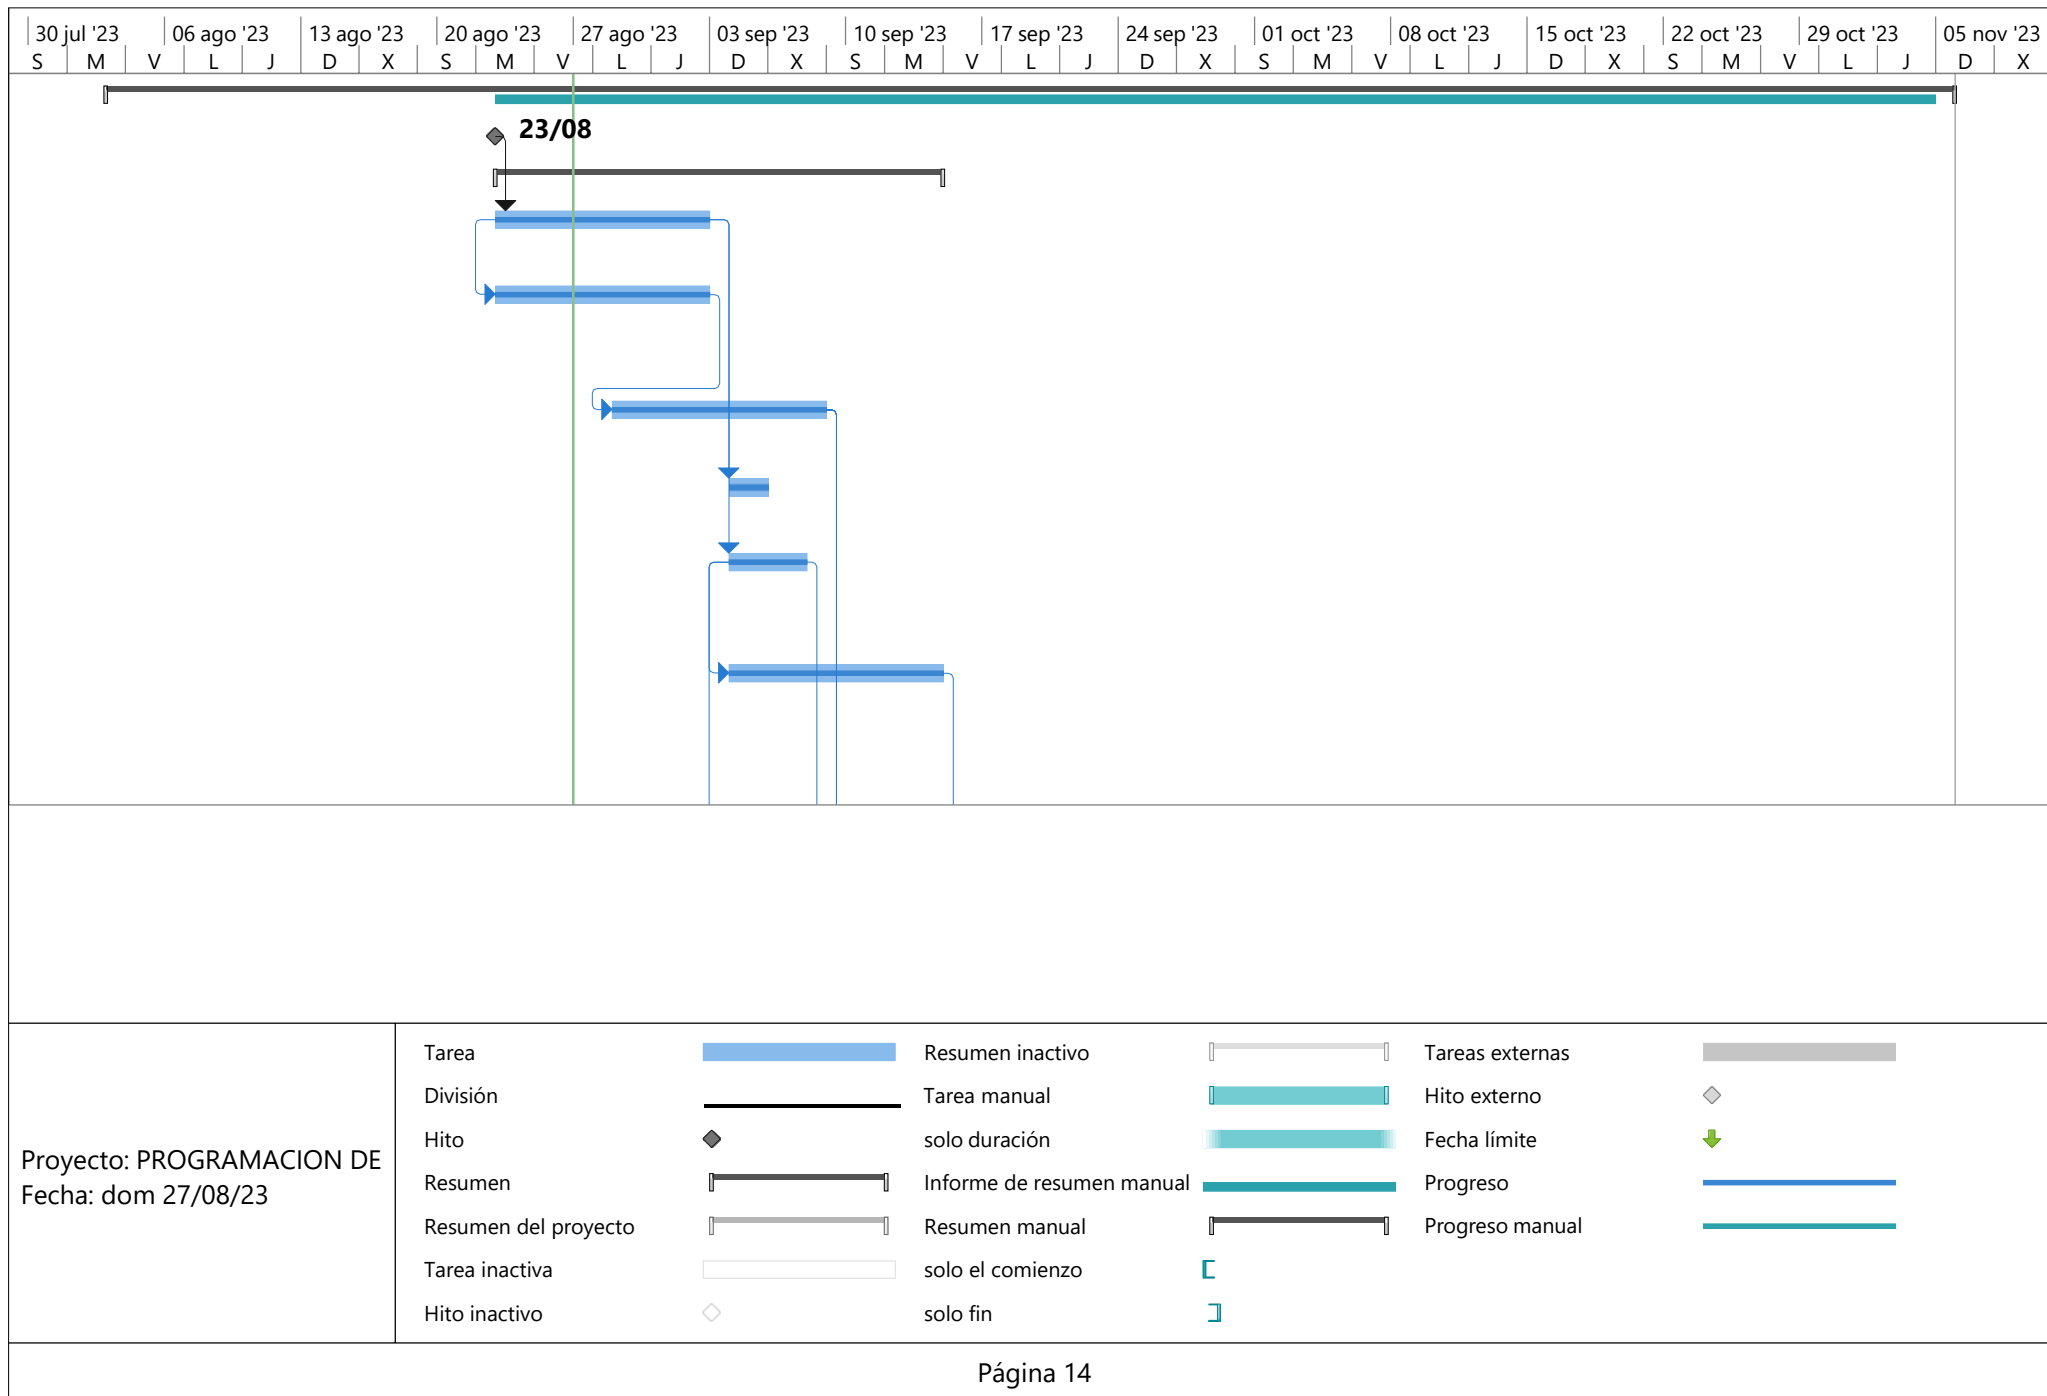

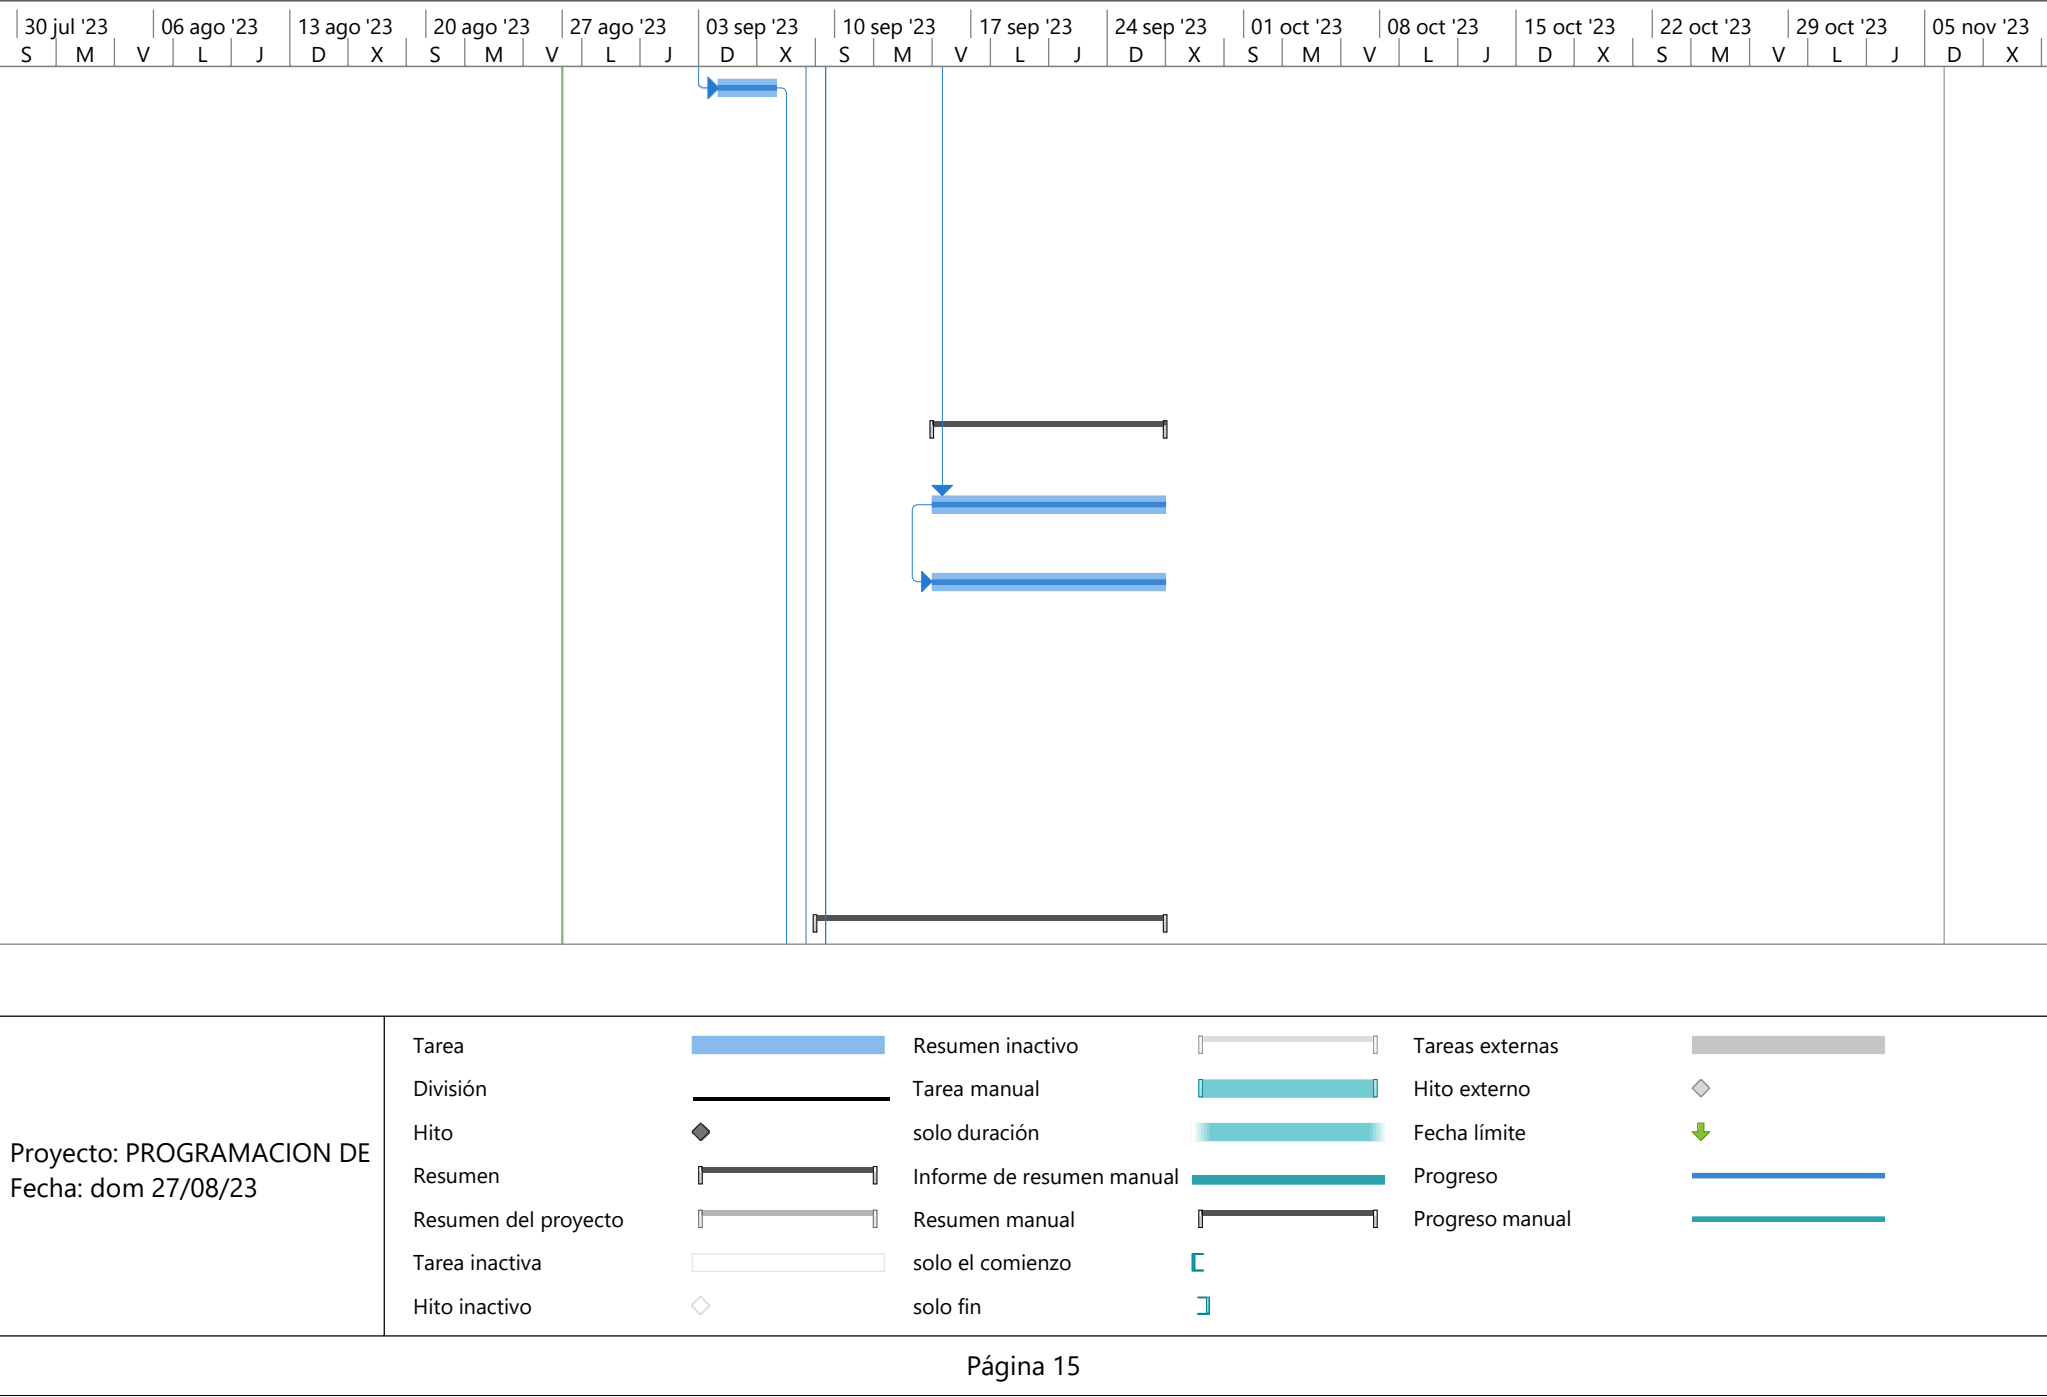


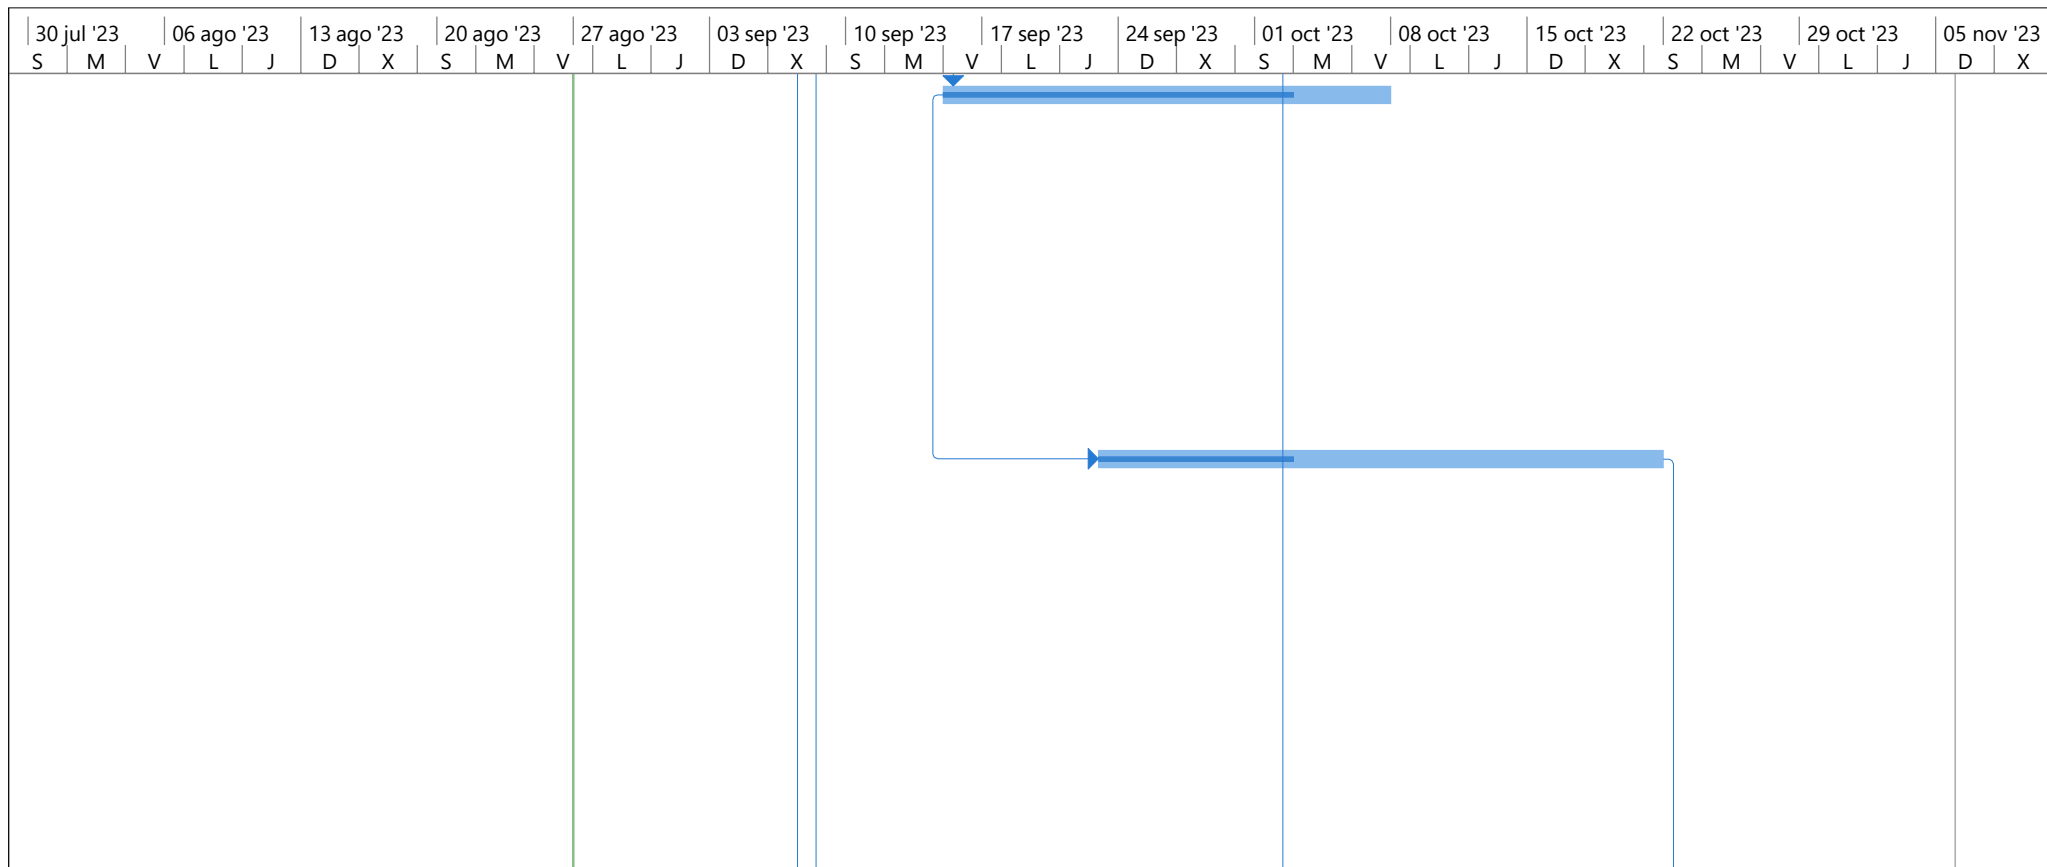

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

30 jul '23			06 ago '23			13 ago '23			20 ago '23			27 ago '23			03 sep '23			10 sep '23			17 sep '23			24 sep '23			01 oct '23			08 oct '23			15 oct '23			22 oct '23			29 oct '23			05 nov '23														
S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X															

Proyecto: PROGRAMACION DE Fecha: dom 27/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

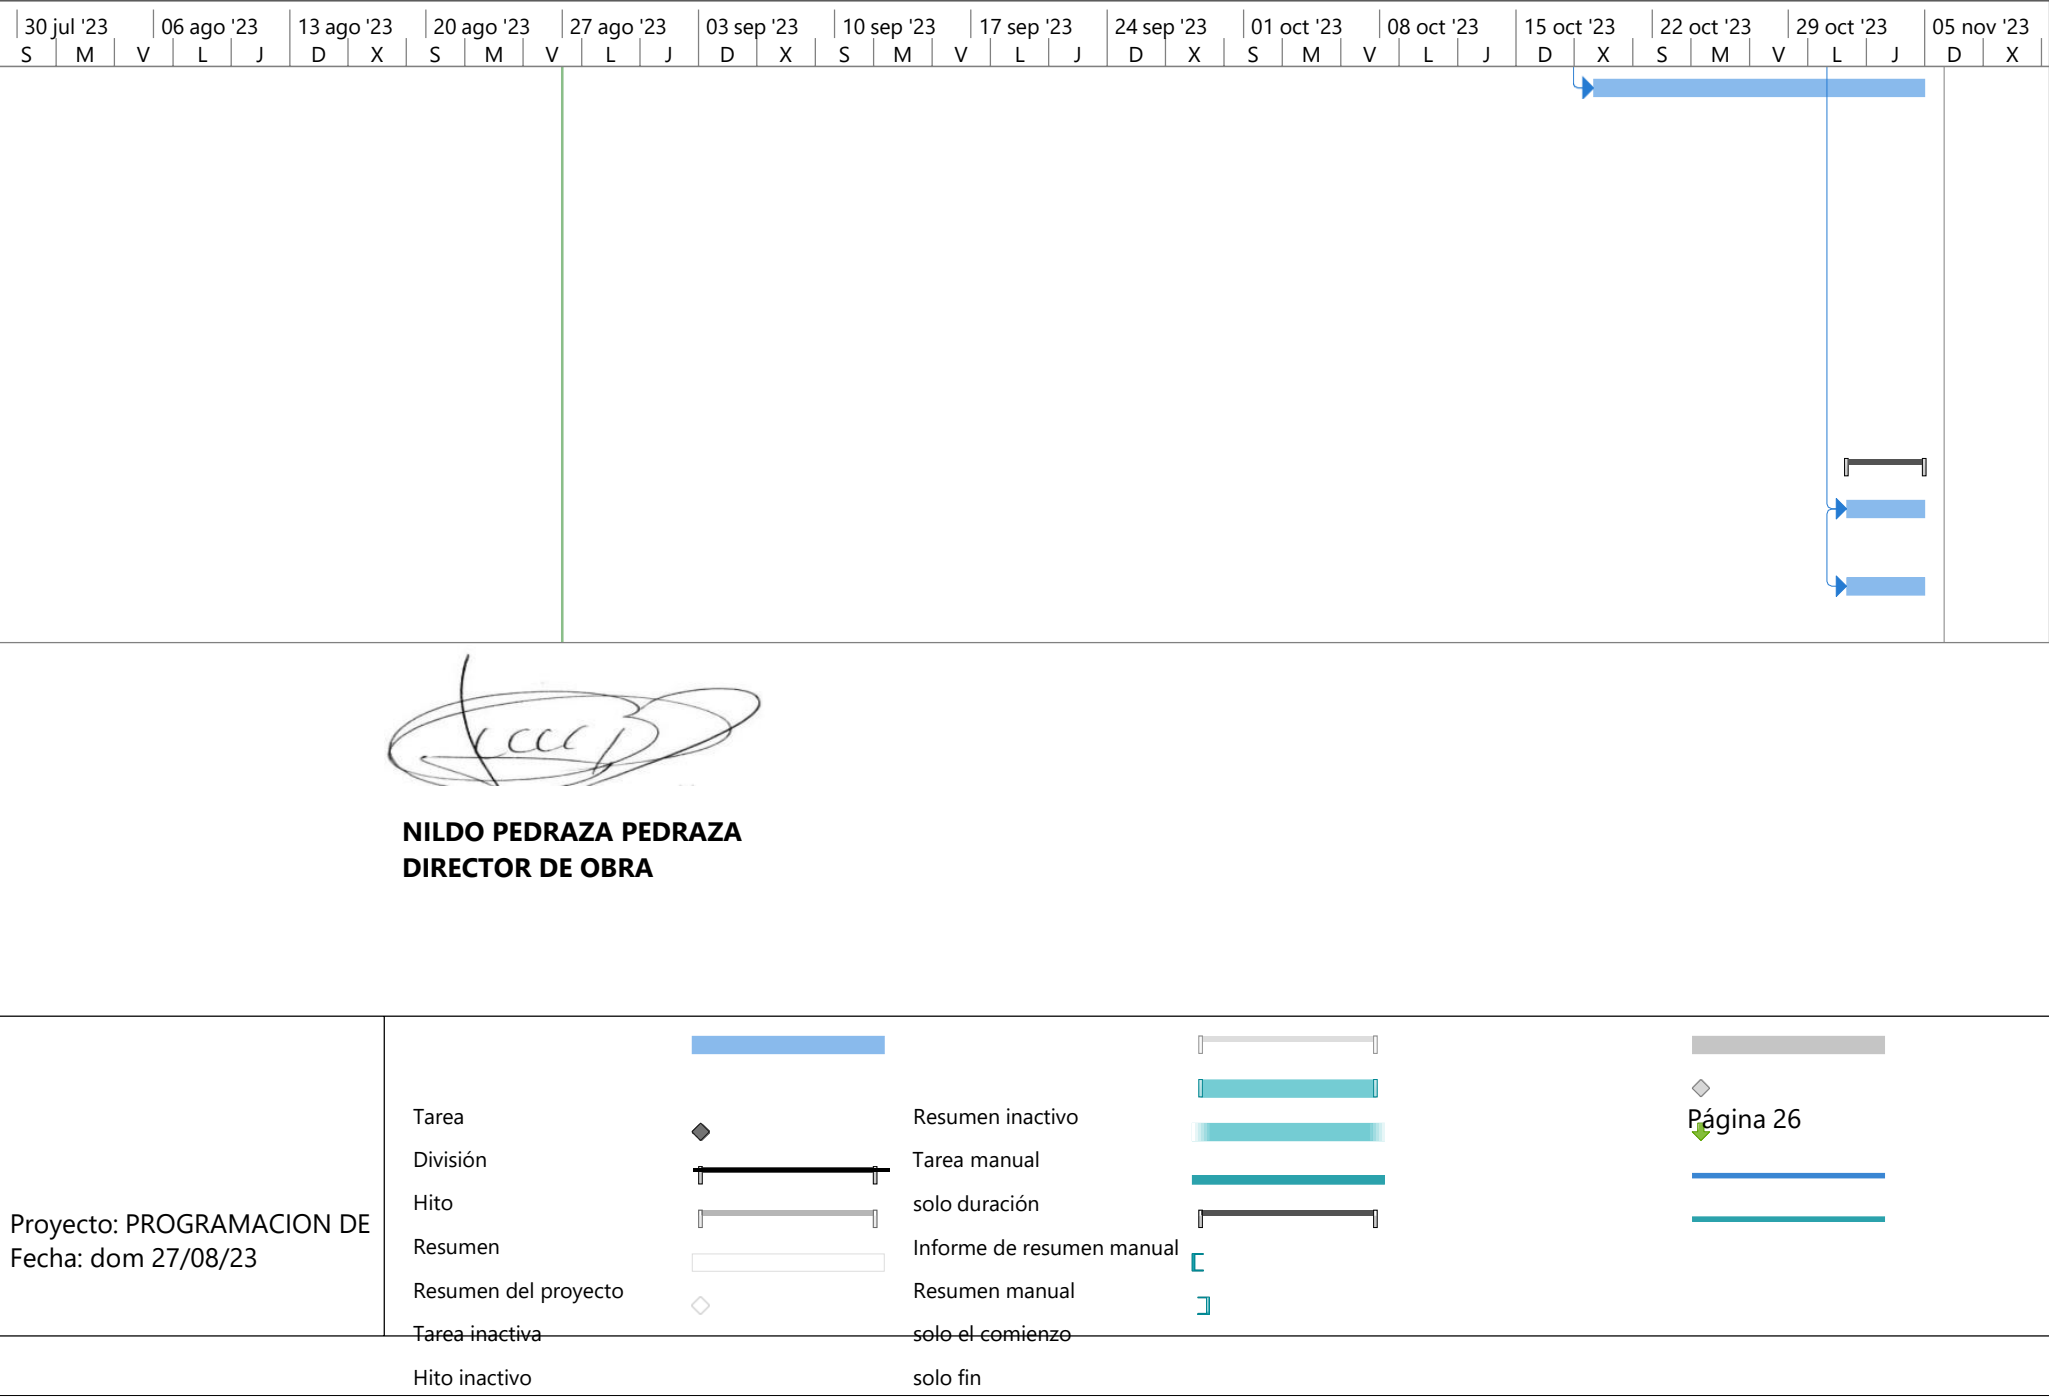

T
a
r
e
a
s

e
x
t
e
r
n
a
s

H
i
t
o

e
x
t
e
r
n
o

F
e
c
h

a

l
í
m
i
t
e

P
r
o
g
r
e
s
o

P
r
o
g
r
e
s
o

m
a
n
u
a
l
