

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-36
	ACTA	Versión: 02
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02
SUSPENSION DE OBRA No.1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-SI-018-2022

Fecha del Contrato: 13 de febrero de 2023

Contratista: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

Objeto: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS,
AVENIDA 6A ENTRE CALLE 4, CALLE 17A, CALLE 4 ENTRE
AVENIDA 7 AVENIDA 6A CALLE 2A ENTRE AVENIDA 10 –
AVENIDA 9A Y CALLE 2 ENTRE AVENIDA 9 AVENIDA 8 DEL
BARRIO TIERRA LINDA

Valor \$ 385.187.180

Plazo: Hasta el 13 de septiembre de 2023

Inicio: 13 de junio de 2023

En la Secretaria de Infraestructura a los doce (12) días del mes de septiembre de 2.023, se reunieron el Arq. **SERGIO DAVID ALBARRACÍN CASTRO** Secretario de Infraestructura y **JOSE ERNESTO RICO OSORIO**, contratista de obra, y **ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO**, contratista de interventoría, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

- A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES
- B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
- C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA
- D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
- E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

Se constata la asistencia al presente comité de las siguientes personas:

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN
Secretario de Infraestructura

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-36
	ACTA	Versión: 02
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

Interventoría

JOSE ERNESTO RICO OSORIO

Contratista de Obra

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Se da inicio a la presente reunión, el **CONTRATISTA** informa sobre desarrollo del contrato:

El día martes 13 de junio de 2023, se da inicio a la ejecución de la obra, se realiza la señalización de la vía, localización y replanteo, demolición de concreto, demolición de pozos de inspección, excavación a máquina, conformación y compactación de la subrasante, instalación de geotextil, extendida de base, reparación de domiciliarias de alcantarillado y acueducto, retiro de sobrantes, actividades contempladas los ítems del contrato.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

El contratista solicita la suspensión del contrato en mención (Contrato de Obra pública N° LP-SI-018- 2022) por el término de quince (15) días contados a partir de la fecha del presente comité, por motivos administrativos y jurídicos.

D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y/O LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

El supervisor y la interventoría del contrato aprueban la solicitud de suspensión del contrato de obra mencionado en el encabezado por los motivos expuesto por el contratista.

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

Se aprueba el comité No. 02 ACTA DE SUSPENSION No.01 con la finalidad de suspender el contrato en mención a partir de la fecha del presente documento.

El Contratista se obliga a notificar a la Compañía de SEGUROS, esta novedad que afecta las Pólizas de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php

www.lospatios-nortedesantander.gov.co

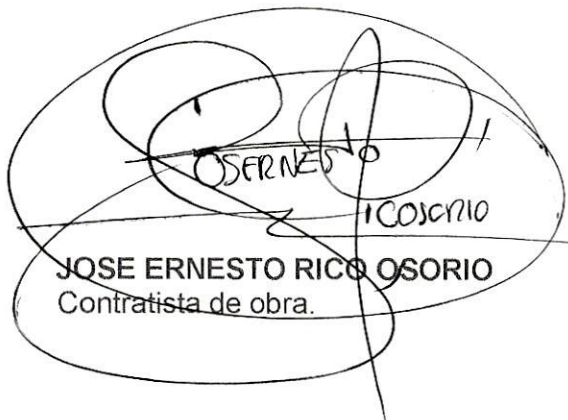
Teléfono: 5829959


 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-36
	ACTA	Versión: 02
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

De igual manera ordénese la publicación de este documento en la página web www.contratos.gov.co, dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2.015.

No siendo otro el motivo de la presente, firman los que en ella intervinieron:


Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN.
Secretario de Infraestructura
Supervisor de contrato


JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Contratista de obra.


ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
Contratista de Interventoría
