


Se adjunta una captura de la reunión del Comité de obra No.41 realizado el día 04 de agosto de 2023, el cual, se efectuó de manera virtual. En la evidencia fotográfica anexada, se observa los siguientes profesionales conectados:

- Nataly Galvis.
- Maritza Ibáñez.
- Christian Rodríguez.
- Geovanni Rojas.
- Geraldine Cerinza.
- Gilberto Martinez.
- Elkin Pineda.
- Leidy Aguirre.
- Marco Antonio Lopez.
- Yenniffer Acosta.
- Juan Carlos Aguirre.
- Luisa Fernanda Izaza.
- Lina Carrillo.

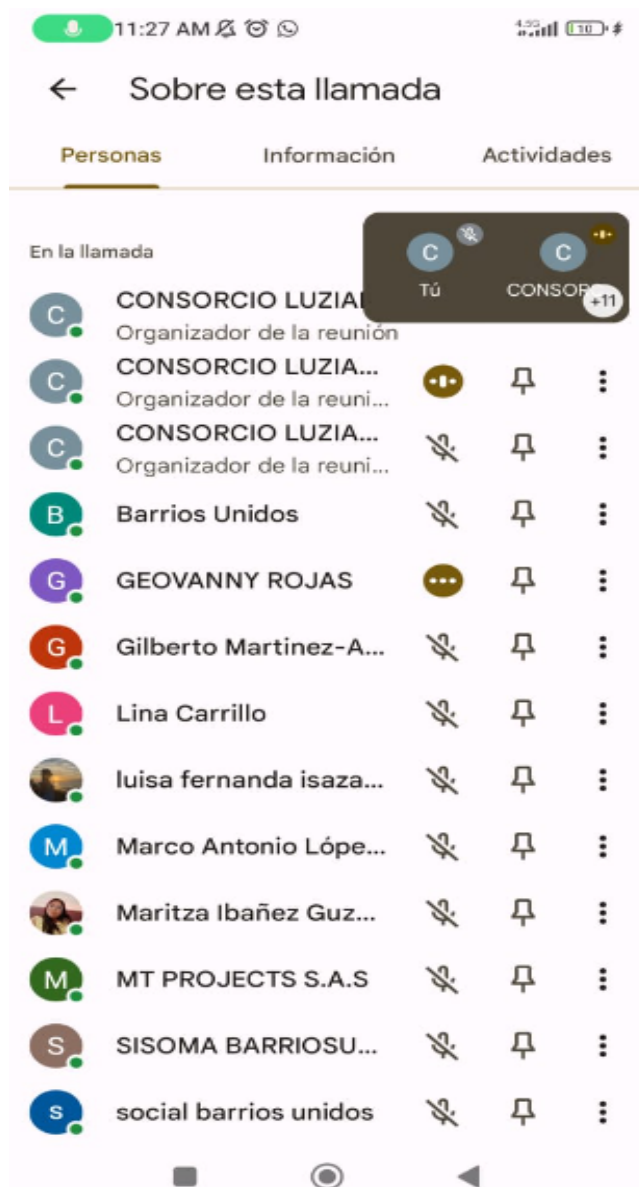

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al Comité de Obra No.41 a las 11:20 a.m. y termino a las 12:30 p.m., se realizó de manera virtual.

La ingeniera Yenniffer Acosta aclara respecto a los compromisos pendientes del Acta de comité No.40 que la respuesta y entrega del listado de segmentos a intervenir radicada por la supervisión se entregó el día de hoy, en esta se menciona los dos segmentos visitas durante el recorrido realizado que se encuentran en mal estado, del 7 de agosto, la supervisión se encargara de iniciar con el proceso de reserva para nuestro contrato, en total son 11 CIV's a intervenir, este oficio será remitido al contratista en horas de la tarde. Según el listado mencionado anteriormente, el contratista podría desarrollar un balance más ajustado a la realidad.

Respecto al ajuste del precio del asfalto, el Arquitecto Giovanni menciona que interventoría debe responder al oficio enviado por Cumbre, dando su punto de vista desde lo técnico, financiero y jurídico. Christian Rodríguez, aclara que se debe solicitar una información mas solida en cuanto a las pruebas adicionales que ratifiquen el desequilibrio, o el porqué del ajuste, por ejemplo, en base a las facturas o comprobantes de pago del asfalto.

La Residente Social de Interventoría, Maritza Ibáñez, menciona que se realizaron las actividades de socialización de obra en los segmentos autorizados, se realizó la aprobación de las Actas de Vecindad tanto de inicio como de finalización pendientes, actualmente se está haciendo entrega de copias de actas de vecindad en los CIV 12000673 y 12001548, así como la socialización del Plan de Manejo de Trafico aprobado y entrega de volantes de inicio en el CIV 12002500, se realizaron cierres en el CIV 12000641 y 12000673, se recibió una felicitación por parte de la comunidad del segmento 12001548, se actualizaron los días que faltan para terminar el proyecto en la malla vial informativa y menciona que no hay PQR's pendientes. La Residente Social del contratista, Leidy Aguirre menciona que enviara el Informe mensual en la tarde.

El residente Ambiental de Interventoría, Christian Rodríguez, menciona que la calificación actual del componente es del 100%, el contratista ha realizado actividades diurnas y nocturnas en la semana, se realizaron debidamente las actividades de instalación del PMT y protección de los sumideros, se entregó a la entidad el reporte del Granulo de caucho el cual fue aprobado por la profesional PIGA, la ingeniera Angelica, se hizo el reporte del segundo trimestre, sin embargo, llegaron algunas observaciones de un formato por parte de la entidad, la residente Ambiental del contratista, Geraldine Cerinza responde, que subsanara las observaciones mencionadas el día martes 08 de agosto, menciona que enviara el informe mensual en la tarde.

Respecto al componente SST, la Residente del contratista, Geraldine Cerinza, aclara que este mes no hubo ingreso de maquinaria ni de personal, también menciona que no hubo retiros de personal, el informe mensual será enviado en horas de la tarde, actualmente se están concluyendo las actividades de cerramiento del CIV 12002500, así como la instalación del campamento de obra.

La Residente de Interventoría, Yenniffer Acosta pone al tanto, de las actividades de obra ejecutadas por el área técnica, primero menciona que en el CIV 12001548 se procede a realizar la limpieza de sumideros y vector, sin embargo, 3 de ellos, necesitaron ser rehabilitadas por lo colmatadas que se encontraban, actualmente nos encontramos en revisión del Acta de Cobro No. 10 radicada por el contratista. Actualmente nos encontramos en la verificación de los segmentos en los que se realizo sello de fisuras y/o juntas en base al listado contractual del diagnóstico de los segmentos en su última versión, ya que la supervisión menciona que algunos de estos segmentos están dentro del grupo de Rehabilitación.

Se recuerda a la supervisión que se envíe el enlace para subir los documentos, para poder comenzar a conformar las carpetas que se imprimirán, así como la fecha de la capacitación que se planteo en la reunión que se tuvo en la Alcaldía.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Respuesta al oficio radicado por Cumbre referente al Ajuste del Asfalto	Consortio Luziana	Jueves, 10/08/2023
2	Remitir observación a movilidad frente al NP de la demarcación, en la cual se aclara que no es un Diseño nuevo, sino una actualización del mismo.	Consortio Luziana	Viernes, 04/08/2023
3	Enviar enlace para subida de documentación y conformación de carpetas para imprimir, así como realizar la capacitación.	Supervisión	Jueves, 10/08/2023

Elaborada por: Consortio Luziana

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:
