


Se adjunta una captura de la reunión del Comité No. 43, realizado el día 17 de agosto de 2023, el cual se efectuó de manera virtual. En la captura anexada se observa los siguientes profesionales conectados:

- Christian Rodriguez.
- Marco Antonio Lopez.
- Nataly Galvis.
- Elkin Pineda.
- Lina Carrillo.
- Maritza Ibañez.
- Leidy Aguirre.
- Geovanny Rojas.
- Yennifer Acosta.
- Geraldine Cerinza.
- Juan Carlos Aguirre.

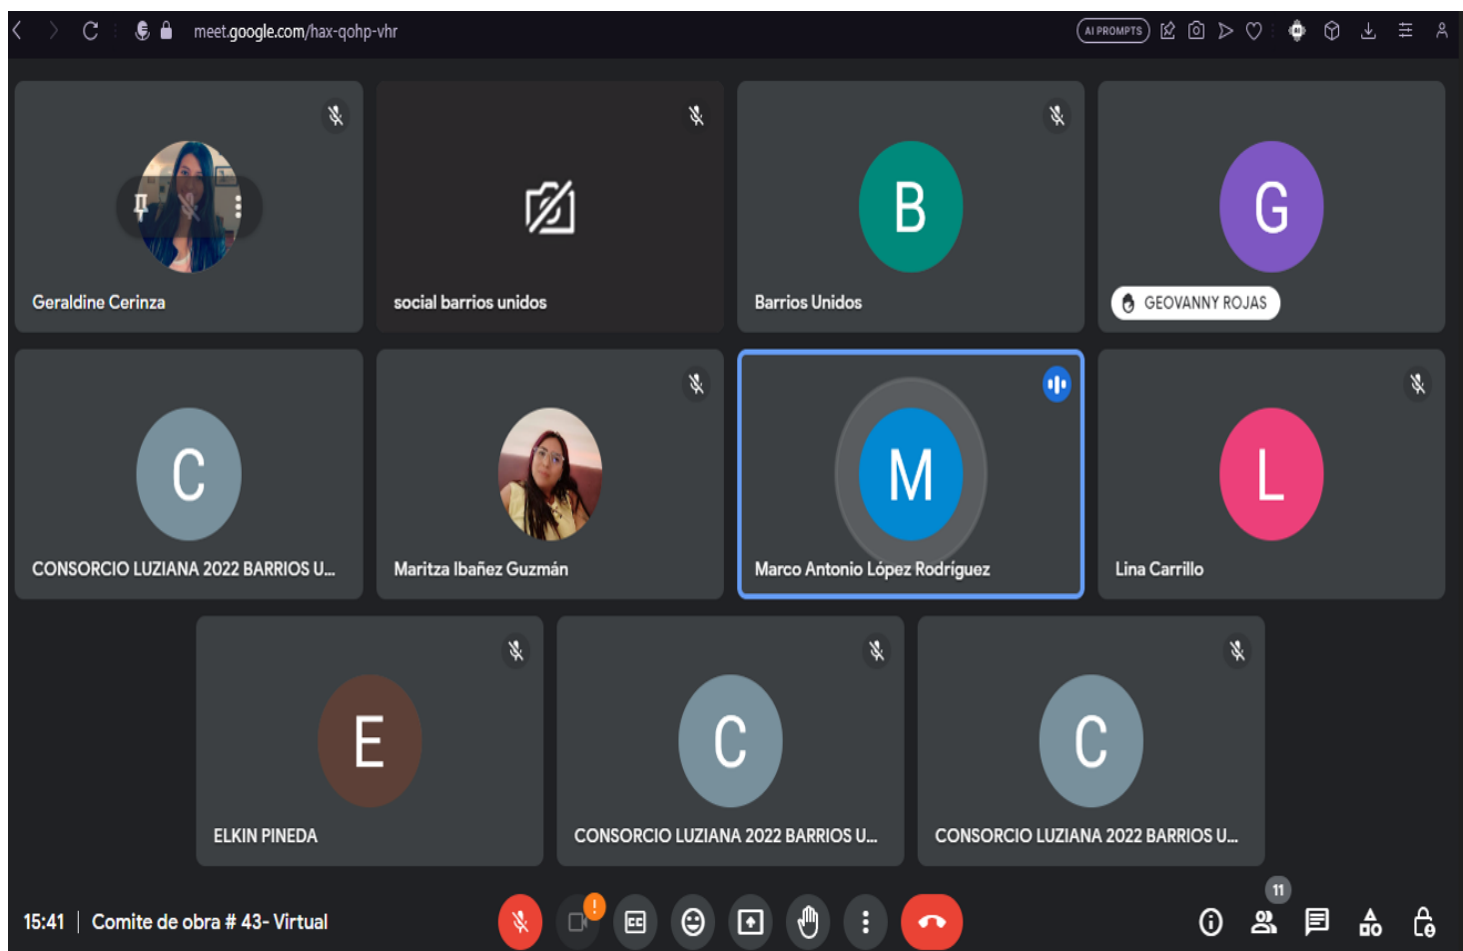

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al Comité de Obra No.43 a las 03:00 p.m. y termino a las 03:50 p.m., se realizó de manera virtual.

La ingeniera Yenniffer Acosta aclara que actualmente se encuentra a la espera de la remisión de las facturas del asfalto por el contratista, este se compromete a enviarlos el día martes.

El ingeniero Marco menciona que pese a que esta reuniendo lo solicitado, dice que a la fecha no ha podido ni siquiera reunirse con la parte jurídica de la alcaldía, menciona que esta optando por solicitar el acompañamiento de la procuraduría, ya que no se ha podido acercar a la alcaldía, el contratista solicita una respuesta y una reunión con el área jurídica porque este tema se torna ya más legal que técnica. El contratista dice que se debe manejar como un ajuste precios fundamentados en los precios del IDU, y no como un reembolso.

El residente Ambiental de Interventoría, Christian Rodríguez, menciona que la calificación actual del componente es del 100%, afirma que el día anterior se realizó un recorrido a la obra en acompañamiento de la Supervisión, junto a la Residente Geraldine, en la cual se realizó un acta con recomendaciones de obra, dando alcance a esto el contratista envió un registro fotográfico evidenciando la protección de los árboles aledaños al frente de obra.

Respecto al componente SST, la Residente del contratista, Geraldine Cerinza, aclara que este mes no hubo ingreso de maquinaria ni de personal, también menciona que se retiró solo un trabajador.

La Residente Social de Interventoría, Maritza Ibáñez, menciona que se realizaron las actividades de socialización de obra en los segmentos autorizados, se realizó la aprobación de las Actas de Vecindad de los segmentos 12001125 y 12001100, así como la socialización del Plan de Manejo de Tráfico aprobado y entrega de volantes de inicio, actualmente se está haciendo entrega de copias de actas de vecindad en los CIV 12000673 y 12001548, se están realizando cierres en el CIV 12001548 y 12002500, se actualizaron los días que faltan para terminar el proyecto en la malla vial informativa y menciona que no hay PQR's pendientes.

La Residente de Interventoría, Yenniffer Acosta pone al tanto, de las actividades de obra ejecutadas por el área técnica, primero menciona que en el CIV 12002500 está pendiente por subsanación del terminado del asfalto de un empalme, el cual quedo bajito de asfalto, también menciona que en el momento se encuentra pendiente un tramo por instalación de asfalto para culminar la intervención del CIV 12002469, anteriormente se intervino el segmento 12003324.

La Ingeniera Yennifer solicito anteriormente una aclaración respecto al pago del Acta de junio tanto del contratista como de interventoría, el Arquitecto Giovanni afirma que estuvo averiguando el motivo, sin embargo, al parecer la persona encargada de esto, se encuentra en vacaciones, afirma que las cuentas están aprobadas desde el 25 o 27 de julio. También comunica que frente a las reservas de los segmentos fueron solicitadas formalmente por infraestructura, cree que recibirá respuesta en los siguientes días, dice que apenas se obtenga respuesta esta se remitirá y notificará tanto al contratista como a interventoría. El Ingeniero Marco afirma que esperara respuesta para poder movilizar o no la maquinaria, ya que afirma que este es un gasto que tiene que afrontar la empresa y es una actividad que no están pagando, pide que ojalá se pueda agilizar esa respuesta.

El arquitecto Giovanni dice que se esta socializando y revisando el listado que remitió el contratista e interventoría, afirma que dará una repuesta aprobando o relacionando los segmentos presentados en el listado mencionado, que posterior a ello se realizará un recorrido y definición de lo que se ejecutará, se compromete a dar repuesta al listado el día miércoles.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega del concepto de facturación solicitada por la interventoría.	Cumbre Ingeniería	Martes, 22/08/2023
2	Programación de la reunión jurídica o concepto jurídico del asfalto.	-	Martes, 22/08/2023
3	Respuesta respecto a la reserva de los CIV's	Supervisión	Martes, 22/08/2023
4	Entregar listado para intervención, en la cual se tendrá en cuenta la propuesta que se ha presentado entre la interventoría y el contratista.	Supervisión	Miércoles, 23/08/2023

Elaborada por: Consorcio Luziana

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:
