

Miércoles 24 de agosto de 2022

Personal de obra:

1 Director, 1 residente

1 Social, 1 Inspector de Obra

Topógrafo, Carteros.

Equipo de Obra:

Equipo topografía

1 retroexcavadora, 4 menores

Clima: Día Soleado.

Actividades.

1. Se inician actividades en campo, se da autorización del PROTOCO al PROTOYO.

2. No se podrá avanzar hasta tanto no se tengan en campo el Equipotilismo, Minicargador, Vibrocompactador, Camotranque, Grúas y demás exigidos en las pliegos de condiciones.

3. Se solicita a la firma contratista algunos afiliados de personal a manejar equipos en campo.

4. La firma contratista ante la Manera unilateral la decisión de continuar excavación desde el PROTOYO en adelante sin previa autorización de la Interventoría.

La Firma Contratista no cuenta con Vibrocompactador, Minicargador, Mototales Grúas en campo. Como San Pajon, Subbase granular.




La Firma Interventoría solicita la Suspensión de la Actividad de excavación del PROTOYO en adelante, toda vez que no está autorizada.

hasta tanto No se cuente con Equipos y Materiales en campo para ir realizando la Estructura del pavimento en el Horno Intervenido.

5. Se Solicita la presencia en Campo del Residente de obra Aprobado el 100% toda vez que no se cuenta con este y No se tiene una persona con quien tomar decisiones de tipo Técnico.

6. Se Solicita a la Firma Contratista Implementar Señalización Anexada mediante esquemas en el PMT Ajustado.

7. Se Solicita a la Firma Contratista entregar Ficha Técnica y Certificado de Garantía del Geotextil NT 2000 A instalar en campo.

Jueves 25 de agosto del 2022

Personal de Obra: 1 Director, 1 Residente
1 Social, 1 Inspector
de Obra, Topógrafo
Cadeniero

Equipo de Obra: Equipo topográfico
1 retroexcavadora, 1/2 menor
1 Manguera Sin operador

clima $\rightarrow$ llovias en la noche; Se extienden hasta toda la Mañana.

Actividades

Por llovias en la Mañana se llevo excavación la firma Contratista coloca Molobomba para evacuar aguas de la excavación.

- A la fecha tenemos los sgtes equipos:

. 1 Retroexcavador

. 3 Volquetas

. 1 Minicargador sin operador

- Se solicita a la firma Contratista tener en campo el vibrocompactador, para sellar el terreno al momento de la excavación

- Así mismo se solicita contar con materiales de construcción de estructura de pavimento como son Pajon y subbase para ir conformando el terreno excavado y no dejar que si llueve, la subrasante se dañe.

- No se autoriza excavación desde el protocolo en adelante hasta no contar en campo con el equipo minimo necesario para desarrollar actividades en desarrollo del contrato de obra.

- La firma hace caso omiso a la solicitud de la Interventoria de no realizar excavación a partir del protocolo y realiza excavación en horas de la tarde por tal motivo estas actividades no se reciben por parte de la firma Interventora

Se recuerda a la firma contratista que debe
cumplir con las cláusulas 7 y 10 del
contrato de obra - obligaciones generales y
especiales del contratista.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Viernes 26 de agosto del 2022.

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente
1 Social, 1 Interventor
de obra, 1 topógrafo,
Cadeniero

Equipo de Obra: Equipo topográfico,
1 Retroexcavadora, M. Menores
1 Minicargador sin operador

Actividades

1. Se continúa excavación en la obra por parte
de la firma contratista

Se solicita a la firma contratista tener
la lona para tapar el material de la Volqueta

Se solicita también a la firma Contratista
la lona para el ceramiento de la obra

así mismo se le solicita a la firma contratista
cumplir con los requerimientos mínimos del
pliego en cuanto a equipos

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sábado 27 de agosto del 2022

Personal en Obra Director, J. Residente
J. Social, J. Interventor
de Obra, J. Topógrafo
Cadeniero


Equipo de obra Equipo topográfico
J. retroexcavadora, Hileros
J. Unicargador Sin operador

Actividades


1. Se continúa excavación en la obra por parte de la firma contratista.

2. Se solicita a la firma contratista la lona para el cercomento de la obra.

3. Se solicita a la firma contratista tener la lona para tapar el material de la Volqueteo.







lunes 29 de agosto de 2022

Personal en obra : 1 Director, 1 Presidente
1 Social, 1 Interventor
de obra, 1 topógrafo
1 Cadenero.

Equipo de obra : Equipo topográfico
1 retroexcavadora, M. Menores
1 minicargador

Actividades



Se realiza excavación desde PRO+095 al
PRO+120.

- Se solicita a la Firma Contratista para las excavaciones toda vez que no cuenta con el equipo mínimo para realizar actividades como son colocación y compactación de rajón y subbase granular
- La firma Contratista ha hecho caso omiso a las solicitudes de la Interventoría en cuanto a la Intervención por tramos y solicitud de equipo mínimo en obra
- La firma Contratista incumple las cláusulas 9 y 10 del Contrato de obra - obligaciones Generales y Específicas del Contratista de Obra.
- Antes de colocar Material en Campo se debe realizar CBE al Terreno natural después de excavación para verificar la Afectación del Terreno a causa de lluvias dentro de la excavación por el Contratista No tener a tiempo Materiales

para construcción de la estructura del pavimento.

La firma Contratista para las Actividades de excavación en el PRO-120.

Se solicita a la firma Contratista contar en obra con afiliaciones del personal de ^{operador} equipo a utilizar.

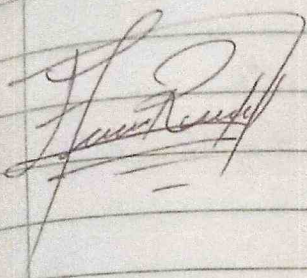Martes 30 de Agosto del 2022.




Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector de obra, 1 SIJO, Comisión topográfica, 1 Operador de Retroexcavadora, 1 Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Manguera (Pinado) Equipo topográfico, 3 Volquetes.

Almuerzo: Suspendido todo el día.

Actividades

1. No se realiza excavación el día de hoy, estas Actividades se encuentran paralizadas.
2. Se nivela Terreno del PRO-000 al PRO-036 manualmente.
3. Se arreglan acometidas del PRO-000 al PRO-036

Miércoles 31 de Agosto del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social,
1 Inspector de obra, 1 SISO, Comisión fotográfica,
1 Operador de Retroexcavadora, 1 Maestro,
Ayudantes,

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Miniargador (Mal
Entendido),
1 Vibrocompactador

Clima: Lluvias en horas de la Tarde
desde las 3:00 pm en adelante. (Fuertes).

Actividades

1. Se inicia con arreglo de terreno de Manera
Manual
2. Se sella la Subrasante con el vibrocompactador,
3. Se instala Geotextil y se coloca una
Capa de rajón
4. Se solicita a la Firma Contratista contar con
más volqueteras para el suministro de Material
Todavía que se cuenta hoy solo con una
y se denomina este suministro de Material.
5. Se suspenden las actividades de obra por fuertes
lluvias en la zona en horas de la tarde.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Jueves 1 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Directo, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector de obra, 1 SISO,
Comisión fotográfica, 1 Operador de Retro

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora, 1 Mini cargador
1 Vibro compactador, 1 Retro excavador
de llanta

Clima: Soleado

Actividades

1. Se continuo arreglo de terreno de manera manual

2. Se Solicita a la Firma Contratista Contar con Mgs Volquetes para el suministro de material

3. Se utiliza una motobomba para drenar las aguas lluvias que quedaron dentro la excavacion por la lluvia del dia anterior.

4. Se continua con la instalacion de la capa de Piedra Razon. del P. 0+00 al P. 0+040.

5. Se Solicita a la Firma Contratista Contar con material de Sbbase en obra.

[Signature]

[Signature]

6. Se debe mejorar Señalización en obra.

7. El Material de Sbbase Colocado en Campo No cumple Confit. 300-13 Terrijas

Viernes 2 De Septiembre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector de obra, 1 Siso
Comision fotografica, Operador
de Retroexcavadora


Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 minicargador,
1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora
de llanta

Clima: Sereno de 4 a 5 de la
tarde

Actividades

1. Se Inician relleno en el primer tramo y
medición desde la Protococo Hasta Protococo
2. Se Instala el material Geotextil y la
Piedra rajon en Prot~~420~~ hasta la 10100
3. Se Solicita a la Firma contratista Contar
con mas Volqueta para el Sumistro de
Material
4. Se Solicita a la Firma Contratista "obrar material de
Subbase granular en campo que Cumpla con Art. 320-13 Inia
5. No Se Autoriza Instalación Subbase.





Sabado 3 de Septiembre de 2022

Personal de Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Socio
1 Inspector de obra, 1 Siso
1 topografo, Comision topogr
1 operado de Retroexcavadora


Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora, 1 minicargador
1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora
de llanta.

Clima: Soleado

Actividades

1. Continúa la Instalación de material Geotextil y Piedra rajon
2. Se Solicita el Suministro de materiales en Obra.
3. Se Solicita a la Firma Contratista Colocar Material de Subbase granular en campo que cumpla con el Art. 320-13 INVIAS





Lunes 5 de Septiembre del 2022



Personal de Obra; 1 Director, 1 Residente
 1 Social, 1 Inspector, 1 Siso
 1 topografo, Camero Fotografo
 1 operado de retroexcavadora

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 minicargador
 1 vibracompactor, 1 Retroexcavadora
 de llantas

Clima: soleado

Actividades

1. Se continúa Instalación de material Geotextil y Piedra rajon
2. Se Solicita a la Firma Contratista el Suministro del Material Subbase que cumple Art. 320-13 INVIAS
3. Se Solicita a la Firma colocar Material de Subbase

Martes 6 de Septiembre del 2022


Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Socio
1 Inspector, 1 Siso, 1 topografo
2 operado de retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora Ologa,
1 minicargador, 1 Vibrocompactador
1 Retroexcavadora de llanta

Clima Soleado

Actividades

1. Se continua la Instalación y Nivelación de la piedra rajon
2. Se sella con una capa pequeña desde la proteas hasta la protego de Material subbase no aprobada
3. Se solicita a la firma contratista contar con mas Volquetas para el Sumistro de material
4. Se solicita colocar Material de Subbase granular
Pro cumplir Art. 320-13 Inviias
5. Se solicita Mejoras Señalización en obra




Mercedes 7 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 SISO, 1 Topógrafo
2 operadores de retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora Oruga.
1 mini cargador, 1 vibracompactor
1 Retroexcavadora de llanta.

Clima: Lluvioso desde la 8am hasta 10am

Actividades

1. Se continua la Instalacion y Nivelacion de la piedra rajon
2. Se sella con una capa pequena desde la $PR+60$ hasta la $PR+0,80$ de subbase no aprobada
3. Se solicita a la Firma Contratista contar con Maguma para el suministro de material
4. Se solicita a la Firma Contratista retirar de Material producto de excavacion protogo.

[Signature]

Jueves 8 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 SISO, 1 Topógrafo
2 operadores de retroexcavadora.

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora Oruga
1 mini cargador, 1 vibracompactor
1 Retroexcavadora de llanta.

Clima: Lluvia de 3 a 5 pm

Actividades.

1. Se inicia la capa de la Subbase en la abscisa 0+000 hasta la 0+036.34
2. Nivelación de la capa de Subbase en el primer tramo.
3. Capa de relleno, desde la ~~PR0+080~~ hasta la PR0+100 de subbase No Aprobada.
4. No se o podido recibir material por bloqueo de la car.
5. Se solicita colocación material subbase en campo que Cumpla con Art. 320-13 Ingres.

Viernes 9 de Septiembre del 2022

Personal de Obra: 1 Director, 1 residente
1 Social, 1 Inspector
1 Siso, 1 topografo
2 operadores de Retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora de Oruga
1 minicargado, 1 Vibrocargador
2 retroexcavadora de llantas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Nivelación de la abscisa 0+000 hasta la 0+06.00
2. Desague desde la abscisa 0+070 hasta 0+090

3. todavía no se a podido recibir Materia por bloqueo de la Cartera

4. Se solicita Colocación de Material Subbase en campo que cumpla con Art 320-13 Inviés.

5. Se solicita Afiliación de Nuevo operador de Retroexcavadora de llantas.

[Signature]

[Signature]

Sábado 10 de Septiembre 2022

Personal de obra: 1 directo, 1 residente, 1 Social
1 Inspector, 1 Siso, 1 topografo
2 operadores de retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 retroexcavadora de oroga
1 minicargador, 1 Vibrocargador
2 retroexcavadora de llanta,

Clima: Soleado

Actividades

1. Excavación desde el PR 0+120 hasta el PR 0+125 Sin contar con Material Aprobado

2. Nivelación del primer tramo, desde el PR 0+000 hasta PR 0+036, con material Nuevo de Subbase, Se solicita entregar ensayos de Materiales.

3. Instalación del Geotextil en el PR 0+120 hasta lo PR 0+125, Se debe Instalar Razon de Manera inmediata e instalar Subbase granular.

4. todavía no se ha podido recibir Material por bloqueo de la Cartera ^{Subbase}

Si No Se Contaba con el Material No se debia
hacer la Excavación por parte de la Firma Contratista
los daños ocasionados por la Subterránea por lo tanto
Responsabilidad del Contratista y debe ser Asumidos sin
Costo alguno al Contrato

[Signature]

[Signature]

Lunes 12 de Septiembre de 2022.

Personal en obra : 1 Director, residente, 1 Social
1 Inspector, 1 Siso, 1 topógrafo
2 operadores de retroexcavadora
1 operador de Vibrocompactador
1 operador de Minicargador

Equipo en Obra : 2 retroexcavadora de llanta
1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima : Fuerte lluvia 4pm hasta la 5:30 pm

actividades

1. Continúa Excavación en el pzo H20 hasta la pzo y Instalación del Geotextil
2. Se le pide a la Firma Contratista Contar con el Material Subbase granular en Campo para Sello de rajón
3. Todavía Sigue el bloque de la cantera donde se suministra Materiales como rajón y subbase granular
4. Se Solicita nuevamente Afiliación del operador de la Nueva Pajarita, No puede laborar
5. Se Solicita Mejorar Señalización en obra.

[Signature]

[Signature]

Martes 13 de Septiembre de 2022.

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social,
1 Inspector, 1 Siso, 1 Topógrafo
2 Operadores de Retroexcavadoras
1 Operador de Vibrocompactador
1 Operador de Minicargador

Equipo en Obra: 2 Retroexcavadora de Llanta
1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado


Actividades

1. Se le pide a la firma Contratista Contar con Material de Subbase granular en campo para Sello de Rajón

2. Se le pide a la firma Contratista retirar el Material Contaminado, tanto Subbase como Rajón

3. Se realiza Excavación PK0+120 al PK0+130

4. Se evidencia agua filtrada a Excavación por Bordes de Vivienda Costado Derecho. Se debe realizar Filtros para Manejo de Aguas de Filtración.
(Desde PK0+100 al PK0+120).

Miércoles 14 de Septiembre del 2017

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente,
1 SISO, 1 Social, 1 Topógrafo,
de obra, 1 Topógrafo, 1 Cadenero,
Ayudantes, 1 Maestro, 1 Oficial
2 operarios de Pajavitas, 1 Operario
Vibro, 1 Operador Alimcangador

Equipo en obra: 2 pajavitas, 1 Vibrocompactador,
1 Alimcangador, Volquetes.

Clima: Nubres en horas de la Mañana

Actividades

Se inicia la Mañana con Fuertes
Nubres, lo que impide Excavación
PRO+40 al PRO+130.

Se evacua agua de excavación
con Motobombas

Se inicia Cero de Subbase granular
PRO+000 al PRO+036.

El contratista instala Fomaleta sin la Interventante
haber recibido la Subbase granular;
El procedimiento es recibir Subbase por
Cotas y ensayo de compactación en Campo.

Se solicita al Firma Contratista Entregar
tramos Creados por topografía y ensayo
de compactación.

[Firma]

[Firma]

Viernes 15 de Septiembre del 2022


Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 ASIS,
1 Social, 1 Inspector de obra, 1 Topógrafo,
1 Cadeniero, 1 Maestro, Ayudantes, 1 Oficial
Operadores de pajarita, 1 operador de Vibrocompactador,
1 operador de Minicargador.


Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador,
1 Minicargador, Volquetes.

Clima: Lluvias Medio día

Actividades.

1. Se instala Geotextil y Razon PRO120 al PRO130.
2. Se instala Subbase granular, la cual cumple
según ensayos presentados en fecha 12 de Sep/22
por parte de la Firma Contratista.
3. La firma interventora ~~Verificadora~~ Verificadora Mediante
ensayos. la Calidad de los materiales
enviados.
4. Se realiza Comité técnico entre
Contratista, Interventora y Entidad Contratante
para Revisar medidas a implementar por la
Firma Contratista para Superar atraso presentado
según Informe Semanal No. 5
Programado: 23,31%, Ejecutado: 1,75%, Atraso: 21,56%
5. Se solicita a la firma Contratista entregar plan de
Contingencia para Superar atraso.
6. Persisten problemas con el suministro de Subbase granular en campo.
7. Se solicita entregar informes mensuales, Apog. Contractuales.





Viernes 16 de Septiembre del 2022
 Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Asa.
 1 Inspector, 1 SISO, 1 topógrafo, 2 operarios
 de paguita, 1 Operador Vibro, 1 operador Minicargador,
 1 Maestro, Ayudantes, 1 Oficial

Equipo en obra: 2 paguitas, 1 Minicargador,
 1 Vibro, H. Menor, Volquetes.

Clima: lluvias de 1 a 3 pm.

Actividades

1. Se cura Sillero Granular PED 1000 al PED 1036
2. Se recibe por topografía PED 1000 al PED 1036
 tramo de Sillero.
3. Se realiza ensayo de compactación PED 1000
 al PED 1036. Se instalan formaleto para
 pavimento.
4. Realiza actividades paralelas.
5. Se deja listo terreno PED 1000 al PED 1036
 postado Izquierdo para instalación de
 concreto 36 ml.

[Firma]

[Firma]

Sábado 17 Septiembre del 2022

Personal en obra:

1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector, 1 Asa.
 1 topógrafo, 2 operarios de paguita, 1 op. Minicargador
 1 Op. de Vibrocompactador, 1 Maestro, Ayudantes,
 1 Oficial.


Equipo en obra: 2 pagentes, 1 Albañil, 1
Microcomputador, H. Pinos.

China Soleado

Actividades:


1. Anualmente Se chequea por propagación de
a. Humedad en formados para concreto.
b. Se hace conexión en Pto 30 Costado Izquierdo.

2. Se funda concreto protoso al Pto 30
Costado Derecho MK 38 kg/cm².



3. Se funden 12 placas de 3x3, se instalan
dovelas en juntas transversales.

4. Se instala parillas de refuerzo de Acero 1/2"
separadas 0,20 x 0,20; doble refuerzo.
Se solicita a la firma Contratista utilizar
para la parilla del fondo ubicada a 1/5.
de la subbase levantadores o montículos donde
instalar este refuerzo.



5. Se toman muestras de concreto en viquetas
para ensayos (03) Tres.

6. Se sigue presentando infiltraciones de agua desde protoso
al Pto 30 Costado Derecho; Se solicita a la firma
Contratista hacer revisión del tema y se coordina
con diseñador para el manejo de estas aguas.

[Firma] *[Firma]*

Lunes, 19 de Septiembre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Presidente, 1 Social,
1 Inspector, 1 SISO, 1 topógrafo, 2 operadores de Puntos,
1 Op. Vibrocompactador, 1 Op. Minicargador,
1 Almacén, 1 Oficial, Apoyantes

Equipo en obra: 2 pagantas, 1 Minicargador,
1 Vibro compactador, Volcos, H. Menores.

Clima: Lluvias en la Mañana.

Actividades

1. Se continúa con Instalación Subbase granular desde PRO-1090 al PRO-1120.
2. Se inicia la Instalación de Formas para concreto desde PRO-1000 al PRO-1036 Costado Derecho.
3. Se rectifican niveles de subbase y cota de Terminación atribuido del concreto.
4. Se presenta informe de Cuentas existentes y a Construir a la entidad Contratante, para que se revise con el diseñador del pavimento la viabilidad de la No Construcción de esta por las razones expuestas en el Comunicado ESASIM-042-2020 de fecha 19/09/22.
5. Demolición Bordillo Derecho PRO-1000 al PRO-1036.

[Firma]

[Firma]

Viernes 20 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Presidente, 1 Social,
1 Inspector, 1 SISO, 1 topógrafo; 2 Op. Pajarita,
1 Op. micoargados, 1 Op. Vibrocompactador,
1 Maestro, 1 Oficial, Ayudantes.

Equipo en obra: 2 pajaritas; 1 Micoargados,
1 Vibrocompactador, Volcos, H. Muebles.

Clima: Día soleado.


Actividades:

1. Continúa la instalación de Subbase granular
PROTOGO al PRO1020.

2. Se instala concreto MP 38 Esp. en
PRO1000 al PRO1036 costado Derecho.

3. Se instala Acero para pasadores cada 0.30m
en 1"

4. Se instala Acero de 1/2" en refuerzo de doble
pirillas planas 1 y 12.



5. Se realiza corte concreto en Ventana de Corte 6 horas
después de la primera Fundido de Concreto Colocado en
campo.

[Firma]

[Firma]

Miércoles 21 de Septiembre del 2022.

Personal en obra: 1 director, 1 presidente, 1 Siso, 1 Social,
1 Inspector, Ayudantes, Maestro, 2 operadores
de Pajaritas, 1 operador de Vibro, 1 operador
de minicargador

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 minicargador
1 Vibrocompactador, Volquetes

Clima: Nubes en horas de la Mañana, Tarde

Actividades.

1. Se sigue presentando inspección en Contratos
de recto proceso al proceso de aguas subterráneas
del Cero al daño al proyecto.
2. Se tiene Material Saneado por Fuentes Húmedas
presentados en la región.
3. Se realiza excavación rectivo al PRO-170.
Se instala Geotextil y Rajor
4. Se proyectan trabajos nuevamente a la tarde.
Se suspenden las actividades.

[Firma]

[Firma]

Viernes, 22 Sep/22.

Personal en obra: 1 director, presidente, 1 Siso, 1 Social,
1 Inspector, Ayudante, 1 Maestro, 2 operadores de
pajarita, 1 operadora de Vibro, 1 operador de
minicargador

EQUIPO EN OBRA: 2 Pajarrutas, 1 Vibrocompactado
1 Minicargador, Volquete

Inicio lluvias en la región en horas de la mañana hasta
8:30 am

Actividades

1. Se tiene material Salurado PRO1040 al PRO120.
Se debe hacer retro de este material, a causa de
de las filtraciones presentadas en el terreno.
2. Se realiza excavación PRO140 al PRO160 y se
presentan filtraciones de agua por debajo de las cotas
3. Se solicita a la firma contratista entregar
afiliaciones del personal nuevo a entrar a obra
antes de iniciar labores.
4. Se realiza Movimiento interno de Material
de rajón
5. Se instala Sobrase a nivel desde PRO1040 al PRO1076.
36 ml.

6. Se presentan lluvias en horas de la Tarde nuevamente.

[Firma]

[Firma: Rodolfo Verrago]

VIENTES, 23 Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SSO, 1 Social
1 Inspector, Ayudante, 1 Maestro, 2 operadores de
Pajarruta, 1 operador de Vibro, 1 operador de minicargador

Equipo en obra: 2 pajarita, 1 Vibrocompactador
1 minicargador, Volquetas

clima: lluvias en la region en la madrugada

Actividades

1. Se presentan adelantos en Material de Subbase. Se solicita a la firma contratista hacer reemplazo de estos trabajos y hace la actividad del reemplazo de material.
2. La firma Contratista instala tubería para evacuar aguas de filtración y lluvias en el tramo PRO+1000 al PRO+1120, para continuar con la instalación de material.
3. Continúa excavación PRO+1100 a PRO+1170; y se siguen presenciando filtraciones por debajo de las cas.
4. Se Daña una de la pajaritas.

5. Se realiza ~~Quemamiento~~ en PRO+1100 a PRO+1170 para nuevo frente de trabajo.

[Firma]

[Firma]

Fecha: 24 de sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Sub
Inspector, 2 operadores de pajarita, 1 operador
de vibro, 1 operador de mini, Ayudantes
1 maestros

Equipo en obra: 2 Pajarita, 1 minicargador
1 Vibrocompactador

clima: Día Soleado. Lluvias en Madrugada

Actividades

1. Se solicita a la firma Contratista Conformar a nivel de Subbase el Pramo PRO40 al PRO80 en un ancho de 6m para instalación de formaletas; después de haberse recibido por topografía y densidades.

2. la firma Contratista que como medida al plan de Configuración trabajara el día Domingo 25 Sep/22.

3. Se instala Subbase PRO130 al PRO150.

[Signature]

[Signature: Rodolfo Uribe]

Domingo, 25 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social
1 Inspector, Ayudantes, 1 Muestrero, 20 operarios
de pajarita, 1 operador de mini, 1 operador
de Vibro.

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 minicargador
1 vibracompactor, Volquetes

Clima: soleado.

Actividades.

1. Se Ceroo tramo PRO40 al PRO80 en subbase granular.

2. Se instaló formaletas para concreto PRO40

3. Se realizó Excavación PRO160 al PRO170, se instaló Bechoen y Rajones.

4. Se solicita entrega de materiales Planos de Concreto

[Signature]

[Signature: Rodolfo Uribe]

Unos, 26 de Sep/22
 Personal en obra: 1 Director, 1 Presidente, 1 S/SC,
 1 Social, 1 Inspector, 1 Topógrafo, 1 Academero,
 Ayudantes, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Operadores de
 Pavimento, 1 Operador de Vibro, 1 Operador de Minicargador,
 Equipo en obra: 2 paletas, 1 vibrador compactador,
 1 Minicargador, Volquetas.

Clina & Sofoarlo.

Actividades

1. Se solicita a la firma contratista no instalar
 conducto en tramo PRO1044 al PRO1120
 hasta tanto no se solucionen problemas de
 infiltraciones presentados, los cuales fueron
 informados por la firma contratista mediante
 oficio radicado LP-SPM-008-2022-41 en fecha
 24 de Sep/22.

2. Se le informa a la firma contratista que la
 firma interventora en fecha 19 de Sep/22
 remitió oficio a la entidad contratante solicitando
 visita del diseñador en campo para revisar
 el tema de Concretos a construir y problemas de
 infiltraciones presentado en el tramo PRO1044
 al PRO1120.

[Firma]

Rodolfo Orriga

3. Se inicia excavación PRO1178 Segundo frente
 - Se solicita tener otro minicargador y mas Volcos
 Para Retiro de Material, Excavación de 10 mts Aprox

4. Se Retira Material de excavación desde el
 PRO1160 al PRO1180 producto de excavación.

5. La firma contratista pese a la solicitud de la Interventoría de no instalar concreto en el tramo PROTO44 al PROTO120, Instaló concreto 36 ml costado Derecho desde el PROTO44 al PROTO80.

6. La firma contratista pasó los vehículos con concreto por el pavimento de 7 y 5 días de fundido sobre la calle 2 Sur PROTO00 al PROTO36 no esperando el tiempo adecuado para esta actividad.

[Signature]

[Signature: Roberto Unzueta]

Martes, 27 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Presidente, 1 SISO,
1 Social, 1 Inspector, 1 Topógrafo, 1 Acordero,
Ayudante, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Representantes
de pajarita, 1 Operador de Vibro, 1 Operador de
Minicargador.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 vibrocompactador
1 Minicargador, Volquetes.

Clima: lluvias moderadas en la mañana

Actividades:

1. Se realiza Excavación desde el PROTO790 al PROTO780, 10 metros. Se instala Geotextil y Fojón.

Se libera tramo por topografía para subbase

2. Continúa Excavación en PROTO780 al PROTO180
Se le indica a la firma contratista que
antes de subir a nivel de subbase se debe

recibir a nivel de Rajeón.

3. Debido al daño presentado de Tubo nº 9 de agua de 3" Se presenta acolchamiento desde el PRO+140 al PRO+180; Se debe retirar Material y Mejorar este tramo.

4. Seguimiento al plan de Contingencia.

A fecha de hoy 27 Sep/22 deberíamos tener:

• Frente 1: PRO+000 al PRO+440

Tramo PRO+000 al PRO+030.

Cuadrilla 3: 2 oficiales, 2 obreros, 1 Camo carga bordillos.

Actividad: Construcción de Espacio público, con Inicio de Instalación de Bordillos.

Complimiento: Se evidencia el No Cumplimiento de esta Actividad.

• Cuadrilla 4: 2 oficiales, 3 obreros, 1 camo carga bordillos

Actividad: Espacio público

Complimiento: Se Evidencia el No Cumplimiento.

• Tramo PRO+040 al PRO+120.

Actividad: Pavingación.

Cuadrilla 2: Concreto premezclado, Vibrador Concreto, Cortadora Cables, 1 Maestro, 1 oficial, 4 obreros.

Complimiento: No se puede iniciar hasta no solucionar problemas de infiltración de Agua sobre excavación realizada.

No Cumple - Se espera respuesta del Diseñador

• Tramo PRO+120 al PRO+190.

Actividad: Excavación, Rajeón y Subbase granular.

Cuadrilla 1: 1 volcargador, 1 vibrador compactador, 1 obrero, 1 topógrafo, 1 cadenero.

Complimiento: A la fecha se está realizando esta actividad. Cumple

Frete 2: PRO+440 al PRO+798.

- Tramo PRO+700 al PRO+798.

Actividades: Excavación, Rajón y Subbase

Maquinaria: 1 Pajarita, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador
3 Volquetas, 1 Obrero, 1 Topógrafo, 1 Cadenero.

Completamiento: A la fecha se han excavado 20 mts.
lineales

- Se han instalado 10 ml de Rajón.

- No se ha instalado subbase granular.

No Comple.

[Signature]

[Signature]

Miércoles, 25 de Sep/22.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Director, 1 Siso, 1 Social
1 Inspector, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, Ayudantes, 1 Muestro
1 oficial, 2 operadores de pajarita, 1 operador del Vibro
1 operador minicargador

Equipo en obra 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador, 1 minicarga
Volquetas.

Clima: Día Soleado

Actividades

1. Instalación de Subbase PRO+798 al PRO+780.

2. Se reemplazó material de subbase costado

Izquierdo PRO+180 al PRO+104, 12 ml x 3m

3. Se Demuele Registro Vivienda Costado Derecho

Reserva de Tienda para Reubicación con Instalación
de tubería de 6".

4. Actividades de Excavación paralizadas
en este frente de obra PRO+120 al PRO+190.

5. No se cuenta con suministro constante de Material de Rajor y Subbase granular, Se debe incrementar suministro, existe dificultad en el suministro por parte de la Contrata.

Juan Raul

Jueves, 29 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sico, 1 Social
1 Inspector, Ayudantes, 1 maestro, 2 operadores de Pajanta, 1 operador de Vibro, 1 operador de mini

Equipo en obra: 2 Pajantas, 1 Vibrocompactador
1 mini cargador, Volquetes

Clima: ~~Soleado~~ Nublado todo el día

Actividades:
- Continúa excavación PRO100 al PRO170,
Se averigua Equipo (Mini cargadores)

- No se cuenta con materiales suficientes de Rajor y Subbase granular para instalación en campo, Hay dificultad en el suministro por la contr.

- Se reemplaza Material de Rajor y Subbase granular por Acolchamiento PRO1090 al PRO1102 por aguas lluvias y filtraciones.

- Se solicita a la firma Contratista que debe Realizar labores de Excavación, Instalación de Geotextil, Rajor y Subbase en el fondo de trazo de vías a intervenir, Aun no se tiene respuesta del contratista.

Se solicita a la Firma Contratista Mejorar el suministro de Materiales en obra.

[Signature]

[Signature]

Viernes, 30 de Sep/22.

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sibo, 1 Social, 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 operadores de Pajaritas, 1 operador de mini, 1 operador de vibro

Equipo en obra: 2 operadores de Pajarita, 1 operador de muncargador, 1 operador de Vibrocompactador

Clima: lluvias en la Tarde, Noche.

Actividades.

1. Maquinaria en obra Varada (2 Pajaritas),

Se solicita al Contratista arreglar cuanto antes los equipos para continuar con las Excavaciones y Actividades en desarrollo del contrato.

2. Evacuación de Aguas Excavación PRO7770 al PRO7790 por lluvias en la Tarde del día anterior.

3.

3. Se solicita a la Firma Contratista señalizar el pavimento del PRO7000 al PRO7036.

Así mismo limpiar el Área de este pavimento, La Comunidad refina la Señalización.

4. Se evidencia el poco suministro del Material de Rapión y Subbase, Por bloqueos y el mal estado de la Vía de la comuna, se dificulta el transporte de los materiales.

Se solicita a la Firma Contratista
mantener en campo el suministro
constante de razón y Subbase.

Sábado, 1 de Octubre del 2022.

Personal en obra: 1 Director, 1 residente, 1 SSO, 1 local
1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 operadores
de paqueta, 1 operador de mini, 1 operador de vibro

Equipo en obra: 2 paquetas (Anviadas), 1 Mixcargador,
1 Vibrocompactador

Clima: Soleado

- Actividades
1. Actividades paralizadoras. por Equipos
(paqueta) Dañados.
 2. Se realiza Filto PROTO44 al PROTO120 Costado
Derecho, para evacuación de los aguas de filtraciones
 3. Se solicita a la Firma Contratista Realizar
Tramo PROTO000 al PROTO36, el cual se encuentra
pavimentado desde el 17 de Sep/22 Costado Derecho.
y Costado Izquierdo desde el 21 Sep/22.
 4. Se solicita a la Firma Contratista Cambiar de Equipos
si estos No Cumplen en campo. Con las Actividades
previstas para estos.

lunes, 03 de Octubre del 2021

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social
1 Inspector, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro, 2
operadores de pajarita, 1 operador de Vibrocompactador
1 de Muncargador

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 Muncargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Continúa Excavación PR 770 al PR 760

2. Se instala la Piedra rajon en los PR 760 hasta
la 770.

3. Se solicita a la firma Contratista el arreglo de
una pajarita y Mas Suministro de Material

4. Instalacion de Subbase en una parte del PR 760
PR 770

4. Se Solicita a la firma Contratista Señalización como
Calle 2 sur pr 700 al PR 736; toda vez que el
tramo esta abierto para cualquier Vehículo

[Signature]

[Signature]

Martes 04 de Octubre de 2021

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social
1 Inspector, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro
2 operadores de Pajarita, 1 operador de Vibrocompactador,
1 operador muncargador

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 muncargado, 1 Vibrocompactador


Clima: Soleado

Actualizado

1. Relleno de la piedra rajon en el PR 760 al PR 770, Recibido por parte de la Interventoría.
2. Nivelacion del terreno y Nivelacion de la Subbase.
3. Se Solicita a la firma Contratista Contar con el suministro del material Subbase.
4. Se Solicita a la firma Contratista Refinar Material suministrado a Campo en PR 770 - toda vez que se evidencia material plástico y Muy Fino cambiando el Material actual Utilizado en Campo; Así lo hizo, se cambio el material.
5. Se Solicita a la Firma Contratista Cumplir con el plan de contingencia presentado a la Firma Interventora.

Actualmente se tiene en Campo un frente de obra

activo



Rodolfo Urriaga

Miércoles 05 de octubre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso
1 Social, 1 Inspector, 1 Topógrafo, 1 cadenero,
1 maestro, Ayudantes, 2 operadores de Pajanta,
1 operador de vibro, 1 operador de puna

Equipo en Obra: 2 Pajaritas, 1 Vibro Compactador
1 minicargador, Volquetes

Clima: Solea lluvia de 10:30pm a 12:00 pm

Actividad

1. Relleno de Subbase en el PR 760 al PR 780.
2. Nivelación de Subbase. en el PR 760 al PR 780
3. excavación del PR 760 al PR 750. Carril Izquierdo
- 3.1 Se realiza Urcita de Diseñador por parte de la Alcaldía.
4. Continúa Pavingación desde el PR 44.33 hasta el PR 80. Por el carril Izquierdo. Aprobado por la Interventor.
5. Se solicita a la Firma Contratista presentar:
 - Informes mensuales No. 1 Corregidos, Informes Mensuales No. 2,
 - Actas de Verificación debidamente diligenciadas y Acta de Compromiso.
6. Se solicita Señalización calle 2 sur, toda vez que no tiene tiempo para apertura, Pero la comunidad quita la Señalización.
7. El contratista debe Continuar con las actividades de Excavación, según Subbase en los tramos Programados.

Jueves 06 de Octubre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social
 1 Inspector, 1 topógrafo, 1 Cadenero, 1 Maestro, 1 ayudante
 2 operadores de pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de mini

Equipo en Obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador.
 1 muncargador, Volqueta.

Clima: Soleado

Actividades

1. Continúa excavación del PR 760 al PR 750 Carril Derecho.

2. relleno del material Subbase en el
PRO+760 al PRO+750.

3. Se Solicita a la firma Contratista Continuar
con el suministro del Material Piedra rajada
y el material Subbase.

4. Se le Solicita a la firma Contratista
Cumplir con el Plan de Contingencia Presentado
a la firma Interventora


5. Se realizan densidades en tramo PRO+798 al
PRO+060; las cuales No Cumplen Se solicita
realizar mas compactación a subbase para poder
liberar tramo para pavimento.


6. Se libera tramo por topografía, Se verifican cotas
de Subbase granular

7. Se realizan nuevamente densidades en campo
y cumplen para liberación del tramo

8. Se Solicita a la firma Contratista Continuar con la
pavimentación del tramo PRO+080 al PRO+115; actamos en
brendas que falta concepto del drenado.

9. llega a obra bordillos prefabricados a la calle 2 Sur.





Viernes 07 de octubre del 2022

Personal de obra: 1 Director, 1 residente, 1 Viso, 1 Social
1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes, 1 operador de
vibro, 1 operador de mini, 2 operadores de pajarita
1 topógrafo, 1 cadenero.

Equipo en Obra: 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador
1 Minicargador.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Inicia Pavimentación en el Prot 798 al Prot 760
del carril Izquierdo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	C.D
											2.25	2.25			C.E

2. Se le solicita a la firma Contratista Indicar el proveedor
de los bordillos prefabricado y así mismo Indicar
ensayos del Material

3. Se hizo revisión de los bordillo y se marcaron
los que están quebrados, se refinan 25 unidades

4. Se le solicita a la firma Contratista Contar con el
Suministro de Subbase y rajón

5. Se solicita Señalizaciones calle 2 Sur, ya que
no tiene tiempo para apertura; se a Señalizado N
veces y la comunidad N veces quita la Señalización.

6. Se instala bordillo prefabricado a la calle 2 Sur
en un costado de vía.

[Firma]


Personal de Obra: 1 Director, 1 Presidente, 1
1 social, 1 Inspector, 1 maestro, Ayudantes
1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de nivel, 1
1 operador de vibrocompactador, 2 operadores
de pajarita

Equipo en obra: 2 paletas, 1 minicargador
1 vibrocompactador,

Clima : Seco

Actividades

1. Continúa pavimentación desde el PR 01798 al PR 01770

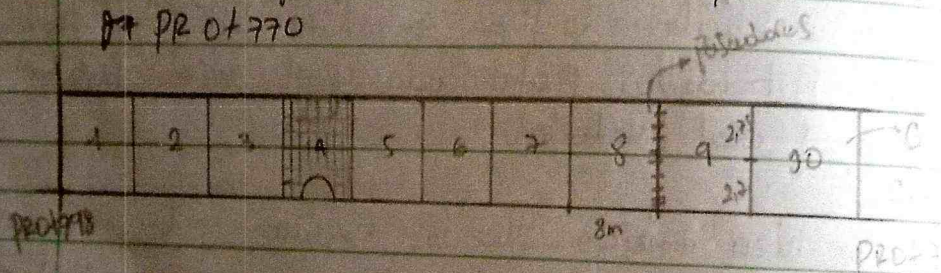

2. Se Solicita a la firma Contratista Contar con mas suministro de Subbase y Piedra rojon
3. Se Solicita a la firma Contratista los Señaliza en la calle 2 Sur y la 9 Con la Verde.
4. Se le Solicita a la firma Contratista entregar ensayos de los elementos prefabricados antes de iniciar cualquier actividad

5. Se continúa la Instalación de bordillos en la calle 2 Sur. Carril derecho.

6. Se inician los cortes en pisos y su demolición para la construcción de andenes

Lunes 10 de Octubre de 2022

Personal de obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SSO.
1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, ayudantes.
1 topógrafo, 1 Cadenero, 1 operador de minicargador
1 operador de Vibrocompactador, 2 operadores de pajarita

Equipo en obra: 2 pajarita, 1 minicargador
1 Vibrocompactador, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Inicio de excavación de P10+750 hasta el P10+730
2. Se para la obra por documentación de pajarita y operador, la cual se entrega a medio día.
3. Se le solicita a la Juma contratista contar con el material subbase y piedra rajon
4. Se solicita a la Juma contratista las señalizaciones de la calle 2 Sur y la 9. la cual se a instalado pero la comunidad la retira.

5. Se cancela cables por falta de mano de obra por material subbase en el Protoso hasta PRO+115.

6. Se toman niveles con subbase y se realiza compactación en PRO+080 hasta PRO+115.

[Firma]

Marles 11 de Octubre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sico, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, Caridenero, 1 Maestro, 1 agodaules, 2 operadores de paquina, 1 operado de minicargado, 1 operador de vibrador,

Equipo en Obra: 2 pajaritas, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1

Actividades

1. Continúa excavación desde el PRO+730 hasta el PRO+720.

2. Se suministra piedra rajon en el PRO+730 hasta el PRO+720

3. Se solicita a la Firma Contratista las Señalizaciones de la calle 2 Sur y la 9

4. Se solicita a la Firma Contratista los Implementos necesarios para sus trabajadores.

5. Continua Instalacion de bordillos en la calle 2 sur carril Derecho.

6. Se libera prot 80 hasta el prot 115 carril derecho para pavimentar.

[Signature]

Miércoles 12 de octubre de 2022

Personal en obra : 1 Director, 1 Residente, 1 Sico
1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, cadenero
1 Maestro, 4 ayudantes, 2 operadores de pajarita
1 operador minicargador, 1 operador de
Vibrocompactador

Equipo en Obra : 2 pajarita, 1 minicargador
1 Vibrocompactador Volquete

Actividades

1. Continua excavacion desde el prot 20 hasta prot 70

2. Se suministra piedra rajon en el prot 70

3. Se solicita a la firma Contratista las
Señalizaciones adecuadas de la calle 2 sur y
la 9; las cuales se han colocado y la Cominido le pide

4. Se solicita a la firma Contratista los implementos
necesarios para sus trabajadores

5. Iniciar Pavimento en el Protoso hasta el
Prot 115 Carriel derecho.



6. Se le solicita a la Firma Contratista arreglar
los bordes en el tramo 2, Protoso hasta
Prot 120. Carriel izquierdo y sellar
bien la Subbase.



Jueves 19 de octubre de 2022
Personal en obra:

5. Inician Pavimento en el PRO7080 hasta el PRO7115 Carriel derecho.

6. Se le solicita a la firma Contratista arreglar los bordes en el tramo 2, PRO7080 hasta PRO7120. Carriel izquierdo y Seller (compactas) buen la Subbase.

Jueves 19 de octubre de 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social, 1 inspector, 1 maestro, Ayudantes, topografo, 1 cadenero, 2 operadores de pajaritas, 1 operador de minicargador 1 operador de Vibrocompactador

Equipos en Obra: 2 Pajaritas, 1 minicargador 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado — Lluvia moderada 4-5 pm

Actividades

1. Continua excavacion de PRO7110 al PRO7100
 ○ ————— ○ —————
 ○ ————— ○ —————
2. Se suministra material Piedra rajón desde el PRO7110 al PRO7100
 ○ ————— ○ —————
 ○ ————— ○ —————
3. Se le solicita a la firma Contratista las señalizaciones adecuadas a la calle 2 sur a la calle 9. ○ —————

4. Se le Solicita a la Firma Contratista Tener los implemento adecuado Para sus trabajadores.

5. Se le Solicita a la firma Contratista traer traer el material rajon adecuado ya que este material presenta Sobretamaño y maximo son 20 cm.

6. Inicio pavimentacion canal Izquierda del PZot 80 ~~hacia~~ hasta el PZot 115.

Viernes 14 de octubre.

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente.
1 Social, 1 Siso, 1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes
1 topografo, 1 cadenero, 1 operado de Muncargador
2 operadores de pajarita, 1 operado de Vibro.

Equipo en Obra: 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador
1 muncargador.

Clima: Sdeade

Actividades

1. Continua excavacion entre el PZot 690 al PZot 680.

2. Se le Solicita a la firma Contratista que Para el Material Piedra rajon son maximo 20 cm ya que cuenta con Sobretamaño


3. Se le Solicita a la firma Contratista traer el Material de Subbase aprobado, ya que trageron un Material No aprobado

4. Se le solicita a la firma Contratista
Cumplir con la dotación del personal
o será apartado del cargo.

5. Se le solicita a la firma Contratista
presentar ensayo de material ante de
suministrar, hay tres clases de Material
de Ryon se debe presentar ensayos.

6. Nivelación de la Subbase del carril
derecho. PRO + 770 hasta el PRO + 730.





Sábado 15 de octubre de 2022.

Personal en obra: 1 Director, 1 estudiante
1 Sibo, 1 Social, 1 Inspector, 1 topógrafo,
Cadenero, 1 maestro, Ayudantes, 2 operadores
de Pajarita, 1 operador de muncargado
1 operador de Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 operador muncargado
1 operador Vibrocompactado
2 operadores Pajaritas

Clima: Soleado.

1. Se Continúa excavación de la PRO 680 al PRO 670

2. Se le solicita a la firma Contratista
Cumplir con toda la dotación del personal
o será apartado del cargo.

3. Se le solicita a la firma contratista
cumplir con las señalizaciones de la calle
2 sur y la calca sur. o _____

4. No está permitido el pavimento
desde el prot 770 hasta el prot 730. o _____

5. No se libero trazo del prot 690 hasta
670. y por lo tanto no hay autorización
de suministrar la piedra rajon. o _____

6. Se le solicita a la firma contratista
laboratorios de piedra rajon. o _____

7. Fundieron concreto en sitio de rampas.
y no se presento ensayos de material y
diseño de mezcla para concreto de 21 MPa.
o _____

o _____

o _____

o _____

Antes 18 de octubre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Presidente, 1 Siso
1 Asocial, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero.
1 maestro, 7 Ayudantes, 2 operadores de pajarita
1 operador de minicargador, 1 operador de
VibroCompactador

Equipo en Obra: 1 operadora minicargador
1 operador VibroCompactador
2 operadores pajarita y minicargador

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua excavación Prot 660 a 640

0 ————— 0 ————— 0

2. Se le Solicito a la firma Contratista el retiro de obra de persona por no tener dotación

0 ————— 0 ————— 0

Se le reitera a la firma contratista que es su obligación dar cumplimiento a:

- Personal: Todo el personal debe contar con elementos de protección, que garanticen su seguridad. No se hace entrega al personal de: Guantes, Guantes de protección Correas.

Se efectúan actividades de demolición de andenes, donde es necesario el suministro de dichos elementos.

Se suspenden actividades hasta tanto se le haga entrega de dichos elementos al personal que labora en el proyecto.

Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Spst. 0 ————— 0

x Instalación de material de estructura:

- Se observa material con sobretamaño en Subbase, No se da cumplimiento a

Especificaciones técnicas Norma INVIAS-2012

Se solicita al contratista garantizar la calidad del material antes de su instalación. No se podrá realizar actividad de retiro de sobretamaño en vía. 0 ————— 0

La firma contratista debe realizar control de calidad de material en sitio de explotación y antes de transporte a la obra, a fin de evitar reprocesos y retiros de materiales instalados. 0 ————— 0

La firma contratista deberá complementar

metodo constructivo para garantizar estas de nivel de subbase, conta con el equipo adecuado y controles topograficos. No se podria realizar excavación del material de manera manual y compactar posteriormente en capas delgadas en espesor inferior al de diseño.


• Se observa sobretamaño de material de Pedregal, no se da cumplimiento a tamaño máximo ($2/3$ del espesor de la capa estructural de diseño). Se deberá realizar retiro de material que no cumpla con lo requerido.


• No se da cumplimiento a la instalación de señalización requerida según PMT. Las señales deberán instalarse en los sectores que a la fecha se han construido y los que se encuentran en expansión.

El contratista deberá proporcionar la información adecuada a los transeúntes, que garantice su seguridad y se eviten accidentes.

• La firma contratista deberá realizar retiro de material sobrante de excavación y/o demolición hasta sitio de disposición final aprobada, dando cumplimiento a la normatividad ambiental.

Se le solicita presentar la información oportuna de sitios definidos como disposición final, con los respectivos soprites.







Viernes 19 de octubre 2022.

Personal en obra: 1 Director, Aux. residente
1 Aux. SSO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo.
1 Cardenero, 1 Maestro, 8 Ayudantes, 2 Oficios
Varios, 1 operador de mini cargador, 1 operador
de Vibro Compactador, 2 operadores de
retroexcavadora de llantas.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de
llantas, 1 mini cargador,
1 Vibrocompactador.

Clima: lluvioso de 4 - 5pm

Actividades

1. Se le solicita a la firma contratista enviar los documentos requeridos para la entrada del personal 1 día antes como mínimo
2. Se le solicita a la firma contratista cumplir con el suministro de material necesario de subbase y piedra regon
3. Se le solicita a la firma contratista cumplir con la señalizaciones en la calle 2 Sur y la 9.
4. Se le solicita a la firma contratista revisar el tramo. PRO+740 carril izquierdo por fallo en la subbase debido a que se presenta un colchón en la rasante.
5. Pavimentación desde el PRO+760 hasta la PRO+736 carril izquierdo

6. Se le solicita a la Firma contratista,
Sacar los piedra de Sobre tamarzo.

[Signature]

[Signature]

Jueves 20 de octubre. 2022

Personal en obra: 1 Directo, Aux residente, 1 Aux Sdo.
1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro
8 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 operador de
minicargador, 1 operado de Vibro compactador,
2 operadores de retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de
llanta, 1 minicargador
1 Vibrocompactador

Clima: Sereno de 3-4 pm

Actividades

1. Se solicita a la firma contratista enviar los documentos requeridos de sus ~~obras~~ Trabajadores
2. Se le solicita a la firma contratista cumplir con el suministro de materiales de Subbase y piedra rajón
3. Se le solicita el arreglo de tubería de agua en el pto 170 del carril derecho.
4. Se le solicita a la firma contratista tener como mínimo 2 motobombas para el desagüe de los tramos
5. Se le solicita a la firma contratista el arreglo y mantenimiento de los tramos trabajados, sacar los escombros etc.

[Signature]

[Signature]

Viernes 21 de octubre

Personal en obra: 1 Director, Auxiliar Residente
1 Social, 1 Auxiliar SSO, 1 Inspector, 1 maestro
8 ayudantes, 2 oficios varios, 1 topógrafo, 1 cadenero
1 operador de minicargador, 1 operador de Vibrocompactador
2 operadores de Retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 3 Retroexcavadora de llanta
1 Vibrocompactador,
1 minicargador

Clima: lluvioso de 3 a 4:30 pm

Actividad

1. Se le reitera a la firma Contratista contar con los materiales suministrados a tiempo
2. Se le solicita a la firma contratista el arreglo de la tubería de 608. en el Prot 630.
3. Se le solicita a la firma contratista los documentos del operado de Vibrocompactador
4. Se le solicita a la firma contratista contar como mínimo con dos motobombas para el desagüe de los tramos inundados
5. Excavación del Prot 640 al Prot 635
6. Se le solicita a la firma Contratista el suministro de los materiales piedra rajon y Subbase.
7. Demolicion de Andenes y bordello desde el Prot 630 hasta el Prot 636

[Firma]

[Firma]

Sábado 22 de octubre

Personal en Obra: 1 Director, Auxiliar Secretario,
1 Social, 1 Auxiliar SSO, 1 topógrafo, 1 maestro
ayudantes, 2 Oficiales Varios, 2 operadores de
retroexcavadora de llanta, 1 operador de minicargador

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta.
1 minicargador, 1 vibracompactor

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le solicita a la Firma Contratista Contar con los materiales de suministro como son Piedra roja y Subbase.
2. Se le solicita a la firma Contratista Contar con dos o mas motobombas para el desagüe de los tramos abiertos.
3. demolicion de andenes de los tramos 100+44 hasta la 100+100 Canal Izquierdo.
4. Se solicita a la Firma Contratista disponer de Material de excavación en sitios autorizados para esto, No se puede hacer excavaciones a lo largo del proyecto sin su debido Manejo Ambiental.

[Firma]

[Firma]

Domingo 24 de octubre

Personal en Obra: 1 Director, Auxiliar Secretario,
1 Social, 1 auxiliar SSO, 1 topógrafo, 1 maestro
ayudantes, 1 Oficiales Varios, 2 operadores de
retroexcavadora de llanta, 1 operador minicargador
1 operador vibracompactor

Equipo en Obra: 1 Minicargador, 2 Retroexcavadora de llanta, 1 Vibrocompactador.

Clima: Lluvioso después de 5pm

Actividades

1. Se Instala Subbase en el PROT 130 hasta el PROT 180. o ————— o ————— o —————
2. Se Instala Subbase en el último tramo en el PROT 230 hasta la PROT 700. o ————— o —————
3. Instalación de Andén en el PROT 000 o ————— o ————— hasta el PROT 03694 Carril Izquierdo. o —————
4. Se le solicita a la firma contratista contar con el suministro del material subbase
5. Se le solicita a la firma contratista hacer un curcuro en la tubería de alcantarillas en el PROT 660. o ————— o —————
6. Se deben presentar ensayos de Materiales de acuerdo al plan de Inspección y Ensayos. —————

[Firma]

[Firma]

Viernes 25 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente 1 Social, 1 auxiliar SISO, 1 topógrafo, 1 cadenero 1 maestro, 3 ayudantes, 1 oficio varios.
2 operadores de retroexcavadora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador
1 Inspector.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llanta
1 Vibrocompactador, 1 minicargador, Volquete

Clima: Soleado

Actividades

1. Se Suspenden ayudante por los documentos ya que no se han presentado. o ————— o —————
Faltan afiliación del Ayudante a ARL y Seguridad Social.

2. Excavación desde el PRO+640 hasta el PRO+630.0

3. Pavimentación desde el PRO+737 hasta el PRO+700 carril Izquierdo en palme con la calle a pavimentada

~~1. Piedra rajón entre la~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

L3.75-1

4. Piedra rajón desde el PRO+640 hasta el PRO+630 y compactación

5. Compactación de Subbase. desde el PRO+690 hasta el PRO+680

6. Se solicita al contratista entregar ensaques de Sardinillas y losetas prefabricadas y Mantener suministro en obra

Miércoles 26 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 Auxiliar residente, 1 Social 1 Auxiliar, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 7 ayudantes 1 oficio varios, 2 operadores de retroexcavadora, 1 lanta, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador 1 Inspector

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de lanta, 1 Vibro compactador, 1 minicargador Volg

Clima: Nublado 5Am - 8Am

Actividades

1. Se le solicita a la Firma contratista mas Motobombas para el desagüe de los tramos abiertos ya que solo cuenta con una

2. Instalación de bordillo desde la abscisa PRO+978 hasta PRO+980.0
3. Se le solicita a la firma contratista suministrar el Material Subbase. Correspondiente a los tramos abiertos 0
4. Se le solicita a la firma contratista la Señalización correspondientes desde la Calle 2 Sur y la Calle 9 Sur
5. Se debe hacer retiro de escombros Sobre Calle 3
6. Se debe disponer de Material de excavación colocado en Viviendas Aleatorias del PRO+700 al PRO+799.

[Signature]

[Signature]

Jueves 27 de octubre

Personal en obra : 1 Director, 1 auxiliar residente
1 auxiliar SSO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro,
7 ayudantes, 1 oficios varios, 1 topógrafo, 1 cadenero,
1 operador de vibro compactador, 1 operador minicargador,
2 operadores de retroexcavadora de llantas.

Equipo en obra : 2 retroexcavadora de llantas.
1 vibrocompactador, 1 minicargador

Clima : Lluvioso 7:30am - 9:00AM

Actividades

1. Se le solicita a la firma contratista mas de dos motobombas. Para el desague de los tramos abiertos 0
2. Se le solicita a la firma contratista el suministro del material Subbase. Correspondiente para los tramos abiertos 0
3. Instalación de bordillo desde la abscisa PRO+780 hasta PRO+734. Carril Derecho.
4. Pavimentación en el PRO+734 hasta el PRO+700 Carril Derecho.

5. Se solicita a la firma contratista el suministro de material, rayon, bordillos y losetas.
6. Se le solicita a la firma contratista finalizar el espacio público del tramo de la calle 2 Sur y 3 Sur Costado Izquierdo.
7. Se solicita Mantener material de Sardineros y losetas en campo y Realizar ensayos de estos materiales.

[Firma]

[Firma]

Viernes 28 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente
1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro
7 ayudantes, 2 Oficiales Varios, 1 topógrafo, 1 cadenero
1 operador de Vibrocompactador, 1 operador minicargador
2 operador de retroexcavador de llantas


Equipo en obra: 2 retroexcavadoras de llantas
1 Vibrocompactador, 1 minicargador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le solicita a la firma contratista más de los motobomba para el desagüe de los tramos abiertos.
2. Se le solicita a la firma el suministro de materiales, subbase, rayon, bordillos y losetas.
3. Continúa Instalación de bordillos en el prot+75 carril izquierdo.
4. Instalación de subbase en el prot+130 hasta el prot+180.
5. Extracción en el prot+650 hasta la prot+640 y Instalación de geotextil.

6. Pavingentación en el P+0+138,62 hasta P+0+171,75 lateral derecho entre calles 3 y 4 carrera se banno alfonso lopez



7. Pese al avance en obra de la firma contratista se presenta un caso al plan de contingencia presentado y Aprobado

[Signature]

[Signature]

Sábado 29 de agosto octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxilio residente.
1 auxiliar fiso, 1 social, 1 maestro, 8 ayudantes
2 Oficiales varios, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador Vibrocompactador
2 operadores de retroexcavadora de llanta

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta
1 minicargador, 1 vibro compactador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le solicita a la firma contratista el suministro de materiales como sobbase, rajon, bordillo, losete
2. Se le solicita a la firma contratista terminar el espacio publico de la calle 2 sur.
3. Se le solicita a la firma contratista las señalizaciones adecuadas para el cierre del tramo a trabajar.
4. Instalación de sobbase en el P+0+690 hasta el P+0+650.
5. Instalación de bordillos P+0+798 hasta P+0+770 canal izquierdo.

Lunes 31 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente
1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Maestro, 7 ayudante, 2 oficios
varios, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador minicargador
1 operador Vibro compactador, 2 operadores
de retroexcavadora de llanta

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta.

1 minicargador, 1 Vibro Compactador

Clima: Soleado

Actividades

1. Excavacion en el prot 626 al prot 620 o —
2. Escañificado de Subbase. prot 670 al prot 660 —
3. Se inicia pavimentacion desde el prot 135 o —
al prot 170 Carril Izquierdo o —
4. Instalacion de bordillo en el prot 750 al
prot 740 o —
5. Se le solicita a la Firma Contratista Suministro
de material Subbase y rajon o —
6. Se le solicita a la Firma Contratista terminar
el espacio publico de la calle 2 y 3 Sur
7. Se le solicita a la Firma contratista la
señalización correspondientes Calle 2 Sur, 3 Sur
y 8 Sur o —

Martes 1 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente,
auxiliar SISO, 1 Social, 1 Maestro, 7 ayudantes, 2 oficios
varios, 1 topografo, 1 cadenero,

1 operador minicargador, 1 operador de Vibrocompactador
2 operadores de retroexcavador de llantas.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 Vibrocompactador, 1 minicargador
Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua excavación en el prot 620 al prot 640
2. Se instala piedra rajon en el prot 620 al prot 640
3. Pavimentación prot 193 - prot 136 una placa
carril derecho. y tambien en el prot 170 al
prot 176 carril ~~izquierdo~~ derecho
4. Subbase en el prot 650 al prot 630 o — o —
5. Se le solicita a la firma contratista. el
suministro de material subbase o — o —
6. Se le solicita a la firma contratista hacer
los cerramientos y señalizaciones correspondientes
7. Se le solicita a la firma contratista las afiliaciones
correspondientes ARL, Seguridad Social de los
ayudantes o — o — o — o —
8. Terminar espacios publicos calle 2 y 3 Sur o —

Martes 9 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente,
1 auxiliar fisio, 1 auxiliar inspector, 1 Social, 1 maestro
7 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador
de minicargador, 1 operador de Vibrocompactador
2 operadores de retroexcavadora de llantas

Equipo en obra: 1 minicargador, 1 Vibrocompactador
2 retroexcavador de llantas, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continúa Excavación desde el prot 610 al prot 600
2. Continúa Suministro de piedra rajon prot 610 al prot 600
3. Suministro de Subbase desde el prot 690 al prot 650
4. Pavimentación de dos losas desde el prot 171 al prot 177. carril Izquierdo
5. Se le solicita a la firma contratista el suministro necesario del material Subbase para los tramos abiertos.
6. Se le solicita a la firma contratista, el cerramientos y señalizaciones correspondientes en los tramos abiertos
7. Se le solicita a la firma contratista retirar los escombros en los tramos pavimentados y la limpieza de las losas.
8. Terminar espacio públicos calle 2 y 3 sus

[Firma]

[Firma]

Jueves 3 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SSO, 1 auxiliar inspector social, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador minicargador, 1 operador vibracompactador, 2 operadores retroexcavadora.

Equipo en obra: 1 minicargador, 2 retroexcavadoras de llantas, 1 vibracompactador, Volquete.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de subbase desde el prot 690 hasta el prot 650.
2. Inicio de excavación desde el prot 585 hasta el prot 590.
3. Continua instalación de andenes calle 250m.
4. Se le solicita a la firma contratista el material de subbase necesario para los tramos abiertos.
5. Se le solicita a la firma contratista recoger los escombros y limpiar las losetas ya terminadas.
6. Se le solicita a la firma contratista los cerramientos y señalización correspondientes a los tramos abiertos.

[Signature]

[Signature]

Viernes 4 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 6 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retroexcavadora de llantas.

Equipo en Obras: 1 retroexcavadora de llantas, 1 Vibrocompactador, 1 minicargador, Volquetes.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Continua excavación PRO+595 hasta el PRO+590.
2. Instalación y Nivelación de subbase desde el PRO+690 al PRO+650.

3. Se le solicita a la firma contratista terminar el espacio público de la calle 2 Sur y 3 Sur.
4. No se autoriza la fondería pavimentación por terreno dañado, presenta hundimiento por humedad, placas en observación. Se solicita al contratista tomar medidas en el P+775 al P+785. carril Izquierdo.
5. Pavimentación desde el P+657,7 hasta el P+690 Carril Izquierdo entre la carrera 8E y 9 Sur.
6. Instalación de Piedra rajón del de el P+685 al P+695.
7. Se le solicita a la firma contratista. Nivelar los tramos por paresos y Nivelados al mismo tiempo.
8. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio público entre los Calle 2 Sur y 3 Sur. Carrera 8E.
9. Se le solicita a la firma contratista terminar bordillos y Andenes de la calle 9 Sur con carrera 8E y ~~de~~ quitar escombros en los tramos abiertos.

[Signature]

[Signature]

Sábado 5 de Noviembre


Personal en Obra: 1 Director, 1 auxiliar residente
1 auxiliar SISO, 1 Inspector, 1 local, 1 Maestro
5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador
de Vibrocompactador, 1 operador de minicargador
2 operadores de retroexcavadora de llanta

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta
1 operador de minicargador, 1 operador
vibrocompactador.

74
Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de bordillo en el pto + 730 Caril J2quenda entre la calle 9 sur con carrera 8E.
2. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio publico en la calle 2 sur y 3 sur con carrera 8E, y tambien en la 9 sur con carrera 8E.
3. Se le solicita a la firma contratista retirar los escombros de los tramos terminados.
4. Se le solicita a la firma contratista el ceramamiento y señalización indicadas para los tramos intervenidos o tramos abiertos.
5. Se le solicita a la firma contratista el suministro de material necesario de piedra rajón y subbase.



Martes 8 de Noviembre



Personal en Obra: 1 Director, 1 auxilia residente, 1 auxilia SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro, 5 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 operador de minicargador, 1 operador Vibrocompactador, 2 operadores de retroexcavadora de llantas.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llantas, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, Volquetas

Clima: Lluvioso 3pm - 5pm

Actividades

1. Excavacion desde la abscisa prot 580 hasta el prot 560 o
2. bordillos en el prot 710 carril izquierdo o
3. Instalacion de subbase desde el prot 630 hasta el prot 600 o
4. Se le solicita a la firma contratista el desage de los tramos abiertos o
5. Se le solicita a la firma contratista el suministro de material necesario para los tramos abiertos como son subbase y rajon.
6. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio publico en la calle 9 sur con canera SE

Miércoles 9 de Noviembre.

Personal en obra: 1 Director, 1 residente auxiliar, 1 auxiliar JSO, 1 social, 1 Inspector, 1 Maestro, 4 ayudantes, 2 oficio varios.



Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 Vibro compactador, 1 muni cargador

Clima: Soleado — Fuerte lluvia 1am — 4pm

actividades

1. Se le solicita a la firma contratista el suministro de materiales como los subbase y piedra rajon.
2. Se le solicita a la firma contratista el desage de los tramos inundados por la lluvia. o

3. No se realiza actividad ni de excavación, tampoco relleno con materia subbase y piedra rajon
4. Instalación de bordillo en prot 140 hasta el prot 170 y prot 700 hasta el prot 710 o Carril Izquierdo
5. Se le solicita a la firma contratista el cerramiento y señalizaciones indicadas para todos tramos abiertos

Jueves 10 de Noviembre


Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SSO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 8 ayudantes, 2 oficios varios, 1 operador de Vibro Compactador, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora de llantas, 1 topógrafo, cadenero

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llantas, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Clima: Soleado.

actividades

1. Se le solicita a la firma contratista el suministro necesario de materiales como son subbase y piedra rajon
2. Se le solicita a la firma contratista. recoger escombros y limpiar losetas terminadas
3. Pavingación desde el prot 690 hasta el prot 699,75 carril derecho.



4. Se le solicita a la firma contratista terminar o —
espacios públicos en la calle 350 y 950 o —
5. Se le solicita a la firma contratista el —
desague de los tramos abiertos o —

[Signature]

[Signature]

11 de Noviembre, Viernes

personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxili-
ar SSO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 7 ayudantes.
2 oficios varios, 1 operador, de vibrocompactador,
1 operador de minicargador, 2 operadores de
retroexcavadora de llanta, 1 topógrafo, 1 cadenero

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: lluvia de 2:30 PM - 5:00 PM

actividades

1. Se le solicita a la firma contratista el desague
de los tramos abiertos, por lo tanto más de
dos motobombas. o —
2. Se le solicita a la firma contratista el
suministro de material subbase necesario para
los tramos abiertos y piedra rajón. o —
3. Se le solicita a la firma contratista
limpiar los tramos pavimentado, recoger escombros
y arena echada en el tramo 950. o —
4. Mantener la señalización adecuada
para los tramos intervenidos y cerramientos
de las vías. o —

[Signature]

[Signature]

Sábado 12 de Noviembre



Personal en obras: 1 Director, 1 auxiliar residente,
1 Social, 1 auxiliar Siso, 1 Inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero,
1 Maestro, 8 ayudantes, 2 Oficio Varios, 1 operador
de minicargador, 1 operador de vibrómetro compactador
2 operadores de retroexcavadora.

Equipo en obras: 2 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrómetro compactador.

Clima: lluvia de 3AM - 5AM

actividades

1. Se le solicita a la firma contratista Material
piedra rayon para los tramos abiertos.
2. Se le solicita a la firma contratista
Mol. Motobombas para el desague de tramos
Intervenidos o _____.
3. Se le solicita a la firma contratista terminar
espacio publico en la calle a sur. o _____.
4. No hubo excavación ni tampoco instalación
de ningun material o _____.



Martes 15 de Noviembre

Personal en obras: 1 Director, 1 auxiliar residente,
1 Social, 1 auxiliar Siso, 1 Inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero,
1 Maestro, 7 ayudantes, 2 Oficio Varios, 1 operador
de minicargador, 1 operador vibrómetro compactador,
2 operadores retroexcavadora.


Equipo en obras: 2 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrómetro compactador


Clima: Soleado.

79

Actividades

1. Se le solicita a la firma Contratista el suministro de material piedra rajón para los tramos intervenidos.
2. Se le solicita a la firma Contratista, terminar espacio público de la calle 9 sur y en el tramo entre la 3 sur y 2 sur. con carrera 8E.
3. Se le solicita a la firma Contratista, recoger escombros de los tramos ya pavimentados.
4. No se hizo actividades de excavación, relleno de subbase, relleno de rajón, solo compactación desde el PRO+628 hasta el PRO+650.
5. Instalación de bordillo en el PRO+700 hasta el PRO+715.





Miércoles 16 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Directo, 1 auxiliar residentes
1 Social, 1 auxiliar. SISO, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero
1 Maestro, ayudante, 2 oficio varios, 1 operarios.
de minicargador, 1 operador vibrocompactador,
2 operadores retroexcavadora.


Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: Llovía de 11:30 - 12:30

actividades.

1. Se le solicita a la firma Contratista el suministro de material rajón para los tramos intervenidos.

2 Pavimentación del el prot 618,2 hasta el prot 657,8 carril derecho

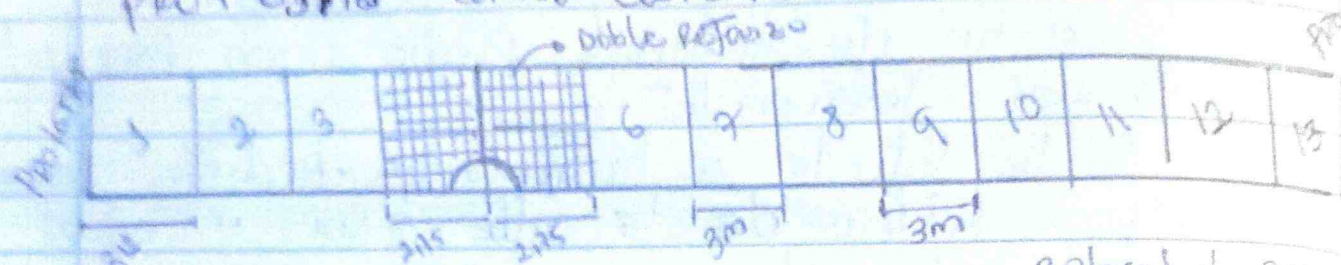

3 placas de 3,12m,
2 placas de 2,15m,
8 placas de 3m


3. Se le solicita a la Firma Contratista terminar espacio público de la calle 9 sur y 3^{ra} sur también entre la 2 sur y 3 sur con carrera SE. o

4. Se le solicita a la Firma Contratista el desague de los tramos abiertos en obra o

[Signature]

[Signature]

2 Pavimentación del el prot 618.2 hasta el
prot 657.8 carril derecho

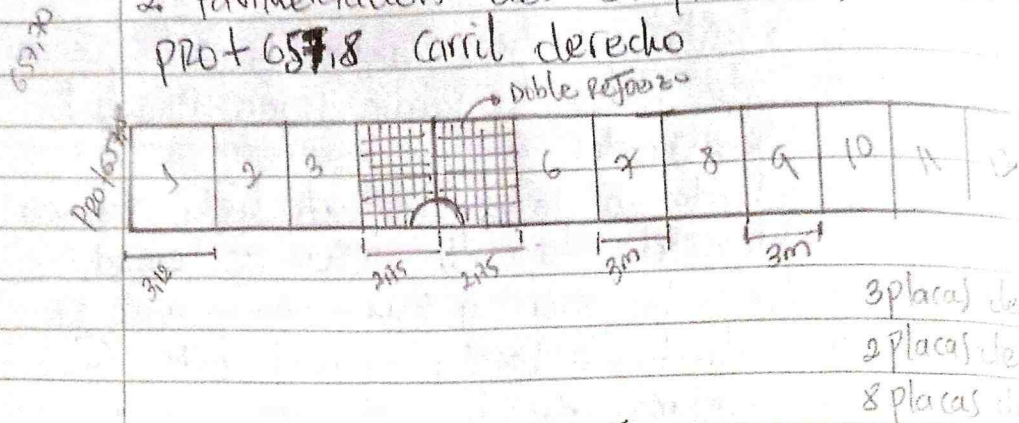

3. Se le solicita a la Firma Contratista terminar
espacio público de la calle 9 sur y 3^{ra}
también entre la 2 sur y 3 sur con carrera
8E. o o o o o

4. Se le solicita a la Firma Contratista o
El Desague de los tramos abiertos en obra o
o o o o o

[Firma]

[Firma]

Jueves 17 de Noviembre



Personal en obra: 1 Director, 1 aux Residente
1 aux Siso, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro,
6 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 ope.
retroexcavadora, 1 operador de minicargado
1 operador de vibrocompactador,

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de 1.5m³
1 minicargado, 1 vibrocompactador

Claro: Soleado

actividades

1. Instalacion de Subbase prot 650. hasta prot 600.
2. adoquines calle 4 Sur carrera 8E.
3. Instalacion de piedra rajon prot 550. hasta la prot 540.
4. Se solicita a la firma contratista suministro de material piedra rajon.
5. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio en las calles 2 sur, 3 sur y 4 sur con carrera 8E.
6. Se le solicita a la firma contratista recorrer escombros en los tramos intervenidos.
7. Se le solicita a la firma contratista recoger o utilizar material que se ha dejado en lotes regalados lo mas pronto.

Viernes 18 de Noviembre.

Personal en Obra: 1 Director, 1 residente aux.
1 Social, 1 inspector, 1 maestro, 6 ayudante
1 topografo, 1 operador minicargador, 1 operador
Vibrocompactador, 1 operador retroexcavadora
de llanta.

Equipo en Obra: 1 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrocompactador.

clima: Soleado.

actividades

1. Instalacion de Subbase del prot 590 al prot 580.
2. Instalacion de andenes y bordillos entre calle 2 sur y 3 sur con carrera 8E.

3. Se le solicita a la firma Contratista el suministro de material piedra rayon necesaria para tramo abierto.
4. Se le solicita a la firma el cerramiento adecuado para tramo abiertos.
5. Se reviso los parillas que se utilizan para boracalles y refuerzo de Manjil, y no cumplen con las especificaciones dadas. que son 20×20 Si no 30×25 .
6. Se solicita a la firma Contratista Compactar tramos abiertos.





Sabado 19 de Noviembre


Personal en obra: 1 Director, 1 aux. retolento, 1 aux. sis, 1 social, 1 inspector, 1 topografo, 1 carbonero, 1 maestro, 6 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador, 1 operador retroexcavadora de llanta.


Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llantas, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, Volquetes.

Clima: Soleado.

1. El tramo a pavimentar la Falta Compactación ya que tiene mucho material suelto de subbase y desnivel en el prot 65+ hasta el prot 67.8 Corriente Izquierda.
2. Las parillas de refuerzo en el prot 64.5.
3. Las parillas de Manjil no son 20×20 , sino 30×25 y no está estipulado en diseño.
4. Se solicita a la firma Contratista material de piedra rayon necesario para tramo abierto.

4. Se le solicita a la firma Contratista el arriendo de retroexcavadora de llanta.
5. Se le solicita a la firma Contratista recoger escombros en los tramos intervenidos.





Lunes 21 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 aux. residente,
1 aux. SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topógrafo,
1 cadenero, 1 Maestro, 5 ayudantes, 1 operador
de Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 Vibrocompactador,
retroexcavadora de llanta (R)
Minicargador (R)


Clima: Soleado

~~Se le solicita a la firma Contratista~~

Actividades

1. Se le solicita a la firma Contratista Material de piedra rayon para los tramos abiertos.
2. Se le solicita a la firma Contratista terminar espacio público de la calle 9 sur, 8 sur 2 sur y 3 sur con carrera SE.
3. Se le solicita a la firma Contratista Mas compactado por los costados por Material suelto.
4. Se le solicita a la firma Contratista avance en bordillo y adoquines.
5. Se le solicita a la firma Contratista recoger escombros en los tramos intervenidos.





Martes 22 de Noviembre.

Personal en obra: 1 Director, 1 aux. Residente,
1 aux. Siso., 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 3 ayudantes,
1 topografo, 1 cadenero, 1 operador vibrocompactador.


Equipo en obra: 1 Vibrocompactador

1 Retroexcavadora de llanta (R)

Clima Soleado

actividades.

1. Relleno de subbase desde el prot 600 hasta el prot 618.
2. Compactacion en el prot 600 hasta el prot 618.
3. Bordillo entre la calle 9 sur y la pared.
4. Se le solicita a la firma contratista material de piedra rajon para tramo abierto.
5. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio publico calle 9 sur y pared, calle 9 sur y 8 sur, calle 8 sur y 7 sur, calle 7 sur y 6 sur. Con carrera 8E.

Miércoles 23 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 aux. Siso, 1 Social, 1 aux. Residente, 1 botaguero, 1 Maestro, 5 ayudantes, 2 oficiales varios, 1 ope. vibrocompactador, 1 ope. retroexcavadora de llanta, 1 topografo, 1 cadenero


Equipo en obra: 1 Vibrocompactador

1 retroexcavadora de llanta

Clima : Soleado

Actividades

1. Excavacion desde el prot 550 hasta el prot 540
2. Nivelacion desde el prot 618 hasta el prot 600
3. Se le solicita a la firma contratista material de piedra rajon
4. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio publico, Calle 7 sor, 8 sor y 9 sor.
5. Se le solicita a la firma contratista Cerramiento de los tranos abiertos
6. Instalacion de vaceo de espacio publico del prot 800 hasta prot 745 carril derecho y carril izquierdo
7. Pavimentacion en el prot 618 hasta prot 600 carril derecho y carril izquierdo



[Firma]

[Firma]

Jueve 16 de Febrero de 2023

Personal en obra : 1 Director, 1 Inspector, 1 aux
SISO, 1 aux residente, 1 Social, 1 bodeguera
1 Maestro, 5 ayudantes, 1 oficio varios, 1 topografo
1 cadenero, 1 ope. retroexcavadora de llanta
1 ope. minicargador, 1 ope. vibrocompactador
Equipo en obra : 1 vibrocompactador, 1 minicargador
1 retroexcavadora llanta

clima: Soleado

actividades

1. Se inicia excavación desde el prot 540 hasta el prot 510, instalación raxon y subbase.
2. Instalación y vaco de espacio público desde el prot 745 hasta prot 700 carril derecho y carril izquierdo
3. Se le solicita a la firma contratista cerramiento de tramos abiertos
4. Corte y demolición de terraza prot 710
5. Se le solicita a la firma contratista
6. Instalación de bordillo desde el prot 680 hasta el prot 650 ambos carriles




Viernes 17 de Febrero del 2023

Personal en obra: 1 Director, 1 aux. residente,
1 Inspector, 1 Siso, 1 Social, 1 Maestro, 6 ayudantes,
1 topógrafo, 1 cadenero, 1 oficio varios,
1 operador retroexcavadora de llanta, 1 op. minicargador,
1 operador vibrocompactador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora, llanta,
1 minicargador, 1 Vibrocompactador

clima: Soleado

actividades

1. Se inicia excavación desde el prot 510 hasta prot 480.

2. Se Instala Material piedra rajon y material Subbase. en el prot ~~600~~ hasta prot ~~580~~.



3. Instalacion y Vaceo de espacio publico en el prot 690 hasta el prot 648,6.

4. Instalacion de bordillo desde la prot 650 hasta el prot 600.

5. pavimentacion desde el prot 600 hasta el prot 565, carril derecho.

6. Se le solicita a la Firma Contratista cerramiento y señalizacion de tramos abierto y limpieza de pavimentos intervenido.

7. Corte y demolicion de terraza. prot 690 hasta prot 670. carril Izquierdo y derecho.



Sabado 18 de Febrero del 2023

Personal en obra: 1 Directa, 1 aux residente

1 Inspector, 1 Sfo, 1 Social, 1 Maestro, 6 ayudante
1 topografo, 1 cadenero, 1 oficio Vario, 1 operador
retroexcavador llantas, 1 oper. muncargador, 1 oper.
Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora llantas, 1 muncargado
1 vibrocompactado

Clima: Soleado

actividades

1. Se Inicio excavacion desde el prot 480 hasta el prot 448.

2. Se instala material piedra rajon y material Subbase en el prot ~~560~~ hasta prot ~~528~~.

3. Instalación y Vaceo de espacio público en el prot 648 hasta el prot 600.
4. Instalación de bordillo desde el prot 600 hasta el prot 540.
5. Se le solicita a la Firma Contratista Cerramiento de tramos intervenidos
6. Se le solicita a la Firma Contratista Cerramiento y Señalizaciones de tramos abiertos

lunes 20 de febrero del 2023


personal en obra: 1 Director, 1 aux residente, 1 aux SSO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 Oficio varios, 1 Ope retroexcavadora llanta, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, 1 topografo, y 1 cadenero.

Equipo en obras 1 retroexcavadora llanta, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador

Clima: Soleado

- actividades
1. Instalación y Vaceo de espacio público desde prot 590 hasta prot 540
 2. relleno de Material Subbase y piedra rajon desde el prot 528 hasta prot 489
 3. Pavimentación desde el prot 600 hasta el prot 565 carril izquierdo.
 4. Se le solicita a la Firma Contratista Cerramiento de tramos intervenidos y Señalizaciones adecuadas.

5. Se le solicita a la firma contratista, dotación de trabajadores como (guantes, casco, gafas de protección)



6. Se le solicita a la firma contratista limpieza de pavimento intervenidos y espacio público

[Firma]

[Firma]

Martes 21 de febrero del 2023


Personal en obra: 1 Director, 1 aux. residente, 1 aux. SISO, 1 inspector, 1 social, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 Oficio Varío, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 ope. retroexcavadora, 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. Muncargador.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta, 1 Muncargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

actividades

1. Se inicia relleno de material piedra rajon y subbase. en el prot 489 hasta el prot 448 y nivelación del terreno.
2. Instalación y vaco desde el prot 530 hasta el prot 490. ambos carriles.
3. pavimentación prot 565 hasta prot 527 carril Derecho.



4. Se le solicita a la firma contratista dotar de trabajadores (gafas de protección, casco, guantes)
5. Se le solicita a la firma contratista limpiar de pavimentos intervenidos
6. Se le solicita a la firma contratista cerrar entos de tramos abiertos
7. Nivelación y compactación prot 565 hasta 527 LT

[Firma]

[Firma: Jorge Carrascal]

Miércoles 22 de febrero de 2023

Personal en obra: 1 director, 1 aux residente.


1 aux SISO, 1 inspector, 1 social, 1 maestro, 6 ayudo,
1 topógrafo, 1 cabletero, 1 ope retroexcavadora,
llantas, 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. Muncarga

Equipo de obra: 1 retroexcavadora de llant.
1 muncargado, 1 Vibrocompacto

Clima: Soleado.

actividades

1. Pavimentación desde prot 565 hasta 527 carril izquierdo




2. Instalación y vaco de espacio público, prot 490 hasta prot 445 Carril derecho y izquierdo

3. Se le solicita a la firma contratista cerrar de vías intervenidas en obra

4. Se le solicita a la firma contratista recoger de escombros en obras.
5. Se le solicita a la firma contratista recoger material dejado en el prot 790 y prot 785 de la calle 950 y pared en lotes.
6. Se le solicita a la firma contratista arreglo de andenes quebrados y juntas no sellados.
7. Se le solicita a la firma contratista el arreglo de algunos tramos pavimentados por concreto.





Jueves 23 de febrero de 2023

Personal en obra: 1 Directo. 1 aux. residente, 1 aux. SSO 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 7 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 op. retroexcavadora de llanta 1 op. vibracompactor, 1 op. minicargador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta 1 minicargador, 1 vibracompactor


Clima: Soleado

actividades

1. Se realiza demolición y corte de terrazas desde el prot 044 hasta prot 143,3 CD
2. Instalación y vaco de espacio público desde el prot 044 hasta el prot 143,3, CD
3. Se le solicita a la firma contratista arreglo arreglo de algunos tramos de andén por (arabado de concreto, fisura en el concreto) Sello de juntas tanto en andén como en

Pavimento, y limpieza

4. Pavimentación desde el prot 527 hasta el prot 489 Carril derecho.



5. Se le solicita a la firma contratista retirar los escombros dejados en obra.

6. Se le solicita a la firma contratista de personal de obra.

[Signature]

[Signature] J. Carrascal

Viernes 24 de febrero de 2023


Personal en obra: 1 Director, 1 Aux. Técnico, 1 Aux. Siso, 1 Inspector, 1 Social, 1 Informante, 1 Maestro, 6 Ayudante, 10pe. retroexcavadora, 10pe. Vibrocompactador, 10pe. minicargador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de tierra, 1 vibrocompactador, 1 minicargador

clima: Soleado

actividades

1. Corte y demolición de terraza desde el prot 175 hasta el prot 175 entre calle 4 y 5.
2. Instalación y vacio de curbe desde el prot 175 hasta el prot 175 carril derecho.
3. Pavimentación desde el prot 527 hasta el prot 489 Carril Izquierdo



4. Se le solicita a la firma contratista, limpieza por tramos intervenidos en obra.
5. Se le solicita a la firma contratista el arreglo de espacio público por (acabados, fisuras en anden) o _____
6. Se le solicita a firma contratista recoger material dejado en obra. Como escombros o material sobbase. o _____

[Signature]

[Signature]

Sábado 25 de Febrero de 2023


Personal en obra: 1 director, 1 aux residente, 1 social, 1 aux siso, 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes, 1 operador retroexcavador de llanta, 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. municargador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta, 1 Vibrocompactador, 1 municargador

Clima: Soleado


actividades

1. Instalación y vacéo de espacio público desde el prot 132 hasta prot 175 carril Izquierdo.
2. Pavimentación prot 489 hasta prot 445 ambos carriles

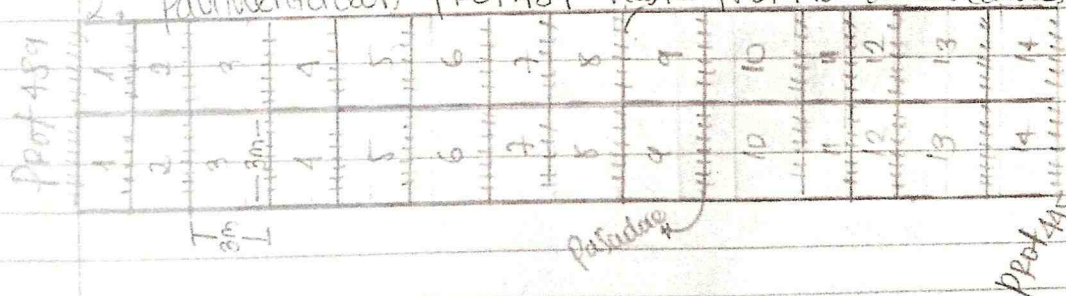

3. Se le solicita a la firma contratista recoger escombros de tramos intervenidos. o _____

4. Se le solicita a la firma contratista arreglo de espacio público por (acabado de concreto, fisuras en el concreto) o —
5. Se le solicita a la firma contratista Sellar juntos entre Sardineros y Pavimento como esta en diseño o especificaciones técnicas o —
6. Se le solicita a la firma contratista arreglo del acopio de la obra y material piedra rajón tiene demarcado Sobre tamaño con más de 50cm de tamaño. hasta 70cm y no lo estipula el diseño o la especificaciones técnicas





27 de febrero del 2023

Personal de obra: 1 aux residente, 1 aux fijo,
1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero,
1 Mostrero, 1 Gacelante, 1 operador minicargador,
1 operador retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta
1 minicargador, 2 Volquete

Clima: Soleado


actividades

1. Se le solicita a la firma contratista arreglo de acabado de espacio público por acabado de concreto, Sello de pavimento y Sardineros o —
2. Excavación en bocacalle protocolo entre Calle 2. Sur con Cra 8E o —
3. Instalación de Geotextil protocolo en bocacalle
4. Instalación de piedra rajón en el protocolo hasta la bocacalle.

5. Se le Solicita a la firma Contratista el arreglo de andén por acabado de concreto en la calle 7 sur y la pared. y sello entre visual y Sordineles

6. Se le Solicita a la Firma Contratista Material piedra rajon con sobre tamaño. no autorizado para utilizarlo en obra ya que Maximo Son 20cm como esta en diseño

7. Se le Solicita a la Firma Contratista Cerrar y tapar Materiales de Subbase y piedra rajon que hay en el acopio en la calle 3 sur





28 de febrero de 2023

Personal en obra: 1 aux. residente, 1 aux. Cito
1 Social, 1 inspector, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 Oficio
Vario, 1 operador de retroexcavadora de llanta
1 operador de minicargador, 1 topografo, 1 cadenero

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta
1 minicargador, volquetes

Clima: Soleado

actividades

1. Extracción en el prot 125 bocanalle calle 3 sur

2. Se le Solicita a la Firma Contratista los
afiliados de operador, y volquetes.

3. Se le Solicita a la firma Contratista el Vibrador
portador para compactación de tramo de PROTO 40
entre calle 2 sur y Carrera 4E

4. Rampa peatonales en el PRO 530 carril Izq
y PRO 445 carril derecho

5. Se le Solicito a la Jirca Contratista,




01 de Marzo de 2023


Personal en obra: 1 aux Residente, 1 aux SSO, 1 social, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales varios, 1 almacenista, 1 operador de retroexcavador de llanta, 1 operador de minicargador, 1 Director de obra, 2 vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
1 minicargador, volcos.

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Excavación en el prot 182 y boca calle Calle 4 Sur.
2. Se realiza fundición de rampa peatonal prot 536 CI
3. Se realiza reparación de tubería sanitaria prot 36 de vivienda a M.H. en calle 2 Sur.




02 de Marzo de 2023.


Personal en obra: 1 Director, 1 Aux Residente, 1 aux SSO, 1 inspector, 1 social, 1 Almacenista, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales varios, 1 operador de retroexcavador de llanta, 1 operador de minicargador, 2 vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta.
1 Minicargador, Volcos.

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se instala geotextil prot 182 a prot 193 y bocacalles, calle 4 sur
2. Excavación en prot 193 hasta prot 210
3. Lleno con piedra riñón Prot 182 hasta prot 193 y bocavalle.
4. Fundida de andén prot 112.48 a prot 113.3 CD.





03 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente
1 aux SISO, 1 inspector, 1 social, 1 Almacenista,
1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 topógrafo,
1 cadenero, 2 oficios varios, 1 operador de retro-
cargador de llanta, 1 operador de minicargador,
2 vigilantes, 1 operador de vibracompactor.

Equipo en obra: 1 Retroexcavador de llanta.
1 Minicargador
1 Vibracompactor
Volcos.

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Excavación en prot 210
2. Extensión de piedra riñón de prot 193 a prot 210.
3. Compactación de terreno con piedra riñón.

- 4 Extensión de geotextil prot 193 a prot 210
 5 Se realizan tomas de muestras nucleares
 hacer ensayos a ordenes para determinar
 resistencia del concreto.

04 de Marzo de 2023

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente,
 1 Almacanista, 1 Inspector, 1 aux SISO, 2 Operarios,
 1 Maestro, 1 Oficial, 5 ayudantes, 1 Topógrafo,
 1 Cadenista, 1 operador de retroexcavadora,
 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrador
 compactador, 2 Vigilantes.



Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
 1 Minicargador
 1 Vibrcompactador
 Volcos.

Clima: Soleado.

Actividades

- 1 Extensión de geo-textil prot 210 a prot 231
 y de prot 231 a prot 243.
- 2 Extensión de piedra ripón hasta prot 231
- 3 Extensión de Material Seleccionado hasta prot 231
- 4 Compactación de Material hasta prot 231
- 5 Excavación desde prot 231 a prot 245.
- 6 Se realizan reparaciones en andenes prot 600
 hasta prot 802 en ambos carriles, Así como
 la toma de detalles.

4. Extensión de geotextil prot 193 a prot 210
5. Se realizan tomas de muestras nucleos para hacer ensayos a andenes para determinar la resistencia del concreto.
6. Se solicita a la firma contratista reparación de espacio público desde prot 600 al prot 799.

04 de Marzo de 2023

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 social
1 almacenista, 1 inspector, 1 aux SISO, 2 oficiales varios
1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 Topografo,
1 cadenero, 1 operador de retroexcavadora de llanta
1 operador de minicargador, 1 operador de vibró-
compactador, 2 vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
1 Minicargador
1 Vibrócompactador
Volcos.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Extensión de geo-textil prot 210 a prot 231 y de prot 231 a prot 243.
2. Extensión de piedra rajón hasta prot 231
3. Extensión de Material Seleccionado hasta prot 231
4. Compactación de Material hasta prot 231
5. Excavación desde prot 231 a prot 245.
6. Se realizan reparaciones en andenes prot 600 hasta prot ~~799~~ en ambos carriles. Así como la toma de detalles.

7.

[Signature]

[Signature]

6 de Marzo del 2023, Lunes

- Personal en obra: Director, Aux Residente, Social, Almacenista, Inspectos, Aux SISO, 2 Oficios Varios, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 ayudantes, 1 Topografo, 1 Cadenero, 3 operarios Equipos, 2 vigilantes.
- Equipo en obra: 1 paqueta, 1 Minicargador, 1 libro Volcos., 4. Menores.
- Clima Soleado

Actividades..

1. Visita de Supervisor a obra por parte de la Secretaria de Infraestructura. y recorrido de obra.
2. Excavación PRO+245 al PRO+262.
3. Instalación de Geotextil desde PRO+245 al 262
4. Instalación Faja PRO+245 al 262
5. Se solicita al contratista hacer deses general de la obra, Retiro de Material Vegetal Proximo de Tala de Arboles.
6. Se solicita a la firma Contratista Tomar detalles andamios PRO+600 al PRO+690.

[Signature]

[Signature]

7 de Marzo del 2023, Martes

- Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Aux. SISO, 2 Oficios Varios,


1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Topógrafo,
 1 Carpinero, 2 Operadores Equipo.
 Equipo en obra: 1 Motocargador de 1100 kg,
 1 Minicargador, 1 Vibracompactor, 1 H. Motor.

Clima: Soleado

Actividades:

1. Excavación PRO+262 al PRO+274.
2. Instalación de Rajos, Geotextil
3. Excavación boca calle PRO+274 Costado Derecho.
4. Instalación de Material de Sólido Gravelar y su compactación.
5. Se solicita nuevamente remoción de escombros y Material vegetal producto de actividades en obra.
6. Se solicita a la firma Contratista presentar Plan de Intervención donde detalle recursos a ser utilizados para cada Cuadra pendiente por Intervención.





8 de Marzo del 2023, Miércoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux Remente, 1 Social,
 1 Almacenerista, 1 Inspector, 1 Aux Siso, 2 Oficiales Varios
 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Topógrafo,
 1 Carpinero, 1 Operador de Reps & Operadora, 1 Operador de
 Minicargador, 1 Operador de Vibro.



Equipo en obra: 1 Pajanta, 1 Vibro, 1 Minicargador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza excavación desde el PRO+274 al PRO+285

2. Instalación de subbase desde el PRO+210 al PRO+260.
3. Instalación de espacio público desde el PRO+446 al PRO+540.
4. Se instala geotextil desde el PRO+274 al PRO+285.
5. Se instala Rajón desde el PRO+274 al PRO+285.
6. Instala Subbase desde el PRO+274 al PRO+285.
7. Se solicita a la Firma Contratista entrega de dotación completa al personal en obra.



9 de Marzo del 2023, Jueves



Personal en obra: 1 Director, 1 AX Residente, 1 Sodal, 1 Almacenerista, 1 Inspector, 1 Aut Sio, 2 Oficiales Varios, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Bombero, 1 Cordonero, 3 Operarios Mageneria, 2 Alacores.

Equipo en obra: 1 Reforcador de llantas, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Excavación entre abscisas PRO+285 al PRO+301
2. Instalación de Geotextil PRO+285 al PRO+301
3. Instalación de Rajón PRO+285 al PRO+301
4. Instalación de Subbase PRO+285 al PRO+301
5. " de subbase en calle 2 PRO+036 al PRO+043 y bocacalle sobre calle 2.
6. Instalación de Subbase granular PRO+113 al PRO+132 y bocalles PRO+120.
7. Continúa Instalación Espacio público PRO+446 (PRO+540)



10 de Marzo del 2022, Viernes



Personal en obra: 1 Director, 1 Aux. Residente, 1 Sisa,
1 Inspector, 1 Social, 1 Almacanista, 1 Maestro,
1 Oficial, 2 Oficiales Varios, 5 Ayudante, 1 Topógrafo,
1 Cadenero, 3 Operadores de equipo, 2 Vigilantes

Equipo en obra: 1 operador de Retroexcavadora de 1.5 toneladas,
1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Instalación de Concreto PRO+036 al PRO+043
y bocanilla de la calle 2, carril derecho
2. Instalación de Concreto PRO+113 al PRO+132.
carril Derecho.
3. Excavación PRO+301 al PRO+309
4. Instalación de Subbase granular PRO+266 al PRO+301
5. Instalación Rajeón y Geotextil PRO+301 al PRO+309.
6. Se instala formaleta para Concreto PRO+180 al
PRO+220.

11 de Marzo del 2023, Sábado

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux. Residente, 1 Sisa,
1 Inspector, 1 Social, 1 Almacanista, 1 Maestro,
1 Oficial, 2 Oficiales Varios, 5 Ayudante, 1 Topógrafo,
1 Cadenero, 3 Operador equipo, 2 Celadores

Equipo en obra: 1 Pajunta, 1 Minicargador, 1 Retro.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de concreto PRO+036 al PRO+043
Carril Izquierdo

2. Instalación de Carretero PRO+113 al PRO+132.
3. Excavación PRO+309 al PRO+315
3. Instalación de Geotextil y Riego PRO+309 al PRO+315
4. Instalación de Subbase granular PRO+180 al PRO+300.
5. Continúa instalación de espacio público.

[Firma]

[Firma]

13 de Marzo del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 Director, 1 Auxiliante, 1 SISO, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenero, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Oficiales Varios, 5 Ayudantes, 1 Topógrafo, 1 Leñador, 3 operadores equipos, 2 Celadores.
Equipo en obra: 1 pagamto 1 Mini cargadora, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades

1. Extensión y Compactación de Subbase PRO+180 al PRO+290.
2. Se paran Excavaciones
3. Se instala formaleta para pavimento desde el 205 al 250, Carriil Izquierdo.
4. Se evidencia placa firmada en PRO+132 costado Izquierdo por corte Tardío de las placas Construidas.
5. Se inicia instalación de Espacio público del PRO+130 al PRO+180, Izquierdo.
6. Se solicita al Contratista Continuar con Actividad de excavaciones todo vez que el plazo del contrato de obra es hasta FOLIO

09 de Mayo del 2023.

Se le solicita a la firma contratista contratar cuadrilla para reparaciones en ardores solicitados por la firma interventora




14 de Marzo del 2023, Marlay


Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 Socio, 1 Almacenero, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 Topografo, 1 Cadenero, 3 operarios de Equipo

Equipo en obra: 1 operador de Retro de 10 toneladas, 1 Mquina de vibrar, 1 Vibrocompactador, H. Menores

clima: Soleado

Actividades:

1. Instalaciones de Concreto PK0+205 a PK0+250 Caril Izquierdo.
2. Extensión y compactación de Subbase PK0+290 al PK0+300.
3. Excavaciones paralizadas por falta de Equipo para Excavación
4. Continua construcción de Espacio público del PK0+130 a PK0+180 Caril Izquierdo.

15 de Marzo del 2023, Miércoles.

Personal en obra: 1 director, 1 aux residente, 1 SISO

1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial, 2 chicos varios, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 Cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: Retroexcavadora de llanta

1 minicargador, 1 Vibro compactador, Herramientas menores

Clima Soleado

Actividades.



1. Instalación de Concreto PRO+205 a / PRO+250
Cavil Derecho

2. Se reinicia excavación PRO+315 al PRO+335

3. Se instala Geotextil y rejón PRO+315 al PRO+330.

4. Continúa la construcción de andén PRO+130 al PRO+180.

5. Extensión Subbase Granular PRO+315 al PRO+335

16 de Marzo del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 director 1 aux residente, 1 SISO



1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial
2 chicos varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 Cadenero
3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador
1 Vibro compactador, Herramientas menores.

Clima Soleado

Actividades

1. Instalación concreto PRO+193 al PRO+205
carri/ Izquierdo
2. Instalación concreto PRO+190, Boca calle
Derecha.
3. Excavación PRO+335 al PRO+354,
Excavación bocanalles PRO+347, Sobre la calle 6.
4. Finaliza Remoción andén Costado Derecho
PRO+180 al PRO+180, Continúa Construcción
espacio público en este costado.
5. Se solicita a la firma Contratista Mantener
Área de trabajos con Señalización,
Limpia sin escombros y sin residuos
de tala de árboles.

17 de Marzo del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 director, 1 auxiliar residente, 1 SISO
1 Inspector, 1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial
2 Oficiales varios, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 ordenero
2 operadores de equipo



Equipos en obra: 1 operador de Repollante, 1 minicargador
1 Vibrocompactador Herramientas menores.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación concreto PRO+193 al PRO+205 Derecho.

2. Excavación desde el PRO+354 al PRO+381
3. Se funda con ~~este~~ boca calle PRO+120
Calle 3 Derecha.
4. Se ~~se~~ Solicita a la Firma Contratista
contar con los materiales como son
rayón y subbase en obra y proteger la
Subrasante a la hora de realizar la
Excavación
5. Se le informa a la firma contratista
que al dejar la Subrasante expuesta
si se deteriora por causa de lluvias
es su responsabilidad por no contar
con materiales para subir la Estructura y
proteger Subrasante.

15 de Marzo del 2023, Sábado


Personal en obra: 1 director obra, 1 auxiliar Residente,
1 siso, 1 inspector, 7 social, 1 almacenista, 1 maestro,
1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo,
1 Cadenero, 30 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Rebollante, 1 maricargador, 1
vibrocompactador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades:

1. Excavaciones ~~PRO+381~~ al PRO+386.
2. No se evidencia rayón definitivo.
3. Excavación abierta desde el ~~PRO+347~~ al PRO+386.
4. Se extiende Geotextil y Rayón PRO+335 al PRO+347

21 de Marzo del 2023, Martes


Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente
1 SSO, 1 Inspector, 1 Social, 1 almacenista, 1 maestro
- 1 Chaval, 8 operarios varios, 3 Ayudantes, 1 topógrafo
- 1 Cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 Roto de llanta, 1 minicargador
1 vibracompactor. Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Construcción de espacio público Costado Derecho PRO+060 al PRO+113.
2. Correcciones de detalles PRO+044 al PRO+113 Izquierdo Solicitados por la firma interventora.
3. Se evidencia obreros sin dotación en obra, Se solicita retro hasta no tener completa dotación del personal.
4. Se evidencia excomunicación abierta desde el PRO+354 al PRO+381, Sin razón, inundado por fuertes lluvias el Fin de Semana.
5. Se indica por parte de la interventoría que los daños que reciba la Subrasante serán asumidos por ellos.
6. Se solicita retiro de escombros ubicados en plaza sobre calle 3^{ra} retiro de Material vegetal en Calle 5 Sur retiro de escombros casa abandonada costado Derecho entre calles 2 y 3 Sur.
7. Se solicita reparación andén PRO+060 Izquierdo; Instalación tubería de 4" para Salida de agua de vivienda a la vía, toda vez que se instaló andén y no se adecuó la tubería, afectando esta al andén construido.

22 de Marzo del 2023, Miércoles


Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente,
1 siso, 1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro
1 oficial, 2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo
1 albañil, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador
1 vibracompactor, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades:

1. Instalación de Geotextil del PRO+347 al PRO+370.
2. Instalación de Pajón del PRO+347 al PRO+370.
3. Se realiza tala de Árboles entre calles 5 y 6 Sur.
4. Reto de Actividades paralizadas.
5. Se le indica a la firma contratista que deben finalizar actividades de espacio público de los tramos construidos desde el PRO+446 al PRO+799. y que a la fecha queda menos de Mes y Medio para finalizar el contrato.

23 de Marzo del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente,
1 siso, 1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro
1 oficial, 2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo,
1 albañil, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Retro llanta, 1 minicargador,
1 vibracargador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades

1. Equipo por obra paralizados (Pobrecargador).
2. Continúa la instalación de bordillos en la calle 3.
3. Tala de árboles en abs PRO+1250.
4. Se funda rampa peatonal en calle 3 abs PRO+120 lateral Izquierdo.
5. Se arman parallas de Acero de $\frac{1}{2}$ " para refuerzo de losas.
6. Se realiza mayol en PRO+125.
7. ~~Inicia~~ Extensión de Subbase en PRO+350 al PRO+380.
8. Se solicita a la firma Contratista asignar recursos de Equipos y personal para finalizar la obra en el tiempo Contractual del proyecto.




24 del mes del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 Director de obra, 1 auxiliar residente
1 SSO, 1 inspector, 1 social, 1 almacenero, 1 maestro; 1 oficial
2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero
3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador, 1 Vibro Compactador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades

1. Continúa la extensión de Material granular desde el PRO+350 al PRO+380

2. Instalación de Guías y Visual en arndas.
Sobre la calle 3 PRO+117 - PRO+125
lateral Izquierdo.
3. Se realiza demolición de Terrazas desde el PRO+119
al PRO+125 lateral Derecho.
4. Se realiza Sello de juntas entre Bordillos y anden
abs PRO+044 al PRO+125.
5. Continúa el equipo Retrocargador (pajante)
paralizado.

26 de Marzo del 2023. Sábado.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente
1 Siso, 1 Inspector de obra, 1 social, 1 albañil, 1 maestro
de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes oficiales Varías 5 Ayudantes
1 topógrafo, 1 Cadenero 3 operadores de equipo
equipos en obra: 1 Retro de llanter, 1 vibracompactor
1 minicargador, Herramientas menores.
Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza Extensión y compactación desde PRO+250
a la PRO+300.
 2. Extensión de Material de relleno del PRO+370 al PRO+380.
 3. Extensión instalación de Geotextil del PRO+370 al PRO+382.
 4. Tala de Arboles desde el PRO+100 al PRO+300.
 5. Aun se encuentra paralizado el retrocargador de llanter.
 6. Las Actividades de Excavación están paralizadas
y el suministro de relleno es deficiente.
- Se solicita al Contratista asignar recursos para finalizar en el tiempo
Contractual.

27 de Marzo del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SSO, 1 Inspector, 1 social, 1 almacenero, 1 maestro, 2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos de obra: 1 vibracompactor, 1 minicargador, 1 Retro de llanta, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza extensión de rajón desde el PROT 380 al PROT 402.

2. Se finaliza cerco desde el PROT 250 al PROT 292.

3. Se instala formateos para concretos desde el PROT 250 al PROT 292 Costado Derecho

4. Actividades de excavación paralizadas.




28 de Marzo del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director, 1 auxiliar Residente, 1 SSO,

1 Inspector, 1 social, 1 almacenero, 1 maestro, 2 oficiales varios - 6 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 minicargador, 1 Retro de llanta, 1 vibracompactor, Herramientas menores


Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de subbase desde el PROT 292 al PROT 330. y su compactación.

2. Se evidencia Periodos de tala de árboles en la zona de trabajos. Se solicita su retiro y disposición de manera inmediata.

3. Las actividades de excavación se encuentran paralizadas.
4. Se realiza chequeo de formidatos y espesores de pavimentos, se solicita por parte de la firma interventora corregir puntos solicitados para espesores.
5. Nuevamente se solicita a la firma contratista asignar recursos para finalizar la obra en el tiempo contractual.





29 de Marzo del 2023, Miércoles.

personal en obra: 1 director, 1 auxiliar residente, 1 SSO
1 Inspector, 1 almacenero, 1 maestro, 1 oficial, 2 oficios
varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 ardenero, 3 operadores
de equipo

Equipos en obra: 1 vibracompactor, 1 minicargador
1 Retroexcavadora - - - - - Clima: Soleado

Actividades

1. Se reinician actividades de excavación desde el PRO+402 al PRO+422
2. Se instala subbase desde el PRO+300 al PRO+370.
3. Se instala concreto desde el PRO+250 al PRO+292 Costado Derecho.
4. Se realiza tala de árboles e instalación de bordillos del PRO+193 al PRO+250.
5. Hacer nuevas formabatas para concreto a la obra

30 de Marzo del 2023, Jueves.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente.

1 SISO, 1 almacanista, 1 inspector, 1 social, 1 maestro,

1 oficial, 2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo

1 cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 miniargador, 1 operador de Retrollanta

1 Vibracompactor

Clima: Soleado.

Actividades:

1. Se realiza excavación del PRO+422 al PRO+436.

2. Se realiza instalación de Geotextil y extensión de Rayón del PRO+402 al PRO+436.

3. Se finalizan Actividades de excavación para el total de la vía a Construir.

4. Se realiza excavación para andén en calle 2 PRO+036

5. Se instala concreto MK38 desde el PRO+292 al PRO+~~347~~ Costado Derecho.

6. Se instala bordillos desde el PRO+190 al PRO+~~294~~.

31 de Marzo del 2023, Viernes.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar de residente.

1 SISO, 1 almacanista, 1 inspector, 1 social, 1 maestro, 1 oficial

2 oficiales varios, 5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 3

operadores de equipos.

Equipos en obra: 1 Retrollanta, 1 vibracompactor, 1 mini-argador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Se instala Concreto desde el PRO+250 a PRO+347 Costado Izquierdo.
2. Se presentan floriguas leves, se solicita al Contratista tapar con plásticos las losas.
3. Se realiza extensión de subbase desde el PRO+350 a PRO+436.
4. Se realiza excavación por presentarse humedad en subbase. Se evidencia Unión del Tubo de 4" de Agua a presión desajustada, se arregla daño y se vuelve a subir estructura.
Largo = 4m, Ancho = 3,10m, Profundidad = 0,175m.

[Firma]

[Firma]

01 de abril del 2023, sábado

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente 1 SSO, 1 albañil, 1 social, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial 2 ayudantes oficiales varios, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 Cadenero, 3 Operadores de equipo.

Equipos en obra: 1 minicargador, 1 vibracompactor, 1 Retro de llanta, - - - - - Clima: soleado.

Actividades

1. Se realiza extensión de subbase PRO+347 al PRO+435.
2. Continúa la instalación de bordillos y fundida de Rampa PRO+190 a PRO+250.

3. Se solicita al firma Contratista iniciar las actividades faltantes como son la compensación parotal y parte eléctrica del proyecto.

[Firma]

[Firma]

03 de Abril del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente
1 SISO, 1 social, 1 almacenista, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial
2 Oficiales varios, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 cordenero, 3 operarios
de equipos

Equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 Vibrocompactador
Herramientas menores

Clima: Soleado.

Actividades:

1. Instalación y compactación de Subbase desde el PRO+347 al PRO+435.
2. Instalación de Formales del PRO+347 al PRO+389. Costado Derecho
3. Se realiza instalación de bordillo desde el PRO+280 al PRO+340. Derecho.
4. Se solicita a la firma Contratista preparar ensayos de los concretos pautados en sitios entre las abscisas PRO+190 al PRO+280.
5. Se solicita a la firma Contratista subsanar detalles solicitados por la interventoría, mediante oficios desde el PRO+436 al PRO+799.
6. Se solicita a la firma Contratista asignar recursos para finalizar en el tiempo contractual el proyecto.
