

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

INFORME SEMANAL No. 4

CONTRATO No. GGC-145-2023

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"

PERÍODO: 11 al 17 de DICIEMBRE 2023

SUPERVISION: ARQUITECTO CAMILO ANDRES HERNÁNDEZ ALFONSO

DICIEMBRE 2023

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

TABLA DE CONTENIDO

1.	<u>DATOS GENERALES DEL PROYECTO</u>	3
1.1	<u>FICHA TECNICA DEL CONTRATO</u>	3
2.	<u>LOCALIZACION DEL PROYECTO</u>	4
3.	<u>ALCANCES</u>	5
3.1.	CONTROL DE PROGRAMACIÓN:	
4.	<u>ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS:</u>	6
5.	<u>PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO</u>	10
5.1	<u>PERSONAL OPERATIVO</u>	10
6.	<u>VEHICULOS Y/O EQUIPOS</u>	10
7.	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO:</u>	11
8.	<u>INFORME SST:</u>	20

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. GGC-145 -2023, en su etapa de obra presenta en siguiente contractual:

1.1 FICHA TECNICA DE OBRA

CONTRATO No. GGC-145-2023	: 24 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	: CONSORCIO ARAGON GTD
CONTRATANTE	: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
INTERVENTOR	: CONSORCIO GINGNOVA
SUPERVISOR	: ARQ. CAMILO ANDRÉS HERNÁNDEZ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 421.702.376,15
ACTA DE INICIO	: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No	: N/A
PLAZO INICIAL	: DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana.

Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m.


Extensión total: 4.493 Km²

Extensión área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la altitud media de 168 m.

Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 °C, con máximas y mínimas de 22°C y 34°C respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada es de 41.5°C y la mínima de 16°C. El mes más caluroso es abril con un promedio de 30°C y el más fresco octubre.

Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha establecido el sitio de la obra en la cabecera municipal específicamente en el barrio 12 de Octubre en la Calle 22 número 14-30.

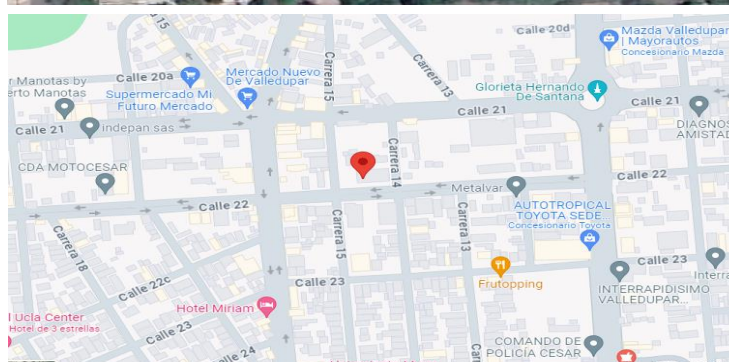

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

3. ALCANCES

La valoración de actividades a ejecutar y áreas a intervenir en este establecimiento, se encuentran enmarcadas dentro de los alcances contenidos en el anexo técnico según lo siguiente:

La actividades y cantidades contractuales iniciales para ejecución dentro de la seccional Valledupar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,00	PRELIMINARES	M2	939,51
2,00	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ML	119,13
3,00	MAMPOSTERIA	M2	101,70
4,00	DIVISIONES DE MUROS	ML/M2	40,00
5,00	PISOS	ML/M2	443,00
6,00	ENCHAPE	ML/M2	119,00
7,00	CIELO RASO	M2	88,00
8,00	PUERTAS	UND	8,00
9,00	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES	UND	53,00
10,00	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA	M2	325,63
11,00	MESONES	ML	48,13
12,00	VENTANAS	M2	44,51
14,00	MUEBLES	UND	15,00
15,00	CUBIERTAS	ML/M2	1530,74
16,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML/UND	224,00
17,00	VARIOS	M2	1342,00
19,00	APARATOS ELECTRICOS	ML/UND	209,50

3.1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

% EJECUTADO EN LA SEMANA	11,95%
VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA	\$ 50.401.970
% EJECUTADO ACUMULADO	57,41%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 242.101.552
% DE ADELANTADO	0.00%
VALOR DEL % ADELANTADO	\$ 0.00

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

BALANCE DE CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	\$ 421.702.376,15	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1. (COBRADO)		\$ 84.340.475,23
SALDO POR COBRAR		\$ 337.361.900,92
SUMAS IGUALES	\$ 421.702.376,15	\$ 421.702.376,15

PORCENTAJE DE EJECUCION FASE IV

57,41 %

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O ZONAS INTERVENIDAS:

Frentes Intervenidos:

- Laboratorio Mosca de la Fruta
- Respel
- Depósitos
- Primer Piso Edificio de Oficinas
- Segundo Piso Edificio de Oficinas
- Cuarto Planta Eléctrica
- Laboratorio Semillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA MOSCA DE LA FRUTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5	PISOS		
5,1	Suministro, transporte e instalación de Piso Baldosa Granito De Mármol Nube 30x30 Cm, tráfico comercial, incluye destronque y brillado	M2	15
6	ENCHAPE		
6,1	Suministro e instalación de media caña en granito pulito de 10 cm de espesor, incluye dilatación, pulida, brillado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	21
8	PUERTAS		

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

8,1	Recuperación de puerta metálica, lijada y pintada; desmonte de marco y suministro e instalación de marco metálico nuevo, incluye chapa y cargue de marco medidas de puerta 1,00 X 2,20 M.	UND	1
10	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA		
10,2	suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	7
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	17
12	VENTANAS		
12,1	Suministro e instalación de ventana corrediza perfil 80-25 vidrio templado de 6mm, aluminio incoloro; incluye chapa y sello perimetral.	M2	11,23
15	CUBIERTAS		
15,3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección promedio de 25cm, incluye soportes pie de amigo para canal, pintura, soscós y gárgolas.	ML	5,3
16	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
16,4	Cuneta de 25x25 cm en concreto, incluye suministro de material, excavación (con botadero certificado)	ML	11,11
17	VARIOS		
17,1	Realización de andén en concreto 10 CM de espesor, con acabado gualado perimetral y centro escobillado con dilatación cada 1,2m, incluye materiales para concreto, excavación (botadero certificado), mejoramiento en recebo, acero, formaletiado y vaciado	ML	2,55
19	APARATOS ELECTRICOS		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x30 24w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	3
19,5	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. Incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	UND	2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA RESPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
8	PUERTAS		
8,1	Recuperación de puerta metálica, lijada y pintada; engrase y mantenimiento de marco metálico existente, incluye chapa medidas de puerta 1,40 X 2,20 M	UND	1
8,2	Elaboración e instalación de puerta metálica tipo persiana en perfil rectangular 50x25 0,8mm, incluye chapa, pasadores y pintura; medidas de puerta 1,20 X 2,20 M	UND	1
10	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA		
10,2	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo EPOXICA color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	59,6
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	16,37

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

15	CUBIERTAS		
15,4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección promedio de 25cm, incluye soportes pie de amigo para canal, pintura, soscós y gárgolas.	ML	9,2
16	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
16,1	Instalación de tubería PVCS 4", incluye accesorios, abrazaderas, pintura y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	8
16,4	Instalación de tubería PVCS 4" subterránea, incluye demolición si es necesario, accesorios, excavación manual (con disposición a botadero), lleno en recebo, cama de arena y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	20
16,5	Caja de inspección de 80x80x80 cm en concreto, incluye suministro de material, excavación (con botadero certificado) y tapa en concreto con marco metálico.	UND	1
17	VARIOS		
17,1	Realización de andén en concreto 10 CM de espesor, con acabado gualado perimetral y centro escobillado con dilatación cada 1,2m, incluye materiales para concreto, excavación (botadero certificado), mejoramiento en recebo, acero, formaletiado y vaciado	ML	20,08
19	APARATOS ELECTRICOS		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 48w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1
19,5	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. Incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	UND	2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA DEPOSITOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6	ENCHAPE		
6,1	Suministro e instalación de pared en cerámica de 20.5 x 20.5 cm tipo natal blanco marca corona	M2	11
6,2	Suministro e instalación de mediacaña en granito pulido de 10 cm de espesor, incluye dilatación, pulida, brillante y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	7
15	CUBIERTA		
15,3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección promedio de 25cm, incluye soportes pie de amigo para canal, pintura, soscós y gárgolas.	ML	14,5
12	VENTANAS		
12,1	Suministro e instalación de ventana corrediza perfil 80-25 vidrio templado de 6mm, aluminio incoloro; incluye chapa y sello perimetral	M2	12
19	APARATOS ELECTRICOS		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 48w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	4
19,5	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. Incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo	UND	2

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.		
--	--	--	--

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS PRIMER PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Demolición de mediacaña en granito pulido Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	ML	28,16
1,2	Demolición de piso incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	M2	20
1,3	Desinstalación de aparatos sanitarios, incluye revisión y destaponamiento de redes	UND	4
4	DIVISIONES DE MUROS		
4,2	Suministro e instalación de muro en drywall 1cm base 9, incluye reformas, instalación y acabado	M2	10
9	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES		
9,3	Suministro e instalación de grifería para lavamanos, incluye conexiones hidráulicas, y todo lo necesario para su total funcionamiento	UND	2
19	APARATOS ELECTRICOS		
19,5	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	UND	2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA OFICINAS SEGUNDO PISO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
19	APARATOS ELECTRICOS		
19,1	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 48w, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	3
19,5	Suministro e instalación de proyector led de 100 W, 6500K, IP65. eficiencia no menor a 90%. 120 - 240 V, 60 Hz. incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	UND	2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA PLANTA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5	PISOS		
5,1	Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 de 5 cm de espesor; incluye acabado tipo concreto quemado manual para pintura	M2	15,75
8	PUERTAS		

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

8,1	Elaboración e instalación de puerta metálica tipo persiana en perfil rectangular 10x4 1.5mm, incluye chapa, pasadores y pintura; medidas de puerta 2,00 X 2,20 M DOBLE HOJA	UND	1
10	PAÑETE ESTUCO Y PINTURA		
10,1	Suministro y aplicación de pañete 1:4 impermeabilizado, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones	M2	23,22
10,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo KORAZA para exteriores color blanco, 2 manos, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos y dilataciones.	M2	11,55
16	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
16,1	Instalación de tubería PVCS 4", incluye accesorios, abrazaderas, pintura y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	8
16,2	Instalación de tubería PVCS 4" subterránea, incluye demolición si es necesario, accesorios, excavación manual (con disposición a botadero), lleno en recebo, cama de arena y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	ML	23
17	VARIOS		
17,1	Realización de andén en concreto 10 CM de espesor, con acabado guialado perimetral y centro escobillado con dilatación cada 1,2m, incluye materiales para concreto, excavación (botadero certificado), mejoramiento en recebo, acero, formaletiado y vaciado	M2	29,12

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA AREA LABORATORIO SEMILLAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
9	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES		
9,2	Instalación de aparatos sanitarios, incluye suministro de acoples y sifones para su correcto funcionamiento	UND	1
15	CUBIERTA		
15,1	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección promedio de 50cm, incluye soportes pie de amigo para canal, pintura, soscas y gárgolas.	ML	15

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO

- **DIRECTOR DE OBRA:** Ingeniero Alex Oliveros
- **RESIDENTE DE OBRA:** Arquitecta Sharon Danay Chaparro Secue
- **INGENIERA AUXILIAR:** Marjith Santamaria Ascanio
- **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL:** Adíela Martínez

5.1 PERSONAL OPERATIVO

- **MAESTRO DE OBRA:** Elkin Rodríguez
- **AYUDANTES:**
 1. Jose Ávila
 2. Martin Barrios

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

3. Jose Beleño
4. Pedro Puerta
5. Jesús Silva

7. VEHICULOS Y/O EQUIPOS:

Mezcladora
Pulidora
Taladro Percutor
Herramienta Menor

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	
Descripción: Instalación de canal en lámina galvanizada en Depósitos.	Descripción: Instalación de canal en lámina galvanizada en Depósitos.
	
Descripción: Instalación de canal en lámina galvanizada en Depósitos.	Descripción: Realización de andenes en concreto en Respel.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: Suministro e instalación de pared en cerámica de 20.5 x 20.5 cm en Depósitos.	Descripción: Suministro e instalación de pared en cerámica de 20.5 x 20.5 cm en Depósitos.
	
Descripción: Suministro e instalación de pared en cerámica de 20.5 x 20.5 cm en Depósitos.	Descripción: Pulido de piso en mármol en depósitos.
	
Descripción: Pulido de piso en mármol en depósitos.	Descripción: Instalación de muro en drywall en oficinas primer piso.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: Instalación de muro en drywall en oficinas primer piso.	Descripción: Excavación e instalación de tubería subterránea de 4" en respel.
	
Descripción: Excavación e instalación de tubería subterránea de 4" en respel.	Descripción: Excavación e instalación de tubería subterránea de 4" en respel.
	
Descripción: Realización de cuneta en concreto en mosca de la fruta.	Descripción: realización de andén en concreto en cuarto planta eléctrica.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: realización de anden en concreto en cuarto planta eléctrica.	Descripción: realización de anden en concreto en cuarto planta eléctrica.
	
Descripción: realización de anden en concreto en cuarto planta eléctrica.	Descripción: realización de anden en concreto en cuarto planta eléctrica.
	
Descripción: instalación de mediacaña en granito pulido en mosca de la fruta.	Descripción: instalación de mediacaña en granito pulido en mosca de la fruta.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: aplicación de pañete impermeabilizado 1:4 en cuarto planta eléctrica.	Descripción: aplicación de pañete impermeabilizado 1:4 en cuarto planta eléctrica.
	
Descripción: Demolición de piso y mediacaña en baños de oficinas edificio primer piso.	Descripción: instalación de puerta tipo persiana de dimensiones 2x2,4 m en cuarto planta eléctrica.
	
Descripción: suministro e instalación de baldosa en mármol para piso en mosca de la fruta.	Descripción: suministro e instalación de baldosa en mármol para piso en mosca de la fruta.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: suministro e instalación de baldosa en mármol para piso en mosca de la fruta.	Descripción: instalación de reflectores de 100w en respel.
	
Descripción: Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 en cuarto planta eléctrica.	Descripción: Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 en cuarto planta eléctrica.
	
Descripción: Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 en cuarto planta eléctrica.	Descripción: Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 en cuarto planta eléctrica.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:4 en cuarto planta eléctrica.	Descripción: Aplicación de estuco para exteriores en mosca de la fruta.
	
Descripción: Aplicación de estuco para exteriores en respel.	Descripción: Aplicación de estuco para exteriores en respel.
	
Descripción: instalación de canal en lámina galvanizada en resoel.	Descripción: instalación de canal en lámina galvanizada en resoel.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: instalación tubería de 4" bajantes para lluvia en cuarto planta eléctrica.	Descripción: instalación de puerta metálica dimensiones 1x2,2 m en mosca e la fruta.
	
Descripción: aplicación de pañete impermeabilizado 1:4 en filos de mesón mosca de la fruta.	Descripción: instalación de puerta metálica tipo persiana dimensiones 1,2x2,2 m en respel.
	
Descripción: instalación de canal en lámina galvanizada en laboratorio semillas.	Descripción: aplicación de estuco para interiores en respel.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

	
Descripción: instalación de ventanas corredizas en mosca de la fruta.	Descripción: instalación de ventanas corredizas en mosca de la fruta.
	
Descripción: instalación de ventanas corredizas en mosca de la fruta.	Descripción: aplicación de estuco en cielo raso depósitos.

8. N_2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ICA VALLEDUPAR

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ICA VALLEDUPAR

En el entorno laboral actual, la seguridad y la salud de los trabajadores son pilares fundamentales para garantizar un ambiente productivo y sostenible. Este informe se centra en analizar y evaluar las medidas de seguridad y los procedimientos de salud implementados en el ICA durante el período comprendido entre el 10 de diciembre y el 17 de diciembre, con el objetivo de reforzar las prácticas existentes.

DEFINICIONES:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: conjunto de medidas, políticas, procedimientos y condiciones diseñados y aplicados en un entorno laboral para proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores. Este concepto busca prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y promover el bienestar general de quienes desempeñan sus labores en un lugar determinado.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso que causa una lesión o alteración en la salud del trabajador por causa o con ocasión del trabajo que realiza.

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

EXPOSICIÓN: Situación de exposición a un peligro que se presenta durante un tiempo determinado durante la jornada laboral.

PELIGRO: Todo acto o suceso que tiene potencial de hacer daño.

RIESGO: Es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro.

PROBABILIDAD. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que ha criterio de la organización por su baja frecuencia de ejecución la determine como no rutinaria.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

INSTALACIÓN DE PISO:

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6



INSTALACIONES ELÉCTRICAS



INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS:



CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

APLICACIÓN DE ESTUCO:



RELACIÓN DEL PERSONAL:

En la ejecución de la obra, en la semana comprendida entre el 10 de diciembre al 17 de diciembre fue el que se relaciona a continuación:

Nº	CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	Nº DE CÉDULA	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO
1	DIRECTOR DE OBRA	ALEX OLIVERO GALINDO	18.972.629	CONSORCIO ARAGÓN GTD	9/12/2023
2	RESIDENTE DE OBRA	MARJITH SANTAMARÍA ASCANIO	1.065.816.051	CONSORCIO ARAGÓN GTD	9/12/2023
3	MAESTRO DE OBRA	ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	CONSORCIO ARAGÓN GTD	
4	SISOMA	ADIELA MARTINEZ	49.606.023	CONSORCIO ARAGÓN GTD	
5	TEC. ELECTRI.	JHON FREDY VALDERRAMA	80.226.043	CONSORCIO ARAGÓN GTD	
6	ING INTERVENTORÍA	JAVIER MENESES		CONSORCIO GINVNOVA	21-nov-23
7	ESP. INTERVENTORÍA	ADRIANA CARDENAS		CONSORCIO GINVNOVA	
8	AUXILIAR ADMINI.	KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	ROZAN	21-nov-23
9	AUXILIAR DE OBRA	YEEIRO FONTALVO	77.030.808	ROZAN	21-nov-23
10	AUXILIAR DE OBRA	JOSE MARIO MARTINEZ	1.065.564.629	ROZAN	21-nov-23
11	OFICIAL DE OBRA	PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	ROZAN	21-nov-23
12	OFICIAL DE OBRA	DARWIN DURAN	17.481.790	ROZAN	21-nov-23
13	AUXILIAR DE OBRA	LUIS ALBERTO BLANCHAR	1.065.650.702	ROZAN	21-nov-23
14	OFICIAL DE OBRA	JESUS ALBERTO SILVA	7.639.141	ROZAN	21-nov-23
15	AUXILIAR DE OBRA	FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	ROZAN	21-nov-23
16	OFICIAL DE OBRA	RICARDO CARRASCAL	18.971.902	ROZAN	4-dic-23
17	AUXILIAR DE OBRA	LUIS CARRASCAL	1.065.849.356	ROZAN	4-dic-23
18	AUXILIAR DE OBRA	JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	ROZAN	21-nov-23
19	AUXILIAR DE OBRA	JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	ROZAN	21-nov-23
20	OFICIAL DE OBRA	HEIDER CAMACHO	17.904.433	MACROSUMINISTROS	21-nov-23
21	OFICIAL DE OBRA	ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	MACROSUMINISTROS	21-nov-23
22					
23					

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

Director de obra (1), Ingeniero Residente (1), Maestro de obra (1), Inspector Siso (1), Ingeniero Interventoría (2) Oficiales de Obra (6) Ayudantes de Obra (7) Auxiliar Administrativo del Contratista (1).

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA.

INDUCCIONES:

Durante la semana 4 no hubo ingresos a obra.

CHARLAS DE SEGURIDAD:

Durante la semana 4 y en pro de continuar la sensibilización del personal en materia de seguridad, se realizaron las siguientes charlas de seguridad:

- ✚ Los riesgos de las bromas en el área de trabajo
- ✚ Distracción en el trabajo.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Hasta la fecha, todo trabajador cuenta con los siguientes elementos de protección personal:

- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Mono gafas, (claras y oscuras)
- ✓ Barbiquejo
- ✓ Escafandra
- ✓ Guantes: Tipo ingeniero o caucho
- ✓ Tapa oído: inserción y tipo copa

ORDEN Y ASEO:

El orden y el aseo en una obra de construcción son fundamentales para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad en el desarrollo de los trabajos.



PUNTO ECOLÓGICO:

Este sistema de gestión de residuos tiene como objetivo fomentar y facilitar la separación adecuada de los desechos en diferentes categorías para su posterior reciclaje o tratamiento adecuado.

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6




EQUIPOS DE EMERGENCIAS:

Estos equipos, están diseñados para ayudar en la gestión y resolución de emergencias, minimizando sus efectos y protegiendo a las personas, propiedades y el medio ambiente.



AUSENTISMO LABORAL:


El ausentismo laboral se refiere a la ausencia no planificada o la falta de un empleado en su lugar de trabajo durante el horario laboral. Puede ser resultado de diversas razones, como enfermedad, lesiones, emergencias familiares, citas médicas, estrés, agotamiento, falta de motivación, entre otros motivos personales o profesionales.

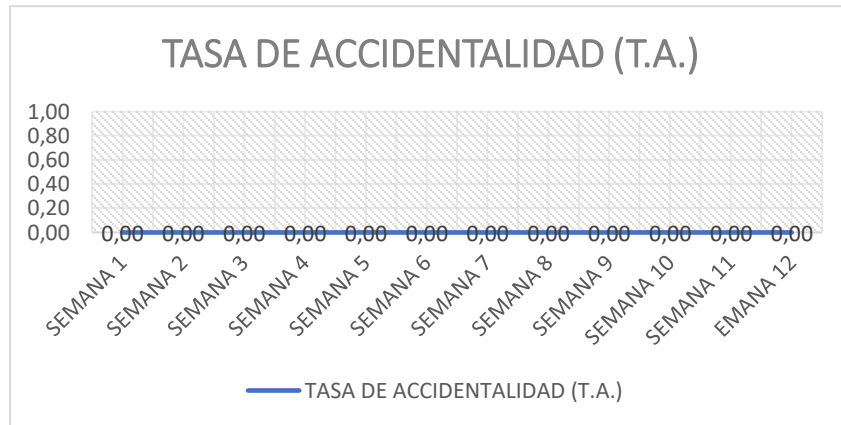

ACCIDENTES LABORALES:

Un accidente de trabajo se define como un evento inesperado, repentino y no deseado que ocurre durante el ejercicio del trabajo o como consecuencia directa del mismo, y que causa una lesión física, enfermedad ocupacional, daño psicológico o la muerte del trabajador.


Durante esta semana NO se presentó evento incapacitante o que ocasionara ausentismo laboral.

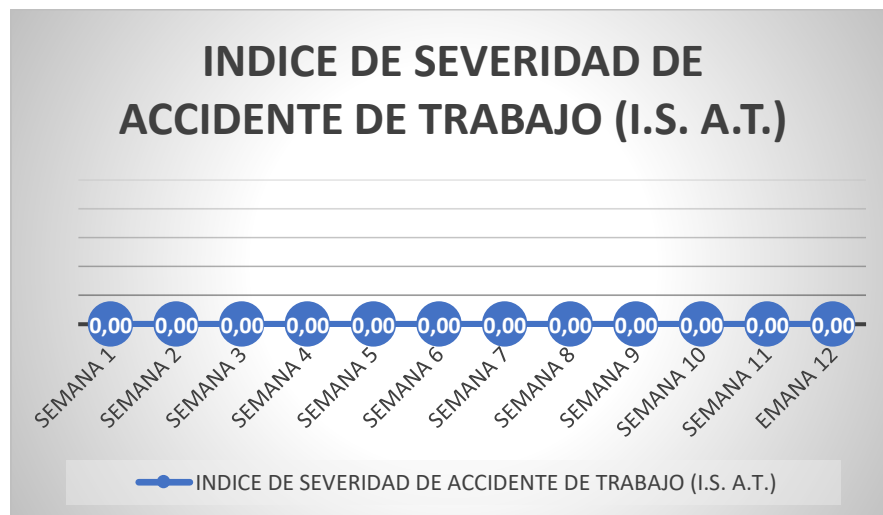

TASA DE ACCIDENTABILIDAD:


La tasa de accidentalidad es un indicador que se utiliza para medir la frecuencia de los accidentes laborales dentro de un entorno de trabajo específico durante un período determinado.

En esta semana no se presentaron accidentes.

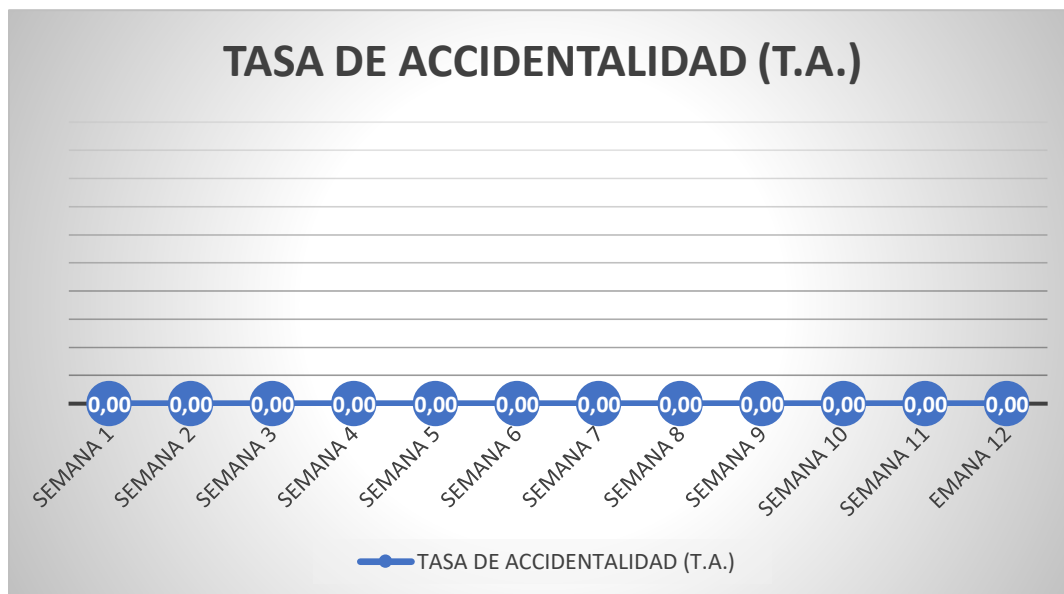

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD:

El ausentismo por enfermedad se refiere a las ausencias de los empleados en el lugar de trabajo debido a enfermedades, ya sean temporales o prolongadas. Estas ausencias pueden ser ocasionadas por diversas razones de salud, como resfriados, gripe, problemas médicos crónicos, enfermedades contagiosas, condiciones de salud mental, entre otras.

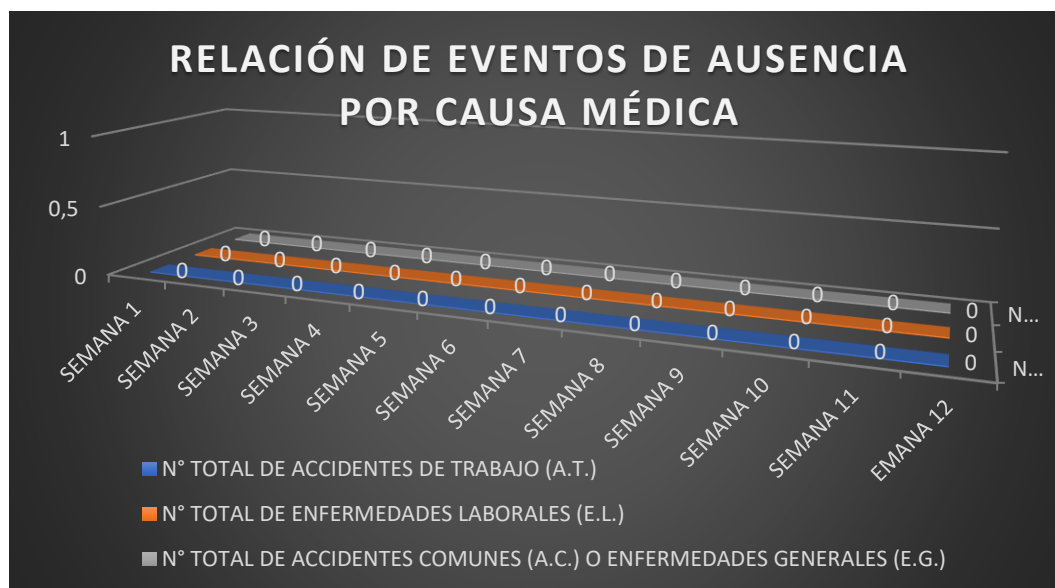

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

HORAS HOMBRE TRABAJADAS:

CONSORCIO ARAGON GTD		REPORTE DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	CODIGO: F-015							
NIT: 901.764.198-6			VERSION: 003							
			FECHA DE INICIO: 21-NOV-202							
NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	HORAS TRABAJADAS POR DÍA semana 4							TOTAL HORAS SEMANA
			L	M	M	J	V	S	D	
ALEX OLIVEROS	18972629	Director de obra	8	8	8	8	8	4		44
MARJITH SANTAMARÍA	1065816051	Residente de obra	8	8	8	8	8	4		44
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	Maestro de obra	8	8	8	8	8	4		44
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	Inspector Siso	5	5	5	5	5	4		29
JHON FREDY VALDERRAMA	80.226.043	Tec. Electrico	8	8	8	8	8	4		44
KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	Aux. Admin	8	8	8	8	8	4		44
YEEIRO FONTALVO	77.030.808	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
JOSE MARIO MARTINEZ	1.065.564.629	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
DARWIN DURAN	17.481.790	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
LUIS ALBERTO BLANCHAR	1.065.650.702	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
JESUS ALBERTO SILVA	7.639.141	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
RICARDO CARRASCAL	18.971.902	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
LUIS CARRASCAL	1.065.849.356	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	aux de obra	8	8	8	8	8	4		44
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
HEIDER CAMACHO	17.904.433	Oficial de obra	8	8	8	8	8	4		44
										0
TOTAL HORAS SEMANAL			TAL HORAS SEMANAL							821
TOTAL HORAS MENSUAL										

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

ANEXOS

Pausas activas y charlas de seguridad



CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		LISTADO ASISTENCIA ACTIVIDADES DEL SG SST		Fecha de actualización: 10/03/2023 Versión: 2
Código: F-SST-021				
Fecha: 12-03-2023		Hora: 9:00 am.		
Lugar: ICA - Valledupar.				
Tipo de actividad: Charla, Capacitación, Inducción, Reinducción, Otro Cual? _____				
Nombre de la actividad: Las cargas de las Pumas en el área de trabajo.				
Temas tratados: Las consecuencias de las lesiones y los riesgos de provocar daños y bienes personales.				
ASISTENTES				
Item	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Karen Rodriguez	1010005296	Aux. Administrativo	Karen Rodriguez
2	Luis Blanche	1065650702	Aux. de Obra	Luis Blanche
3	Darwin Duran	17481790	Oficial de Obra	Darwin Duran
4	Yasero Fontalvo	77030808	Aux. de Obra	Yasero Fontalvo
5	Francisco Puzbano	1121001466	Aux. de Obra	Francisco Puzbano
6	Pedro Puerto	1065852365	Oficial de Obra	Pedro Puerto
7	Jander Fonseca	1065650389	Aux. de Obra	Jander Fonseca
8	Jose Martinez	1065564629	Aux. de Obra	Jose Martinez
9	Ricardo Carrascal	18971902	Oficial de Obra	Ricardo Carrascal
10	Jesús Silva	7639141	Oficial de Obra	Jesús Silva
11	Luis Carrascal	1065899356	Aux. de Obra	Luis Carrascal
12	Jose Zambano	12621086	Aux. de Obra	Jose Zambano
13	Alfonso Flores	80226043	Tec. Electrico	Alfonso Flores
14	Alex Olivera G.	18972629	Director de Obra	Alex Olivera G.
15				
16				
17				

CONSORCIO ARAGÓN GTD NIT: 901.764.198-6	LISTADO ASISTENCIA ACTIVIDADES DEL SG SST	Fecha de actualización: 10/03/2023 Versión: 2		
Código: F-SST-021				
Fecha: 14 de Dic 2023.		Hora: 9:00 am.		
Lugar: ICA - Valledupar.				
Tipo de actividad: Charla Capacitación Inducción Reinducción Otro Cual? _____				
Nombre de la actividad: La Distracción en el trabajo.				
Temas tratados: - Las Consecuencias inmediatas.				
ASISTENTES				
Item	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Luis Carrascal	Ayudante de Obra	1065899356	Luis Carrascal
2	Jesús Silva	Oficial de Obra	7639141	Jesús Silva
3	Ricardo Carrascal	Oficial de Obra	18971902	Ricardo Carrascal
4	Jose Martinez	Ayudante de Obra	1065564629	Jose Martinez
5	Jander Fonseca	Ayudante de Obra	1065650389	Jander Fonseca
6	Pedro Puerto	Oficial de Obra	1065852365	Pedro Puerto
7	Francisco Puzbano	Ayudante de Obra	1121001466	Francisco Puzbano
8	Yasero Fontalvo	Ayudante de Obra	77030808	Yasero Fontalvo
9	Darwin Duran	Oficial de Obra	17481790	Darwin Duran
10	Luis Blanche	Ayudante de Obra	1065650702	Luis Blanche
11	Karen Rodriguez	Aux. Admin.	1010005296	Karen Rodriguez
12	Jose Zambano	Ayudante de Obra	12621086	Jose Zambano
13				

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

Inspecciones y preoperacionales:

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS																			
FECHA: 10-03-2023		CODIGO: SG- F-61				VERSION: 003				PAGINA: 1 DE 1											
PERIODO: DEL 10 Dic AL 17 de Dic DEL 2023.																					
PULIDORA N°																					
MARCA: DeWalt								MODELO:													
DESCRIPCION								LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)								✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA								✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (5800)								✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LA TAREA								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)								✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR								✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS								✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL DISCO								✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA INSPECTOR HSE								Piedad Martinez													
FUERA DE SERVICIO:																SI ☐ NO ☒					
OBSERVACIONES:																					

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA PROCESO DE MEJORA CONTINUA													
Código: FO-MEJ-48		Versión: 02				Fecha: 30/04/2022									
OCLADOR No 001		MARCA		SERIAL											
MANA DEL 10 de Dic		AL 17 de Dic													
IM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BUJIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Y GUARDA DE LOS PINONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CHOCQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TOYO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TAPON DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	GUARDA DE LOS PINONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* TAMBOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERIO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ELANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BALHERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA	NOMBRE DEL OPERADOR	Jose Martinez													
	NOMBRE DEL SISO	Adela Martinez													
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA				RESPONSABLE				FECHA					
*PUNTO CRITICO QUE INHIBIRIA EL EQUIPO PARA OPERAR															

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

Inspección de equipos de emergencia:

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		INSPECCIÓN DE EXTINTORES					Fecha de actualización: 15/03/2023 Versión: 02
Código: F-557-085							
MARQUE BAJO LA COLUMNA ESTADO LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONVENIONES: Bueno? Regular? Malo? No aplica?							
COMPONENTE A EVALUAR	RESPONSABLE	ESTADO	RESPONSABLE	ESTADO	RESPONSABLE	ESTADO	
FECHA DE INSPECCIÓN	11-Dic-2023						
Ubicación	Almacén						
Exterior	001						
Fecha próxima revisión	1 de Mayo 2024						
Agente extintor	Multipropósito, Sulfato de CO2, Agua, Otro		Multipropósito, Sulfato de CO2, Agua, Otro		Multipropósito, Sulfato de CO2, Agua, Otro		
Carga de extintor	ABC, A, BC, K		ABC, A, BC, K		ABC, A, BC, K		
Capacidad	10 Litros						
Presión de seguridad	Bueno						
Presión de descarga	Bueno						
Mano de transporte	Bueno						
Indicador de presión (manómetro)	Bueno						
Cuerpo (medida: gramos, pulgadas)	Bueno						
Equipo con fecha de última y próxima revisión	Bueno						
Estado de identificación y tipo de extintor	Bueno						
Reserva	Bueno						
Alarma	Bueno						
Almacenamiento de extintor (módulo)	Bueno						
Accesorios	Bueno						
Características	Bueno						
Externa	Bueno						
No total de hallazgos							
3. OBSERVACIONES							

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA				Fecha de actualización: 15/03/2023 Versión: 02
Código: F-557-087						
Ubicación:	Almacén		TIPO: A, B, C...	Responsable de la Inspección:		
Fecha:	11-Dic-2023		Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones W=si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.			
Nº	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20				
2	ESPÁRAMPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD				
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1 paq	2026	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B	1 paq	Marzo 2024	
5	VENDA ELÁSTICA 2X3 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2023	
6	VENDA ELÁSTICA 3X3 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2023	
7	VENDA ELÁSTICA 5X3 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2023	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X3 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2023	
9	VENDA DE ALGODÓN 5X3 YARDAS	1 UNIDAD	B	1 und	2023	
10	PODOPOVOCINA LABÓN QUIRÚRGICO (BOONE)	1 FRASCO X 125ml		X		
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1 und	2024	
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD		X		
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO 250ml	1 UNIDAD		1 und	2026	
14	CRIPS	1 und	B	1 paq		
CAMILLA						
ASPECTO		ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Mal	Regular	N.A	
20	¿La camilla se encuentra visible?	✓				
21	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
24	¿Se encuentra sellada?	✓				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
26	¿Cuenta con correa de seguridad?	✓				

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

Soporte de inducción general.

CONSORCIO ARAGON GTD NIT: 901.764.198-6		LISTADO ASISTENCIA ACTIVIDADES DEL SG SST Código: F-SST-021		Fecha de actualización: 10/03/2023 Versión: 2
Fecha: 23-NOV-2023 Hora: 9:05 AM.				
Lugar: Pálio ICA				
Tipo de actividad: Charla ☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Reinducción ☐ Otro Cual? ☐				
Nombre de la actividad: Inducción de Seguridad				
Temas tratados: Misión, Visión, Políticas, Peligros y Riesgos inherentes asociados a la Construcción, Compromiso con la entidad a intervenir y todos los reglamentos de Seguridad estipulados para el desarrollo de las diferentes actividades.				
ASISTENTES				
Item	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Aníbal	1065650386	Auxiliar	Javier Aníbal
2	Yopier Escobar	1065650386	Auxiliar	Yopier Escobar
3	Rodrigo Rueda	1065852365	Oficial	Rodrigo Rueda
4	Rodrigo Rueda	17491790	Oficial	Rodrigo Rueda
5	Rodrigo Rueda	18981902	Oficial	Rodrigo Rueda
6	Luis Carrasquel	3063849356	Auxiliar	Luis Carrasquel
7	Luis Alberto	106565070	Auxiliar	Luis Alberto
8	Fernando Robano	1.324.001.466	Auxiliar	Fernando Robano
9	Diego Jesús	7639148	Oficial	Diego Jesús
10	José María	1065564629	ayudante	José María
11	Luis Alberto	106565070	ayudante	Luis Alberto
12	Diego Flores	80226043	Tec. Electricista	Diego Flores
13	Heyder Camacho	17909933	Heyder Camacho	oficial de obra
14	Alexander Albis	Alexander	3.574.330-Oficial	Alexander Albis
15	Karen Rodriguez	4042005296	Administrativo	Karen Rodriguez
16	Elkin Rodriguez	12.646.815	Maestro de obra	Elkin Rodriguez
17	John Flores	80226043	Tec. Electricista	John Flores
18				
19				
20				
21				
22				
Nombre Capacitador: Adolfo Martínez			Empresa: Rojan.	
			Firma:	

CONSORCIO ARAGON GTD

NIT: 901.764.198-6

RELACIÓN DEL PERSONAL (INGRESO –EGRESO)

Nombre Completo	CC	Contratista	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
RICHARD LOPEZ	77.170.914	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	21/11/2023	6/12/2023
ALEX ADRIAN OLIVERO	18.972.629	CONSORCIO ARAGON	DIRECTOR DE OBRA	9/12/2023	
MARJITH SANTAMARÍA	1.065.816.051	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	9/12/2023	
DANA CASTILLO	1.121.336.363	CONSORCIO ARAGON	RESIDENTE DE OBRA	21/11/2023	7/12/2023
ADIELA MARTINEZ	49.606.023	CONSORCIO ARAGON	SISOMA	2/11/2023	
JHON FREDI VALDERRAMA	80.226.043	EXTERNO	TÉCNICO ELÉCTRICO	21/11/2023	
ELKIN RODRIGUEZ	12.646.815	ROZAN	MAESTRO DE OBRA	2/11/2023	
PEDRO LUIS PUERTA	1.065.852.365	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
DARWIN DURAN	17.481.790	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	
JESUS SILVA	7.639.141	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	21/11/2013	
MARTIN ESCORCIA	84.049.181	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	27/11/2023	2/12/2023
HERMES GRANADOS	1.065.843.568	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	27/11/2023
LUIS DE JESÚS CARRASCAL	1.065.849.356	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	4/12/2023	9/12/2023
RICARDO CARRASCAL	18.971.902	ROZAN	OFICIAL DE OBRA	4/12/2023	
LUIS RAMIREZ	1.065.567.513	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	27/11/2023	4/12/2023
KAREN RODRIGUEZ	1.010.005.296	ROZAN	AUX. ADMINISTRATIVA	2/11/2023	
FRANCISCO PUSHAINA	1.124.001.466	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
YEEIRO FONTALVO	77.030.808	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
JOSE JAVIER BELEÑO	1.064.718.608	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	4/12/2023
JOSE MARIO MARTINEZ	1.065.564.629	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
LUIS ALBERTO BLANCHAR	1.065.650.702	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	18/12/2023
JAIDER DE JESUS FONSECA	1.065.650.386	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
JOSE LUIS ZAMBRANO	12.621.086	ROZAN	AUXILIAR DE OBRA	21/11/2023	
ALEXANDER JAVIER BERNAL	7.574.730	MACROSUMINISTRO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	
HEIDER CAMACHO	17.904.433	MACROSUMINISTRO	OFICIAL DE OBRA	23/11/2023	
JUAN CANTILLO	1.065.831.699	MACROSUMINISTRO	AUXILIAR DE OBRA		

Cordialmente,



CONSORCIO ARAGON GTD
Nit. 901.764.198-6
GUSTAVO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Representante Legal
