



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



INFORME DE AVANCE NO. 2

CONVENIO 182-2023

OBJETO: IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NARIÑO – MUNICIPIO DE NARIÑO N° 182-2023

Fecha de inicio: 18-04-2023

Fecha de finalización inicial: 18-10-2023

Plazo inicial: 6 meses

Fecha de finalización final: 18-11-2023

Plazo final: 7 meses

CONTRATISTA EJECUTOR ASIGNADO POR EL MUNICIPIO:

A&J INGENIERÍA SAS

NIT. 900768556-4

VALOR:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$139'196.669)

APORTE MUNICIPIO: VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVELTA PESOS M/L (\$28'589.090)

CORNARE: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (110'607.509)

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



SUPERVISIÓN CORNARE:

JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO

TABLA DE CONTENIDO.

Pág.

INTRODUCCIÓN	2
1.1. Descripción general del proyecto.....	3
1.2. Localización del proyecto.	3
1.3. Información general contrato	4
2. ASPECTOS TÉCNICOS.....	4
3. REGISTRO FOTOGRAFICO	5
4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.....	185
5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.....	185
6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.....	186

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene El INFORME FINAL DE OBRA, correspondiente a las obras ejecutadas, Elaborado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato interadministrativo CONI-182-2023 suscrito entre el Municipio de Nariño y Cornare, cuyo objeto es: “IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.”

En este informe se incluyen los aspectos más relevantes que le permitan a CORNARE, o a quien lo consulte, tener una visión general de los trabajos que se ejecutaron.

En el presente informe, se relaciona lo ejecutado en el contrato de obra, en el que se incluye principalmente el registro fotográfico que sustenta las actividades realizadas en los puntos de intervención.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA




1.1. Descripción general del proyecto.

En general las actividades del convenio consisten principalmente en:

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO
Perfilada de talud	m2	169	\$ 4,618	\$ 780,442	780,442	
Estructura en gavión 1x1x1 malla galvanizada triple torción calibre 3mm numero 17	m3	110	\$ 603,507	\$ 66,385,770	55,506,690	10,879,080
Construcción de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización	ml	461	\$ 75,777	\$ 34,933,197	31,564,637	3,368,560
Revegetalización útil para la estabilización de taludes y control de erosión	m2	500	\$ 10,000	\$ 5,000,000	5,000,000	
Construcción cuneta en 'U'	ml	40	\$ 84,214	\$ 3,368,560	3,368,560	
Fundición de concreto 21 mpa (3000 psi), suministro y todo lo necesario para su correcta.	m3	1.0	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	1,000,000	
Geo membrana suministro e instalación.	m2	200	\$ 38,358	\$ 7,671,600	4,171,600	3,500,000
Conducción de aguas de escorrentía que causan procesos erosivos en áreas expuestas	m	40	\$ 47,273	\$ 1,890,920	0	1,890,920
Construcción muro de contención en mampostería confinada	m	5	\$ 865,263.00	\$ 4,326,315	4,326,315	
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	Taller	3	\$ 429,955.00	\$ 1,289,865	400,000	889,865
Apoyo técnico y administrativo	Mes	6	\$ 2,000,000.00	\$ 12,000,000	0	12,000,000
Valla Publicitaria	Valla	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000	550,000	
total:				\$ 139,196,669	\$ 106,668,244	\$ 32,528,425

1.2. Localización del proyecto.

Las obras ejecutadas se encuentran en la zona urbana y rural en el Municipio de Nariño Antioquia.

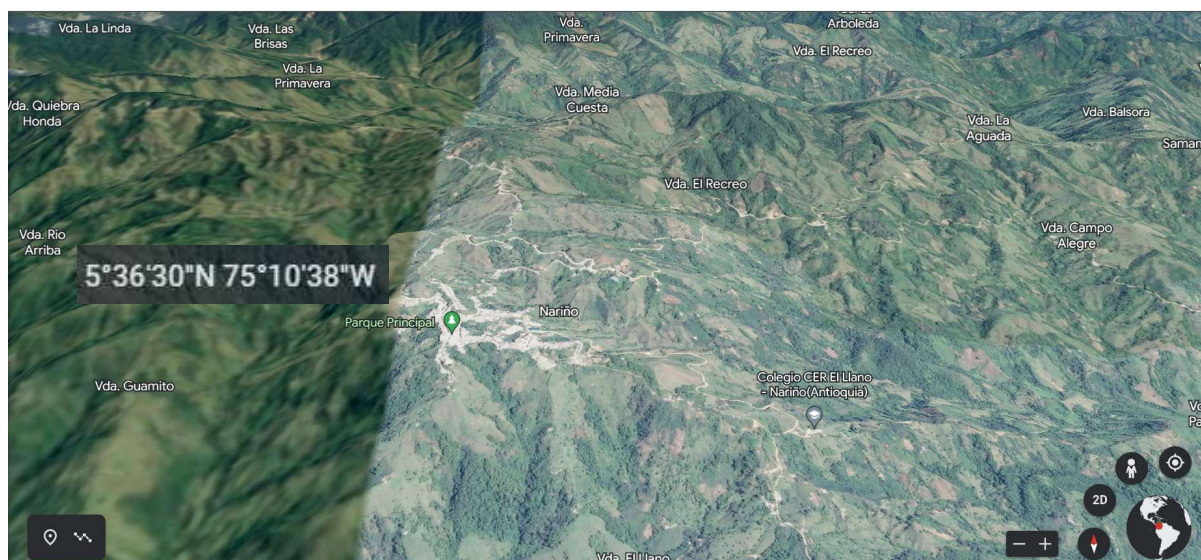

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: **alcaldia@narino-antioquia.gov.co**



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



1.3. Información general contrato

A continuación, se relacionan los datos del contrato

Tabla 1 RESUMEN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCION	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONI-182-2023
OBJETO	IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NARIÑO
CONTRATISTA	A&J INGENIERÍA SAS NIT. 900768556-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO CC. 75.075.556 CEL: 315 4616130
VALOR CONVENIO	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$139'196.669) APOORTE MUNICIPIO: VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVEATA PESOS M/L (\$28'589.090) CORNARE: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (110'607.509)
VALOR CONTRATO OBRA A&J INGENIERÍA SAS	SA-006-2023 CIENTO VEITICETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$127'196.620)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato se establece en siete (07) MESES, contados a partir del Acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal del 2023.
FECHA ACTA DE INICIO	18 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2023

2. ASPECTOS TÉCNICOS.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el presente convenio el cual se especifican unitariamente en el registro fotográfico.

Ítem 1: Para la ejecución de los 110 m3 de muro en sistema gavión se han ejecutado hasta el presente informe se han consolidado 54 m3 del informe N°1 y 46 m3 del presente informe para un total de 100 m3 ya el restante del recurso de 10 m3 se dispondrían a liberación de recursos. El sistema de contención por masa que se ejecuta es el muro gavión el cual consiste en su respectivo solado de 10 cm de espesor en concreto simple, malla gavión 2x1 m triple torsión C. 13 y hueco 10x10, alambre galvanizado C. 14 para las respectivas tensoras, recubrimiento en concreto

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



simple de 0.06 m y los respectivos oídos en el solado; se ejecutan en dos puntos en la zona urbana y uno en la vereda quiebra honda en zona rural del municipio.

Ítem 2. Los tres talleres sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres se realizaron a cabalidad por personal idóneo y las charlas cuentan con sus respectivos refrigerios.

Ítem 3. El municipio de Nariño cuenta con apoyo técnico y administrativo el cual brinda al proyecto con profesional idóneo en ingeniería civil el ing. Heber Morelo Tirado.

Ítem 4. La construcción de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización se ejecutan 15 m de trincho para la contención de talud con cercanía al restaurante de la escuela de la vereda rioarriba.

Ítem 5. La construcción de la cuneta en 'U' se contempla para la conducción de aguas de escorrentía que están afectando el talud al pie del restaurante del centro educativo rural rioarriba.

Ítem 6. El suministro y todo lo necesario para su correcta fundición de concreto 21 mpa (3000 psi). Se contempla para obras complementarias en muro gavión en la vereda quiebra honda.

Ítem 7. La conducción de aguas de escorrentía que causan procesos erosivos en áreas expuestas se contempla para mitigar la problemática de erosión en la vivienda de Olver Castro en vereda quiebra de san juan.

LOS DEMÁS ITEMS NO REALIZADOS SE DISPONEN A DESEMBOLSO.

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el sitio de la obra.

JUAN CARLOS MORALES – BARRIO EL PROGRESO - CEL: 323 2967565

16 m3 de gavión



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA


NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



TALUD ENTRE EL BARRIO SAGRADA FAMILIA Y VILLANUEVA AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD:

6 M3 DE GAVIÓN

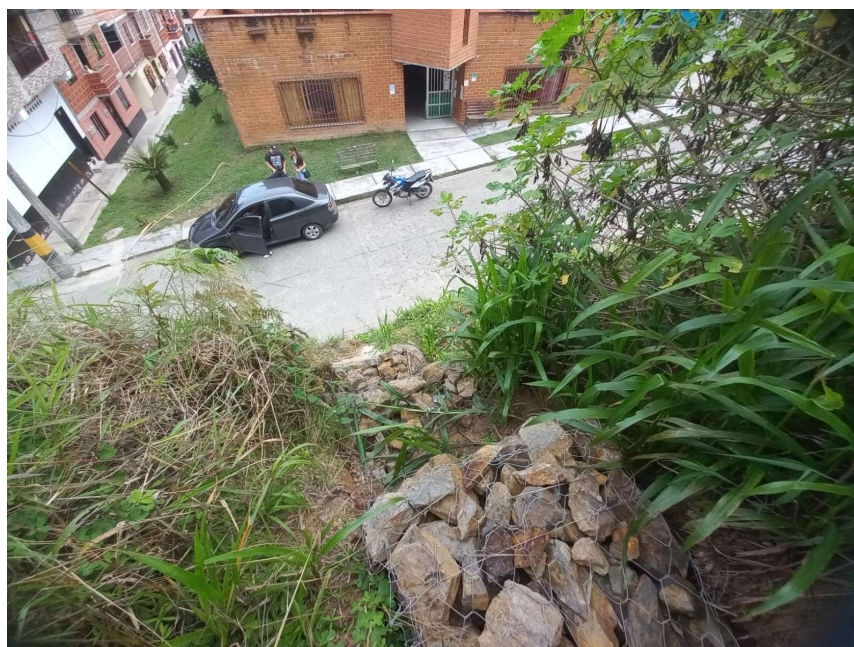

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



ARACELLY GÓMEZ PÉREZ. – VEREDA QUIEBRA HONDA – CEL: 311 7751767

24 M3 DE GAVIÓN y 1 M3 DE CONCRETO PARA SOBRE DIMENSIONAMIENTO DE SOLADO, RECUBRIMIENTO Y PERFILADA DE MURO.



Suministro de piedra

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co




MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



Formaleta de armado de gaviones.

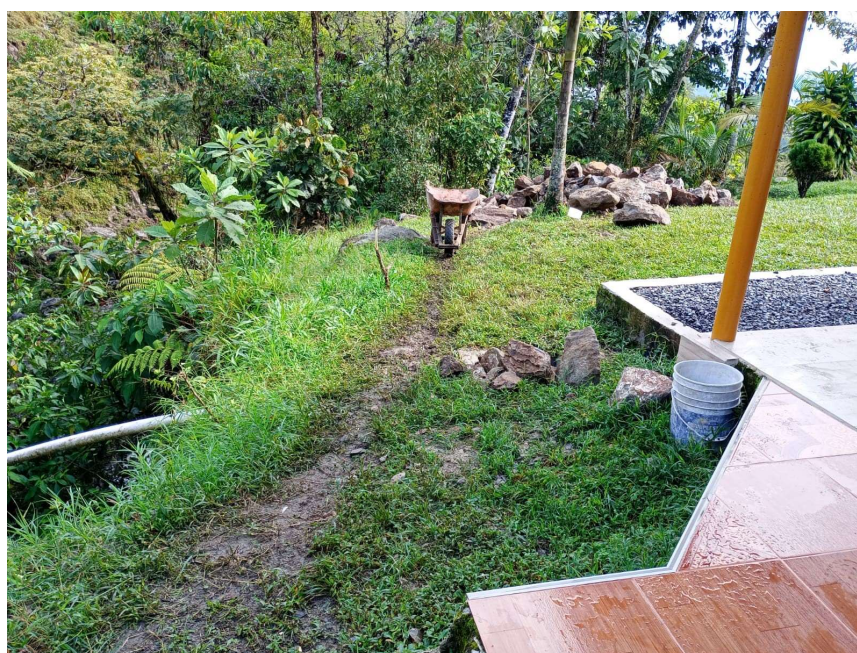

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.


<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA

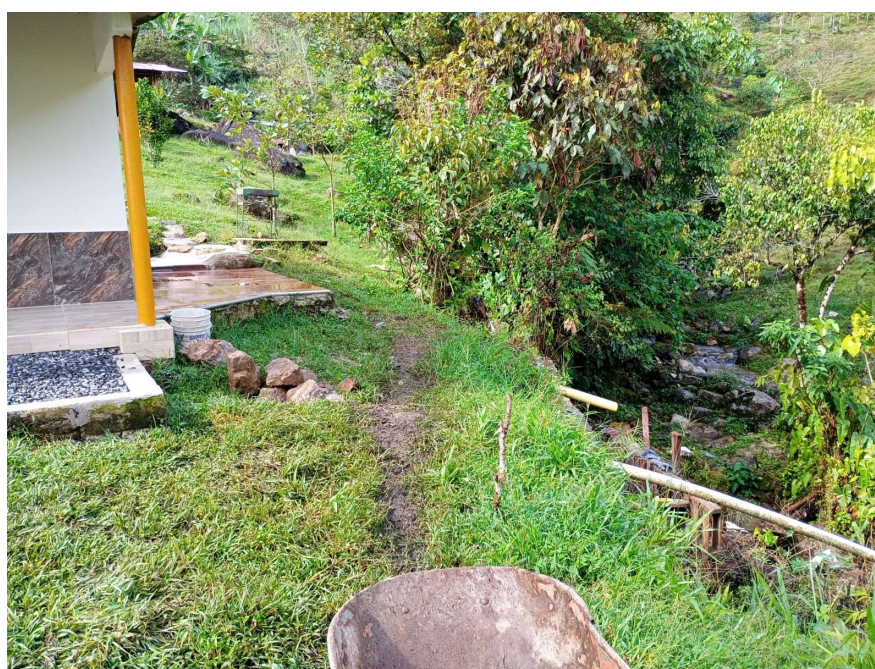

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



C.E.R RIOARRIBA

15 M DE TRINCHO Y 11 M DE CUNETA.



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



OIVER JAIME CASTRO AGUIRRE. CC: 71334403, VEREDA QUIEBRA DE SAN JUAN

40 M DE CONSUCCIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA QUE CAUSAN PROCESOS EROCIVOS EN ÁREAS EXPUESTAS



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co

<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
Convenio 182-2023
REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Taller Sobre Prácticas de Conservación del Suelo y Tipos de Erosión LUGAR: Parque Educativo de Nariño
MUNICIPIO: Nariño CORREGIMIENTO: Cabrera VEREDA: _____
FECHA/HORA: 01/11/2023-9am-12pm GRUPO INTERES*: Comunidad Beneficiaria FACILITADOR: Heber Morelo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	TELÉFONO FIJO	ZONA			SEXO			RANGO EDAD (AÑOS)					CONDICIÓN			
							U	R	M	F	13-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	C	A	D	O
	Amanda Osorio Henandez	218941853			3147430486		X				X						X				
	M ^{rs} Robiela Orozco	21892073			378877091		X				X						X				
	Otilia Rincón Orozco	21102014			310635487		X				X						X				
	Luz Elena Mejía	22098288			314659987		X				X						X				
	Maretha Arias Aguirre	21893382			3123601512		X				X						X				
	M ^a Asenod Quinto	218945910			3113717094		X				X						X				
	M ^a Evangelina García	30344143			3207355092		X				X						X				
	Ruby Pérez Orozco	21894452			3123780945		X				X						X				
	Cecilia Montes	21892325			3206076071		X				X						X				
	Blanca Ocampo	21892643			31169167292		X				X						X				
	Alba Lucia León Pérez	43596337			3147341334		X				X						X				
	Evangelina Giraldo				3147341334		X				X						X				
	M ^a Edilma Galves S				No tiene		X				X						X				
	Otilia Galves de L.	21893233			3128010006		X				X						X				

SIGLAS: U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado
Grupo de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la misma institución.

"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
Convenio 182-2023
REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Taller Sobre Prácticas de Conservación del Suelo y Tipos de Erosión LUGAR: Parque Educativo
MUNICIPIO: Nariño CORREGIMIENTO: Cabrera VEREDA: _____
FECHA/HORA: 01/11/2023-7:30pm-4pm GRUPO INTERES*: Comunidad Beneficiaria FACILITADOR: Diego Medina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	TELÉFONO FIJO	ZONA			SEXO			RANGO EDAD (AÑOS)					CONDICIÓN			
							U	R	M	F	13-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	C	A	D	O
	Doris Martínez Ruiz	218951554	Adulto Mayor		3146125315		X				X						X				
	Ana de Jesús Pérez	21892458			312220374		X				X						X				
	M ^a Luz Elena Estada	21893093			3125641811		X				X						X				
	Martha Irene Mejía	43458666			3105102940		X				X						X				
	Argemiro Jimenez	43330126			3206546972		X				X						X				
	Lila de Jesús Quinto	22108095			3117491634		X				X						X				
	Gloria Ines Herrera L	21893466			3137137818		X				X						X				
	Ara Rosa Martínez P	21894108			3105942017		X				X						X				
	José Jaime Granada	30106977			3135927650		X				X						X				
	M ^a Olga Pamiere	43110031			3106540038		X				X						X				
	Luz Irene Ocampo	21893477			3206106831		X				X						X				
	Ana Graciela Castañeda	218940221			3137364863		X				X						X				
	M ^a Angelica Valencia	21892068			3116694164		X				X						X				
	Gilma Rosa Maria	21893358			3137217057		X				X						X				

SIGLAS: U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado
Grupo de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la misma institución.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA**

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA

**4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.
Estructura en gavion 1x1x1 malla galvanizada triple torsión calibre 3mm número 17	m3	46	\$ 603,507	\$ 27,761,313
Construcción de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización	ml	15	\$ 75,777	\$ 1,136,655
Construcción cuneta en 'U'	ml	11	\$ 84,214	\$ 926,354
suministro y todo lo necesario para su correcta fundición de concreto 21 mpa (3000 psi).	m3	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
conducción de aguas de escorrentía que causan procesos erosivos en áreas expuestas	m	40	\$ 47,273	\$ 1,890,920
taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	glb	3	\$ 429,955	\$ 1,289,865
apoyo técnico y administrativo	mes	2	\$ 2,000,000	\$ 4,000,000

total: \$ 38,005,107**5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

El avance físico del proyecto es de 77.72% teniendo en cuenta el valor ejecutado al dieciocho (18) de noviembre de 2023.

6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que a la fecha la presente corresponde a la primera acta de avance parcial, el avance financiero es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL APOORTE DEL CONVENIO		\$ 139.196.669
Valor Acta Nro. 1		\$ 70.184.641
Valor Acta Nro. 2		\$ 38.005.107
TOTAL SIN EJECUTAR DEL CONTRATO		\$ 31.006.921

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



RESÚMEN FINANCIERO CONTRATO CONI-182-2023		
VALOR DEL CONVENIO	\$ 139.196.669	100.00%
VALOR ACTA N°1	\$ 70.184.641	50.42%
VALOR ACTA N°2	\$ 38.005.107	27.30%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 31.006.921	22.28%

RESUMEN TÉCNICO

1. Las obras se modifican en cantidades respetando los ítems en lo proyectado inicialmente. NO Fue necesario proyectar algunas obras extras.
2. Las obras adelantadas se ejecutaron de acuerdo con el presupuesto y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión.
3. Las herramientas y equipos utilizados fueron aprobadas por la supervisión.
4. La mano de obra calificada está siendo ejecutada por dos oficiales de obra los cuales cuentan con las respectivas prestaciones sociales.
5. La empresa contratista dispone de un residente de obra con una dedicación del 100 %.
6. El municipio de Nariño cuenta con el apoyo técnico y administrativo.
7. **Imprevistos presentados durante la ejecución de la obra:** se contempla el desembolso del 20.28% por falta de ejecución de ítems en el presupuesto.

Para la constancia de lo anterior se firma el día dieciocho (18) de noviembre de 2023.

HÉCTOR DAVID LÓPEZ QUINTERO

Seretario de planeación y desarrollo territorial.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.

<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co
