

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO**

**PROYECTO**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**PERIODO DEL INFORME**

19 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 18 DE ENERO DE 2020

**CONTRATANTE**



ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**CONTRATISTA**

**CONSTRUCTORA MyS**

Bogotá D.C, 18 de Enero de 2020

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**INDICE GENERAL**

**1. COMPONENTE TECNICO**

- 1.1. INTRODUCCION
- 1.2. ANTECEDENTES
- 1.3. AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS
- 1.4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
- 1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO
- 1.6. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
- 1.7. FOTOCOPIA DE LA BITACORA DE OBRA
- 1.8. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS
- 1.9. PERSONAL EMPLEADO
- 1.10. CUADRO DE FLUJO DE INVERSION
- 1.11. CUADRO INVERSION ANTICIPO
- 1.12. ANEXOS

**2. COMPONENTE SST**

**3. COMPONENTE AMBIENTAL**

**4. COMPONENTE SOCIAL**

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

# 1. COMPONENTE TECNICO

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

## **TABLA DE CONTENIDO**

### **1. COMPONENTE TECNICO**

- 1.1. INTRODUCCION
- 1.2. ANTECEDENTES
- 1.3. AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS
- 1.4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
- 1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO
- 1.6. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
- 1.7. FOTOCOPIA DE LA BITACORA DE OBRA
- 1.8. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS
- 1.9. PERSONAL EMPLEADO
- 1.10. CUADRO DE FLUJO DE INVERSIO
- 1.11. CUADRO INVERSION ANTICIPO
- 1.12. ANEXOS

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

## 1.1 INTRODUCCION

El presente informe se presenta para evidenciar el desarrollo de la obra durante el periodo del 19 de diciembre de 2019 hasta el 18 de enero del 2020, teniendo en cuenta los componentes técnicos, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social, para el proyecto "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

| DATOS DEL CONTRATO                         |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE EJECUCION                        |                          |
| Duración de la Obra Inicial                | 6 meses                  |
| Fecha de inicio                            | 17 de julio de 2019      |
| Suspensión N° 1                            | 16 de agosto de 2019     |
| Tiempo de suspensión                       | 10 días calendarios      |
| Prorroga N° 1 a suspensión N° 1            | 26 de agosto de 2019     |
| Tiempo de suspensión prorroga N° 1         | 15 días calendario       |
| Prorroga N° 2 a suspensión N° 1            | 10 de septiembre de 2019 |
| Tiempo de suspensión prorroga N° 2         | 8 días calendario        |
| Fecha de finalización del contrato de obra | 18 de febrero de 2020    |
| VALOR DE EJECUCION                         |                          |
| Valor del contrato                         | \$4.047.764.888          |

## 1.2 ANTECEDENTES

La secretaria de educación suscribió el contrato No CO1.PCCNTR958234 con la firma **CONSTRUCTORA MyS S.A.S**, para la construcción de la planta física Fontana Grande en la localidad de Suba ubicada en la carrera 106b No 151C-92 en la Ciudad de Bogotá, el cual será construido según la propuesta del contratista, de acuerdo con las Especificaciones Generales, Particulares y términos de la propuesta, cumpliendo con las normas según la NSR-10, estudios y recomendaciones técnicas.

El proyecto cuenta con la Licencia de construcción LC-17-4-0399 de la curaduría número 4 con fecha de expedición de 25 de julio de 2017 y fecha de vencimiento el 25 de julio de 2019 y con prorroga según resolución No.11001-4-19-2518 del 30 de agosto de 2019 por 12 meses más.

De acuerdo a exigencias se da inicio a la obra el 17 de julio de 2019 mediante acta, con las actividades de tala autorizada de 10 árboles, descapote e inicio de excavación labor la cual se vio interrumpida por la falta del PMT el cual cuando se

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTORA MyS</b><br><b>NIT 900.361.854-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234</b><br>"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED." |                                                                                     |

solicito fue negado ya que había vencimiento de la licencia de construcción el 25 de julio de 2019, solicitud la cual lleva a cabo la Secretaria de Educación solicitando la debida prorroga ante la curaduría urbana número 4 de Bogotá, dentro de las exigencias del proyecto, la aprobación del PMT-PLAN DE MOVILIDAD Y TRANSITO es indispensable para tráfico de volquetas o maquinaria junto con señalización de alerta de obra y peligro una de las exigencias para su aprobación es tener la licencia de construcción vigente.

#### Gestión para lograr aprobación del PMT

| PMT  |              |                |                                      |                                  |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ITEM | No. RADICADO | FECHA RADICADO | RESPUESTA                            | OBSERVACIONES                    |
| 1    | 198891-2019  | 25-jul         | hubo respuesta hasta el 15 de agosto | Licencia de construccion vencida |
| 2    | 216172-2019  | 13-ago         | 15-ago                               | Licencia de construccion vencida |
| 3    | 220953-2019  | 16-ago         | 22-ago                               | Licencia de construccion vencida |
| 4    | 232312-2019  | 3-sept         | 12-sept                              | Aprobacion PMT                   |

El PMT fue aprobado el 12 de septiembre de 2019 y publicado el 13 de septiembre de 2019 donde da REINICIO AL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL ACTA DE REINICIO DE OBRA No.1 CON FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Se solicita prorroga del PMT el cual fue aprobado a partir del 12 de diciembre y con vigencia de 3 meses.

Una vez entregada toda la documentación técnica por parte de la secretaria se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los temas y componentes del proyecto por parte de los profesionales de la obra y asesores externos donde se han ido encontrando información incompleta y deficiente sobre los temas de:

**Topografía.** Al iniciar actividades la comisión topográfica para la implantación del proyecto en el lote se encontró que el predio vecino Parque Imperial se encuentra 2.0 metros dentro del lote del proyecto en la zona oriental, con un cerramiento en tubo cuadrado apoyado sobre muro bajo en mampostería, esta ubicación se dio por las coordenadas topográficas entregadas por el consultor en sus planos.

Este inconveniente se puso en consideración de la Secretaria de Educación mediante reunión donde se concluyó que la entidad se encargaría con el área

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

jurídica para restablecer este espacio al proyecto que corresponde a zona libre perimetral de la obra.

Se encontró también con la ubicación de los puntos topográficos, el punto nor-oriental está ubicado en tramo de la vía vehicular donde se concluyó que la implantación del proyecto no influía respecto a este punto que corresponde a límite del lote aprobación hecha por secretaria.

Durante el periodo correspondiente al informe N° 2 se ha realizado control de niveles de excavación ya que el nivel de excavación aumento de -0.45m a -1.35m.

Durante el periodo correspondiente al informe N° 3 se realiza control al nivel de excavación, se realiza control de asentamiento a las edificaciones torres 1 y 2 del conjunto Plaza Imperial, y se realiza control al asentamiento de las vías calle 152ª y carrera 106B.

Durante el periodo correspondiente al informe N° 4 se realiza el control de nivel a los llenos de recebo B-200 de cantera, para instalación del geotextil e inicio de suministro y extendido del material aprobado por la SED e interventoría de reciclado similar al B-400. También se realiza la localización de los ejes, se verifica el nivel de excavación del tanque y el nivel de solado o concreto pobre para instalación de acero de refuerzo. Se verifica caudal de los pozos de aguas lluvias y aguas negras, se realiza inspección de nivel de los pozos para saber cota inicial dentro del proyecto, para instalación de tubería.

Durante el periodo correspondiente al informe N° 5 se realiza control de niveles de asentamiento de la vía calle 152 A y en el conjunto residencial cercano a la obra parque plaza imperial torres 1 y 2 en conjunto con la interventoría lo cual se deja anotado en bitácora de obra, se realiza control de nivel de lleno de la tercera y cuarta capa de material de cantera recebo B-400, se realizará la entrega de ejes a interventoría y de niveles de última capa de recebo de cantera B-400. La última capa se realiza control de lleno y seriado cada 3 metros para entregarla a nivel -0.15m para que interventoría la reciba.

**Geotecnia.** Al revisar el estudio de suelos entregado por el consultor se encontraron inconsistencias con los tres apiques del estudio, se solicitó por parte de la ing. Geotecnista del contratista realizar seis apiques adicionales, donde se evidencia perfiles del suelo diferentes a los del sondeo hecho por el consultor donde se encontró en el apique número 6 en costado nor-occidental gran cantidad de basuras lo que implica revisión al tema del relleno para cimentación del proyecto.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."



Como recomendación por parte de nuestra asesora en Geotecnia Ing. Ángela Parra se plantea un mejoramiento total del terreno mediante una capa de rajón de 40cm., una capa de recebo B-200 de 5cm, una capa de SBGB de 60cm, y la losa en concreto de 10cm, esta recomendación se entrega a interventoría para su respectiva evaluación y comentarios por parte del consultor. Por esta recomendación se han realizado varios comités de obra para dar solución conjunta. El 26 de agosto el consultor responde a la recomendación ampliando a un más el concepto de mejoramiento que se había entregado, donde plantea que la conformación del terreno se debe hacer de la siguiente forma:

Capa 1 Relleno granular 80 cm

Capa 2 Geotextil pavco T-2100, sección 330-11 IDU

Capa 3 Material sello 10cm sección 321-11 IDU

Capa 4 Mejoramiento con rajón 30cm sección 321-111 IDU

El 17 de septiembre de 2019 el consultor ratifica su planteamiento para mejoramiento del terreno, donde mediante comité de obra del 19 de septiembre se aprueba por parte de la interventoría continuar con los trabajos de excavación de acuerdo a lo entregado por el consultor ESTUDIO TERRITORIOS (CONSULTOR) estudios realizados por la firma CIG.

La actividad de excavación se había iniciado a una profundidad de 45cm mientras se definía la profundidad real para el mejoramiento del terreno por parte del consultor, esta actividad de excavación se vio afectada por la suspensión de la obra, al día 24 de septiembre se continua con la actividad según documento enviado del asesor, dentro de las actividades habrá mayor cantidad de obra en cuanto a excavaciones, como también NP nuevos con rajón, Geotextil, material seleccionado.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

Definido la estructura del terreno en comité de obra N° 8 se realizará la excavación a los -1.35m. y se utilizará el material de rajón, recebo B-200 como sello del rajón, geotextil NT2100, estamos a la espera de definición del material para la estructura de lleno de 80cm de altura.

En el comité de obra N° 13 del 7 de noviembre nos indican que el relleno a utilizar en la estructura de .80cm es material granular recebo B-400 tanto en material de cantera como reciclado.

Se realiza mezcla del material a utilizar en obra entre el reciclado que se estaba aplicando en obra y nuevo reciclado sub-base tipo B para poder encontrar una homogeneidad en la granulometría del material instalado, ya que el primer material Base B-400 reciclado no estaba cumpliendo la granulometría, se envían los laboratorios con la mezcla realizada 50% material reciclado base B-400 y material reciclado sub-base tipo B, dando los resultados que se cumple con la granulometría, humedad y plasticidad. Se realiza el lleno de las capas 1 y 2 con material reciclado B-400 entre ejes (4-21) (A-F) se cumple a cabalidad con lo requerido en la parte ambiental en cuanto a material reciclado a utilizar en obra, las capas 3 y 4 se realizan con material de cantera B-400 entre

**Estructural:** Según revisión de los profesionales de obra y asesor estructural externo, se encontró falta de información en los planos estructurales estos se encuentran incompletos, falta información en cuanto a cotas, cantidades de flejes por viga, no es clara la información de acero ya que hay vigas que no cumplen con la mínima cuantía, el tanque de agua el concreto solicitado es de 3000psi y por norma debe ser de 4000psi de baja permeabilidad. Las vigas diseñadas de cubierta se encuentran con un espesor de concreto de 10cm, a su vez esta cuenta con unos flejes que por tamaño no cumplen con el recubrimiento de concreto y si cumplieran con el recubrimiento no se podría realizar el fleje ya que sería un fleje de 2cm de ancho, también se evidencio que no está incluida la cartilla de despiece de hierros importante para la figuración y pedidos del mismo.

Las anteriores solicitudes se entregaron a interventoría por medio de oficio SED-SUBA-021 y correos al iniciar el contrato para que fueran enviadas al consultor y a la entidad contratante, estos temas se han tratado en diferentes comités de obra para ser resueltas lo más pronto posible por parte del consultor. Se define realizar la cartilla de acero por parte del contratista ya que el consultor definitivamente no la entrego, estas cartillas se realizarán desde la cimentación hasta la cubierta, y serán entregadas a la medida que las vayamos realizando, igualmente se plantea la solución de manejar los aceros de los muros traslapados para no manejarlos de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTORA MyS</b><br><b>NIT 900.361.854-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234</b><br>"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED." |                                                                                     |

forma completa, se presentara la propuesta a interventoría para la aceptación de este tipo de instalación de aceros.

Se entregó a interventoría los traslapes de aceros de los muros para su aprobación mediante oficio SED- SUBA N° 104 con fecha 30 de octubre de 2019, igualmente se realizó el pedido de acero de vigas de cimentación y tanque.

Se radico a interventoría el detalle de traslapo de acero de los muros mediante oficio SED- SUBA N° 151 con fecha de 07 de diciembre de 2019, para su respectiva aprobación.

Se radica a interventoría el oficio SED-SUBA 189 con fecha de 08 de enero de 2020, el detalle de la placa del tanque, el cual será con espesor de 0.15cm y acero de refuerzo N° 4 en parrilla, interventoría emitió respuesta mediante oficio INT-JUANLOZANO-010 DEL 13 enero de 2020.

**Redes eléctricas:** En revisión que efectuó el asesor eléctrico del contratista se halló lo siguiente: se encuentra vencido el plano de serie 3, por este motivo se realizó reunión en las instalaciones de la Secretaria de Educación con la ingeniera encargada por parte de la SED de los temas eléctricos, llegando a la conclusión que la entidad se encargara del trámite de actualización del plano serie 3, también se evidencio que en el presupuesto no se encuentra la planta eléctrica para el proyecto, por lo tanto este ítem se ingresara como un No Previsto, el estudio de fotometría no cumple con los requerimientos exigidos, por lo tanto se realizara un estudio de fotometría por parte del contratista, se plantea la posibilidad del cambio de colores en algunos sitio del proyecto lo que implica también hacer nuevo estudio de fotometría.

Se está realizando la gestión con firmas especializadas para el estudio fotométrico.

Se recibió la factibilidad de parte de ENEL-CODENSA para la conexión de la provisional de obra y de la definitiva del proyecto, se iniciarán los trámites ante el IDU para los permisos de excavación de la vía de la Carrera 106B ya que debemos realizar la conexión por este punto.

Se presento el estudio fotométrico por parte del constructor, de la firma Hight Light la encargada de realizar el estudio de fotometría del Colegio Juan Lozano Lozano de primera infancia.

**Red hidrosanitaria y de Gas:** En la revisión realizada por nuestro especialista se encontró que no existen diseños de red de gas natural para el proyecto, este inconveniente se informó a interventoría y consultor mediante comité de obra y en oficio SED-SUBA-021, el consultor respondió por medio de comunicado enviado a

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

la Secretaria de Educación, con fecha del 8 de agosto de 2019, donde nos solicita consultar por medio de la interventoría un documento entregado por la consultoría a la secretaria de educación, con fecha de 24 de marzo de 2017 de gas natural informando que se hizo la revisión de los diseños del proyecto y estos se ajustan a los parámetros normativos, este documento es con el único que se cuenta, hacen falta los planos aprobados por gas Natural para poder ejecutar las obras correspondientes al tema de instalación de gas.

El 7 de enero de 2020 salió la disponibilidad de Gas Natural aprobada para el proyecto, la cita para revisión de diseño de Gas Natural, la dieron para el 28 de enero de 2020.

En la parte hidrosanitaria se recibió visita por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO para provisional de obra, ya se radicarón los documentos pertinentes al tema, se instaló cajilla para medidor provisional hacia el exterior para verificación del acueducto. Estamos a la espera de la instalación de la provisional de obra por parte de la EAAB.

Red contra incendio se realizó la revisión a la norma, ya que no se plantean en el proyecto rociadores, sino extintores, se evalúa según el área y uso del establecimiento. Revisada la norma y en reunión entre los dos asesores hidrosanitarios tanto de contratista como de interventoría, se concluye que en el proyecto no son necesarios los rociadores

Realizada la revisión del equipo de bombeo, se establece que hay que cambiar la bomba de red contra incendio, según las indicaciones de los asesores de la parte hidrosanitaria, tanto de interventoría como del constructor.

En oficio INT-JUANLOZANO-163-2019 con fecha 04 de diciembre de 2019 radicado por interventoría se autoriza el cambio de la bomba de red contraincendios, por lo tanto, se presentaran las debidas cotizaciones para la aprobación del nuevo A.P.U., se continúan con los tramites de la provisional de obra ya que la EAAB solicito un documento de entrega del lote por parte del DADEP a la SED, este documento fue enviado vía correo electrónico por el supervisor del contrato el día 2 de diciembre de 2019.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

### **1.3 AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

A continuación, se hace una breve descripción de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2019 hasta el 18 de enero del 2020.

**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS.**

**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**

**SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 2"**

Se realiza la actividad de instalación de niple en el muro entre el tanque de agua de red contraincendios y el cuarto de máquinas.



**SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 1-1/2"**


Se realiza la actividad de instalación de niple en el muro entre el tanque de agua de red contraincendios y el cuarto de máquinas.

**CONSTRUCTORA MyS**  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. C01.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

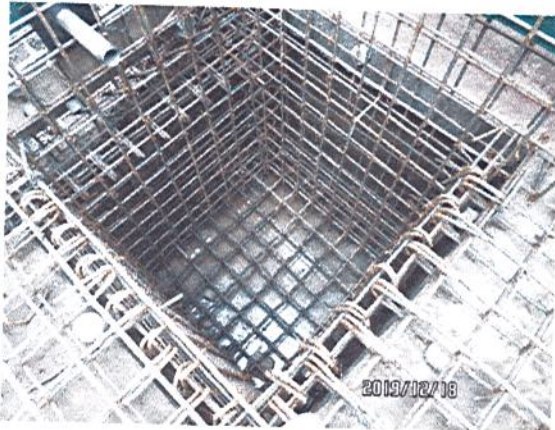

**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100**

Se realiza la actividad de suministro e instalación de geotextil T2100 sobre la capa de recebo B-200, con el fin de instalar sobre el geotextil el recebo B-400 tanto de cantera como reciclado.



**SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO GRANULAR RECICLADO B-400**

Se realiza la actividad de suministro e instalación del recebo reciclado B-400, entre los ejes (A-F)-(3-21) en cuarta capa y tercera capa, este material es utilizado para el lleno y mejoramiento del terreno en esta área ya se ha extendido el geotextil T2100

**CONSTRUCTORA MyS**  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."



**SUMINSTRO E INSTALACION DE RELLENO GRANULAR B-400**

Se realiza la actividad de suministro e instalación del relleno B-400 entre los ejes (A-F) – (3-21) sobre la capa de material reciclado, este material es utilizado en segunda y primera capa del material de lleno y mejoramiento del terreno.



**CONCRETO MUROS TANQUE DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO**


Se hace la actividad de suministro y fundida de concreto de 4000psi impermeabilizado para los muros del tanque con la concretera tremix, el descargue se hace directo al tanque, se deja con sus pases para el equipo de bombeo de la red contra incendio y la cinta PVC de 22 cm, para evitar filtraciones.

**CONSTRUCTORA MyS**  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. C01.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

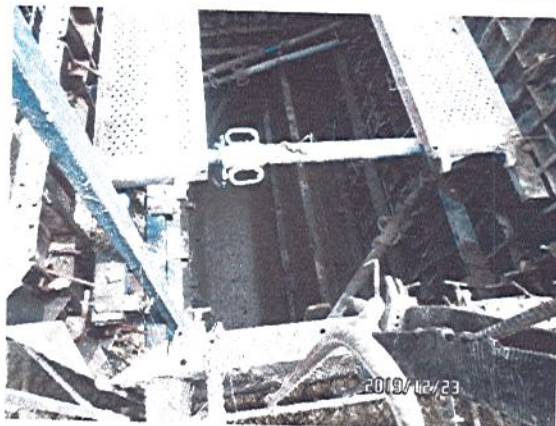

**CONSTRUCTORA MyS**  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**1.4 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PERIODO**

| ITEM         | DESCRIPCION                                                         | UN  | CANT.  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>07</b>    | <b>INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS</b>                   |     |        |
| <b>07-78</b> | <b>CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO</b>                         |     |        |
| 07-78-180    | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 2"     | UND | 1      |
| 07-78-190    | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 1.1/2" | UND | 2      |
| <b>N.P.</b>  | <b>NO PREVISTOS</b>                                                 |     |        |
| N.P. 03      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100                        | M2  | 648.90 |
| N.P. 04      | MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUE DE AGUA E: 0.30 M.         | M3  | 23.18  |
| N.P. 05      | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO GRANULAR B-400 DE CANTERA       | M3  | 310.55 |
| N.P. 08      | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO GRANULAR RECICLADO B-400        | M3  | 588.88 |
|              |                                                                     |     |        |
|              |                                                                     |     |        |
|              |                                                                     |     |        |
|              |                                                                     |     |        |
|              |                                                                     |     |        |

CONSTRUCTORA MyS  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO**

**CONTROL DE NIVELES DE LLENO DE MEJORAMIENTO**



**SLUMP CONCRETO.**



CONSTRUCTORA MyS  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**FUNDIDA DE TANQUE EN 4000 PSI IMPERMEABILIZADO**



**TOMA DE DENSIDADES**



**LLENO DE MATERIAL CON B-400**



CONSTRUCTORA MyS  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**INSTALACION DE GEOTEXTIL NUEVO**



**COMPACTACION DE MATERIAL**



**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA B-400**



**CONSTRUCTORA MyS**  
NIT 900.361.854-6



**CONTRATO No. C01.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**MEZCLA DE MATERIAL RECICLADO B-400**



**INSTALACION DE PASES Y NIPLES**



**APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE MUROS DE TANQUE EXTERIORES**



**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. C01.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**1.6 ENSAYOS DE LABORATORIO.**

Contamos en este periodo con un laboratorio certificado, el cual es Laboratorio G&S, y se recibieron pruebas de proctor de Recebo B-400 tanto de cantera como de material reciclado, se entregan resultados de concreto de 4000psi el cual fue el del tanque, las cuales se adjuntan.

CODIGO:  
VERSIÓN: 01  
FECHA: 8-Jul-14


OBRA: CALLE 152A No. 104-90

MATERIAL: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO  
FUENTE: SUB BASE B-400  
INTERESADO: CANTERA EL CEDRO  
INTERVENIOR: CONSTRUCTORA M Y S  
ING ELSA TORRES ARENALES

NI:   
FECHA MUESTREO: 9-ene-2020  
FECHA ENSAYO: 13-ene-2020  
O. T.: 318-2020  
PROFUNDIDAD:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

| TAMIZ  | NO    | PESO RETENIDO | % PASA |
|--------|-------|---------------|--------|
| 2"     | 0,0   | 0,0           | 100,0  |
| 1 1/2" | 211,1 | 5,9           | 94,1   |
| 1"     | 175,6 | 4,9           | 89,2   |
| 3/4"   | 323,4 | 9,0           | 80,2   |
| 1/2"   | 136,4 | 3,8           | 76,4   |
| 3/8"   | 153,0 | 4,3           | 72,2   |
| No 4   | 494,0 | 13,7          | 58,4   |
| 10     | 651,1 | 18,1          | 40,3   |
| 40     | 612,6 | 17,0          | 23,3   |
| 80     | 302,6 | 8,4           | 14,9   |
| 200    | 298,6 | 8,3           | 6,6    |
| Fondo  | 235,8 | 6,6           | 0,0    |

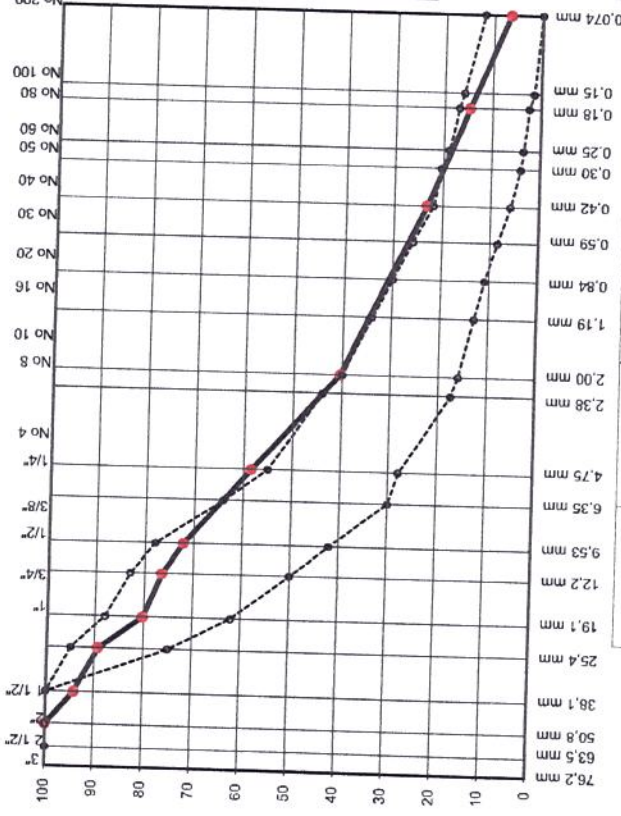

Gravas: 41,6% Arenas: 51,9% Finos: 6,6%

OBSERVACIONES:

Cumple: SI ☒ NO ☐

| Especif.              | Resultado |
|-----------------------|-----------|
| LÍMITE LÍQUIDO        | 25        |
| LÍMITE PLÁSTICO       | 19        |
| ÍNDICE DE PLASTICIDAD | 6         |
| HUMEDAD NATURAL       | 7,8       |

$C_u = 47,1$   $C_c = 1,1$

CLASIFICACIÓN

AASHTO (I.G.): A-1-b (0)  
U. S. C. S.: SW-SM

ERNESTO GARZON  
JEFE DE LABORATORIO


LABORATORISTA

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>G &amp; S</b><br>LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS<br>SAS | RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS<br>(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)<br>UN.V.E - 142 - 13 METODO C | VERSION 1<br><br>8-2013 |
| 0 CALLE 152A No. 104-90                                                           |                                                                         |                                                                                                                               |                         |
| OBRA: COL.FGO JUAN LOZANO Y LOZANO                                                |                                                                         |                                                                                                                               |                         |
| 0 SUB BASE B-400                                                                  |                                                                         |                                                                                                                               |                         |
| MATERIAL: CANTERA EL CEDRO                                                        |                                                                         | FECHA MUESTREO: 9 de enero de 2020                                                                                            |                         |
| FUENTE: CONSTRUCTORA M Y S                                                        |                                                                         | FECHA ENSAYO: 11 de enero de 2020                                                                                             |                         |
| INTERESADO: ING ELSA TORRES ARENALES                                              |                                                                         | O. T. : 318-2020                                                                                                              |                         |

| PRUEBA                                    | 1     | 2     | 3     |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| No. de golpes                             | 56    | 56    | 56    |  |  |  |
| Molde No.                                 | 19    | 19    | 19    |  |  |  |
| Humedad natural muestra (%)               | 6,3   | 6,3   | 6,3   |  |  |  |
| Humedad adicional (%)                     | 1,0   | 4,0   | 7,0   |  |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 6000  | 6000  | 6000  |  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 5622  | 5622  | 5622  |  |  |  |
| Agua adicional, cm <sup>3</sup>           | 60    | 240   | 420   |  |  |  |
| Peso muestra humeda + molde, gramos       | 6656  | 6971  | 6805  |  |  |  |
| Peso molde, gramos                        | 2237  | 2237  | 2237  |  |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 4419  | 4734  | 4568  |  |  |  |
| % humedad (homo)                          | 7,3   | 10,0  | 13,2  |  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 4118  | 4304  | 4035  |  |  |  |
| Volumen del molde, cm <sup>3</sup>        | 2130  | 2130  | 2130  |  |  |  |
| Densidad muestra seca, gr/cm <sup>3</sup> | 1,934 | 2,020 | 1,895 |  |  |  |



Densidad Seca en gr/cm<sup>3</sup>

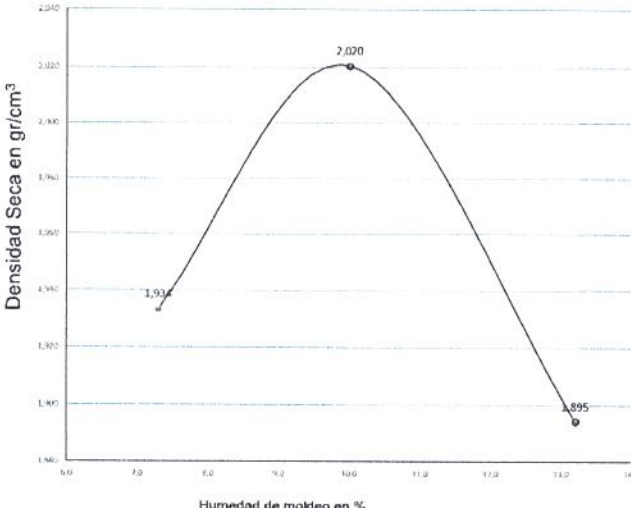Humedad de molde en %

|                  |       |
|------------------|-------|
| DENSIDAD MAXIMA: | 2,020 |
| HUMEDAD OPTIMA:  | 10,0  |

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLO A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

|                                       |                                        |                                |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELABORO: R.M.L.<br>9 de enero de 2020 | DIGITO: M.N.R.T.<br>9 de enero de 2020 | RE-VISO:<br>9 de enero de 2020 | APROBO: E.G.P.<br>9 de enero de 2020 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

CALLE 23A No.96G-04 TELEFONO 4134906 CEL 311-2682862 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D. C.

**G & S**LABORATORIO DE SUELOS,  
PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE. -410

VERSION :01  
8 de julio de 2013OBRA: CARRERA 106B #151C-02  
SECTOR: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA M Y S  
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALESFECHA DE INFORME CORTE : 30 de diciembre de 2019  
FECHA DE INFORME FINAL : 17 de febrero de 2020

| Cilindro | No. | Fecha de toma | Fecha de Rotura | Edad Dias | Resistencia (MPa) | diámetro (mm) | longitud (mm) | area (mm²) | carga (kN) | Resistencia (kg/cm²) | Resistencia (MPa) | Resistencia (P.S.I.) | tipo falla | % avance |                         |
|----------|-----|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-------------------------|
| 1        |     | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28,0              | 191,0         | 204           | 8012       | 204,7      | 261                  | 25,6              | 3722                 | 4          | 81%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 2        |     | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28,0              | 191,0         | 201           | 8012       | 200,3      | 256                  | 25,0              | 3642                 | 4          | 89%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 3        |     | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28,0              | 191,0         | 203           | 8012       | 205,7      | 262                  | 25,7              | 3740                 | 4          | 92%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 4        |     | 23-dic-19     | 17-feb-20       | 56        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 5        |     | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28,0              | 191,5         | 204           | 8091       | 253,4      | 319                  | 31,3              | 4563                 | 4          | 112%     | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 6        |     | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28,0              | 193,3         | 202           | 8373       | 238,2      | 290                  | 28,4              | 4144                 | 4          | 102%     | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 7        |     | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28,0              | 192,5         | 203           | 8252       | 244,6      | 302                  | 29,6              | 4316                 | 4          | 106%     | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 8        |     | 23-dic-19     | 17-feb-20       | 56        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 9        |     | 23-dic-19     | 20-ene-20       | 28        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 10       |     | 23-dic-19     | 20-ene-20       | 28        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 11       |     | 23-dic-19     | 20-ene-20       | 28        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 12       |     | 23-dic-19     | 17-feb-20       | 56        | 28,0              |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 13       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 14       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 15       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 16       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 17       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 18       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 19       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 20       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 21       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 22       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 23       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 24       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 25       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 26       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 27       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 28       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 29       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 30       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 31       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 32       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 33       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 34       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 35       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 36       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 37       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 38       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 39       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 40       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 41       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 42       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 43       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 44       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 45       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 46       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 47       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 48       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 49       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 50       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 51       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 52       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 53       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 54       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 55       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 56       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 57       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 58       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 59       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |
| 60       |     |               |                 |           |                   |               |               |            |            |                      |                   |                      |            |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE |

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

|         |           |        |           |                |
|---------|-----------|--------|-----------|----------------|
| ENLAYO: | R.M.I.    | CRITO: | REVISO:   | APROBÓ: E.G.P. |
| FECHA:  | 30-Dec-19 | FECHA: | 30-Dec-19 | FECHA:         |

CALLE 23A No. 960-23 TELÉFONO 4134806 CEL 311-2687862 3192588979 gylaboratorios@gmail.com BOGOTÁ D.C.



**G & S**  
LABORATORIO DE SUELOS,  
PAVIMENTOS Y CONCRETOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA N.E. 418

VERSION :01  
8 de julio de 2013

---

OBRA: CARRERA 1068 #151C-92

SECTOR: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA M Y S

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DE INFORME CORTE : 30 de diciembre de 2019

FECHA DE INFORME FINAL : 6 de enero de 2020

---

| Cilindro | Fecha de toma | Fecha de Rotura | Edad Dias | Resistencia (MPa) | diametro (mm) | longitudud (mm) | area (mm) | carga (kN) | Resistencia (kg/cm2) | Resistencia (MPa) | Resistencia (P.S.I.) | tipo | % avance | Localizacion de las Muestras |
|----------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|------|----------|------------------------------|
| 1        | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28.0              | 101.0         | 204             | 8012      | 204.7      | 261                  | 25.6              | 3722                 | 4    | 91%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 2        | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28.0              | 101.0         | 201             | 8012      | 200.3      | 255                  | 25.0              | 3642                 | 4    | 89%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 3        | 23-dic-19     | 30-dic-19       | 7         | 28.0              | 101.0         | 203             | 8012      | 205.7      | 262                  | 25.7              | 3740                 | 4    | 92%      | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 4        | 23-dic-19     | 17-feb-20       | 56        | 28.0              |               |                 |           |            |                      |                   |                      |      |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 5        | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28.0              | 101.5         | 204             | 8091      | 263.4      | 319                  | 31.3              | 4563                 | 4    | 112%     | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 6        | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28.0              | 103.3         | 202             | 8373      | 238.2      | 290                  | 28.4              | 4144                 | 4    | 102%     | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 7        | 23-dic-19     | 6-ene-20        | 14        | 28.0              | 102.5         | 203             | 8252      | 244.6      | 302                  | 28.6              | 4318                 | 4    | #DIV/0!  | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |



(1) Cono



(2) Cono hendiduras



(3) Cono y corte



(4) corte



(5) columna

ESQUEMA DE TIPOS DE FALLA

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

ENSAYO R.M.L. 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19

DIGITO M.N.R.T. 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19

APROBO: E.G.P.

ARCHIVO 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19

CALLE 23A No. 96G-23 TELÉFONO 4134806 CEL. 311-2602862 3192588978 [myslaboratorios@gmail.com](mailto:myslaboratorios@gmail.com) BOGOTÁ D.C.



G & S

LABORATORIO DE SUELOS,  
PAVIMENTOS Y CONCRETOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

VERSION :01  
8 de julio de 2013

OBRA: CARRERA 106B #151C-92

SECTOR: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA M Y S

INTERVENIENTOR: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DE INFORME CORTE : 30 de diciembre de 2019

FECHA DE INFORME FINAL : 17 de febrero de 2020

| Cilindro | No. | toma      | Fecha de Rotura | Edad Dias | Resistencia (MPa) | diametro (mm) | longitud (mm) | area (mm) | carga (kN) | Resistencia (kg/cm2) | Resistencia (P.S.I.) | Resistencia tipo | % avance | Localizacion de las Muestras |
|----------|-----|-----------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 8        |     | 23-dic-19 | 17-feb-20       | 56        | 28.0              |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 9        |     | 23-dic-19 | 20-ene-20       | 28        | 28.0              |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 10       |     | 23-dic-19 | 20-ene-20       | 28        | 28.0              |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 11       |     | 23-dic-19 | 20-ene-20       | 28        | 28.0              |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 12       |     | 23-dic-19 | 17-feb-20       | 56        | 28.0              |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 13       |     |           |                 |           |                   |               |               |           |            |                      |                      |                  |          | IMPERMEABILIZADO TANQUE      |
| 14       |     |           |                 |           |                   |               |               |           |            |                      |                      |                  |          |                              |

ESQUEMA DE TIPO DE FALLA



(1) Cono



(2) Cono hendiduras



(3) cono y corte



(4) corte



(5) columnar

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

ENSAYO R.M.L. 30-Dec-19

DIGITO M.R.T. 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19

APROBO: E.G.P.

CALLE 23A No. 96G-23 TELEFONO 4134906 CEL 311-2612862 319258879 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D.C.

ARCHIVO 30-Dec-19

FECHA: 30-Dec-19




**G & S**LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS  
SASRELACIONES DE HUMEDAD - MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)  
I.N.V. E - 142 - 07

Version 1

|             |                                     |                                         |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0           | CALLE 152A No. 104-90               | Equi-13                                 |
| OBRA:       | COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO        |                                         |
| 0           | RECICLADO RECEBO HABANO (MUESTRA 3) |                                         |
| MATERIAL:   | CANTERA LA CALERA                   |                                         |
| FUENTE:     | CONSTRUCTORA M Y S                  | FECHA MUESTREO: 13 de diciembre de 2019 |
| INTERESADO: | 0                                   | FECHA ENSAYO: 14 de diciembre de 2019   |
|             | 0                                   | O. T. : 307-2019                        |

| PRUEBA                                    | 1     | 2     | 3     |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| No. de golpes                             | 56    | 56    | 56    |  |  |
| Molde No.                                 | 19    | 19    | 19    |  |  |
| Humedad natural muestra (%)               | 14.2  | 14.2  | 14.2  |  |  |
| Humedad adicional (%)                     | 1.0   | 4.0   | 7.0   |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 6000  | 6000  | 6000  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 5148  | 5148  | 5148  |  |  |
| Agua adicional, cm <sup>3</sup>           | 60    | 240   | 420   |  |  |
| Peso muestra humeda + molde, gramos       | 6361  | 6514  | 6502  |  |  |
| Peso molde, gramos                        | 2228  | 2228  | 2228  |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 4133  | 4286  | 4274  |  |  |
| % humedad (homo)                          | 15.2  | 18.2  | 21.4  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 3588  | 3626  | 3521  |  |  |
| Volumen del molde, cm <sup>3</sup>        | 2123  | 2123  | 2123  |  |  |
| Densidad muestra seca, gr/cm <sup>3</sup> | 1,690 | 1,708 | 1,658 |  |  |

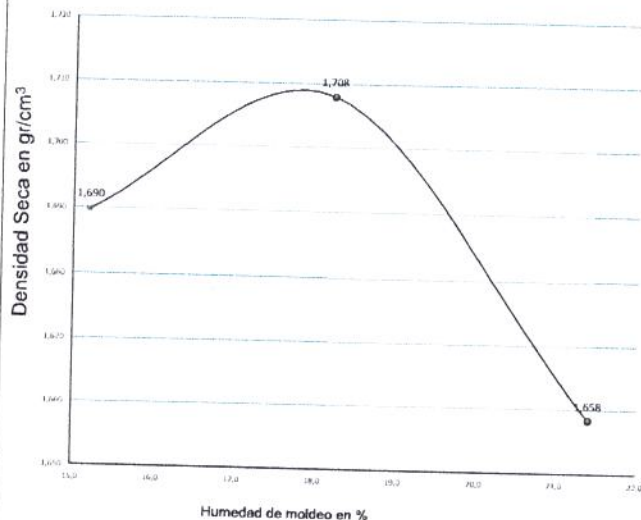


|                  |       |
|------------------|-------|
| DENSIDAD MAXIMA: | 1.708 |
| HUMEDAD OPTIMA:  | 18.2  |

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLO A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

|                                                                                             |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ELABORO: R.M.L.                                                                             | DIGITO: M.N.R.T.        | REVISO:                 | APROBO: E.G.P.          |
| 13 de diciembre de 2019                                                                     | 13 de diciembre de 2019 | 13 de diciembre de 2019 | 13 de diciembre de 2019 |
| CALLE 23A No.95G-04 TELEFONO 4134806 CEL 311-2602862 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D. C. |                         |                         |                         |

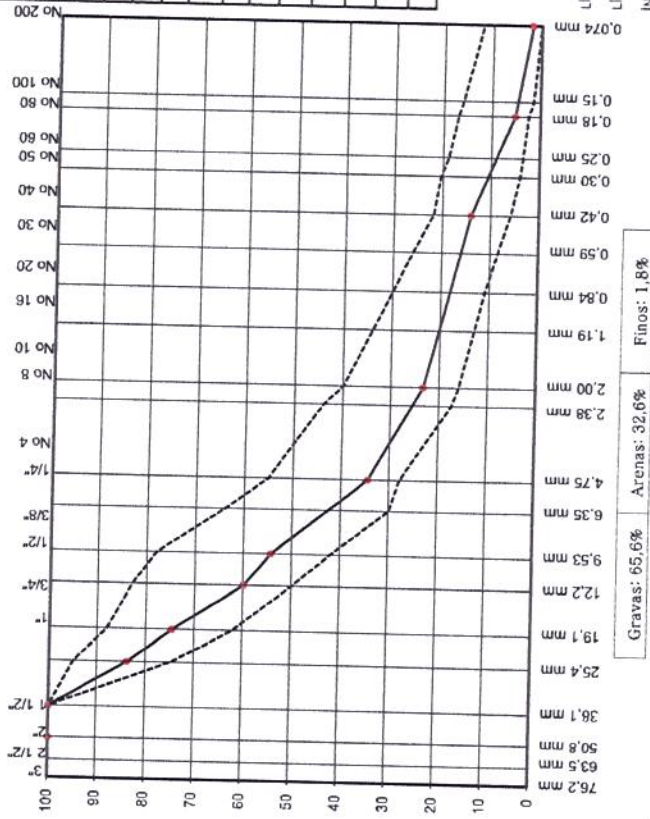

OBSERVACIONES:

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| Gravas: 65,6% | Arenas: 32,6% | Finos: 1,8% |
|---------------|---------------|-------------|

Cumple: ☒ SI ☐ NO

$$C_u = \frac{43,8}{C_c = 3,0}$$


## CLASIFICACIÓN

AASHTO (I.G.): A-1-b (1)  
U.S.C.S.: GP

LABORATORISTA

ERNESTO GARZON  
JEFE DE LABORATORIO

Calle 23 a No 96g - 23 TEL 4134906 -311-260286 3192588979 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D.C.

**G & S**LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS  
SASRELACIONES DE HUMEDAD - MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)  
I.N.V. E - 142 - 97

VERSION 1

0 CALLE 152A No. 104-90

OBRA: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO

0 SUB BASE TIPO B-CARMELITA OSCURO (MUESTRA 2)

MATERIAL: CANTERA EL GRECO

FUENTE: CONSTRUCTORA M Y S


INTERESADO: 0

FECHA MUESTREO: 13 de diciembre de 2019

FECHA ENSAYO: 14 de diciembre de 2019

O. T. : 307-2019

| PRUEBA                                    | 1     | 2     | 3     |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| No. de golpes                             | 56    | 56    | 56    |  |  |
| Molde No.                                 | 19    | 19    | 19    |  |  |
| Humedad natural muestra (%)               | 7,8   | 7,8   | 7,8   |  |  |
| Humedad adicional (%)                     | 1,0   | 4,0   | 7,0   |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 6000  | 6000  | 6000  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 5532  | 5532  | 5532  |  |  |
| Agua adicional, cm <sup>3</sup>           | 60    | 240   | 420   |  |  |
| Peso muestra humeda + molde, gramos       | 6493  | 6665  | 6652  |  |  |
| Peso molde, gramos                        | 2228  | 2228  | 2228  |  |  |
| Peso muestra humeda, gramos               | 4265  | 4437  | 4424  |  |  |
| % humedad (horno)                         | 8,8   | 11,6  | 14,5  |  |  |
| Peso muestra seca, gramos                 | 3920  | 3976  | 3894  |  |  |
| Volumen del molde, cm <sup>3</sup>        | 2123  | 2123  | 2123  |  |  |
| Densidad muestra seca, gr/cm <sup>3</sup> | 1,846 | 1,873 | 1,820 |  |  |

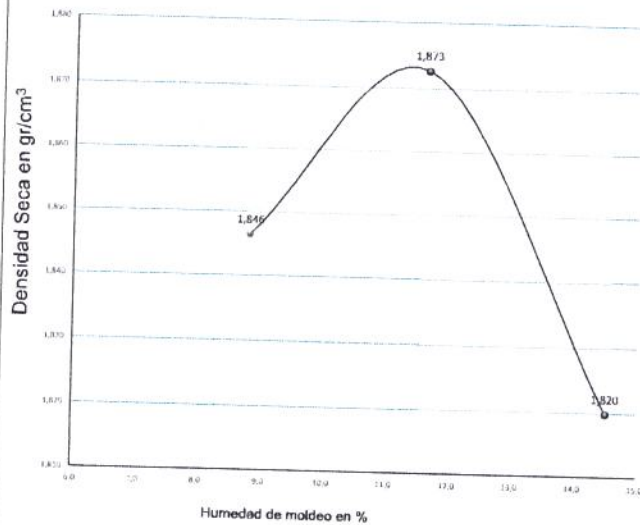


|                  |       |
|------------------|-------|
| DENSIDAD MAXIMA: | 1,873 |
| HUMEDAD OPTIMA:  | 11,6  |

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLO A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

|                                            |                                             |                                    |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ELABORO: R.M.L.<br>13 de diciembre de 2019 | DIGITO: M.N.R.T.<br>13 de diciembre de 2019 | REVISO:<br>13 de diciembre de 2019 | APROBO: E.C.P.<br>13 de diciembre de 2019 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|

CALLE 23A No 366-04 TELEFONO 4134806 CEL 311-2602862 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D. C.

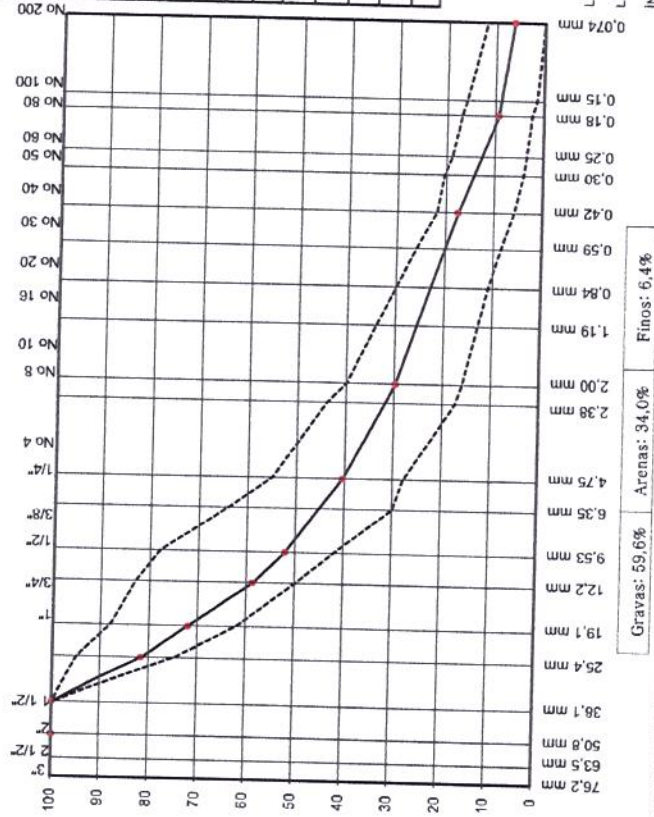

OBSERVACIONES:

PRESENCIA DE MADERA

**Cumple:** ☒ SI ☐ NO

$$C_u = 65,7 \quad C_c = 1,5$$


## CLASIFICACIÓN

AASHTO (I.G.): A-1-b (1)

U. S. C. S.;

LABORATORISTA


ERNESTO GARZON  
JEFE DE LABORATORIO

Calle 23 a No 96g - 23 TEL 4134906 -311-260286 319258979 gyslaboratorios@gmail.com BOGOTÁ D.C.

**G & S**LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS  
SASRELACIONES DE HUMEDAD - MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)  
I.N.V. E - 142 - 97

VERSION 1

|                                              |       |                                         |       |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| CALLE 152A No. 104-90                        |       | B4-12                                   |       |
| OBRA: COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO           |       |                                         |       |
| SUB BASE TIPO B-CARMELITA OSCURO (MUESTRA 1) |       |                                         |       |
| MATERIAL: CANTERA EL GRECO                   |       | FECHA MUESTREO: 13 de diciembre de 2019 |       |
| FUENTE: CONSTRUCTORA M Y S                   |       | FECHA ENSAYO: 14 de diciembre de 2019   |       |
| INTERESADO: 0                                |       | O. T.: 307-2019                         |       |
| PRUEFA                                       |       |                                         |       |
| No. de golpes                                | 1     | 2                                       | 3     |
| Molde No.                                    | 56    | 56                                      | 56    |
| Humedad natural muestra (%)                  | 7,8   | 7,8                                     | 7,8   |
| Humedad adicional (%)                        | 1,0   | 4,0                                     | 7,0   |
| Peso muestra húmeda, gramos                  | 6000  | 6000                                    | 6000  |
| Peso muestra seca, gramos                    | 5532  | 5532                                    | 5532  |
| Agua adicional, cm <sup>3</sup>              | 60    | 240                                     | 420   |
| Peso muestra húmeda + molde, gramos          | 6546  | 6728                                    | 6745  |
| Peso molde, gramos                           | 2228  | 2228                                    | 2228  |
| Peso muestra húmeda, gramos                  | 4318  | 4500                                    | 4517  |
| % humedad (homo)                             | 8,8   | 11,8                                    | 14,8  |
| Peso muestra seca, gramos                    | 3069  | 4025                                    | 3935  |
| Volumen del molde, cm <sup>3</sup>           | 2123  | 2123                                    | 2123  |
| Densidad muestra seca, gr/cm <sup>3</sup>    | 1,859 | 1,896                                   | 1,853 |

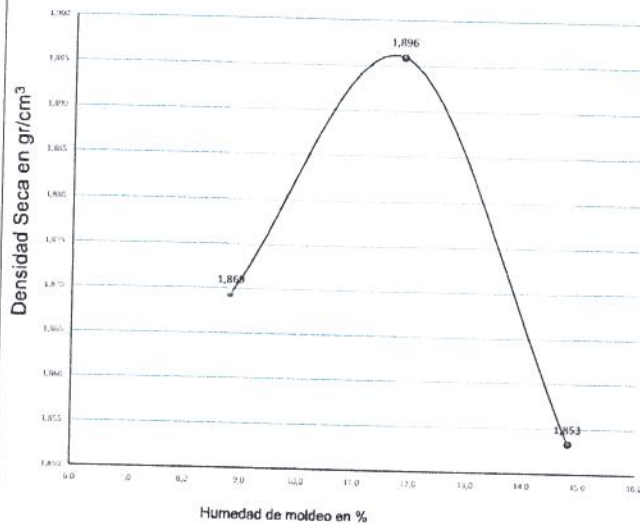

|                  |       |
|------------------|-------|
| DENSIDAD MAXIMA: | 1,896 |
| HUMEDAD OPTIMA:  | 11,8  |

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLO A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

|                                                                                             |                                             |                                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ELABORO: R.M.L.<br>13 de diciembre de 2019                                                  | DIGITO: M.N.R.T.<br>13 de diciembre de 2019 | REVISO:<br>13 de diciembre de 2019 | APROBO: E.G.P.<br>13 de diciembre de 2019 |
| CALLE 23A No. 96G-44 TELEFONO 4134996 CEL 311-2602652 gylaboratorios@gmail.com BOGOTA D. C. |                                             |                                    |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONSTRUCTORA Mys</b><br/> <b>NIT 900.361.854-6</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p align="center"><b>CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234</b></p> <p align="center"><small>"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."</small></p> |                                                                                     |

### **1.7 COPIA DE LA BITACORA DE OBRA.**

En anexos del informe se incluye la copia de bitácora la cual dio inicio el 19 de diciembre de 2019, al 18 de enero de 2020.

Miércoles 18 de Diciembre de 2019.

Clima: mañana soleado

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Tarde: Nublado

1 Arq. Residente obra.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Maestro obra.

1 Vibrocompactador

1 Almacanista. - Aux.

1 minicargador.

1 Topógrafo

1 Cadanero

2 Ayudantes obra

2 operarios maquinaria

Estructura: 1 Maestro encargado

2 oficiales.

5 Ayudantes.

Se inicia armado de formata metálica, para fundida de tanque concreto 4000psi baja permeabilidad, se continua levantando el material reciclado de forma manual para no avariar tanto al geotextil, igualmente se instalara el geotextil nuevo que llega a obra al día de mañana, se acatarán las recomendaciones de interventoría en cuanto a la fundida del tanque, y en cuanto a la solicitud de la formata se realizará esta fundida con la formata que ha llegado a obra, para muros se realizará con la formata en mejores condiciones.

Interventoría obra que se inicia a instalar la formata en el tanque, sin embargo esta llega incompleta y no hay un avance representativo en esta actividad.

Topografía del contratista realiza replanteo de ejes. Durante el día la maquinaria estuvo quieto.

A las 4:30 pm se evidencia que llega un segundo viaje de formata, sin embargo aún está incompleta.



Arq. Residente obra.

\* Jueves 19 de Diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Nublado

1 Maestro obra.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Almacanista Aux

1 Vibrocompactador

1 Topógrafo

1 minicargador.

2 ayudantes obra.

2 operarios maquinaria.

1 Ing. hidrosanitario Asesor.

1 Ing Costos y presupuestos Asesor.

1 Ing Geotecnista asesor.

1 Ing Topografo asesor.

Estructura: 1 Maestro encargado


2 oficiales

5 Ayudantes.

Se continua levantando el material reciclado, para realizar la mezcla 50%-50% con el material sub-basa tipo B ya que las densidades tomadas por nosotros dieron sobre el 100% proctor modificado, se continuara con la mezcla de los materiales reciclados para instalarlos en obra. al dia de hoy llega un geotextil para instalar sobre el que esta instalado en obra como reemplazo de este ya que al retirar el material reciclado instalado este se alcanza a rasgar en algunos puntos. se continua con el armado de formata del tanque, desafortunadamente al proveedor no ha cumplido con la entrega del equipo en obra. por lo tanto el ramamiento de formata en armado no es el mejor. Se continua con el trazado de gas del proyecto. Se realiza comita de obra N° 19, al dia de hoy se reciben 3 viajes de doble troque y un viaje de sencilla de material sub-basa tipo B reciclado para realizar la mezcla con el reciclado que se encuentra en obra.

Por parte de interventoria no se autoriza sobreponer el geotextil nuevo sobre el deteriorado, este ultimo debe ser reemplazado.

En el acta de comite No 18 el contratista tiene el compromiso de suministrar la planta electrica, solicitamos que el compromiso se cumpla, refiriendo que la interventoria no se hace responsable de ningun tipo de sanción debido a que el contratista durante esta semana ha suministrado energia a la obra mediante extensión tipo cable desde las oficinas (cara 3). El compromiso tiene fecha de 19 de diciembre.

  
Arq. Residente obra.

\* Viernes 20 de diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.      Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra.      Tarde: Nublado

1 Maestro obra      Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Almacanista.      1 Vibrocompactador

1 Topógrafo      1 minicargador.

1 Carbanero

2 Ayudantes obra.

2 operarios maquinaria.

Estructura: 1 Maestro Encargado.


2 oficiales

5 Ayudantes.

Se continua levantando el material reciclado, y realizando la mezcla 50% - 50%, se empieza a instalar el material reciclado mezclado en obra sobre el nuevo geotextil que se empezó a instalar, y se retira al geotextil que se encuentra deteriorado. Se continua con el armado de formelata metálica para el tanque hoy termina de llegar al equipo faltante para el armado. Se reciben 3 viajes de doble troque y 3 viajes de volquete sencilla con el material subbase tipo B.

Interventoria cordones que la planta eléctrica no llegó, se retira que esta interventoria no se hace responsable de ningún tipo de conexión que pueda ocasionar al suministro de energía que el contratista realiza mediante extensión desde el campamento administrativo a la obra.

A medida que el contratista extiende geotextil, interventoria va liberando esta actividad verificando trabajos, se realiza extensión del material reciclado B-400 mezclado entre ejes A-F/13-21 con ayuda de topografía.



Arq. Residente obra.

\* Sábado 21 de diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.      Clima mañana: Soleado.

1 Arq. Residente obra.      Tarde: Nublado

1 Maestro obra      Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Residente SST      1 Vibrocompactador.

1 Almacanista.      1 minicargador.


1 Topografo  
1 Cadenaro  
2 Ayudantes obra  
3 operarios maquinaria.

Estructura: 1 Encargado maestro  
3 oficiales  
5 Ayudantes.

Se continua levantando material reciclado y realizando la mezcla del material reciclado, se continua instalando al material reciclado mezclado en obra, se instala geotextil nuevo y se retira el geotextil rogado. Se continua con la instalación de formate metalica para el tanque. Se realizara fundida el dia lunas a partir de las 7:00am.

Interventoria le recuerda al contratista que para la fundida de tanque deben contar con un Coordinador de trabajo en altura, equipos de proteccion contra caidas, linea de vida, todos lo ofuros deben ser certificados, ademas deben realizar una Plataforma segura como arayo para la fundida, cumpliendo con lo anterior se autoriza realizar la fundida.

Interventoria observa que se inicia con la compactacion de la primera capa de 20cm entre ejes A-F/15-21, adicionalmente se instala geotextil y extiende material reciclado mezclado en obra entre ejes A-C/13-18.



Arg. Residente obra.


\* Domingo 22 de Diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arg. Residente obra.

1 Almacanista.

Estructura: 1 Encargado  
3 oficiales.  
5 Ayudantes.

Se realiza la instalacion de formate metalica, esta actividad, queda terminada el dia de hoy, se instalan las plataformas seguras para la fundida del dia de mañana, se deja plomos instalados para revision antes de iniciar fundida. Se deja tequetado los moros del tanque para evitar inconvenientes en la fundida.



\* Lunes 23 de diciembre de 2019

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: soleado

1 Arq. Residente obra.

tarde: soleado

1 Almacanista

Maquinaria: 2 retroexcavadoras

1 Residente SGT

1 vibrocompactador

1 Maestro de obra.

1 minicargador.

1 Topógrafo

1 Cadenaro

2 Ayudantes obra

2 operarios maquinaria

Estructura: 1 Maestro encargado

3 oficiales

5 Ayudantes

El día 23 de diciembre se generaron retrasos en la fundida del tanque porque el contratista no contaba con la documentación para que esta interventoria autorizara la actividad.

El día de hoy se realiza la fundida del tanque, la cual se realizará monolíticamente. Se continúa suministrando material reciclado B-400 para mezclar con el material reciclado que se ha ido levantando. Se continúa con la conformación de la terraza entre ejes (A-F) (16-21) con una capa de zocón de altura. Al día de hoy se reciben 3 viajes de doble troque y 3 de sencillo del material reciclado B-400, la documentación requerida por interventoria para la fundida son los permisos de altura. La actividad de la fundida inició a las 8:30am.

- Interventoria solicita que para realizar la actividad de vaciado de concreto del tanque se tenga la documentación de seguridad completa debidamente diligenciada antes de iniciar la actividad.
- Se presenta retraso en el suministro de concreto lo que genera que esta actividad se demore al rededor de 12 horas generando posible presencia de juntas frías, por lo cual se verificará en el desencofrado de la estructura.
- El contratista no cuenta con la logística necesaria para realizar

la actividad concerniente en: • No ~~tenia~~ tenia lista las plataformas o caminadores para el personal.

- No tenia lista la documentación de seguridad.

- No utilizo bomba estacionaria, y no tenia listas canchales para el vaciado del concreto, por lo que el contratista utilizo tejus de zinc del caramiento.

- No contaba con luminarias para trabajo nocturno.

- La primer mixer llega a la obra alas 6:45 y se inicia su descarque alas 7:40 am

- Se solicita tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el tecnico en concreto de tremix, concerniente a elaboracion de cilindros y condiciones y mantenimiento piscina decorado.

- La última mixer llego 6:15 pm obligando a realizar la actividad en horas de la noche.

- Se observa solo 1 operador para la retro y el vibrocompactador, generando atrasos en la actividad. Se solicita que cada maquina tenga su operador.

La no utilización de bomba estacionaria o autobomba se debe a que la empresa suministradora de concreto no contaba con disponibilidad de servicio para este dia, respecto a las luminarias no se tenían en obra, ya que la actividad de vaciado de tanques se programo para realizarla en medio dia, en ningun momento tremix cumplio con lo programado ya que se habia solicitado despacho de carros cada 45 minutos. y de la planta hicieron al despacho de carros cada 2 1/2 a 3 horas, se tenían en cuenta las recomendaciones del tecnico de concreto de tremix.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

---

\* Martes 24 de Diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima soleado: <sup>Mañana.</sup> Soleado.

1 Arq. Residente obra.

Tarde: soleado.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Maestro obra.

1 Vibrocompactador

1 Residente SST.

1 minicargador.

1 Ing. Representante legal.

1 Topógrafo

1 Cadenero.

2 Ayudantes obra.

2 operarios maquinaria.

Estructura: 1 Maestro Encargado

2 Oficiales

5 Ayudantes.

Se continua con el extendido y compactación de material reciclado B-400, se ratifican los parámetros del tanque, se realiza aso en obra.

- Se reitera que solo se observa un operador para la retro excavadora y el vibro compactador, generando mayor atraso en la actividad de extendido, compactación y mezcla de material granular B-400. Se reitera la solicitud que cada máquina tenga su operador.

- Se reitera que el contratista continua suministrando energía y agua a la obra desde la casa N-3 (campamento administrativo) actividad que puede acarrear sanciones, las cuales son netamente responsabilidad del contratista. De igual manera se reitera que el sitio de obra debe contar con sus instalaciones provisionales. Las provisionales de obra se encuentran en trámite.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

\* Jueves 26 de Diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima: Soleado Mañana

1 Arq. Residente obra.

Nublado Tarde.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Maestro obra.

1 Vibrocompactador

1 Residente SST.

1 minicargador.

1 Ing. Representante legal

1 Topógrafo

1 Cadenaro.

2 Ayudantes obra

1 Ing. Ambiental

1 Ing. Asesor estructural

1 Ing. Asesor Costos y presupuestos.

3 operarios maquinaria.

Estructura: 1 Maestro encargado, 2 oficiales, 5 Ayudantes.

Se continua con el extendido de material reciclado B-400, a igual-  
mente con la mezcla del material reciclado, se realiza el desencofrado del tanque, primero caras externas y luego las caras inte-  
nas del tanque, se informa que las provisionales de obra se encon-  
tran en tramita ante las entidades pertinentes. Se realiza ~~la~~ solicitud de toma de densidades por parte del contratista a inter-  
ventoria para el día de mañana. Viernes 27 de Diciembre.

-Se reitera que solo se observa un operador para la retro excava-  
dora y el vibró compactador, generando mayor atraso en la  
actividad de extendido compactación y mezcla de material granular  
B-400. Se reitera la solicitud que cada máquina tenga su  
operador.

-Se observan 2 filtraciones en los círculos del tanque, al  
igual que hormigueros luego del desencofrado, por lo que  
se solicita realizar las correspondientes reparaciones con un mortero  
epóxico.

-El contratista continua con suministrando energía y agua  
desde la casa N° 31 campamento administrativo. Se reitera que esta  
actividad puede acarrear sanciones y que es responsabilidad del  
contratista. Se les recuerda que el sitio de obra debe contar con  
sus instalaciones provisionales.

Se realizó comita de obra N° 20, el operario N° 2 llega después  
de medio día, contando así con los 3 operadores para la maquinaria.  
Se realizarán las reparaciones correspondientes para el arrigo del  
tanque con el producto que corresponda, para garantizar la permeabi-  
lidad del tanque. Se realizó solicitud de instalación de planta eléc-  
trica, la cual debe llegar el día sábado 28 de diciembre.

*[Firma]*

Arq. Residente.

\* Viernes 27 de diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra. Clima mañana: Soleado.

1 Arq. Residente obra. Tarda: Soleado.

1 Almacanista. Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Maestro obra. 1 Vibrocompactador

1 Residente SST. 1 minicargador.

1 Topógrafo Estructura: 1 maestro encargado.

1 Cadenaro. 2 oficiales.

2 Ayudantes obra: 5 Ayudantes.

3 operarios maquinaria.

Se continua con la mezcla de material reciclado, y se continua con el extendido y compactado de material reciclado B-400, se realizan las reparaciones correspondientes en el tanque con un producto master emaco 548801, para dejar subsanado el tema, y se inicia la aplicación del Igol denso (cemento marino) en la parte externa del tanque, por parte de interventoría se realiza toma de densidades, entre el eje (A-F) (15-21). pasando los resultados entre ejes (A-F) (17-21) y al tramo que se presenta con una densidad baja (92%) se compactara y humedecera para cumplir con lo programado mayor al (95%) se realiza limpieza de formateo para entregar a equipos glisson. El día de hoy se encuentran operando las 3 maquinas.

- Se reitera que solo se observa un operador para la retroexcavadora y el vibro compactador, generando mayor atraso en la actividad de extendido, compactación, y mezcla de material granular B-400. Se reitera la solicitud que cada maquina tenga su operador.

- Se realiza toma de densidades por parte de la interventoría a la primera capa de material granular B-400 entre los ejes (A-F) (15-21). Se autoriza esta primera capa entre los ejes (A-F) (17-21) y (A-D) (15-17) con los siguiente resultados 97.5% - 96.1% - 96% - 96%.

Se rechaza el área entre los ejes (D-F) (17-15) con un resultado de 92.6%, por lo que se le solicita al contratista mayor humedecimiento y compactación.

agua desde la casa N-31 (campamento administrativo). Se recuerda que esta actividad puede acarrear sanciones y que es responsabilidad del contratista. Se les recuerda que el sitio de obra debe contar con sus instalaciones provisionales.

*[Firma]*

Arg. Residente obra.

\* Sabado 28 de diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arg. Director obra.

1 Arg. Residente obra.

1 Almacanista.

1 Maestro obra

1 Residente SST

1 Topografo

1 Carlonero.

2 Ayudantes obra.

3 operarios maquinaria.

Clima: mañana: soleado

Tardecilla: soleado.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras

1 Vibrocompactador

1 minicargador

Estructura: 1 Maestro encargado

2 oficiales.

5 Ayudantes.

Se continua con extendido y compactado de material reciclado, se continua mezclando material reciclado, se inicia a extender segunda capa entre ejes (15-21)(A-F). se realiza antraga de formata metalica con equipos gleason, llega a obra la planta electrica de 20KVA. en los proximos dias se realizara la adecuacion para suministrar de esta la energia para la obra, se aplica la primera capa de igol denso en la parte externa del tanque. para proteccion de humedad externa la estructura. en concreto. se labora hasta las 4:30 de la tarde. se encuentran laborando 3 operarios, uno en la retroexcavadora, uno en el vibrocompactador y uno en el minicargador. los tramites de las provisionales de obra se encuentran en proceso, dependamos de la entidades prestadoras de servicio publico para las conexiones de las provisionales. se solicita toma de densidades por parte de intervencion para el dia lunes en la tarde. se realiza control de niveles.

- El contratista continua suministrando energía y agua desde la casa N-3 (campamento administrativo). Se reitera que esta actividad puede acarrear sanciones y que es responsabilidad del contratista. Se les recuerda que el sitio de obra debe contar con sus instalaciones provisionales.

- Llega a la obra planta eléctrica pero no se a puesto en funcionamiento.

la planta eléctrica llega sobre las 12:00 del día. se adecuara en el transcurso de la semana.

*Julio* Arq. Residente obra

\* Lunes 30 de diciembre de 2019.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima: mañana soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Nublado.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras

1 Maestro obra.

1 Vibrocompactador

1 Residente SST.

1 minicargador.

1 Topografo.

1 Cadanero.

2 Ayudantes obra.

3 operarios maquinaria.

Estructura: 1 Maestro encargado.

2 oficiales.

5. Ayudantes.

Continuamos con extendido y compactado de material reciclado B-400. conformando la segunda capa entre ejes (13-21)(A-F), se aplica la segunda capa de igoldenso en los muros exteriores del tanque, para amparar a conformar elrellano alrededor del tanque. se termina de entregar toda la formelata del tanque de equipos gleason. se realiza toma de densidades por parte de interventoria en primera capa. entre ejes (A-F) (13-15) y (A-3) (9-15). se arma el cuarto de quimicos, se realiza asseo a la obra, se labora hasta las 8:30pm.

- Se realiza toma de densidades por parte de esta interventoria a la continuación de la primera capa de material granular B-400. se toma de nuevo densidad en el área entre los

ejes (D-F) (17-15) con un resultado del 98,1% por lo tanto cumple y se autoriza.

Entre los ejes (A-B) (9-15) se realizaron 3 densidades con los siguientes resultados: 89,8% - 89,3% - 98,4%, por lo tanto se autoriza el área entre los ejes (A-B) (10-15) con el resultado del 98,4%

Entre los ejes (B-D) (13-15) se realizaron 2 densidades con los siguientes resultados: 89,9 - 93,5, por lo tanto no cumplen y se solicita más humedecimiento y mayor compactación.

- El contratista trae planta eléctrica pero a la fecha no se encuentra en operación y continúa suministrando energía y agua desde la casa N°3 (Campamento administrativo). Pido que se reitera que esta actividad puede acarrear sanción y que es responsabilidad del contratista. Se reitera que el sitio de obra debe contar con sus instalaciones provisionales.

- Se realiza verificación de niveles para primera capa de relleno granular B-400 entre los ejes (A-F) (13-15) y (A-B) (11-13).

- El vibrador compactador se encontró descompuesto desde las 13:00.

*Arquitecto. Residente obra*  
\* Martes 31 diciembre 2019

La Interventoría manifiesta su preocupación por no haber trabajado en obra.

El Contratista de obra no tuvo personal de obra este día, no hubo ninguna actividad de obra y por ende ningún avance. Esto genera un aumento en los atrasos de programación de la obra.

\* Jueves 02 de enero 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra    Clima: Mañana: soleado

1 Arq. Residente obra    Tarde: soleado.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Maestro obra.

1 vibrador compactador

1 Residente SST

1 Minicargador.

1 Topógrafo

1 Cadenero.

4 Ayudantes obra.

3 operarios maquinaria.

Se continuó con extendido y compactado de material en primera capa entre ejes (10-14)(A-F) y en segunda capa entre ejes (14-21)(A-F). Con material reciclado, se inicia llano con material reciclado al-  
rededor ~~del~~ del tanque solo se hará una capa, ya que solicitaron  
pruebas de estanquidad al tanque. Se solicita a interventoría reali-  
zar tomo de densidades para el día de mañana viernes 03 de enero  
en horas de la tarde.

- El contratista a la fecha no ha puesto en operación la planta  
eléctrica para el suministro de energía para la obra. De igual  
manera se continúa con el suministro de agua para la  
obra desde la casa N-3 (campamento administrativo). Por lo  
que se reitera que esta actividad puede acarrear sanciones  
y que es responsabilidad del contratista. Se reitera que el  
sitio de obra debe contar con sus instalaciones provisionales  
se realiza comita de obra N° 21.



Arq. Residente obra.

\* Viernes 03 de enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima: mañana soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Soleado.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadoras

1 Residente SST.

2 vibrocompactador

1 Maestro obra.

1 minicargador.

1 Topógrafo

1 Cadenero.

4 Ayudantes obra.

4 operarios maquinaria.

Continuamos con extendido y compactado de material reciclado en prime-  
ra capa entre ejes (10-14)(A-F) y en segunda capa compactando entre ejes.

(14-21)(A-F). con material reciclado, llega a obra al segundo vibrador compactador de 4 toneladas. se realiza toma de densidades por parte de interventoria en segunda capa entre ejes (A-F)(15-21) y en primera capa entre ejes (A-F)(10'-14), en obra se deja funcionar la planta eléctrica, se instalan 2 tanques de agua para mantener en la obra agua para las actividades requeridas. se deja compactar la primera capa de 20cm alrededor del tanque. se tienen programadas densidades por parte del contratista de obra, mañana sábado de enero en horas de la mañana.

- Se revisan niveles con topografía e hilo para la segunda capa de material granular B-400 entre ejes (A-F)(14-21)
- Se realiza toma de densidades por parte de la interventoria a la segunda capa de material B-400 entre ejes (A-F)(14-21) con los siguientes resultados: 98.3% - 95.3% - 97.9% - 95.4% - 97.95.6%, por lo tanto se liberan en segunda capa los ejes en mención.
- Se realizan densidades en los ejes (AF)(14-11) en el área donde están dando los resultados. Los valores de las nuevas densidades son: 97.1% - 98.3%.
- Teniendo en cuenta las densidades tomadas se autoriza por parte de esta interventoria: • primera capa B-400 entre los ejes (A-F)(11-21)
- Segunda capa entre los ejes (AF)(14-21).
- Se le recuerda al contratista que debe tomar sus propios ensayos tal como se solicita en el contrato. Esta interventoria realizará el acompañamiento pertinente dentro de los horarios habituales de obra de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 y sábado de 7:00 a 12:00.
- Se reitera que apesar de que el contratista trae a obra los tanques para el agua de la obra continua tomando el agua de la casa N=3 que funciona como campamento administrativo, por lo tanto se reitera que cualquier tipo de sanción es responsabilidad del contratista.

  
Aro D. J. J.

Sábado 04 de Enero 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde soleado

1 Almacanista

Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Residente SST.

2 v. bro compactador

1 Maestro obra

1 minicargador.

1 Topógrafo

1 Cadanero


4 Ayudantes obra

4 Operarios maquinaria

Continuamos extendiendo y compactando material reciclado B-400 en primera capa entre ejas (3-11) (A-F) y en segunda capa se extiende y compacta entre ejas (10-14) (A-F). Se ~~se realiza~~ <sup>realiza</sup> toma de densidades por parte del contratista. entre ejas (A-F) (10-14) en primera capa dando los resultados sobre el 95% cumpliendo con lo requerido para que interventoria reciba. para continuar avanzando, se programan densidades para el día martes en horas de la mañana. para liberar las terrazas para continuar la actividad de extendido y compactado, se realiza control de nivelación con topografía y se realiza ubicación de ejas.

El tema de suministro de agua se está realizando con el suministro de la casa, ya que actualmente se encuentran en trámite los T.P.O. de la obra, y no hemos recibido respuesta por parte de las empresas prestadoras de servicio Público. El día de hoy se labora en obra hasta las 5:00pm. se deja homectado el recebo. mañana domingo se laborará en ubicación de ejas.

-Se reitera que el contratista continúa suministrando agua a la obra desde la casa N°3 (campamento administrativo), y se le recuerda que la obra debe contar con sus instalaciones provisionales y que cualquier tipo de sanción es responsabilidad del contratista.

  
Arq. Residente obra.

\* Domingo 05 Enero de 2020

Personal obra: 1 Topógrafo

1 Cadenero.

Se realiza ubicación de gas, se elaboran puntos para la ubicación de los gas laboran de 7:00am a 3:00pm.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

\* Martes 07 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Soleado.

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Maestro obra.

2 Vibrocompactador

1 Residente SST.

1 minicargador.

1 Topógrafo.

3 Volquetas.

1 Cadenero

1 Ing. Costos y Presupuesto.

5 Ayudantes obra.

1 Ing Ambiental.

3 operarios maquinaria.

Se termina de mezclar al material reciclado B-400 se realiza toma de densidades en primera capa entre gas (3-10)(A-F) y en segunda capa entre gas (10-14)(A-F). estas densidades se tomaron 7 y todas estuvieron por encima del 95% proctor modificado. se reciben viajes de material B-400 de cantara al cual se empieza a extender. En las densidades tomadas por nosotros damos esperar aproximadamente 3 horas de 1:00pm a 4:00pm para que interventoria nos autorice extender al reciclado de segunda capa entre gas (3-10)(A-F). se controla los niveles de las capas de los llenos con la comisión de topografía. se entrega la disponibilidad de gas a interventoria.

- Realizada la toma de densidades por parte del contratista en las siguientes áreas: • Primera capa entre ejes (10-3)(A-F)  
• Segunda capa entre ejes (14-10)(A-F)

Esta interventoria autoriza estas áreas para continuar con la capa siguiente de material granular B-400 teniendo en cuenta que las densidades son mayores al 95%

según las especificaciones del proyecto.

- Se reitera que el contratista continua suministrando agua a la obra desde la casa N°3 (campamento administrativo), y se le recuerda que la obra debe contar con sus respectivas instalaciones provisionales y que cualquier tipo de sanción es responsabilidad del contratista.

- Se le solicita al contratista caracterización y Proctor del material granular B-400 de cantera que llegó el día de hoy.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

Miércoles 08 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra

Tarde: Soleado

1 Almacanista.

Maquinaria: 2 retroexcavadora

1 Residente SST.

2 Vibrocompactador

1 Topógrafo

1 minicargador.

1 Maestro obra

3 Volquetas.

4 Ayudantes obra.

1 Oficial Electrico.

4 Operarios maquinaria.

Se continua con extendido de material de cantera B-400, se realiza compactación de tercera capa entre ejes (15-21)(A-F) y se inicia extendido y compactado de segunda capa con material reciclado entre ejes (4-10)(A,F). Se recibe suministro de material B-400 de cantera. Se realiza prueba de estanqueidad en el tanque ya que al concreto a 7 días está al 90% con los ensayos, al realizar la prueba. Se nota que presenta fisuras (3) por donde se pasa al agua al cuarto de maquinas de la RCI. La prueba de proctor y caracterización se envía al día de mañana al laboratorio, se controla los niveles de llano con la comisión de topografía. El día de mañana se tomarán densidades en la capa N°3 de material reciclado B-400 de cantera. La prueba de estanqueidad se realiza con un carrotanque de 12m³. Se arma tablero eléctrico N°2. Se realiza retiro de geotextil con la empresa autorizada.

- Se solicita al contratista sellar las filtraciones presentadas en el tanque de agua potable y red contra incendio. Antes de la ejecución de esta actividad se solicita hacer entrega de la ficha técnica del producto a utilizar.
  - Se solicita al contratista realizar los ensayos de laboratorio correspondiente al material B-400 de cantera que está llegando a la obra.
  - Se solicita al contratista mayor humedecimiento y compactación a las capas de material granular B-400 por requerimiento de la interventoría la contratista realiza retiro del geotextil para dar disposición final con empresa autorizada. Para la secretaría de Ambiente, es pendiente entregar certificado de disposición final.
- \* Jueves 09 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

1 Arq. Residente obra.

1 Maestro obra.

1 Almacanista.

1 Residente SST

1 Topógrafo.

1 Cadanero.

3 Apodantes obra.

4 Operarios maquinaria.

Clima mañana: soleado

Tarde: soleado.

Maquinaria: 2 retroexcavadora.

2 vibracompactor

1 minicargador.

3 volquetas.

1 Ing. Asesor Estructural.

1 Ing. Asesor Ambiental

1 Trabajadora Social.

Electrico: 1 oficial electrico.

Se continua con extendido de material de cantera en 3<sup>a</sup> capa y compactación entre gas (A-F) (10-15). Se realiza toma de densidades en segunda capa en gas (A-F) (7-11) y en 3<sup>a</sup> capa entre gas (A-F) (15-21) El día de hoy se reciben 12 viajes de material B-400 de cantera. Se izan los postes de madera donde se instalarán los reflectores y las cámaras, se realiza control de surtido y lleno de material con la comisión topográfica. Se realiza comita de obra. N° 22. Se realiza suministro de agua de los tanques que se tienen en obra para humedecer y compactar al material reciclado.

- Se realiza toma de densidades en la segunda capa entre ejes (A-F) (7-11), se realizan 4 ensayos con una densidad promedio de 99,7%, por lo cual este interventor autoriza esta capa en los ejes mencionados.

- Se realiza toma de densidad en la tercera capa de material granular B-400, se hacen 6 ensayos entre los ejes (A-F) (15-21). Los resultados se encuentran pendientes de verificación por lo tanto deno cumplir con la especificación del 95% mínimo el contratista levantará la capa N=4 y realizará las correcciones necesarias para cumplir con la especificación.

- Se solicita realizar las reparaciones pertinentes al compactador averiado al final de la jornada para no disminuir rendimientos.

~~Julio~~ Arq Residente obra

\* Viernes 10 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: soleado

1 Arq. Residente obra

Tarde soleado.

1 Maestro obra

Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Almacanista.

2 vibrocompactador

1 Residente SST

1 minicargador.

1 Topógrafo

3 volquetas.


1 Cadenero

3 Apudantes obra

4 operarios maquinaria.

Se realiza chequeo de tercera capa de B-400, con nivel precisión, desde el eje 11 al 21 y el A al F. Los cuales cumplen con la tolerancia exigida. Se realiza chequeo de control de asentamiento en el edificio y salón social de conjunto residencial Parque Imperial II, encontrando niveles distintos en cada nivelata de acuerdo a la nivelación inicial. Se concluye que los equipos utilizados anteriormente se encontraban sin la correcta calibración, por lo que se solicita realizar cambio del nivel utilizado en obra ya que presenta el

mismo problema. Nuevamente se solicita realizar los controles de asentamiento cada 15 días.



Omar Díaz Alonso


TOP. INTERVENTORIA ETA



Juan Diego Suarez  
Top. Contratista.

En horas de la tarde la interventoría observa que el electricista realiza instalación de postes para la iluminación. El personal se encontraba sin permisos de trabajo realizando trabajo en alturas, por tal motivo esta interventoría cancela actividades hasta que cuenten con las condiciones de Seguridad y Permisos según normatividad.

- Se solicita al contratista revisar y realizar los traslapes a los que haya lugar en el geotextil, teniendo en cuenta que el tendido y compactación del material B-400 se encuentra en tercera capa. El día de hoy se continúa con suministro, extendido y compactación del material de cantara B-400 en tercera capa entre gajos (A-F) (7-10) las cuales se tomarán densidades al día sábado 11 Enero de 2020, se realiza las reparaciones al tanque con el producto maxplug al cual sella las porosidades del tanque. Se realiza suministro de material y extendido para amparar a conformar capa 4 entre gajos (19-21) (A-D). Se realiza el humedecimiento del material con el agua que se encuentra en el tanque y motobomba. El día de hoy al suministro de la cantara es lento ya que se presenta bastante represamiento de volquetas. Solo llegan 6 viajes de volquetas. Llegan los resultados de concreto del tanque a 14 días los cuales serán entregados a interventoría. Se labora hasta las 6:00pm.



Arq. Residente obra.

\* Sábado 11 de ~~Febrero~~ Enero de 2020

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

1 Arq. Residente obra

1 Almacanista

Clima: mañana soleado

Tarde soleado.

Maquinaria: 2 retroexcavadora

1 Residente SST  
1 Maestro de obra.

1 Topógrafo  
1 Cadanero.

3 Ayudantes obra.

4 Operarios maquinaria.

2 Vibrocompactadoras.

1 minicargador.

3 Volquetas.

Estructura: 2 oficiales.

1 Ayudante.

Eléctrico: 1 oficial.

Laboratorio: 1 Toma densidades.

-El contratista realiza 6 ensayos de toma de densidades en la tercera capa de material granular B-400 entre los ejes (A-F) (11-7). Los cuales se encuentran pendientes de verificación hasta tener el resultado del Proctor. Se reitera al contratista que de no cumplir con los resultados solicitados, según las especificaciones del proyecto se levantará la capa y se realizarán las correcciones necesarias para cumplir con la especificación. Se continúa con el suministro de material B-400 cantara. se extiende y se deja surcado en capa 4 entre ejes (19.21) (A-F). se compacta desde el eje (7-11) (A-F). para toma de densidades. las cuales se realizan a partir de las 10:00am, se continúa realizando las reparaciones del tanque. El suministro de material de cantara estuvo lento el día de hoy, ya que en cantara trabajan hasta las 11:30am. solo llegaron 6 viajes de Volqueta, se labora hasta las 3:00pm. se realiza control de llenos con la comisión topográfica.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

Domingo 12 de enero de 2020.

Personal obra: 1 Topógrafo

1 Cadanero.

Se realiza ubicación de ejes. se labora de 7:00am a 2:00pm.

*[Firma]*

Lunas 13 de enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director de obra. Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Soleado

1 Residente SST

Maquinaria: 2 retroexcavadoras

1 Almacanista.

2 Vibrocompact

1 Maestro obra.

1 minicargador

1 Topógrafo

3 Volquetas.

1 Cadenero.

3 Ayudantes obra.

~~Estructura~~

4 operarios maquinaria.

Estructura:

2 oficiales.

2 Ayudantes obra.

Eléctrico:

1 Oficial.

Se continúa suministrando, extendiendo y compactando material B-400 de cantera, este material se deja extendido hasta el día (15) (A-F) y se deja seriado y compactado, se realiza la instalación de reflectoras. por la parte eléctrica, se realiza suministro de agua para la obra en carrotanque, al día de hoy se recibe 9 viajes de Volqueta de material B-400, se continúa realizando reparaciones en el tanque, el personal de estructura empieza a seleccionar al acero de las vigas. Se controlan niveles de seriado y lleno con la comisión de topografía, a la obra llegan 80 bultos de cemento y 4 tanques de agua, para  $3 \text{ mts}^3$  mas para mantener la obra con agua ya que al carrotanque dejó  $14 \text{ mts}^3$  de agua los cuales se dejan en el tanque. acopiados la planta eléctrica ya está en funcionamiento.

- Se reitera hacer la entrega de los resultados de laboratorio al material granular B-400 de cantera, teniendo en cuenta que a la fecha se han realizado densidades a las capa N=3 y no se cuenta con el valor del proctor para determinar si las densidades cumplen con las especificaciones del Proyecto.

- Se solicita al contratista tomar medidas correctivas en los porosos de la excavación del tanque, debido a que

la arcilla perdidos su humedad natural se encuentra totalmente seca y se pueden presentar derrumbes de las paredes en mención. De presentarse derrumbe de las paredes de la excavación el contratista asumirá el costo del relleno adicional que se genere.

*Julio Pulgar*

Arq. Residente obra.

Martes 14 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: soleado.

1 Residente SST

Maquinaria: 2 retroexcavadora.

1 Almacanista.

2 Vibrocompactador

1 Maestro obra.

1 minicargador.

1 Topógrafo.

3 Volquetas.

1 Cadenero

3 Ayudantes obra.

4 operarios maquinaria.

Estructura: 2 oficiales.

2 Ayudantes

Eléctrico 1 oficial.

Se continúa con el suministro, extendido y compactación del material ~~reciclado~~ B-400 de cantara, este material hoy se deja extendido, se riado y compactado del gja (8-15) (A.F). Se continúa seleccionando al acero de las vigas de cimentación, se define con interventoría en cuanto fljas de las vigas realizar la distribución de manera uniforme entre los ejes o las caras de viga, cumplir que se realiza por debajo de los 20cm de ser necesario pero nunca por encima de 20cm. esta distribución, se realiza control de seriado y compactación con topografía los reflectores instalados se dejan cableados. Se humedeca al material compactado, al día de mañana se realizará toma de densidades. Se acata la sugerencia de interventoría en cuanto al material alrededor del tanque.

---

Se solicita al contratista mantener al día los mantenimientos de los equipos, especialmente las motobombas teniendo en cuenta que al día de hoy no se ha podido retirar el agua del tanque de la red contra incendio y agua potable para realizar las reparaciones pertinentes a las infiltraciones presentadas.

- Se reitera tomar acciones correctivas a las paredes de la excavación del tanque para evitar derrumbes.

---

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

\* Miércoles 15 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

Clima mañana: Soleado

1 Arq. Residente obra.

Tarde: Nublado.

1 Residente SST

Maquinaria: 2 retroexcavadoras.

1 Almacanista.

2 Vibrocompactadoras

1 Maestro obra.

1 minicargador.

1 Topógrafo

3 Volquetas

1 Cadanero

1 Asesor Topógrafo.

3 Ayudantes obra.

4 operarios maquinaria.

Estructura: 30 Oficiales.

2 Ayudantes.

Eléctrico: 1 Oficial


1 Ayudante.

Se continúa con suministro, extendido, sariado y compactado de material 0-400 de cantara para conformación de última capa, entre ejes (A-F) (5-8) se continúa seleccionando acero de las vigas de cimentación, se realiza toma de densidades entre ejes (17-21) (A-F) de cuarta capa y en los ejes (3-7) (A-F) de 2da y 3ra capa, se continúa con las reparaciones del tanque. se instalan cables para el suministro de las cámaras.


\* Se realiza chequeo de la cota final correspondiente al B400 (2553.000), se encontraron puntos altos y bajos, de manera que no cumple con la tolerancia exigida. Se solicitó corregir para una nueva verificación.

  
OMAR DÍAZ ALONSO.

TOP. INTERVENTORIA ETA.

  
Francisco A. Cumbá  
Topografía M.S.

-Se reitera que para la aprobación de las densidades realizadas a la tercera y cuarta capa de material granular B-400 se debe contar con los ensayos de laboratorio correspondiente.

  
Arq. Residente.

\* Lunes 16 de Enero de 2020

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

1 Arq. Residente obra

1 Almacaniista.

1 Residente SST

1 Maestro obra.

1 Topógrafo

1 Cadenero.

1 Asesor Ambiental

1 Asesor Topógrafo.

3 Ayudantes obra.

4 operarios maquinaria.

Clima: soleado mañana

Tarde Nublado.

Maquinaria: 1 Retroexcavadora.

2 v. bro compactadores

1 minicargador.

2 Volquetas.

Estructura: 3 oficiales

2 Ayudantes.

Hidráulico: 2 oficiales.

Eléctrico: 1 oficial


1 Ayudante.

Se continúa con suministro, extendido, sariado y compactado de material B400 de cantas para conformación de última capa, entre gas (3-5)(A-F) se continúa seleccionando acero de vigas de cimentación, se continúa con repara-

ciones del tanque, se realiza comita de obra N° 23. llega la miniexcavadora a obra para la excavación de vigas, llega a obra el acero de arranque de muros.

- Esta interventoria realiza la verificación de los resultados de densidades tomadas en la tercera capa de material granular B-400 de los días 09-01-2020 y 11-01-2020 entre los ejes (A+B)(7-21), los cuales cumplen con la especificación solicitada de mayor al 95%, Por tanto se libera y avala estas áreas en tercera capa.

- Interventoria toma densidad en la cuarta capa entre los ejes (E-10), (C-D/19), (19-A), (A/16-17), (AB/12-13), (D/14-15), (D-13), (EF-16). Pendiente de result.



Arq. Residente obra.

\* Viernes 17 de Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

1 Arq. Residente obra

1 Almacanista.

1 Residente SST.

1 Maestro obra.

1 Topógrafo

1 Asesor topógrafo

1 Cadenero.

2 Ayudantes obra.

3 Operarios maquinaria.

Clima: mañana: soleado

Tarde: soleado.

Maquinaria: 1 Retroexcavadora

1 miniretroexcavadora.

2 Vibrocompactadoras.

1 minicargador.

1 Volqueta.

Estructura: 1 Maestro Encargado Hidráulico: 2 oficiales.  
2 oficiales.

Eléctrico: 2 oficiales.

Se continua con la reparación del tanque en los puntos donde se presenta fugas o escapes de agua, estos puntos de fuga son mínimos ya que a la fecha se ha reparado un 99% de los puntos de escape, se compacta el recebo B-400 de cantera en ultima capa entre los ejes (3-10)(A-F). para poder realizar toma de densidades, se continua en el proceso de selección de acero para las vigas de cimentación en obra ya contamos con el acero de arranque de muros, y tambien tenemos el acero de todas las vigas de cimentación. Se recibe visi-

la por parte de topografía, de interventoría, para revisión de ejes y niveles de la última capa de acabado B-400 de cantera, para su debida aprobación, y poder dar inicio a la excavación de las vigas. Realizamos visita a obra, cercana a la obra, donde están trabajando con formelata de unispan, para revisar los acabados con los que se funda con dicha formelata metálica, ya que al acabado allí es con concreto a la vista, con formelata de unispan, se realizan observaciones en sitio en cuanto a la formelata, ya que presenta rayaduras, hendiduras, golpes. con pulidora, se solicita que la formelata entregada en obra, deba ser casi nueva, que no calque los detalles.

- Se solicita al contratista realizar o tomar las medidas pertinentes en cuanto a las paredes de la excavación del tanque de agua potable y red contra incendio teniendo en cuenta que ya se presentan desprendimientos de una de las paredes, de igual manera se este tema se trató en el comité de obra del día jueves 16-01-2020. (numeral 13 acta N:23). Por lo tanto se solicita iniciar con el entibado para evitar mayores desprendimientos de las paredes.

- Se realiza visita a obra con personal de Unispan, constructora MES y la interventoría a unas torres de apartamentos en las cuales se encuentran en la construcción de muros a la vista, con el objetivo de observar la formelata metálica y el acabado de los muros. Por lo anterior se presentan las siguientes observaciones:


- 1.- El contratista debe tener en cuenta que el concreto a utilizar debe ser grava fina y con un asentamiento mínimo de 7" pulgadas con el fin de que tenga buena manejabilidad, vibrado, y disminuir casi por completo hormigueros y poros grandes en el concreto.
- 2.- Se observa que la formelata utilizada presenta detalles a causa del uso de pulidora para la limpieza, golpes, hendiduras etc, debido a que estos detalles se reflejan en el terminado final.
- 3.- Se debe tener en cuenta el acabado en los puntos

donde rascan los forclan.

A: Según lo comentado en la visita se requiere el uso de tornillos y no de uras en la unión de los paneles con el fin de evitar rebabas en el acabado final.

Por último la interventoría sugiere y recomienda que los paneles de formaleta a utilizar se encuentren en excelente estado para obtener el acabado que requiere el proyecto evitando reprocesos y demolición de elementos por no cumplir con las especificaciones del proyecto.

- Se solicita al contratista atender las observaciones del topógrafo de la interventoría teniendo en cuenta que en transcurso de la semana del 13 al 19 de enero de 2020 se realizaron 2 visitas el 15-01-2020 y el 17-01-2020 en las cuales no se pudo avanzar en los ejes del proyecto, nivelación cuarta capa de material granular B-400 y con de asentamientos.



Arq. Residente obra.

\* Sábado 18 Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Director obra.

1 Arq. Residente obra.

1 Almacanista.

1 Residente SST

1 Maestro obra.

1 Topógrafo

1 Topógrafo asesor

1 Cadanero.

2 Apudantes obra.

3 operarios maquinaria.

Clima mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Maquinaria: 1 Retroexcavadora

1 mini retroexcavadora

2 Vibrocompactador

1 Volqueta.

Estructura: 1 Maestro encargado obra.

2 Oficiales.

2 Apudantes.

Eléctrico 2 Oficiales

Hidráulico 2 Oficiales.

se continua compactando la ultima capa. de B-400 de cantara. entre los gas (3-10) (A-F). se realiza reparacion de tanque. al dia de hoy se realiza toma de densidades de ultima capa. (9-15) (A-F) se realiza control de niveles de ultima capa, donde se realizara entrega a interventoria de ultima capa con el nivel -0.15cm, donde esta ultima no se entregara o sera recibida si tiene menos del nivel exigido, se realiza verificacion de gas, los cuales se verifican con las coordenadas entregadas por la interventoria. y la entidad, se realiza esta labor hasta las 6 de la tarde. para poder realizar entrega a la interventoria. El dia de hoy es entregado al minicargador y la vibrocompactadora. ya que los tramos que faltan por realizar llanos son apenas entre los gas (1-3) (A-C, E, F). al resto pertenecen al tanque. El personal electrico instala reflectores en obra, instala cableado de camaras de seguridad y de video para iniciar grabacion de avance de obra. Personal hidraulico se encuentra en revision de planos con respecto a la estructura.

- Interventoria solicita al contratista realizar los ensayos de densidades con una profundidad minima de 15cm teniendo en cuenta y reiterando que la capa es de 20cm. Por tal motivo los densidades tomadas (A-F) (15-9) (el dia de ayer viernes 17-01-2020 no se tendran en cuenta para recibir esta area.
- Se reitera que a la fecha el contratista no ha entregado los ensayos de laboratorio para el material B-400.

*[Firma]*

Arq. Residente obra.

\* Domingo 19 Enero de 2020.

Personal obra: 1 Arq. Residente obra      Clima: mañana soleado.

1 Maestro obra.

Tarde: Soleado.

2 Topografo

Maquinaria: 1 Retroexcavadora.

1 Cadenero.

1 miniretroexcavadora.

Estructura: 1 Maestro encargado.

1 Vibrocompactador.

1 oficial

2 Ayudantes.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

## **1.8 RESUMEN DE ACTIVIDADES.**

### **Topografía.**

La comisión de topografía se encuentra en obra controlando los niveles de lleno de mejoramiento de terreno, ya se controló el lleno con rajón y con recebo B-200 entregándolos a interventoría para la instalación del geotextil e inicio de extendido de material reciclado B-400 en primera capa y segunda capa entre ejes (A-F) (3-21) para el mejoramiento del terreno, e igualmente se extiende el material de B-400 de cantera, en tercera y cuarta capa, cada capa se conformó de 20cm de altura, para llegar al nivel -0.15m, nivel en el que debemos fundir la placa de  $e=10\text{cm}$ .

### **Geotecnia.**

Se entrega solución definitiva por parte del consultor para el mejoramiento del terreno reiniciando la actividad el 18 de septiembre después de haber sido aprobado el PMT por la SECRETARIA DE MOVILIDAD y así poder evacuar el material apilado en obra y continuar con la excavación dando paso a las volquetas. Se termina la excavación para iniciar el mejoramiento del terreno con el lleno del rajón con capa de .30m y sello con recebo B-200, se revisa los perfiles de excavación. Se define en comité de obra 13 que el material a utilizar de lleno en la estructura de .80m es recebo B-400, tanto reciclado como de cantera. Se entregan los resultados de laboratorio de cantera B-400 e igualmente se entregaron los resultados del material reciclado a utilizar en obra.

### **Eléctrico.**

Se recibe la factibilidad de obra de la conexión definitiva, este punto es contiguo a donde se realizará la provisional de obra, por lo tanto, se realizará los trámites necesarios ante el IDU, para la solicitud de la licencia de excavación el cual tiene una duración de trámite de 45 días hábiles a partir de la solicitud ante dicha entidad.

Se presentó el diseño de iluminación para cumplir con el tema de lúmenes por espacio y a su vez cumplir con el Retie y Retilap este diseño lo realizo la firma Hight Light. Se iniciarán los trámites ante el IDU, para la licencia de excavación para las conexiones provisional de obra y la definitiva, estamos a la espera del Serie 3 aprobado por Enel Codensa, el cual no lo debe entregar la secretaria de movilidad.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**Hidrosanitario.**

Se realiza reunión entre los consultores hidrosanitarios de la obra e interventoría, donde uno de los puntos más importantes a tratar es el tipo de bomba RCI ya que las especificaciones entregadas por el consultor, no es el tipo de bomba a utilizar en el proyecto.

Es aprobado por interventoría el cambio de la bomba RCI, En oficio INT-JUANLOZANO-163-2019 con fecha 04 de diciembre de 2019 radicado por interventoría se autoriza el cambio de la bomba de red contraincendios, la cual se solicitará las respectivas cotizaciones para la presentación del A.P.U. para su debida aprobación por parte de interventoría y de la SED.

Se continua con los trámites ante la EAAB de solicitud de la provisional de obra, el 2 de diciembre la secretaria de educación nos entrega un documento solicitado por la EAAB, donde se informa la entrega formal del lote por parte de la entidad DADEP quien era la propietaria inicialmente del lote a la SED, lote donde se construye el colegio Juan Lozano Lozano, por parte de la SED.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTORA MyS</b><br><b>NIT 900.361.854-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>CONTRATO No. C01.PCCNTR958234</b><br>"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED." |                                                                                     |

## 1.9 PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO

Se cuenta con personal técnico, administrativo, consultores, contratistas los cuales se describen a continuación:

| PERSONAL ADMINISTRATIVO |         |          |            |                    |
|-------------------------|---------|----------|------------|--------------------|
|                         | NOMBRE  | APELLIDO | CEDULA     | CARGO              |
| 1                       | CARLOS  | PINZON   | 79333178   | DIRECTOR DE OBRA.  |
| 2                       | NELSON  | BOLIVAR  | 79597196   | RESIDENTE DE OBRA. |
| 3                       | JAVIER  | GALEANO  | 79423062   | RESIDENTE SST      |
| 4                       | EMERSON | CARDOZO  | 1110448527 | ALMACENISTA        |
| 5                       | JAIRO   | CASTRO   | 17337406   | AYUDANTE           |
| 6                       | NELSON  | GOMEZ    | 1069128587 | AYUDANTE           |
| 7                       | FREDY   | RIOS     | 3231264    | MAESTRO DE OBRA    |

Asesores en las diferentes especialidades.

|   | NOMBRE      | APELLIDO | CEDULA     | CARGO                          |
|---|-------------|----------|------------|--------------------------------|
| 1 | FRANCISCO   | CARRILLO | 80246500   | ASESOR TOPOGRAFICO             |
| 2 | CAROLINA    | JIMENEZ  | 1032368456 | ASESORA AMBIENTAL              |
| 4 | FLOR ANGELA | PARRA    | 40620346   | ASESORA GEOTECNISTA            |
| 5 | MARGARITA   | ROMERO   | 52827506   | ASESOR SOCIAL                  |
| 6 | CARLOS      | SUAREZ   | 7185013    | ASESOR HIDRAULICO              |
| 7 | NESTOR      | BARRERO  | 79652171   | ASESOR ESTRUCTURAL             |
| 8 | CARLOS      | CUELLAR  | 19459807   | ASESOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO |

## Personal de obra Operarios

| PERSONAL SUBCONTRATISTAS        |   |
|---------------------------------|---|
| OPERARIOS MAQUINARIA EXCAVACION | 1 |
| OPERARIO BOBCAT                 | 1 |
| OPERARIO VIBROCOMPACTADOR       | 2 |
| CONDUCTORES DE VOLQUETA         | 4 |
| TOPOGRAFO                       | 1 |
| CADENERO                        | 1 |
| PERSONAL ESTRUCTURA JGR         | 8 |
| PERSONAL DE VIGILANCIA          | 3 |
| PERSONAL HIDROSANITARIO         | 2 |
| PERSONAL ELECTRICO              | 2 |

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**1.10 CUADRO FLUJO DE INVERSION ANTICIPO**

Se encuentra con los anexos al informe.

**CONSTRUCTORA MyS**  
**NIT 900.361.854-6**



**CONTRATO No. CO1.PCCNTR958234**

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."

**1.12. ANEXOS**



### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CPVC

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía  
Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 1062 (2014)

Sistemas de distribución de agua caliente y fría con tubería plástica de poli (cloruro de  
vinilo) clorado (CPVC)

Chlorinated poly (vinil chloride) (CPVC) plastic hot and cold water distribution systems

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en  
el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC",  
lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit  
criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document,  
which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del  
presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSC-0034-9**  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2000-10-25  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16  
Expiration Date:

**Roberto Enrique Montoya-Villa**  
Director Ejecutivo  
CEO



### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía  
Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 1087 (2016)

Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación  
Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

**Certificado CSC-0034-3**  
Certificate

Fecha de Aprobación: 1993-07-28  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16  
Expiration Date:

**Roberto Enrique Montoya Villa**  
Director Ejecutivo  
CEO



### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía  
Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 1339 (2006)

Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) schedule 40

Pipe fittings of poly (vinyl chloride) (pvc) schedule 40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC-0034-5  
Certificate

Fecha de Aprobación: 1997-12-17  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16  
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa  
Director Ejecutivo  
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:  
ICONTEC is a certification body accredited by:





### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## CEMENTO SOLVENTE PARA PVC

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía  
Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 576 (2008)

Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de poli (cloruro de vinilo) (PVC)  
Solvent cement for poly (vinyl chloride) (PVC) plastics piping systems

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC-0034-8  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2000-10-25  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16  
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya-Villa  
Director Ejecutivo  
CEO



### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía  
Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación  
Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

**Certificado CSC-0034-6**  
Certificate

Fecha de Aprobación: 1997-12-17  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16  
Expiration Date:

**Roberto Enrique Montoya-Villa**  
Director Ejecutivo  
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:  
ICONTEC is a certification body accredited by:





### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

### TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA DRENAJE SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### NTC 3722-3 (2012)

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra).  
Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B  
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non-smooth external surface, type B

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

**Certificado CSC - CER377459**  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-03-18  
Approval Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-07-18  
Expiration Date:

**Roberto Enríque Montoya-Villa**  
Director Ejecutivo  
CEO
