

01-09-2023 Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro, ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de volqueta, 1 conductor de mini, 1 conductor pajarita

personal administrativo: Director, residente, SST e Inspector

personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST
Herramienta menor; volqueta, mini, pajarita, trompo, martillo demolidor, taladro, sierra y pulidora

Actividades:

- Se inician actividades de cimentación ciclopea, con piedra rayón y mezcla en sitio para zapatas de módulo 2 educativa.
- Interventoría ejecuta perforación con broca y taladros a muro de módulo 1 Educativa, desde el baño de Auditorios. El constructor se hará cargo del aseo y resane de esta perforación.
- Se hacen movimiento de tierras en técnica para inicio de llegada de recibo camion.
- Se hace compactación de recibo camion en control Interior
- Se continúan trabajos de demolición en módulo 2 de Educativa. ~~offluent~~

Leonardo Oro

David B

02-09-2023 Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro, ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 conductor de mini, 1 conductor de volqueta

personal administrativo: Director, residente, SST e Inspector

personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST

Herramienta y equipos: volqueta, mini, pajarita, trompo, martillo demolidor, taladro, sierra, pulidora y herramienta menor.

Actividades:

Se hace perforación en baños hombres de modulo 1 Educativa, con el fin de revisar si existe doble muro. La perforación se hace con broca encima del enchape. Se informa ese si es doble muro y se puede continuar con actividades de demolición.

Se hace revisión de cimentación ciclopea en edificio Científica. Se ingresa payarita a modulo 1 para actividades de movimiento de tierras.

Se hace compactación de relleno común con vibró-compactador

Se hace recorridos generales de Asso. *Almud*
Leonardo Asso *Daniel*

04-09-2023 Clima: parcialmente nublado.

personal de obra: 1 maestro, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de volquete, 1 Conductor de mini, 1 Conductor de payarita, 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, rsl, ambiental I y ambiental II e inspector

personal administrativo Interventoría: Director, rsl y residente florentina y equipos: volquete, mini, payarita, trompo, brochador, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra y herramienta menor.

Actividades:

Por parte del equipo Ambiental se realiza recorreo de verificación en puntos de obra con la verificación de puntos ecológicos y señalización, se revisa a personal las instrucciones a tener en cuenta en el área ambiental y se realiza archivo de información base para elaboración de informes -


- Hedy Herrera.

Se continúa con actividades de demolición en modulo 1 y 2 de Educativa, con herramientas manuales.

Se continúan trabajos de movimiento de tierras en modulo 1 Científica con Payarita. Se informa la rotura de tubería $\frac{1}{2}$ " hidráulica, la cual fue arreglada en el momento.

Se hace recorrido con el Ing. Alejandro Gordillo y la Aro. Isabel Alvarez en modulo 2 Científica para revisar el recorrido de la fibra optica y cableado de baja tension a continuación las nuevas cajas y recorrido.

Este esquema será replanteado en sitio nuevamente entre las partes.

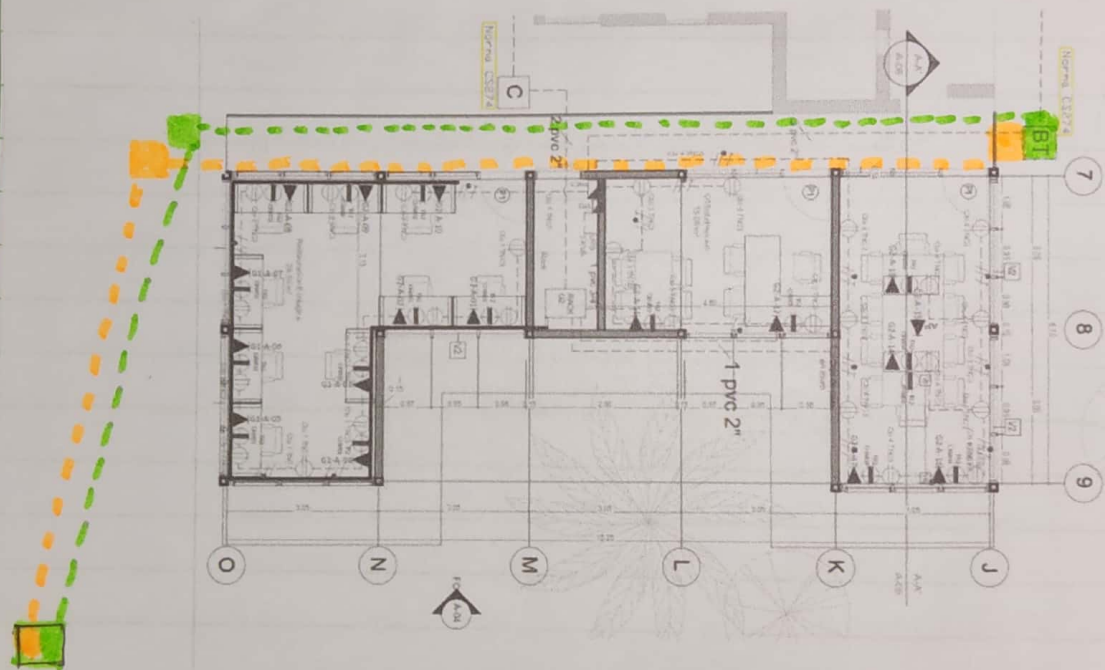

- cableado baja tension / cajas nuevas
- Fibra Optica / cajas y tubería nueva
- caja existente.

con el fin de definir ubicación exacta de cajas ~~afuera~~!

Se continúan actividades de compactación de relleno común en control Interno. ~~afuera~~!

Daniel

- Se recuerda al contratista de obra que el desplazamiento de la maquinaria debe hacerse previa autorización por parte de la entidad. Adicional, se le recuerda al Contratista que se deben tomar las pruebas de densidad en control Interno ~~afuera~~! se recuerda la entrega de los APU's ~~afuera~~!

5-09-23

Clima : parcialmente nublado, lluvias leves

personal de obra: 1 maestro, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor pajarita, 1 conductor volquete, 1 conductor minicargador, 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, SST e inspector.

personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volquete, minicargador, pajarita, trompo, taladro demolitor, taladro, pulidora, brozadora, sierra y soplador e herramienta menor

Actividades:

Se ingresan 4 viajes de recibo canon para control Int. se continúan actividades de compactación.

Se realizan actividades de excavación para ciclopeo de zapatas en edificio Técnica. Se solicita a Interventoria revisar el suelo de fundición y autorizar actividad.

Se realiza movimiento de tierras en modulo 1 científico con pajarita. En modulo 2, se realizan actividades de formateo de zapatas.

Se continúan actividades de demolición de vigas aéreas en Educativa.

Se solicita a la entidad informar sobre una circulación de volículos de carga adicional a la usada, ya que, se instalaron carpas para un evento de la entidad. Se enviara oficio.

Melencior

Daniel

2-09-23

Clima Soleado

personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 conductor minicargador, 1 conductor volquete, 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, ambiental I y ambiental

II, Sst e inspector

personal administrativo Interventoria: Docente, residente y Sst
 Herramientas y equipos: volquete, mini, payarita, ultracompactador,
 taladro demolidor, taladro, pulidora, serra y herramientas menores
 Actividades:

- Ingreso de piedra rajón a Técnica por sendero informado por la entidad.
- Se continúan excavaciones de ciclopeas para zapatas en Técnica.
- Retiro de tierra contaminada en Módulo 1, de Científica, se hacen trasiegos con minicargador y payarita, hasta módulo 2, a volquete.
- Se continúan actividades de formateo de zapatas en Módulo 2 de Científica.
- Se ingresen viajes de recibo canon a control interno para compactación en sitio.
- Se terminan de demoler vigas aéreas en educativa. Se continúan demoliciones de columnas y placa de contrapiso.
- Se instalan tablero eléctricos en todos los frentes, sin conexión a red principal por el momento.

Leonardo Cso

Milena! Damián

07-09-2013 Clima: Soleado

personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de payarita, 1 Conductor de mini, 1 Conductor de volquete y 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, SST Inspector ambiental I
 personal administrativo Interventor: Director, residente y SST
 Herreramientos y equipos: volquete, mini, payanita, vibracompactador,
 baladros demolidores, taladros, picadores, sierra y herramienta manua
 Actividades:

- Se continúan actividades de demolición en plaza y cimentación de Edificio Educativo.
- Se realizan apertura de luzes para zapatas en Control Interno.
- Se trasiegan materiales a Técnica para mezcla de concreto pobre para cimentación ciclopea.
- Se realizan excavaciones en modelo 1 Científica, para reubicar tubería sanitaria y suministro agua potable.
- Se realiza cargue de material orgánico-contaminado y se retira de la entidad.
- Se realiza comité de obra junto a la interventoría, la entidad y el constructor. A continuación los puntos mas importantes:
 1. Se informa que el día lunes ingresara el 1er pedido de hierro y bloque No 5
 2. La entidad, colaborará con el préstamo de carro para el retiro de tierra en Científica.
 3. Se solicita al consultor firmar planimetría entregada y realizar los ajustes electricos solicitados.

- Se solicita al consultor detalles constructivos como pletina de pedestales. *Millenat!*

Leonardo Carrero Daniel B

08-09-23

clima : Soleado.

personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de paqueta, 1 conductor minicargador, 1 conductor volquete

personal administrativo: Director, residente, SST e Inspector de obra

personal administrativo Intendencia: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volquete, paqueta, minicargador, trampa, hacha, taladro demolider, pulidora, Sierra, y herramienta menor.

Actividades:

Se recuerda al Contratista que debe hacer la toma de muestro de las denidades. *Millenat!*

- Se informa que la entidad solicitó detener las actividades de demolición en Educativa hasta el medio día. El personal de esta area se traslado a ejecutar actividades en tecnica, por lo tanto no abra personal en el area.
- Se realiza movimiento de tierras para zapatas de técnica. Se trasladan equipos y materiales al area para fundida de concreto pobre de ciclopeo
- Se realizan cambios de tuberías hidráulicas en módulos 1 y 2 de Científica
- Se excavan zapatas para ciclopeos de control Interno. Se informa que en 2 perforaciones se encontro nuevamente ciclopeos de la estructura anterior.
- Se realizan instalaciones de tableros provisionales eléctricos para 3 edificaciones, Se realiza

acompañamiento del Ing. Alejandro Gordillo para informar el punto de conexión por la entidad

Se realicen cargue y descargues de material de obra y retiro de tierra contaminada y RCD. *Milena!*

Leonardo Oro

Daniela B

09-23 clima: Soleado.

personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de peyante, 1 conductor minicargador, 1 conductor volquete y 3 electricos

personal administrativo: Director, residente, SST e inspector

personal administrativo Interentaria: Director, residente y SST

herramientas y equipos: volquete, peyante, minicargador, compactadora

balastro demoler, pulidora, sierra y herramienta mena

actividades:

• Se realiza fundición de concreto para en Central interna y técnica, se realiza excavación de zapatas en el área de control interno

• Se realiza cambio de tablero eléctrico en el área de control interno de acuerdo a la solicitud realizada por la entidad, se realiza la instalación de tableros nuevos en técnica y científica de acuerdo a lo conversado con el Ing. Alejandro Gordillo donde indique los puntos de conexión.

• Se continúa con demoliciones en el área educativa

• Se realizan cargue y descargue de material y retiro a disposición final de tierra contaminada *Milena!*

Daniela B

Leonardo Oro

09-2023 clima: Soleado

personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de peyante, 1 conductor minicargador, 1 conductor volquete y 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, SST, inspector y ambiental I y II

personal administrativo Interentaria: Director, residente, SST

Herramientas y equipos: volqueta, pajarita, mini cargador, trampa, taladro, taladro demoler, liera, pulidora y herramientas menores.

Actividades:

- En tubería provisional para tablero de Educativa, se excava senya para ocultar cableado.
- Se continúan trabajos de demolición manual de modulo 1 y 2 Educativa. Se realiza trasiego de escombros.
- Se realizan excavaciones para zapatas de control Interno con retro excavadora.
- Se hacen formaletas para zapatas de tecnica y de científica modulo 2.
- Se realiza charla de seguridad al personal en obra, con el tema "Riesgo ergonomico" con el objetivo "Malas posturas y mala manipulación de cargas" en el área de control Interno antes de iniciar la jornada laboral o actividades operativas. *Milena! Reing B heo Oro*

12-09-2023 Clima: Soleado

Personal de Obra: 1 Maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 conductor mini cargador, 1 conductor de volqueta.

Personal Administrativo: Director, Residente, SST, Inspector de Obra.

Personal Administrativo Intersectorial: Director Residente, SST.

Actividades:

- Ingresan 3 volquetas a las 6:00 am para retiro de RCD "escombros" en Educativa

- Se hacen selecciones de Acero para los edificios, desde Control Interno. *¡Felicidades!* *Daniel B* *Leo Oro*

14-09-23

Clima: Soleado

Personal de Obra: 1 Maestro, 3 ayudantes, 4 oficiales
 1 conductor Payarita, 1 conductor volaveta, 1 conductor minicargos
 Personal Adm: Director, Residente, SST, inspectores
 Personal Adm Interventoria: Director, Residente, SST
 Herramientas y Equipo: Volaveta, minicargador, payarita, vibracompactador; pulidora, taladro de moleador, taladros, trampo, cortadora, herramienta de mano.

Actividades

- La entidad hace préstamo de tractor, con el cual se hace trasiego de tierra continuada de modulo 2 a modulo 1 de científica entre las 7:00 am a 9:00 am
- Se hace revision junto a Interventoria de la estructura armada de Aceros, previo a fundición en modulo 2 Científica
- Se funden ciclopeos para zapatas de Control Interno. Con mezcla en sitio. Se continúan armada de canastos de zapas en Técnica.
- Se revisan con el maestro y la Interventoria, los ejes, distancias, figurada de zapatas en Técnica.
- Se continúan trabajos de demolición de cimentación en modulo 2 Educativa con apoyo de payarita

¡Felicidades! *Daniel B* *Leo Oro*

09-23 Clima: Soleado

personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de payarita, 1 conductor de volquete, 1 conductor de mini cargador

personal administrativo: Directa, residente, SST e inspector

personal administrativo Interventoria: Directa, residente y SST

Herramientas y equipos: volquete mini, payarita, retroexcavadora, vibrador de concreto, barra, picadora, taladro, taladro demolitor, trépalos y herramientas menas.

Actividades:

- Se realiza toma de muestras para densidades de recibo en Control Interno.
- Se continúan trabajos de armado de canastos y pedestales en Control Interno.
- Se continúan trabajos de Demolición con payarita modulo 2 Educativo.
- Se deja programación de fundida de zapatas para Técnica el día lunes 7:00 am. En este Edificio no se pueden realizar trabajos por evento de la entidad "oraxideas".
- Se funden zapatas con concreto 3000 PSI de Mixer en Modulo 2 Científica. Se ingresa el vehículo hasta el área. Se comienza la actividad a las 6:00 pm. Se hace uso de reflector, carretillas, vibradores, tabla barra, plástico de protección. Se realiza toma de muestras para resistencias.
- Se realiza reunión con la entidad, para compartir los diseños de las redes sanitarias y pluviales y el alcance de desarrollo por el constructor, *Offshoot* los *Os* *Quim*

16-09-23 Clima : Soleado

personal de obra : 1 maestro, 3 ayudantes, 4 especiales, 1 conductor de pejarita, 1 conductor de volquete, 1 conductor de mini cargador

personal administrativo : Director, residente, SST e inspector

personal administrativo Interventoria : Director, residente y SST

Herramientas y equipos : volquete, mini cargador, pejarita, vibracompactador, taladros, taladro demolitor, pulidas, llaves, trépanos, vibradores de concreto y herramienta mena

Actividades :


Se continúan trabajos de demolición de vigas de cimentación en Educativa modelo 1 y 2.

Se revisan ejes de pedestales en Científica modelo 2, después de fundida el día anterior. Se retiran muestras de concreto de cilindros, se marcan y se dejan en agua.

Se funden 3 ciclopes para zapatas de control Interno


Se revisa con Interventoria, aceros, ejes, medidas, de zapatas para fundir el día lunes.

EDIFICIO CONTROL INTERNO

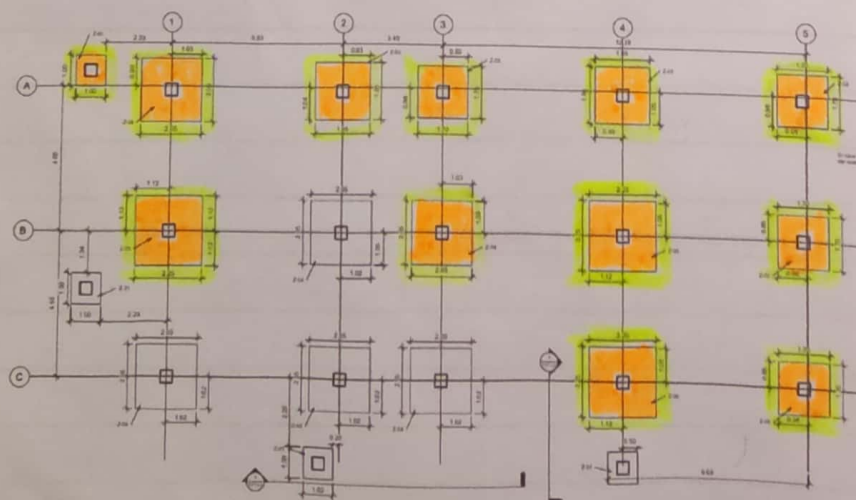


ciclopes a la fecha
 zapata
 pedestal

EDIFICIO TECNICA

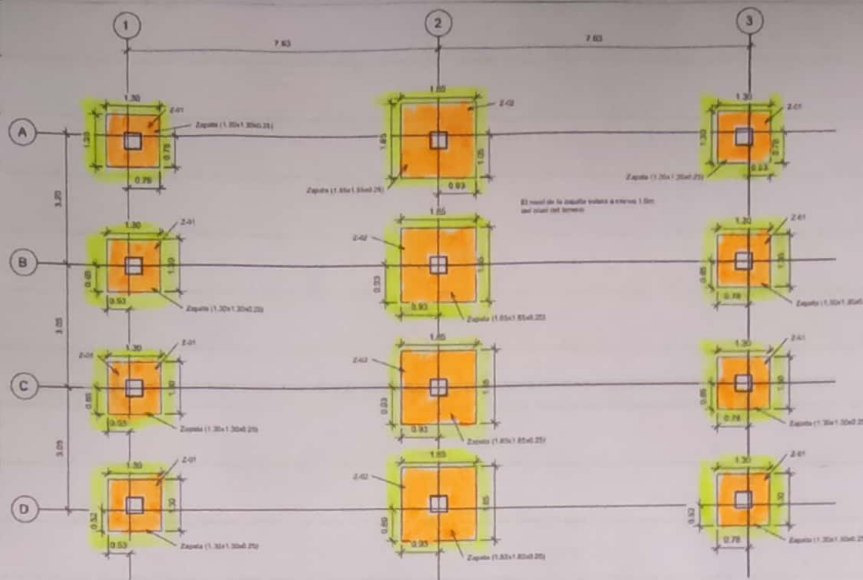


□ Cyclopeo a la fecha □ Zapata 13/09/23 □ Pedestal

EDIFICIO CIENTIFICA

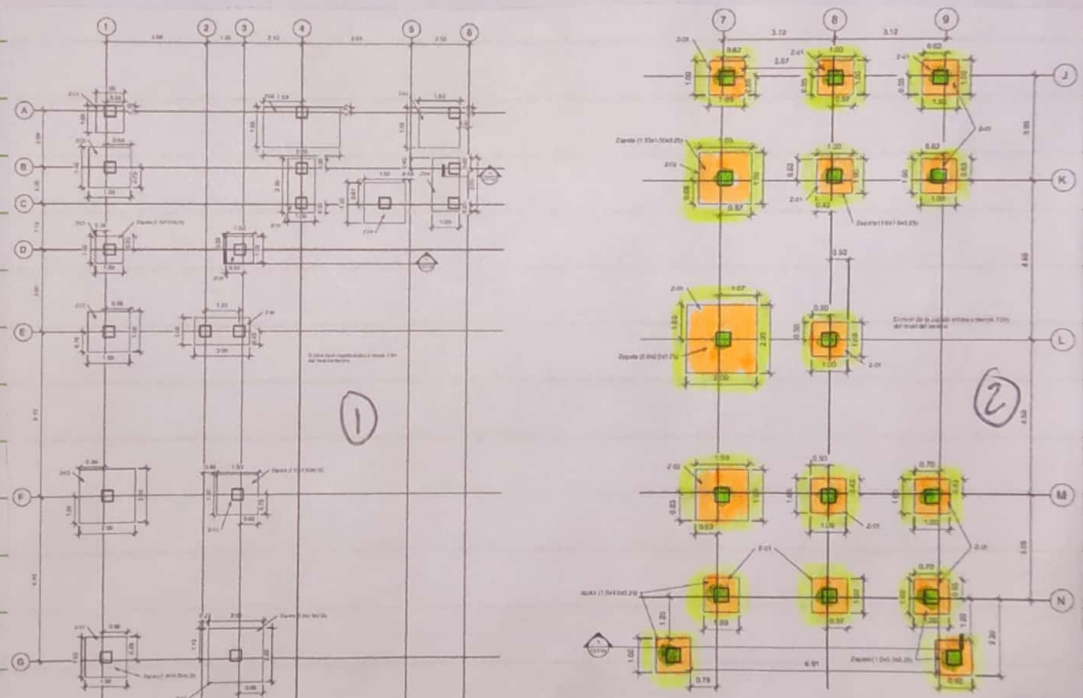

□ Cyclopeo a la fecha □ Zapata 15/09/23 □ Pedestal

EDIFICIO EDUCATIVA

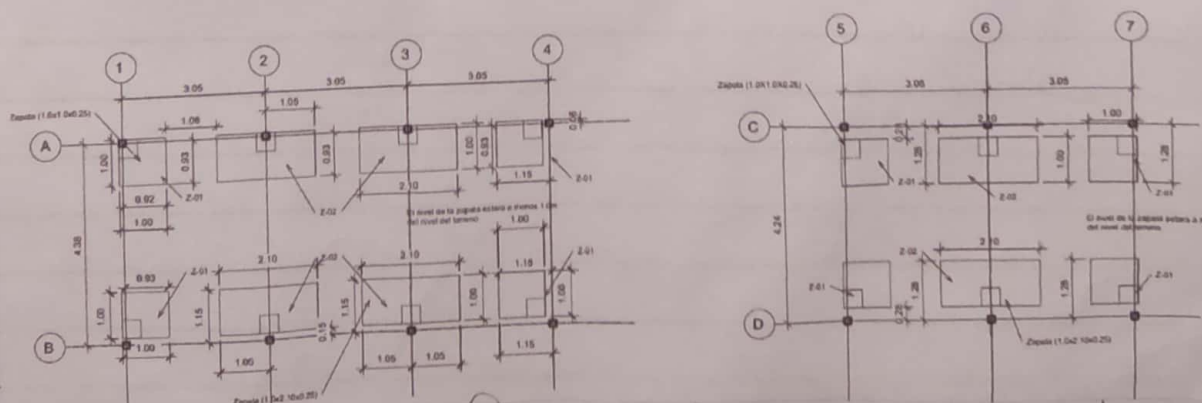

Deunf

Leo 330

18-09-23 Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 conductor de volqueta y 1 conductor de mini Cargador

personal administrativo: Director, residente, SST e Inspector

personal administrativo Interventor: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volqueta, minicargador, pajarita, vibracompactador, trompo, taladro demolitor, taladro, pulidora, trépano, sierra y soplador, herramienta menor.

Actividades:

- Ingreso de Mixer con concreto para fundición de zapatas de Edificio Técnica. Se hace uso de bomba móvil.
- Se realiza fundición de concreto para ciclópes en Control Interno, para el zapatas. Se realiza con mezcla en sitio.
- Se arman formateas para pedestales en Científica Módulo 2. Formateas metálicas.
- Se realiza movimiento de tierras en Científica módulo 1. Se comienza siembrado de zapatas. Se reitera al Contratista el incremento del personal ~~efectuado~~

(Cada) heo Oso

19-09-23 Clima: parcialmente nublado.

personal de obra: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes, 1 conductor de volqueta, 1 conductor mini Cargador, 1 conductor pajarita

personal administrativo: Director, residente, SST, ambiental I y II e inspector de obra

personal administrativo Interventor: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volqueta, minicargador, pajarita, vibracompactador, trompo, taladro, demolitor, taladro, pulidora, trépano, sierra y soplador, herramienta menor.

Actividades:

- Se realizan solados de limpieza en ciclópeos de control interno. Se continúan actividades de excavación de zapatas de 4 ciclópeos. Se alistan parrillas de zapatas para fundida al día siguiente.
 - Se realiza sembrado de zapatas en Científica 1
 - Se revisan encofrados de formatebas en Científica 2
 - No se pueden realizar actividades en Técnica, por fraguado de concreto. Se desencofran cilindros para muestras de concreto.
 - No se pueden realizar actividades de retiro de escombros de Educativa, por movimiento de visitantes, cerca a los módulos. Se solicitará a la entidad permiso especial para transitar con mini, y posiblemente pajarita.
- Se recuerda al Contratista la entrega de APD's, NP's y Balance
- Hecho* *Leo*

20-09-2023 Clima : parcialmente nublado.

personal de obra: 1 maestro, 4 oficiales, 8 ayudantes, 1 conductor de volquete, 1 conductor minicargador, 1 conductor de pajarita

personal administrativo: Director, residente, SST e inspector

personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST

herramientas y equipos: volquete, minicargador, pajarita, vibracompactor, taladro limador, taladro, sierra, brochadora, pulidora, soplador, y herramienta mena:

Actividades:

Interventor SST:

De acuerdo a las inspecciones realizadas durante la mañana en la actividad de fundida de concreto Ciclópeo se evidenciaron condiciones inseguras y

actos inseguros poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores operativos y profesionales; a continuación se anexa registro fotográfico de los hallazgos:

Imagen No. 1.

Ubicación: Control Interno.



- En el recorrido que realiza el trabajador para el transporte del material no se evidencia demarcación y aseguramiento de las excavaciones; de acuerdo a este hallazgo se solicitó al contratista tomar acciones correctivas.
- Se evidencia a la Profesional SST. realizando una condición insegura ya que se encuentra en una posición que pueda conllevar a caer sobre la excavación y sufrir fracturas o heridas graves; es importante tener en cuenta que para evitar estas condiciones y actos inseguros se deben identificar los peligros, valorar los riesgos y evaluarlos con el fin de tomar acciones preventivas.

Imagen No. 2

Ubicación: Control Interno.



- Se evidencia al trabajador en presencia de un riesgo latente al caer al vacío, de igual forma se identifica que la excavación no está demarcada y señalizada, se solicita asegurar el área y demarcar con cinta de peligro el sendero o paso que recorre el trabajador hasta el sitio donde descarga el material.

Imagen No. 3.

Ubicación: Científica:



- En esta área se evidencia que las excavaciones no se encuentran señalizadas y demarcadas con cinta de peligro, se solicita validar las condiciones de seguridad y tomar acciones correctivas.

Imagen No. 4.

Ubicación: Técnica.



- Se evidencia en el acceso al frente de trabajo del área técnica; excavaciones sin demarcar y sin señalización, es importante tener en cuenta estas condiciones inseguras presentes puede conllevar a la ocurrencia de accidentes de trabajo; se solicita al contratista tomar acciones correctivas y remitir la evidencia a la interventoría.

Nota: Es de aclarar que en todos los frentes de trabajo se deben contar con la respectiva señalización y aseguramiento de áreas intervenidas; identificando los peligros presentes, pues se informa que se ha evidenciado la falta de señalización en el interior de los frentes: Control Interno, Técnica, educativa y Científica. De igual forma se comunica que todos el personal objeto de las obras deben contar con todos los EPP.

[Signature]
Interventor
20-09-2023 8:51

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Se funden pedestales de cimentación en Científica, con soporte de bomba estacionaria, en horas de la mañana.
- Se realiza fundida de zapatas en Control Interno sin uso de bomba estacionaria.
Se continúan actividades de armado de aceros para zapatas.
- Se realiza excavación con pajarita de 3 zapatas faltantes.
- Se hace ingreso de aseton para 2 edificios y se ubican en el perímetro del Edificio Técnica
- Se realiza pase del cableado de fibra optica en la tubería existente. No se puede ingresar al rack de la entidad por congestión del área de trabajo.
- Se realiza trazado de ejes de pedestales en técnica, con el fin de formatizar al día siguiente.
- En actividades de excavación manual, se evidencian vigas de cimentación en Científica Cuadro 1
- Se desencofran cilindros de pruebas de concreto, se marcan y se dejan en Agua.

Daniel

hoy Oso afilados!

09-23

Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de volquete, 1 conductor de pajarita, 1 conductor de mini

personal administrativo: Director, residente, ambiental 1, e inspector

personal administrativo: Quota, residente, SST

Herramientas y equipos: volquete, minicarguero, pajarita, vibracompactador, trompo, taladro, taladro demolitor, pulidora, trizadora, sierra, soplador y herramientas menor.

Actividades:

- Se desmoldan formateras para pedestales en científica modulo 2, Se hidratan y se revisan.
- Se ingresa recibo para tapar excavaciones de las zapatas y se traslada formateras a tecnica.
- Ingreso de formateras para pedestales en tecnica, se realiza limpieza de estas y se continua con el armado para la fundición del siguiente día.
- Se comienza a demoler vigas de cimentación en modulo 2 Científica con taladro demolidor. Se ingresa payarita para excavación de zapatas.
- Se revisan zapatas fundidas en control interno, se realiza fundida de ciclopeo.

Dauif

Mileuot!

hoo Oro

22-09-23 Clima: Soleado - lluvias fuertes desde las 3:00 pm
 Personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de payarita, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de minicargador.

Personal administrativo: Director, residente, SST e inspector

Personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volqueta, minicargador, payarita, retro-compactadora, trompo, taladro, taladro demolidor, taladro, pulidora, lijadora, sierra, aplada y herramienta mena

Actividades:

Se recuerda al Contratista de obra la entrega de los APU's ajustados, los NP's y el balance de obra.

Mileuot!

Dauif

Actividades:

Se realiza comite de Obra con la entidad y Interventoria. A continuación los puntos mas relevantes:

- Se informa que la reprogramación de Obra fue enviada y revisada por interventoria.
- Se informa que la actividad de instalación de fibra optica no se pudo completar por restricciones en DATA CENTER.
- De acuerdo a las observaciones realizadas por el ente ambiental sobre ... acopios de tierra en algunos sectores, se responde con que las actividades de trasiego se comenzaron y se continuaran a medida que el clima y las actividades con los vehiculos se puedan.
- De acuerdo a observaciones de SST interventoria, se realizara señalización pertinente en excavaciones de control interno.
- Se informa que la factura de corte 1 se subio al sistema.
- Se hacen solicitudes de entrega de APD'S y NP'S por el constructor. Se informa que se estan realizando y se entregaran el proximo comite.
- Se realiza socialización del evento navideño y se informan fechas para esta. Se solicita reunión con esa empresa para revisar actividades de ejecución y afectación de las obras de abastecimiento para el día miércoles.
- Se continúan actividades de tondido de pedestales en tecnica.
- Se fondea con bomba estacionaria.
- Se fondea zapatas en control interno.

- Se realizan actividades de excavación manual en Científica Modulo I para zapateras.
- Se continúan demoliciones manuales de vigas de cimentación.

Se realiza retiro de tierra con tractor suministrado por la entidad.

Dainy

Leo Oro ~~afiliado~~

23-09-23 clima soleado.

personal de obra: 1 maestro, 5 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de mini Cargador, 1 conductor de pajarita

personal administrativo: Director, residente, sst e inspector

personal administrativo Interventor: Director, residente y sst

herramienta y equipos: volqueta, mini cargador, pajarita, vibracompactor, trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra, soplador, vibradores y herramientas menores.

Actividades:

- Se realiza limpieza de asfalto en pasillos del área técnica por tránsito de minicargador.
- Se continúa con excavación y movimiento de tierras en el área de educativa modulo I
- Se realiza encofrado en zapateras y pedestales del área de Control, adicionalmente se realiza desmoldado de pedestales fundidos el día 22 de septiembre de 2023.
- Se continúa con excavaciones de zapateras en el área de Científica modulo I

Dainy

Leo Oro ~~afiliado~~

25-09-23. Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de pajarita, 1 volqueta, 1 minicargador.

personal administrativo: Director, residente, sst, e inspector

personal administrativo Interventor: Director, residente y sst

herramienta y equipos: volqueta, mini cargador, pajarita, vibracompactor, trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra, soplador, vibradores y herramientas menores

Actividades:

Interventoria recuerdo al Contratista lo entrega de los APO's ajustados, los NP's y el Balance de obra. Adicionalmente recuerdo que debe mantener los 4 pretes activos, y con personal de manera constante, simultaneo y durante la duracion del contrato. ~~Millenest~~ Daniel

• Se realiza reunion con la entidad y el constructor para exponer los tiempos y las rutas de ejecucion del mes de Octubre, para instalacion de tuberias y tanques de la red pluvial.

• Se realiza reunion y recorrido de Obra con la entidad "Ing. Alejandro Gordillo" y el especialista electrico de la interventoria. Con el fin de revisar en sitio, las adecuaciones y solicitudes electricas.

• Se ingresa recebo comun a control interno para compactacion de terrenos y llenado de excavacion de zapatas. Se funden pedestales 3000 PSI

• Se ingrese piedra rayon a cientifica modulo 1. Se continuan trabajos de excavacion de zapatas en Cientifica modulo 1. Se continuan trabajos de demolicion de vigas de cimentacion con herramienta de mano.

• Se realiza retiro de tierra excavada en modulo 2 Educativa, con bobcat en horario diurno y se hace acopio de tierra con retroexcavadora en la tarde.

• Se entregan cilindros de muestras de concreto de zapatas, para sus fallos y certificados de modulo 2 cientifica

• Se hacen "Funden" ciclopeas de 4 zapatas en cientifica modulo 1 Daniel Los Oso

26-09-23

Clima: Soleado mañana - lluvia tarde

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor volqueta, 1 conductor mini, 1 conductor pajarita

personal administrativo: Director, residente, ambiental I, II, Asst e inspector

personal administrativo Intermonitoria: Director, residente y Asst

Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador, trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra, soplador, vibradores, canguro, rotomartillo y herramientas menores.

Actividades:

- Se ingresa recibo común a control interno para compactación con vibrocompactador y canguro
- Se ingresa piedra rayón a científica modulo 1 para ciclopeos.
- Se realizan retiros de tierra contaminada con tractor de la entidad en científica 1. Se ingresa pajarita para movimiento de tierras.
- Se retira material del jardín en volquetes.
- Se hace cerramiento de paravento.
- Se desmontan pedestales de Control Interno, se revisa concreto y se hidrata

(Dumf)

Millen!

heo Oro

27-09-23

Clima: Soleado - lluvias en horas de la tarde de 3:00 a 4:00 pm

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor volqueta, 1 conductor mini, 1 conductor pajarita

personal administrativo: Director, residente, Asst e inspector

personal administrativo Intermonitoria: Director, residente y Asst

Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador, trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra, soplador, vibradores, rotomartillo y herramientas menores.

Actividades.

- Se realiza retiro de tierra modulo 1 Científica a modulo 2 Científica con tractor prestado por la entidad.
- La tierra acopiada en científica 2, se retira en volqueta, Fuera del jardín.
- Se ingresan 5 viajes de relleno común a control interno. Se realiza compactación del terreno con vibro y canguro.
- Se subsana rotura de tubería suministro agua potable en modulo 1 Educativa.
- Se instala solisombra y Banner en paravento para cercamiento provisional de acopio de materiales de alcantarillado.
- Se preparan excavaciones de zapatas en modulo 1 Científica para fundida de ciclopeos
- Respuesta OFICIO "CONSTRU-JARDIN-CTO-997-23-097"
De acuerdo con el asunto y compromisos contractuales me permito dar respuesta al oficio enviado por interventoría el día 21/09/2023, donde se pide evidenciar las acciones correctivas en cada uno de los frentes
A continuación, se relaciona evidencia con sus respectivas correcciones

Evidencia N° 1: Sendero Peatonal Delimitado en control interno.



Evidencia N° 2: Zapatas Científica 2 rellenas de relleno, no requiere señalización de sendero peatonal.



Deniel

afiliat!

Leo Corso

2

Dando abance a su requerimiento, en las Fotografías anteriores se evidencian las acciones tomadas frente a cada uno de los hallazgos relacionados, quedo resaltar que en cada uno de los frentes y en cada labor, los trabajadores cuentan con el uso correcto y respectivo para cada una de las actividades realizadas dentro del proyecto, las actividades que se realizan diariamente están supervisadas al 100% por la profesional SST, donde se lleva no solo la visita, sino también el control de cada una de ellas.

[Signature] *Milemat!*

[Signature]

28-09-23 Clima : Soleado.

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de pejarita, 1 Conductor mini

personal administrativo : Director, residente, sst, inspector y representante legal suplente

personal administrativo Interventoria: Director, residente y sst

Herramienta y equipos: volqueta, mini, pejarita, vibrocompactadora, bomba, taladro, taladro demoldador, pulidora, sierra,opleadora, vibradores, extomartillo, Congruos y herramienta menor.

Actividades:

Se recuerda al Contratista que debe realizar la reparación de la tubería de la red Contra incendio en educativa, esto debe realizarse de manera prioritaria teniendo en cuenta que allí se encuentran los auditorios. Adicional, debe mantener los 4 frentes con personal permanente. Se debe realizar el mantenimiento del cerramiento ya que se encuentran descolgados o arrugados. Debe presentar APU's ajustados, NP's y balance de manera prioritaria. *Milemat!* Adicional a lo anterior, Interventoria recuerda a Contratista de obra que debe tomar densidades en el recebo de Científico Módulo 2. *Milemat!*

[Signature]

- Se realiza comite de Obra con la entidad y la consultoria, se relacionan los puntos mas relevantes:
- 1. Se informa que por lluvias del viernes anterior, el fin de semana y el dia lunes, las canteras de material petreo cerraron. Por consiguiente se ven afectadas actividades de relleno con reecho comun. Como mitigación se informa el ingreso de volaveta doble trazo y el aumento de viajes.
- 2. Se informa que para poder retirar tierra contaminada del modulo de educativa, se realizaran o continuaran las actividades en horario diurno hasta medio dia, con trasiegos de mini cargador.
- 3. Se entregan a Interventoria parciales de APO'S y NPS para revisión.
- 4. Se informa que la siguiente semana se comenzaran trabajos con topografia para actividades de abastacillado.
- 5. Se hace solicitud a la entidad para la pda de las copas laterales de acuerdo a oficio y tambien el traslado de 3 especies en educativa y tecnica.
- Se realizan actividades de fundido de ciclopeas en científica modulo 4 con concreto pobre
- Se evidencia pase de tuberia de baja tension por la excavación de una zapata. Se revisaran ejes para tomar acciones preventivas.
- Se realizan trasiegos de reecho comun para Control Interno y Cientifica. Se termina de nivelar y compactar Control Interno, para aronado de vigas.

29-09-23

Clima: Soleado - lluvias de 5:00 pm a 6:30 pm
 personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor de volqueta, 1 Conductor de pajarita, 1 conductor mini,
 personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
 personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
 Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador, taladro, taladro demolido, pulidora, sierra, soplador, vibrador de concreto, Rotomartillo y Canguro e herramienta mena.

Actividades:

- Ingreso de doble traves con recebo canon para clasificar. Se ingresa bobcat al modulo 1 para extender recebo.
- Se funden picaplast en Cientifica modulo 1 con concreto mezclado en sitio.
- Se realiza retiro de tierra contaminada con bobcat en Educativo. Se realiza jornada de Aseo para limpiar el camino adyacente. Se retira gu volqueta.
- Se comienzan a armar vigas con acero en control interno de Acuerdo a planimetria estructural apostada.
- Se hace recorrido con la interventoria para toma de medidas para corte 2.
- Se realiza compactación de terreno Cientifica 2 con vibrocompactador y canguro. *Decimetro*

30-09-23

Clima: Soleado

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes 1 conductor volqueta, 1 conductor mini, 1 conductor pajarita
 personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
 personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volquete, mini, pajarita, vibrocompactador, taladro, taladro demolitor, pulidora, sierra, soplador, vibrador de concreto, rotomartillo, Canguro y herramienta menor.

Actividades:

- Se reciben casetones de tecnica para llevarlos a control Interno.
- Se continuan trabajos de armado de acero vigas y viguetas en control Interno
- Se compacta relleno canon en Cientificas 2 con vibro compactador y canguro.
- Se excavan 2 zapatas faltantes en Cientificas 1, ~~fallentes~~. Demof B.

-10-23 Clima: Soleado.

personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor volquete, 1 conductor pajarita, 1 Conductor mini

personal administrativo: Director, residente, SST, ambiental I y II e inspector

personal administrativo Interventor: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volquete, mini, pajarita, vibrocompactador, taladro, taladro demolitor, pulidora, sierra, soplador, vibrador de concreto, rotomartillo, Canguro y herramienta menor.
