

INFORME MENSUAL 5 DE INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023
		INTERVENTOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED

INFORME MENSUAL No.	5	IED JUAN REY	DEL:	24/02/2024	AL:	23/03/2024
---------------------	---	--------------	------	------------	-----	------------


ANEXO FOTOGRAFICO



Continuan con el destronque de tablon granito en pisos de las aulas.



Continuan con desmonte de carpinteria metalica en el aula

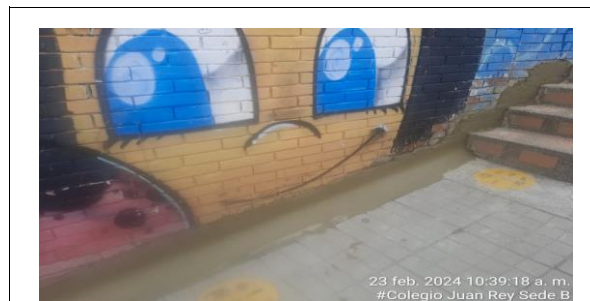

Aplicación de media caña mortero impermeabilizado de la zona exterior del colegio.



Inician con el brillo de los pisos de las aulas.



Remates de granito en la boca puerta de las aulas.



Remates de pañete y filos en los vanos de las ventanas.



Inician con el picado de muros para la aplicación de pañete en la zona cancha.



Inician con el chirleado de muros de la zona exterior de la cancha.



Inician con el chirleado de muros del aula 4.



Inician con la demolicion de enchape pisos del aula 4.



Inician con la demolicion y excavacion de las zapatas de la zona cancha.



Inician con la aplicación de pañete en muros del aula 4.



Inician con la instalacion de ventaneria de las aulas del segundo nivel.



Inician con la instalacion de las rejas de la parte exterior de las aulas.



Inician con la instalacion del tablon granito en el aula 4.



Inician con la aplicación de pañete en el aula de los profesores.



Inician con el corte de placas para las vigas de la zona cancha.



Continuan con la instalacion del tablon granito en el aula 4.



Inician con la instalacion de guarder escobas y remates del tablon granito del aula 4.



Inician con la demolicion de enchape de la zona de profesores.
