

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 17



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**ARMADA
DE COLOMBIA**



**INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 003 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 al 01 DE ENERO DEL 2024**

LAPSO del 03 de diciembre de 2023 al 01 de enero de 2024

CONTRATO	:	CONTRATO No. 105-ARC-CBNL02-2023
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	28 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL	:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$1.333.110.237,00), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan
ADICIÓN (S)	:	SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$642.000.000,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$1.975.110.237,00)
DESCRIPCIÓN DE IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL - PROFESIONAL EN ARQUITECTURA
SUPERVISOR INICIAL	:	TKAIAR ALEJANDRA DOMINGUEZ ZAMBRANO
SUPERVISOR FINAL	:	TKAIAR ALEJANDRA DOMINGUEZ ZAMBRANO

En la ciudad de Buenaventura – Valle del Cauca, al primer (01) día del mes de enero de 2024, en calidad de Supervisor encargado del contrato N° CONTRATO No. **105-ARC-CBNL02-2023** suscrito con la firma **CONSORCIO MEJORAMIENTO 23** con NIT N° 901756844-2, representada legalmente por el **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³,

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales”, 5° “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”, 11° “De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales”, 12° “De la Delegación para Contratar”, 26° “Del Principio de Responsabilidad”, 50° “De la Responsabilidad de las Entidades Estatales”, 51° “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, 52° “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53° “De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” ¹, 56° “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal”.

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° “Responsabilidad de los interventores”, 83° “Supervisión e interventoría contractual” y 84° “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 2 de 17

entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015⁵ y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022⁶, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN (MODIFICACIÓN, ADICIÓN, REDUCCIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS) Y NUMERO DEL DOCUMENTO.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (CUANDO APLIQUE).	VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)
MODIFICACIÓN NO 1 - ADICIÓN PRESUPUESTO Y ANEXO TECNICO ECONOMICO	23 DE OCTUBRE 2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	SÍ	\$642.000.000,00
MODIFICACIÓN NO 2 – ADICIÓN EN TIEMPO Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA	20 DE DICIEMBRE 2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	\$1.975.110.237,00	\$1.975.110.237,00	N/A	N/A	\$1.975.110.237,00

⁴ Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 3 de 17

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
---	--	--	--	--	--

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 11-44-101208932 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A 09 DE OCTUBRE DE 2023
---	--

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A		N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	N/A

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 10-40-101055706 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A 09 DE OCTUBRE DE 2023
---	--

MODIFICACIÓN SÍ

PRIMERA MODIFICACIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 11-44-101208932 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A 27 octubre 2023
---	--

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE 2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE 2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE 2023
TODO RIESGO	N/A	N/A		

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 4 de 17

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBREA	SI	09 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE 2023
-----------------------------------	----	-----------------------	--------------------

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 10-40-101055706 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A 09 DE OCTUBRE DE 2023
--	---

SEGUNDA MODIFICACIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 11-44-101208932 DE FECHA 29/12/2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A P/C
--	--

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	P/C
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	P/C
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	P/C
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	P/C
TODO RIESGO	N/A	N/A		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBREA	SI		09 DE OCTUBRE DE 2023	P/C

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 10-40-101055706 DE FECHA 27/12/2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A P/C
--	--

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIALES	2023	\$1.975.110.237,00	172723	27/12/2023	482903423	27/12/2023	\$122.944.108,70	\$1.852.166.128,3	6,22%
PARCIALES	2023	\$1.975.110.237,00	173223	27/12/2023	483486123	27/12/2023	\$239.627.210,13	\$1.612.538.918,17	12,13%
PARCIALES	2023	\$1.975.110.237,00	824	12/01/2024	1693324	12/01/2024	\$340.429.081,53	\$1.272.109.836,64	17,24%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL			
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA	
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020		Página 5 de 17

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
OBRA	2023	13233 09/05/2023	3.976.290.526,00	N/A	N/A	N/A	78223 13/09/2023	\$1.383.110.237,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	OBRA	\$1.975.110.237,00	No 1 14-dic-2023	\$122.944.108,70	No 1 14-dic-2023	\$122.944.108,70	5003284301 5003284302 14-12-23	\$117.641.336,16 \$5.302.772,54	N/A
2	2023	OBRA	\$1.975.110.237,00	No 2 20-dic-2023	\$239.627.210,13	No 2 20-dic-2023	\$239.627.210,13	5003290743 5003290784 20-12-23	\$229.291.712,46 \$10.335.497,67	N/A
3	2023	OBRA	\$1.975.110.237,00	No 3 28-dic-2023	\$340.429.081,53	No 3 28-dic-2023	\$340.429.081,53	5003294411 5003294412 28-12-23	\$325.745.840,95 \$14.683.240,58	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 “Supervisión contractual” y 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ^z, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Durante el periodo se ejecutan obras en los siguientes frentes así:

- Colegio Naval – reparación de columnas/perfiles metálicos, ya finalizado, pero no recibido a satisfacción.
- Alojamientos militares – mantenimiento de cocinas, elaboración de carpintería de puertas y closets.
- Cámara de suboficiales – mantenimiento de cocina y baño del sector de la piscina.
- Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Pacífico - cambio de cubierta total sector comedor bar y remodelación de baños de dos barracas de IMP.
- Grupo Aeronaval del Pacífico – cambio de cubierta compañía seguridad, adecuaciones de carpintería de cocina de infantes, impermeabilización de la placa cubierta del armerillo.
- Departamento de administración – deshabilitación de baño y unificación de espacios (baño y pantry), adecuación de oficina de archivo y traslado de tableros eléctricos.
- Casa CFNP – adecuaciones de obra civil para instalación de terraza en deck y pérgola.
- Edificio PROA (Buenaventura) – pintura de fachada edificio.
- Estación de Guardacostas (Isla Naval) – Cambio de cubierta, instalación de bajantes y tragantes de aguas lluvias, mantenimiento e impermeabilización de tanque de agua potable.
- Centro de Reclusión Militar (CRM Isla naval) – Mantenimiento e impermeabilización de polaca cubierta, cambio de tanques y conexiones hidráulicas de sistema de recolección de aguas lluvias.
- coman

No.	LINEA	FRENTE	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	PENDIENTE POR	%
-----	-------	--------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL					
	Proceso: Adquisiciones			Autoridad: JOLA		
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07		Rige a partir de: 07/05/2020		Página 6 de 17	

	BASE		CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	EJECUTAR	AVANCE
1	M	CASA CFNP	\$ 154.366,05	\$308.732,10		\$ 327.444.785,13	0,14%
1	M	COAL BNL02-COCINA				\$11.530.881,06	0,00%
1	M	DEPARTAMENTO DE ADMIN BNL02	\$ 1.448.686,50			\$14.341.538,66	9,17%
1	M	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BNL02				\$ 230.312.624,26	0,00%
1	M	CAMARA SUBOFICIALES BNL02	\$25.988.982,24	\$7.027.123,34	\$12.389.893,28	\$34.574.901,99	56,77%
1	M	COLEGIO NAVAL		\$ 5.023.863,10	\$8.793.657,24	\$1.104.069,03	92,60%
1	M	COMANDO FUERZA NAVAL				\$11.215.080,34	0,00%
1	M	FLOTILLA SUPERFICIE DEL PACIFICO				\$10.647.992,63	0,00%
1	M	EDIFICIO PROA		\$ 52.198.155,57	\$22.840.657,40	\$9.002.575,62	89,29%
1	M	CUBIERTA - GRUPO FUERZA ESPECIALES NAVALES DEL PACIFICO		\$74.752.070,10	\$122.506.184,22	\$ 1.494.510,43	99,25%
1	M	BAÑOS - GRUPO FUERZA ESPECIALES NAVALES DEL PACIFICO	\$29.484.841,82	\$44.090.068,45	\$ 20.032.961,05	\$ 125.152.838,78	42,79%
1	J	GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 3	\$5.507.010,21		\$ 1.261.063,03	\$2.529.607,54	72,79%
1	J	GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO – GANPA 4	\$20.549.585,18	\$ 12.676.289,91	\$9.176.229,14	\$ 174.476.532,95	19,55%
1	J	GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO1				\$34.126.057,21	0,00%
1	J	GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 2		\$6.249.213,63		\$59.731.761,17	9,47%
1	ISLA	GUARDACOSTA ISLA NAVAL ADICION	\$39.810.636,70	\$37.301.693,93	\$137.220.686,17	\$184.304.225,50	53,77%
1	ISLA	CRM			\$ 6.207.750,0000	\$62.755.933,69	9,00%
VALOR TOTAL DE INTERVENCIONES			\$122.944.108,70	\$239.627.210,13	\$340.429.081,53	\$1.294.745.915,98	35,19%

¹Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORA

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	35.19%	\$695.041.292,4

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Acuerdo al seguimiento del periodo pasado y posterior a las reuniones y citaciones al contratista, se procede a realizar una prórroga al contrato, constituyendo una reserva, debido a que los tiempos de ejecución del contrato y según lo manifestado por el contratista, no pudieron ser cumplidos, sobre todo por las lluvias que dificultaron las obras en exteriores.

Por lo anterior, el contratista realiza solicitud de prórroga hasta el 28 de febrero del 2024

Se compromete a la entrega de cronogramas actualizados, así como presupuestos oficiales por cada frente de trabajo.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 89 de 1988, 7º de la Ley 21 de 1982 y 2º y 3º de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa CONSORCIO MEJORAMIENTO 23, representada legalmente por el Señor WILVER FRANCINY RUSSY LADINO frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES del mes de

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 7 de 17

diciembre de 2023, información que se puede constar en la plantilla o certificado de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de la orden de compra, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe semanal de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO			
			
			



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 8 de 17

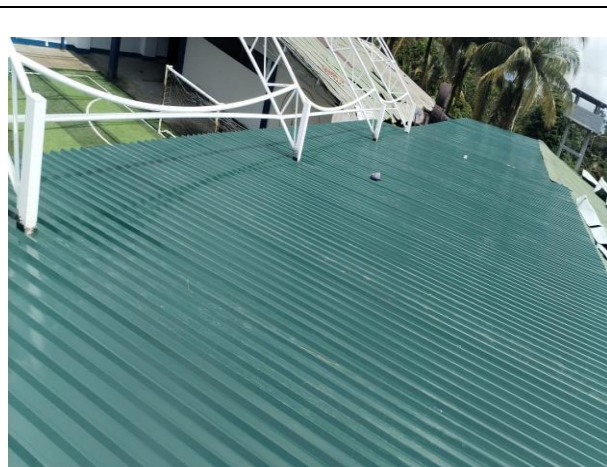



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 9 de 17



GRUPO FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACÍFICO – REMODELACIÓN BAÑOS Y CUBIERTA





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 10 de 17

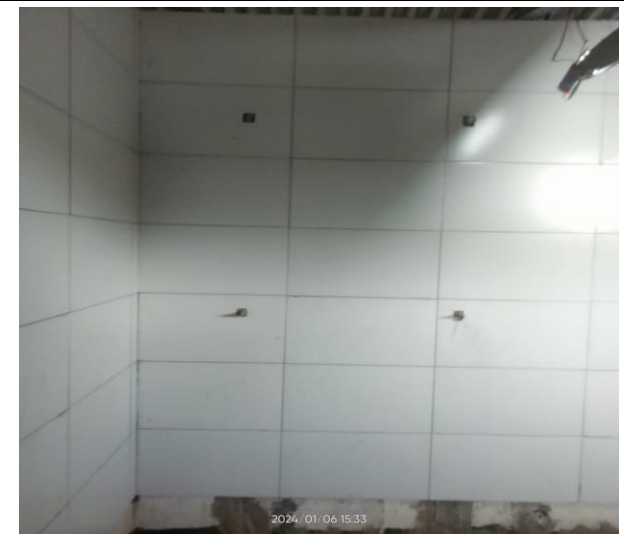



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 11 de 17

CAMARA SUBOFICIALES – REMODELACIÓN BAÑOS Y COCINA





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 12 de 17





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 13 de 17



CASA CFNP

Demoliciones, excavaciones y cimentación para instalación de estructura de DECK





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 14 de 17



PROPUESTA CASA CFNP





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 15 de 17





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 16 de 17

CRM (ISLA NAVAL)

Rasqueteo, resane de pared y acabados de obra blanca. Impermeabilización de placa cubierta.





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 17 de 17

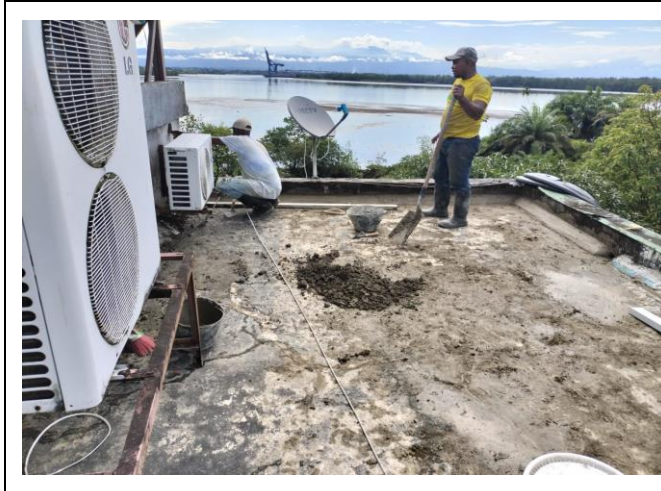

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

Se anexa la siguiente documentación como parte de los entregables del contratista.

- Planilla seguridad social diciembre.
- Cronogramas ajustados.
- Informes semanales diciembre
- Informes SST diciembre.

TKAIAR ALEJANDRA DOMINGUEZ ZAMBRANO

C.C 1.143.155.311

SUPERVISORA DEL CONTRATO

ARQUITECTA OIARQ

CEL 3207682347

Alejandra.dominguez@armada.mil.co.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901756844-2	CONSORCIO MEJORAMIENTO 23		CALLE 8F#79-94	4111513	HSEQ@WRUSSYINGENIEROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73147839	TOTAL A PAGAR
					\$3.006.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.800	0		0		0	0	0	0	52.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.300	0		0		0	0	0	0	15.300	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.500	0		0		0	0	0	0	36.500	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	37.400	0		0		0	0	0	0	37.400	1
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	12.100	0		0		0	0	0	0	12.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	58.100	0		0		0	0	0	0	58.100	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	15.300	0		0		0	0	0	0	15.300	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	312.200	0	0	0	0	0	0		312.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.434.900	0	0	0	0	0	0		1.434.900	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	24.800	0	0	0	0	0	0		24.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	574.400				574.400	0	0	574.400			5.744	574.400	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	330.300	0	0	330.300	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901756844-2	CONSORCIO MEJORAMIENTO 23		CALLE 8F#79-94	4111513	HSEQ@WRUSSYINGENIEROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					16 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73147839	\$3.006.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	330.300	330.300
Pensión	3	1.771.900	1.771.900
Riesgos Laborales	1	574.400	574.400
CCF	1	330.300	330.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	3.006.900	3.006.900

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901756844-2	CONSORCIO MEJORAMIENTO 23		CALLE 8F#79-94	4111513	HSEQ@WRUSSYINGENIEROS.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16 0
					TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73147839	\$3.006.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublejo	Extremo Colono anterior	Extremo Colono posterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN										
1	CC	1016036939	BARRERA PALACIOS LUIS MIGUEL	1	0				S	X						X									230301	912.396	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC	1016036939	BARRERA PALACIOS LUIS MIGUEL	1	0				S								X								230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	CC	1070820492	MIRANDA HERRERA ARQUIMIDES	1	0				S	X						X									230201	949.037	151.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1070820492	MIRANDA HERRERA ARQUIMIDES	1	0				S								X								230201	116.000	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1077633517	IBARGUEN GOMEZ ALBRIN MARGROBIN	1	0				S	X							X								230301	934.000	149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1077633517	IBARGUEN GOMEZ ALBRIN MARGROBIN	1	0				S								X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1107090634	PEREA BERRIO GILMAR	1	0				S	X							X								230301	856.667	137.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1107090634	PEREA BERRIO GILMAR	1	0				S									X							230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1111786310	GARCÉS SINISTERRA AIMER YESID	1	0				S	X							X								230301	895.333	143.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	1111786310	GARCÉS SINISTERRA AIMER YESID	1	0				S								X								230301	116.000	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	1150941917	VALENCIA TORRES JESUS DAVID	1	0				S	X							X								230301	934.000	149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	1150941917	VALENCIA TORRES JESUS DAVID	1	0				S								X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	79774751	TORRES SEGURA WILSON	1	0				S	X							X								230301	381.951	61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	79774751	TORRES SEGURA WILSON	1	0				S								X								230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1006193496	ARROLLO RENTERIA CHRISTIAN	1	0				S	X							X								230301	295.358	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1006193496	ARROLLO RENTERIA CHRISTIAN	1	0				S								X								230301	232.000	37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1193580410	QUIÑONEZ TORRES KEVIN	1	0				S	X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	CC	1193580410	QUIÑONEZ TORRES KEVIN	1	0				S								X								230301	348.000	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	84094073	PEREZ PACHECO MARIO ROBINSON	1	0				S	X							X								230301	420.618	67.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	84094073	PEREZ PACHECO MARIO ROBINSON	1	0				S								X								230301	116.000	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	CC	1039705553	VALENCIA GUERRERO JUAN CAMILO	1	0				S	X							X								230301	301.531	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	1039705553	VALENCIA GUERRERO JUAN CAMILO	1	0				S								X								230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	1070810107	ALVAREZ DE LOS REYES WILLIAM ANDRES	1	0				S	X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	1070810107	ALVAREZ DE LOS REYES WILLIAM ANDRES	1	0				S								X								230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	1028181031	HURTADO RUIZ JHON	1	0				S	X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	1028181031	HURTADO RUIZ JHON	1	0				S								X								230301	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	1028181149	MOSQUERA PRETEL JIMMY	1	0				S	X															25-14	154.667	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	CC	6174773	RIASCOS WAITOTO DARIO	1	0				S	X							X								230201	381.951	61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	6174773	RIASCOS WAITOTO DARIO	1	0				S								X								230201	502.667	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1149186363	VICTORIA ALBORNOS JUAN CAMILO	1	0				S	X							X								230301	360.346	57.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	1149186363	VICTORIA ALBORNOS JUAN CAMILO	1	0				S								X								230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73148027	\$1.067.100	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	119.200	0		0		0	0	0	0	119.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	18.700	0		0		0	0	0	0	18.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	239.900				239.900	0	0	239.900			2.399	239.900	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901756844-2	CONSORCIO MEJORAMIENTO 23		CALLE 8F#79-94	4111513	HSEQ@WRUSSYINGENIEROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	adm	adm	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73148027	\$1.067.100

DETALLE POR COTIZANTE																									
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
1	CC	1012415534	PARRA LEON MICHAEL STEVEN	1	0				S	X															
2	CC	1012442180	GARCIA NEGRETE MARIANA	1	0				S							X									
				Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
				230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	18.700	14-11	466.667	5	32.500	CCF56	466.667	18.700	0	0	0	0	0
				230301	2.978.927	476.700	0	0	0	0	EPS008	2.978.927	119.200	14-11	2.978.927	5	207.400	CCF56	2.978.927	119.200	0	0	0	0	0

PAGADA



No. 20240021360028011 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-JOIARQ-29.25

Bahía Málaga, 23 de enero de 2024

Señor
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal: CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
Dirección: CL 8 F 79 94
Correo: licitaciones@wrussyingenieros.com.
Dirección: Calle 25B No. 80 C 56
Bogotá D.C

Asunto: Citación reunión verificación de obras contrato N° 105-ARC-CBNL02-2023

Con relación al contrato No.105-ARC-CBNL02-2023 cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de la Armada Nacional para la defensa y seguridad de la nación en la Fuerza Naval del Pacífico a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste del lote 2 – construcción o mantenimiento o adecuación o rehabilitación o remodelación de bienes inmuebles o mejoramiento de bienes inmuebles, y previo lo manifestado durante el comité de obra el día 22 de enero de 2024, se requiere su asistencia a reunión el día 25 de enero de manera virtual, y el día 30 de enero de 2023, su asistencia presencial a las instalaciones de la Base Naval No. 02 ARC “Málaga”, con el fin de verificar los avances de obra por cada frente de trabajo, acuerdo los cronogramas de obra presentados, riesgos y novedades durante el tiempo que lleva de ejecución.

Así mismo, se debe tener en cuenta lo pactado en los comités de obra y suministrar la información solicitada acuerdo las fechas establecidas para cada punto. Toda vez que los procesos constructivos no cumplen con los requerimientos establecidos por parte de la entidad, ni satisface la necesidad planteada, lo cual genera retrasos en las obras, incertidumbre con respecto a la ejecución total y posibles incumplimientos por parte de su empresa para con la entidad.

Por lo anterior, se hace necesario por parte de la empresa, replantear la supervisión de las obras con relación al residente de obra líder, por novedades evidenciadas durante los recorridos y visitas por parte de la supervisión general, local y usuarios finales de cada frente de trabajo, ya que la mayoría de estas observaciones no han sido subsanadas en su totalidad y entregar los planes de mitigación de los mismos, para culminar con satisfacción el objeto del presente proceso.

Atentamente,



Teniente de Corbeta ALEJANDRA DOMÍNGUEZ ZAMBRANO
Supervisora contrato 105-ARC-CBNL02-2023


Copia: CBNL02, JDEADM

CONSORCIO MEJORAMIENTO 25	INFORME AVANCE DE OBRA	CODIGO GP-FOR-23																																																																																																																																																	
		VERSION 1																																																																																																																																																	
		FECHA APROBACION: 29/05/2020																																																																																																																																																	
SEMANA:		8																																																																																																																																																	
FECHA DE INICIO:		25 de noviembre de 2023																																																																																																																																																	
FECHA DE CORTE:		01 de diciembre de 2023																																																																																																																																																	
FRETE DE OBRA																																																																																																																																																			
1. Descripción de las actividades realizadas																																																																																																																																																			
Durante la semana 8 de la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio." Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:																																																																																																																																																			
EDIFICIO PROA Se realiza visita de inspeccion para el lavado de fachada																																																																																																																																																			
GUARDACOSTA ISLA NAVAL ADICION Se inicia limpieza de tanque y desinfeccion culminando la limpieza desinfeccion se continua con la limpieza de la viga canal																																																																																																																																																			
CAMARA SUBOFICIALES BN102 se zafarrear muros para afinar e iniciar a instalar enchape blanco 30x60.																																																																																																																																																			
2. Anexos																																																																																																																																																			
<table><tr><th colspan="8">ANALISIS VALOR GANADO</th></tr><tr><th colspan="3">PRESUPUESTO:</th><th colspan="2">\$ 1.977.970.086,14</th><th colspan="2">VALOR EJECUTADO (EV)</th><th colspan="1">% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO</th></tr><tr><th colspan="3">VALOR PROYECTADO (PV):</th><th colspan="2">\$ 1.977.970.086,14</th><th colspan="2">\$ 17.965.267,33</th><th colspan="1">\$ -</th></tr><tr><th>SEMANA</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA FIN</th><th>% PROYECTADO (% PV)</th><th>VR PROYECTADO (PV)</th><th>% EJECUTADO (% EV)</th><th>VR EJECUTADO (EV)</th><th>% DIFERENCIA (SV)</th></tr><tr><td>1</td><td>10/10/2023</td><td>13/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>2</td><td>14/10/2023</td><td>20/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>3</td><td>21/10/2023</td><td>27/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>4</td><td>28/10/2023</td><td>3/11/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>5</td><td>4/11/2023</td><td>10/11/2023</td><td>0,20%</td><td>\$ 3.955.940,17</td><td>0,43%</td><td>\$ 8.433.150,43</td><td>0,23%</td></tr><tr><td>6</td><td>11/11/2023</td><td>17/11/2023</td><td>0,80%</td><td>\$ 15.823.760,69</td><td>0,91%</td><td>\$ 17.965.267,33</td><td>0,11%</td></tr><tr><td>7</td><td>18/11/2023</td><td>24/11/2023</td><td>1,20%</td><td>\$ 23.735.641,03</td><td>2,00%</td><td>\$ 39.568.415,26</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>8</td><td>25/11/2023</td><td>1/12/2023</td><td>2,50%</td><td>\$ 49.449.252,15</td><td>2,66%</td><td>\$ 52.554.665,19</td><td>0,16%</td></tr><tr><td>9</td><td>2/12/2023</td><td>8/12/2023</td><td>16,65%</td><td>\$ 329.380.945,09</td><td></td><td>\$ -</td><td>-16,65%</td></tr><tr><td>10</td><td>9/12/2023</td><td>15/12/2023</td><td>45,30%</td><td>\$ 896.020.449,02</td><td></td><td>\$ -</td><td>-45,30%</td></tr><tr><td>11</td><td>16/12/2023</td><td>22/12/2023</td><td>100,00%</td><td>\$ 1.977.970.086,14</td><td></td><td>\$ -</td><td>-100,00%</td></tr></table> <div><div>AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL</div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><table><tr><td>% PROYECTADO (% PV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,20%</td><td>0,80%</td><td>1,20%</td><td>2,50%</td><td>16,65%</td><td>45,30%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>% EJECUTADO (% EV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,43%</td><td>0,91%</td><td>2,00%</td><td>2,66%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div><div></div></div>				ANALISIS VALOR GANADO								PRESUPUESTO:			\$ 1.977.970.086,14		VALOR EJECUTADO (EV)		% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO	VALOR PROYECTADO (PV):			\$ 1.977.970.086,14		\$ 17.965.267,33		\$ -	SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)	1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%	6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%	7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%	8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.554.665,19	0,16%	9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09		\$ -	-16,65%	10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02		\$ -	-45,30%	11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%	% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%	% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%			
ANALISIS VALOR GANADO																																																																																																																																																			
PRESUPUESTO:			\$ 1.977.970.086,14		VALOR EJECUTADO (EV)		% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO																																																																																																																																												
VALOR PROYECTADO (PV):			\$ 1.977.970.086,14		\$ 17.965.267,33		\$ -																																																																																																																																												
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)																																																																																																																																												
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																												
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																												
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																												
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																												
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%																																																																																																																																												
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%																																																																																																																																												
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%																																																																																																																																												
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.554.665,19	0,16%																																																																																																																																												
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09		\$ -	-16,65%																																																																																																																																												
10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02		\$ -	-45,30%																																																																																																																																												
11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%																																																																																																																																												
% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%																																																																																																																																								
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%																																																																																																																																											



Observaciones: El traslado del material se ha retrasado por que la marea se baja y la lancha no puede salir, adicional a esto los vientos fuertes.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23		INFORME AVANCE DE OBRA		CODIGO GP-FOR-23																									
				VERSION 1																									
				FECHA APROBACION: 29/05/2020																									
SEMANA:		9																											
FECHA DE INICIO:		02 de diciembre de 2023																											
FECHA DE CORTE:		08 de diciembre de 2023																											
FRETE DE OBRA																													
1. Descripcion de las actividades realizadas																													
Durante la semana 8 de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:																													
EDIFICIO PROA Se inicia lavada de fachada y cubierta.																													
CASA ALMIRANTE Se inicia con replanteo y excavacion para zapatas.																													
GRUPO AERONAVAL 2 Se inicia desmonte de techo y matenimiento estructura metalica																													
GAMPA Se inicia a realizar mantenimiento con anticorrosivo estructura metalica e instlacion perfleria metalica, llegada de teja arquitectonica tono verde esmeralda																													
2. Anexos																													
ANALISIS VALOR GANADO																													
PRESUPUESTO:		\$ 1.977.970.086,14		VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO																								
VALOR PROYECTADO (PV):		\$ 1.977.970.086,14		\$ 17.965.267,33	\$ -																								
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)																						
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																						
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																						
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																						
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																						
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%																						
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%																						
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%																						
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.614.004,29	0,16%																						
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09	17,50%	\$ 346.144.765,07	0,85%																						
10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02		\$ -	-45,30%																						
11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%																						
AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL																													
<table><tr><td>% PROYECTADO (% PV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,20%</td><td>0,80%</td><td>1,20%</td><td>2,50%</td><td>16,65%</td><td>45,30%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>% EJECUTADO (% EV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,43%</td><td>0,91%</td><td>2,00%</td><td>2,66%</td><td>17,50%</td><td></td><td></td></tr></table>						% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%	% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%		
% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%																		
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%																				






Observaciones:

- La mula que llevaba el material tuvo problemas por la restricción en el país por festivo de 8/12/2023, lo que ocasiono que llegara el día Lunes 11 de diciembre.
- El día 4 diciembre se cargo la lancha con el material, pero como la marea estaba bajita no se pudo trasladar el material.
- las lanchas se han tenido que devolver porque en maguipi ya que el oleaje a sido fuerte y se corre el riesgo de que la lancha de volteee.
- El 8 diciembre en edificio proa no tenia luz lo que dificulto el trabajo en el frente.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

1

FECHA DE INICIO:

10 de octubre de 2023

FECHA DE CORTE:

13 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripción de las actividades realizadas

Durante la **semana 1** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

Se inician actividades administrativas como afiliación de personal , procesos de seguridad y salud en el trabajo.

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO

PRESUPUESTO:	\$	1,977,970,086.14	VALOR EJECUTADO (EV)		% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1,977,970,086.14	\$	-	\$

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$	3,955,940.17	0.00%	\$
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$	15,823,760.69	0.00%	\$
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$	23,735,641.03	0.00%	\$
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$	49,449,252.15	0.00%	\$
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$	329,380,945.09	0.00%	\$
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$	896,020,449.02	0.00%	\$
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$	1,977,970,086.14	0.00%	\$

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	45.30%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. REVISIÓN

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

2

14de octubre de 2023

20 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripcion de las actividades realizadas

Durante la **semana 1** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

Se inician actividades administrativas como afiliacion de personal , procesos de seguridad y salud en el trabajo.

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO

PRESUPUESTO:	\$	1,977,970,086.14	VALOR EJECUTADO (EV)		% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1,977,970,086.14	\$	-	\$

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$	-	0.00%	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$	3,955,940.17	0.00%	-0.20%
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$	15,823,760.69	0.00%	-0.80%
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$	23,735,641.03	0.00%	-1.20%
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$	49,449,252.15	0.00%	-2.50%
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$	329,380,945.09	0.00%	-16.65%
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$	896,020,449.02	0.00%	-45.30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$	1,977,970,086.14	0.00%	-100.00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	45.30%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. REVISIÓN

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

3

FECHA DE INICIO:

21 de octubre de 2023

FECHA DE CORTE:

27 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripcion de las actividades realizadas

Durante la **semana 1** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

Se realiza visita el día 23 de octubre de 2023 junto con la supervisora ALEJANDRA DOMINGUEZ ZAMBRANO para definir cuadrillas de trabajo y frentes de trabajo a intervenir.

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO

PRESUPUESTO:	\$	1,977,970,086.14	VALOR EJECUTADO (EV)		% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO		
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1,977,970,086.14	\$	-	\$	-	
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$ 3,955,940.17	0.00%	\$ -	-0.20%
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$ 15,823,760.69	0.00%	\$ -	-0.80%
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$ 23,735,641.03	0.00%	\$ -	-1.20%
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$ 49,449,252.15	0.00%	\$ -	-2.50%
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$ 329,380,945.09	0.00%	\$ -	-16.65%
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$ 896,020,449.02	0.00%	\$ -	-45.30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$ 1,977,970,086.14	0.00%	\$ -	-100.00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	45.30%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. REVISIÓN

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

4

FECHA DE INICIO:

28 de octubre de 2023

FECHA DE CORTE:

03 de Noviembre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripción de las actividades realizadas

Durante la **semana 1** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

Se continua con el proceso de afiliacion de personal y capacitaciones.

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO								
PRESUPUESTO:	\$		1,977,970,086.14		VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO		
VALOR PROYECTADO (PV):	\$		1,977,970,086.14		\$	-	\$	-
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)	
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$ 3,955,940.17	0.00%	\$ -	-0.20%	
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$ 15,823,760.69	0.00%	\$ -	-0.80%	
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$ 23,735,641.03	0.00%	\$ -	-1.20%	
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$ 49,449,252.15	0.00%	\$ -	-2.50%	
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$ 329,380,945.09	0.00%	\$ -	-16.65%	
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$ 896,020,449.02	0.00%	\$ -	-45.30%	
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$ 1,977,970,086.14	0.00%	\$ -	-100.00%	

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	45.30%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. REVISIÓN

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

5

4 de Noviembre de 2023

10 de Noviembre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripción de las actividades realizadas

Durante la semana 1 de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 3 Se inicia afinado de piso sobre cubierta

BAÑOS Se inicia a demoler enchape de baños

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO							
PRESUPUESTO:		\$		1,977,970,086.14		VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO
VALOR PROYECTADO (PV):		\$		1,977,970,086.14		\$ 8,433,150.43	\$ -
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$ 3,955,940.17	0.43%	\$ 8,433,150.43	0.23%
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$ 15,823,760.69	0.00%	\$ -	-0.80%
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$ 23,735,641.03	0.00%	\$ -	-1.20%
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$ 49,449,252.15	0.00%	\$ -	-2.50%
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$ 329,380,945.09	0.00%	\$ -	-16.65%
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$ 896,020,449.02	0.00%	\$ -	-45.30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$ 1,977,970,086.14	0.00%	\$ -	-100.00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	45.30%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. REVISIÓN

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:	7
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre de 2023
FECHA DE CORTE:	24 de Noviembre de 2023
FRETE DE OBRA	

1. Descripcion de las actividades realizadas

Durante la **semana 7** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

LB BAÑOS BAHIA MALAGA Se continua con demolicion de enchape de muros , se continua demolicion de lavamanos corrido, se hacen regatas para retiro de instalacion hidraulica, se finaliza demolicion muro divisorio.

DPTO DE ADMON BNLO2 se realiza el desmonte de estructura de soporte y angulo perimetral.

CAMARA SUBOFICIALES BNLO2 se coontinua retiro de enchapen en baños y cocina.

GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 3 Se inicia aplicacion en cubierta de emulsion bituminosa.

2. Anexos

ANALISIS VALOR GANADO							
PRESUPUESTO:	\$	1,977,970,086.14	VALOR EJECUTADO (EV)			% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO	
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1,977,970,086.14	\$	17,965,267.33	\$	-	
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%		0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$ 3,955,940.17	0.43%	\$ 8,433,150.43	0.23%
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$ 15,823,760.69	0.91%	\$ 17,965,267.33	0.11%
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$ 23,735,641.03	2.00%	\$ 39,568,415.26	0.80%
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$ 49,449,252.15	0.00%	\$ -	-2.50%
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$ 329,380,945.09	0.00%	\$ -	-16.65%
10	9/12/2023	15/12/2023	45.30%	\$ 896,020,449.02	0.00%	\$ -	-45.30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100.00%	\$ 1,977,970,086.14	0.00%	\$ -	-100.00%





Observaciones: Se evidencia bastante variacion en el clima presentando mucha lluvia lo que dificulta un poco el trasiego del material.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

8

25 de noviembre de 2023

01 de diciembre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripcion de las actividades realizadas

Durante la **semana 8** de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

EDIFICIO PROA Se realiza visita de inspeccion para el lavado de fachada

GUARDACOSTA ISLA NAVAL ADICION Se inicia limpieza de tanque y desinfeccion culminando la limpieza desinfeccion se continua con la limpieza de la viga canal

CAMARA SUBOFICIALES BNLO2 se zafarrean muros para afinar e iniciar a instalar enchape blanco 30x60.

2. Anexos



ANALISIS VALOR GANADO


PRESUPUESTO:	\$	1.977.970.086,14	VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1.977.970.086,14	\$ 17.965.267,33	\$ -

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.554.665,19	0,16%
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09		\$ -	-16,65%
10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02		\$ -	-45,30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%


AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%			

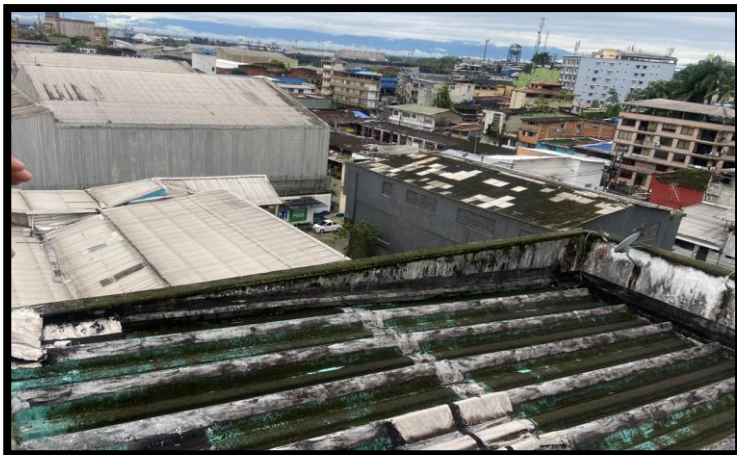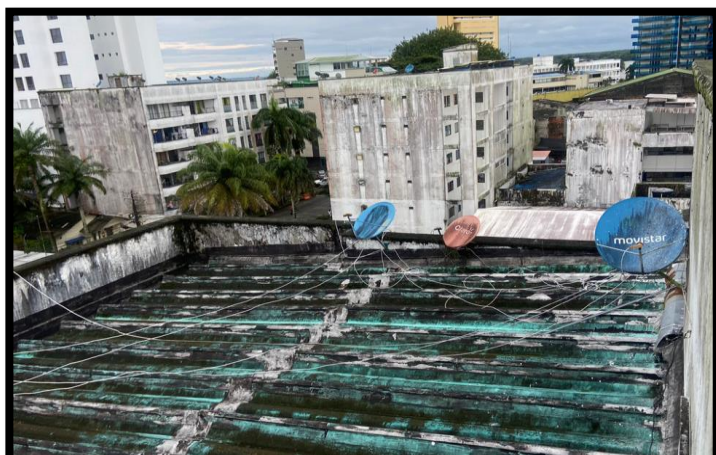

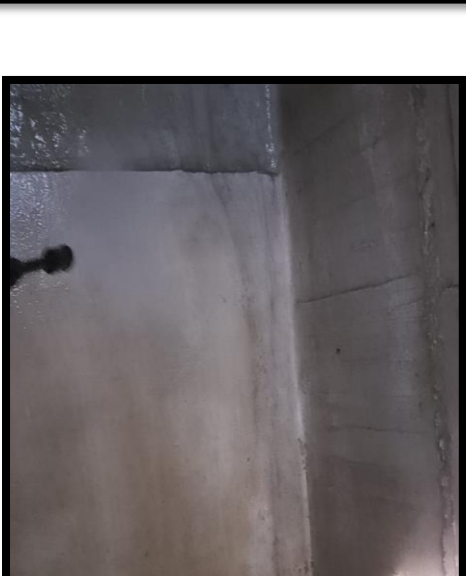



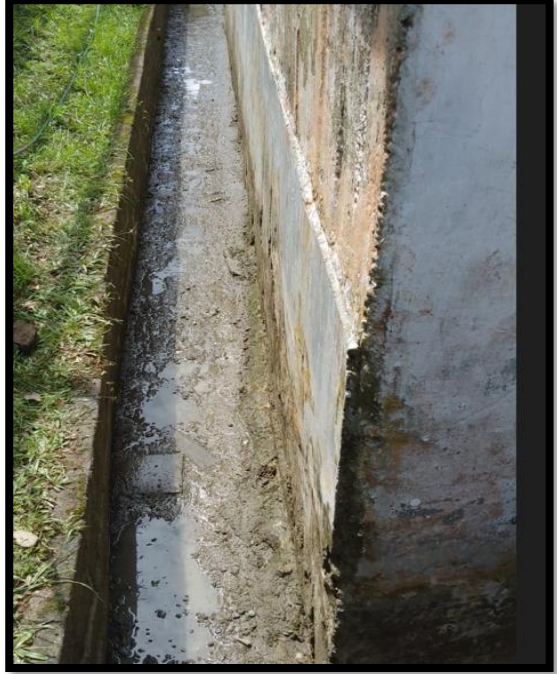

Observaciones: El traslado del material se ha retrasado por que la marea se baja y la lancha no puede salir,adicional a esto los vientos fuertes.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FOR-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

FRENTE DE OBRA

9

02 de diciembre de 2023

08 de diciembre de 2023

1. Descripcion de las actividades realizadas

Durante la semana 8 de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

EDIFICIO PROA Se inicia lavada de fachada y cubierta.

CASA ALMIRANTE Se inicia con replanteo y excavacion para zapatas.

GRUPO AERONAVAL 2 Se inicia desmonte de techo y matenimiento estructura metalica

GAMPA Se inicia a realizar mantenimiento con anticorrosivo estructura metalica e instalacion perfleria metalica, llegada de teja arquitectonica tono verde esmeralda

2. Anexos


ANALISIS VALOR GANADO

PRESUPUESTO:	\$	1.977.970.086,14	VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1.977.970.086,14	\$ 17.965.267,33	-

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.614.004,29	0,16%
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09	17,50%	\$ 346.144.765,07	0,85%
10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02		\$ -	-45,30%
11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%		

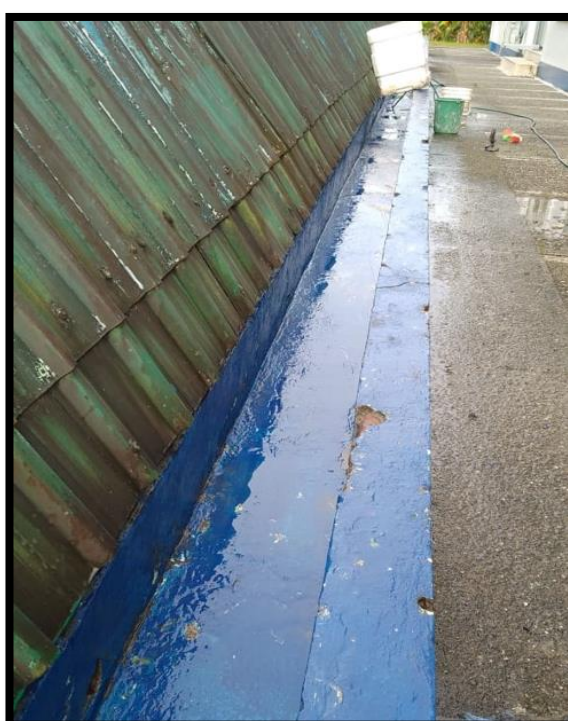








Observaciones:
-La mula que llevaba el material tuvo problemas por la restriccion en el pais por festivo de 8/12/2023, lo que ocasiono que llegara el dia lunes 11 de diciembre.
- El dia 4 diciembre se cargo la lancha con el material, pero como la marea estaba bajita no se pudo trasladar el material.
-las lanchas se han tenido que devolver porque en maguipi ya que el oleaje a sido fuerte y se corre el riesgo de que la lancha de volteee.
-El 8 diciembre en edificio proa no tenia luz lo que dificulto el trabajo en el frente.
-El 8 diciembre por fuertes lluvias la lancha no pudo llevar los trabajadores al frente malaga

3. REVISIÓN



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RÚSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23	INFORME AVANCE DE OBRA		CODIGO GP-FOR-23																																																																																																																																																														
			VERSION 1																																																																																																																																																														
			FECHA APROBACION: 29/05/2020																																																																																																																																																														
SEMANA:		10																																																																																																																																																															
FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2023																																																																																																																																																															
FECHA DE CORTE:		15 de diciembre de 2023																																																																																																																																																															
FRENTE DE OBRA																																																																																																																																																																	
1. Descripcion de las actividades realizadas																																																																																																																																																																	
Durante la semana 8 de la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio.” Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:																																																																																																																																																																	
EDIFICIO PROA Se continua con lavada fachada principal en mas de un 50%.																																																																																																																																																																	
CASA ALMIRANTE Se continua con descapote y excavacion de zapatas																																																																																																																																																																	
GRUPO AERONAVAL 2 Se continua desmonte de techo y matenimiento estructura metalica																																																																																																																																																																	
GAMPA Se inicia instalacion teja arquitectonica verde esmeralda																																																																																																																																																																	
COAL BNLO2-COCINA Se inician actividades remplazo de columnas que estaban corroidas																																																																																																																																																																	
DPTO ALOJAMIENTOS MILITARES BNLO se dan inicio a las actividades , regateo .																																																																																																																																																																	
2. Anexos																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="8">ANALISIS VALOR GANADO</th></tr><tr><th>PRESUPUESTO:</th><td colspan="3">\$ 1.977.970.086,14</td><th>VALOR EJECUTADO (EV)</th><td colspan="3"></td><th>% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO</th></tr><tr><th>VALOR PROYECTADO (PV):</th><td colspan="3">\$ 1.977.970.086,14</td><td>\$ 17.965.267,33</td><td colspan="3">\$</td><td>-</td></tr></table> <table><tr><th>SEMANA</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA FIN</th><th>% PROYECTADO (% PV)</th><th>VR PROYECTADO (PV)</th><th>% EJECUTADO (% EV)</th><th>VR EJECUTADO (EV)</th><th>% DIFERENCIA (SV)</th></tr><tr><td>1</td><td>10/10/2023</td><td>13/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>2</td><td>14/10/2023</td><td>20/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>3</td><td>21/10/2023</td><td>27/10/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>4</td><td>28/10/2023</td><td>3/11/2023</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>5</td><td>4/11/2023</td><td>10/11/2023</td><td>0,20%</td><td>\$ 3.955.940,17</td><td>0,43%</td><td>\$ 8.433.150,43</td><td>0,23%</td></tr><tr><td>6</td><td>11/11/2023</td><td>17/11/2023</td><td>0,80%</td><td>\$ 15.823.760,69</td><td>0,91%</td><td>\$ 17.965.267,33</td><td>0,11%</td></tr><tr><td>7</td><td>18/11/2023</td><td>24/11/2023</td><td>1,20%</td><td>\$ 23.735.641,03</td><td>2,00%</td><td>\$ 39.568.415,26</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>8</td><td>25/11/2023</td><td>1/12/2023</td><td>2,50%</td><td>\$ 49.449.252,15</td><td>2,66%</td><td>\$ 52.614.004,29</td><td>0,16%</td></tr><tr><td>9</td><td>2/12/2023</td><td>8/12/2023</td><td>16,65%</td><td>\$ 329.380.945,09</td><td>17,50%</td><td>\$ 346.144.765,07</td><td>0,85%</td></tr><tr><td>10</td><td>9/12/2023</td><td>15/12/2023</td><td>45,30%</td><td>\$ 896.020.449,02</td><td>45,40%</td><td>\$ 897.998.419,11</td><td>0,10%</td></tr><tr><td>11</td><td>16/12/2023</td><td>22/12/2023</td><td>100,00%</td><td>\$ 1.977.970.086,14</td><td></td><td>\$ -</td><td>-100,00%</td></tr></table> <div><div>AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL</div><table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td>% PROYECTADO (% PV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,20%</td><td>0,80%</td><td>1,20%</td><td>2,50%</td><td>16,65%</td><td>45,30%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>% EJECUTADO (% EV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,43%</td><td>0,91%</td><td>2,00%</td><td>2,66%</td><td>17,50%</td><td>45,40%</td><td></td></tr></table></div>				ANALISIS VALOR GANADO								PRESUPUESTO:	\$ 1.977.970.086,14			VALOR EJECUTADO (EV)				% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO	VALOR PROYECTADO (PV):	\$ 1.977.970.086,14			\$ 17.965.267,33	\$			-	SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)	1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%		0,00%	2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%	6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%	7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%	8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.614.004,29	0,16%	9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09	17,50%	\$ 346.144.765,07	0,85%	10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02	45,40%	\$ 897.998.419,11	0,10%	11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%	% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%	45,40%	
ANALISIS VALOR GANADO																																																																																																																																																																	
PRESUPUESTO:	\$ 1.977.970.086,14			VALOR EJECUTADO (EV)				% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO																																																																																																																																																									
VALOR PROYECTADO (PV):	\$ 1.977.970.086,14			\$ 17.965.267,33	\$			-																																																																																																																																																									
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)																																																																																																																																																										
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%		0,00%																																																																																																																																																										
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																																										
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																																										
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																																																																																																																																										
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%																																																																																																																																																										
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%																																																																																																																																																										
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%																																																																																																																																																										
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.614.004,29	0,16%																																																																																																																																																										
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09	17,50%	\$ 346.144.765,07	0,85%																																																																																																																																																										
10	9/12/2023	15/12/2023	45,30%	\$ 896.020.449,02	45,40%	\$ 897.998.419,11	0,10%																																																																																																																																																										
11	16/12/2023	22/12/2023	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																						
% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	45,30%	100,00%																																																																																																																																																						
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%	45,40%																																																																																																																																																							

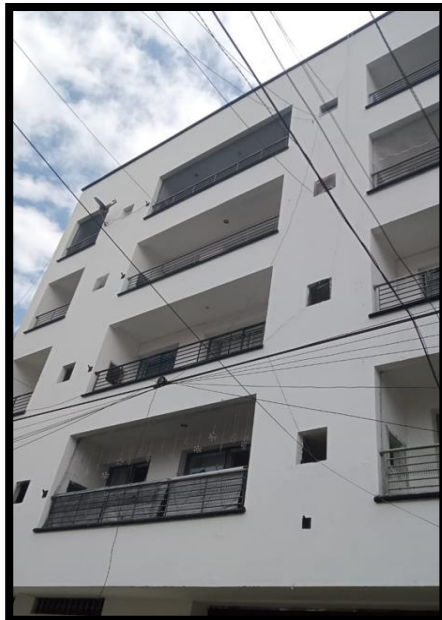





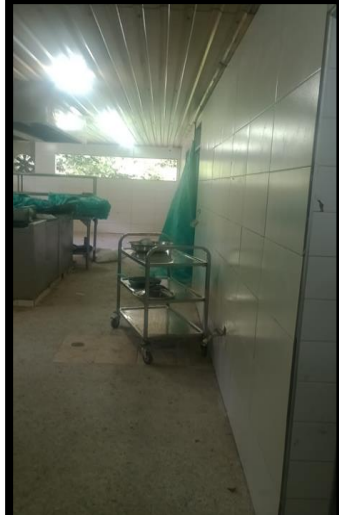






Observaciones:
-El lunes 11 de diciembre llega la mula pero no se puede cargar todo el material a la lancha debido al peso para llevar a los diferentes frentes materiales.
- El día 14 de diciembre llovió muy fuerte y no se pudo llevar el personal al frente de malaga
- El día 15 de diciembre llovió en los frentes Edificio proa , Isla naval, Malaga lo que retrasa las tareas ya que algunas de estas son mantenimientos e instalaciones en cubiertas.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RÚSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

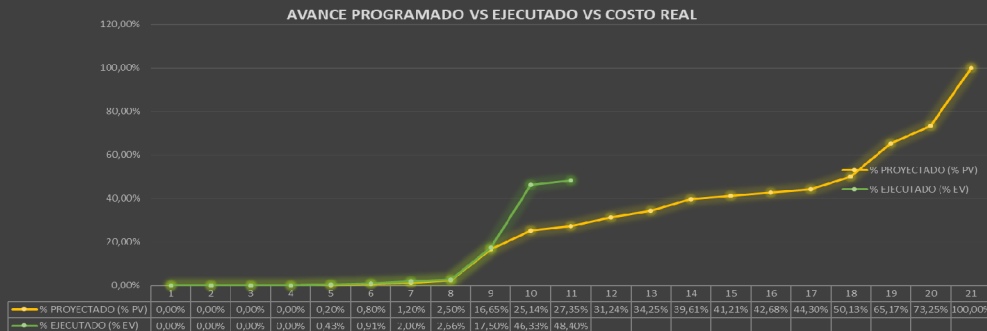		INFORME AVANCE DE OBRA		CODIGO GP-FOR-23																																															
				VERSION 1																																															
				FECHA APROBACION: 29/05/2020																																															
SEMANA:		11																																																	
FECHA DE INICIO:		16 de diciembre de 2023																																																	
FECHA DE CORTE:		22 de diciembre de 2023																																																	
FRENTE DE OBRA																																																			
1. Descripción de las actividades realizadas																																																			
Durante la semana 11 de la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio." Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:																																																			
EDIFICIO PROA Se continua con lavada fachada principal en mas de un 50%.																																																			
GRUPO AERONAVAL 2 Se continua desmonte de techo y mantenimiento estructura metalica																																																			
GAMPA Se inicia instalacion teja arquitectonica verde esmeralda																																																			
COAL BNL02-COCINA Se inician actividades remplazo de columnas que estaban corroidas																																																			
DPTO ALOJAMIENTOS MILITARES BNLO Se inicia instalacion enchape blanco 30x60																																																			
COLEGIO NAVAL Se inician limpiezas en columnas metalicas y cambio de perfil retirado,se hace aplicacion de anticorrosivo y aplicacion de pintura esmalte blanco.																																																			
BAÑOS se inicia instalacion de carpinteria metalica																																																			
GUARDA COSTA se inicio instlacion de estructura metalica par ainstlacion de teja termo acustica azul																																																			
2. Anexos																																																			
ANALISIS VALOR GANADO																																																			
PRESUPUESTO:		\$	1.977.970.086,14	VALOR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO																																														
VALOR PROYECTADO (PV):		\$	1.977.970.086,14	\$ 17.965.267,33	\$ -																																														
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)																																												
1	10/10/2023	13/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																												
2	14/10/2023	20/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																												
3	21/10/2023	27/10/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																												
4	28/10/2023	3/11/2023	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%																																												
5	4/11/2023	10/11/2023	0,20%	\$ 3.955.940,17	0,43%	\$ 8.433.150,43	0,23%																																												
6	11/11/2023	17/11/2023	0,80%	\$ 15.823.760,69	0,91%	\$ 17.965.267,33	0,11%																																												
7	18/11/2023	24/11/2023	1,20%	\$ 23.735.641,03	2,00%	\$ 39.568.415,26	0,80%																																												
8	25/11/2023	1/12/2023	2,50%	\$ 49.449.252,15	2,66%	\$ 52.614.004,29	0,16%																																												
9	2/12/2023	8/12/2023	16,65%	\$ 329.380.945,09	17,50%	\$ 346.144.765,07	0,85%																																												
10	9/12/2023	15/12/2023	25,14%	\$ 497.261.679,66	46,33%	\$ 916.393.540,91	21,19%																																												
11	16/12/2023	22/12/2023	27,35%	\$ 540.974.818,56	48,40%	\$ 957.337.521,69	21,05%																																												
12	23/12/2023	29/12/2023	31,24%	\$ 617.917.854,91		\$ -	-31,24%																																												
13	30/12/2023	5/01/2024	34,25%	\$ 677.454.754,50		\$ -	-34,25%																																												
14	6/01/2024	12/01/2024	39,61%	\$ 783.473.951,12		\$ -	-39,61%																																												
15	13/01/2024	19/01/2024	41,21%	\$ 815.121.472,50		\$ -	-41,21%																																												
16	20/01/2024	26/01/2024	42,68%	\$ 844.197.632,76		\$ -	-42,68%																																												
17	27/01/2024	2/02/2024	44,30%	\$ 876.240.748,16		\$ -	-44,30%																																												
18	3/02/2024	9/02/2024	50,13%	\$ 991.556.404,18		\$ -	-50,13%																																												
19	10/02/2024	16/02/2024	65,17%	\$ 1.289.043.105,14		\$ -	-65,17%																																												
20	17/02/2024	23/02/2024	73,25%	\$ 1.448.863.088,10		\$ -	-73,25%																																												
21	24/02/2024	28/02/2024	100,00%	\$ 1.977.970.086,14		\$ -	-100,00%																																												
AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL																																																			
																																																			
<table><tr><td>% PROYECTADO (% PV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,20%</td><td>0,80%</td><td>1,20%</td><td>2,50%</td><td>16,65%</td><td>25,14%</td><td>27,35%</td><td>31,24%</td><td>34,25%</td><td>39,61%</td><td>41,21%</td><td>42,68%</td><td>44,30%</td><td>50,13%</td><td>65,17%</td><td>73,25%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>% EJECUTADO (% EV)</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,43%</td><td>0,91%</td><td>2,00%</td><td>2,66%</td><td>17,50%</td><td>46,33%</td><td>48,40%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	25,14%	27,35%	31,24%	34,25%	39,61%	41,21%	42,68%	44,30%	50,13%	65,17%	73,25%	100,00%	% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%	46,33%	48,40%										
% PROYECTADO (% PV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	1,20%	2,50%	16,65%	25,14%	27,35%	31,24%	34,25%	39,61%	41,21%	42,68%	44,30%	50,13%	65,17%	73,25%	100,00%																														
% EJECUTADO (% EV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,91%	2,00%	2,66%	17,50%	46,33%	48,40%																																								
																																																			





Observaciones:

- El lunes 18 diciembre se presentan fuertes lluvias en el frente de Juan Chaco, Malaga e Isla Naval lo que dificulta el trabajo puesto que están instalando cubiertas
- El martes 19 de diciembre se presentan fuertes lluvias en el edificio Proa y Malaga.
- El jueves 21 de diciembre por mal clima no se puede trasladar material de ventanería al frente de Juan Chaco, adicional se deben detener trabajos de cubierta por la lluvia
- Por fuertes lluvias en el frente de Casa Almirante no se pudo avanzar durante 2 días

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME AVANCE DE OBRA

CODIGO GP-FO-23

VERSION 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

SEMANA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

12

29 de diciembre de 2023

23 de diciembre de 2023

FRENTE DE OBRA

1. Descripción de las actividades realizadas

Durante la semana 12 de la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio." Se adelantaron las siguientes actividades en cada uno de los distintos frentes:

ISLA NAVAL: SE TERMINA LA APLICACION DE PAÑETE Y PINTURA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

MALAGA: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEDO EN LA ZONA INTERVENIDA DE LA CASA DEL ALMIRANTE

COMANDO BASE: INSTALACION DE MURO DIVISORIO

2. Anexos


ANALISIS VALOR GANADO

PRESUPUESTO:	\$	1,977,970,086.14	VALOR EJECUTADO (EV)	\$	968,611,951.18	% DIFERENCIA EJECUTADO VS PROYECTADO	17.73%
VALOR PROYECTADO (PV):	\$	1,977,970,086.14		\$	968,611,951.18		17.73%

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROYECTADO (% PV)	VR PROYECTADO (PV)	% EJECUTADO (% EV)	VR EJECUTADO (EV)	% DIFERENCIA (SV)
1	10/10/2023	13/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
2	14/10/2023	20/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	21/10/2023	27/10/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	28/10/2023	3/11/2023	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	4/11/2023	10/11/2023	0.20%	\$ 3,955,940.17	0.43%	\$ 8,433,150.43	0.23%
6	11/11/2023	17/11/2023	0.80%	\$ 15,823,760.69	0.91%	\$ 17,965,267.33	0.11%
7	18/11/2023	24/11/2023	1.20%	\$ 23,735,641.03	2.00%	\$ 39,568,415.26	0.80%
8	25/11/2023	1/12/2023	2.50%	\$ 49,449,252.15	2.66%	\$ 52,614,004.29	0.16%
9	2/12/2023	8/12/2023	16.65%	\$ 329,380,945.09	17.50%	\$ 346,144,765.07	0.85%
10	9/12/2023	15/12/2023	25.14%	\$ 497,261,679.66	46.33%	\$ 916,393,540.91	21.19%
11	16/12/2023	22/12/2023	27.35%	\$ 540,974,818.56	48.40%	\$ 957,337,521.69	21.05%
12	23/12/2023	29/12/2023	31.24%	\$ 617,917,854.91	48.97%	\$ 968,611,951.18	17.73%
13	30/12/2023	5/01/2024	34.25%	\$ 677,454,754.50		\$ -	-34.25%
14	6/01/2024	12/01/2024	39.61%	\$ 783,473,951.12		\$ -	-39.61%
15	13/01/2024	19/01/2024	41.21%	\$ 815,121,472.50		\$ -	-41.21%
16	20/01/2024	26/01/2024	42.68%	\$ 844,197,632.76		\$ -	-42.68%
17	27/01/2024	2/02/2024	44.30%	\$ 876,240,748.16		\$ -	-44.30%
18	3/02/2024	9/02/2024	50.13%	\$ 991,556,404.18		\$ -	-50.13%
19	10/02/2024	16/02/2024	65.17%	\$ 1,289,043,105.14		\$ -	-65.17%
20	17/02/2024	23/02/2024	73.25%	\$ 1,448,863,088.10		\$ -	-73.25%
21	24/02/2024	28/02/2024	100.00%	\$ 1,977,970,086.14		\$ -	-100.00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO VS COSTO REAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
% PROYECTADO (% PV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	1.20%	2.50%	16.65%	25.14%	27.35%	31.24%	34.25%	39.61%	41.21%	42.68%	44.30%	50.13%	65.17%	73.25%	100.00%
% EJECUTADO (% EV)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.91%	2.00%	2.66%	17.50%	46.33%	48.40%	48.97%									

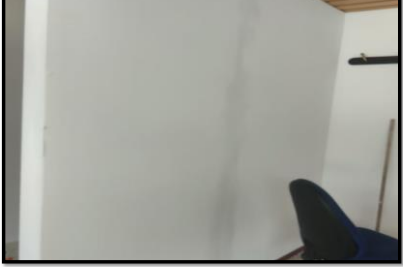

Observaciones:
Por motivo de festividades no se conto con la totalidad del personal durante los dias martes y miércoles.

3. REVISIÓN


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

INFORME SEMANAL SST

SEMANA DEL 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2023.

**ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA
MALAGA”**



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Elaboró:

MARIANA GARCIA NEGRETE
SUPERVISORA HSEQ
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

Revisó y Aprobó:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL COVID.19.

1. Listado de personal que laboraron en obra de la semana del 30 Noviembre al 06 Diciembre 2023.

No	Nombre Y Apellido	Cedula	Empresa	Cargo	Estado	Frete de Trabajo	Ingreso	Egreso
1	Wilver Franciny Russey Ladino	80.212.380	Consorcio Mejoramiento 23	Director de Obra	ACTIVO			
2	Mariana Garcia Negrete	1.012.442.180	Consorcio Mejoramiento 23	Supervisora Hseq	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	08-11-2023	
3	Michael Steven Parra Leon	1012415534	Consorcio Mejoramiento 23	Residente De Obra	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	27-11-2023	
4	Yuber Albeiro Perez Rodriguez	80.199.653	Consorcio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
5	Gilmar Perea Berrio	1,107,090,634	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
6	Albrin Margrobin Ibarguen Gomez	1,077,633,517	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
7	Jesus David Valencia Torres	1,150,941,917	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
8	Aimer Yesid Garces Sinisterra	1,111,786,310	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
9	Arquimides Miranda Herrera	1,070,820,492	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	10-11-2023	
10	Luis Miguel Barrera Palacios	1,016,036,939	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
11	Oscar Gustavo Caro Saavedra	80,819,503	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
12	Carlos Eduardo Suarez Guerrero	1,019,01,410	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	21-11-2023	
13	John Edwing Ramirez Arguello	1.102.719.047	Consorcio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	

INFORME SEMANAL

14	Alex Ricardo Puello Pedreros	8,567,360	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	
15	Dario Riascos Waitoto	5,174,773	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
16	Wilson Torres Segura	79,774,751	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
17	Mario Robinson Perez Pacheco	84,094,073	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
18	Christian Arrollo Renteria	1,006,193,496	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	24-11-2023	
19	Kevin Quiñonez Torres	1,193,580,410	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
20	William Andres Alvarez De Los Reyes	1,070,810,107	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
21	Jhon Hurtado Ruiz	1,028,181,031	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
22	Jimmy Mosquera Pretel	1,028,181,149	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
23	Juan Camilo Valencia Guerrero	1,039,705,553	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
24	Juan Camilo Victoria Albornos	1,149,186,363	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
25	Carlos Arturo Suarez Forero	79.238.174	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	24-11-2023	
26	Leonel David Rueda Royero	1.068.976.760	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	02-12-2023	
27	Claudia Alexandra Daza Vargas	1.002.696.225	Consorcio Mejoramiento 23	Inspectora SST	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	02-11-2023	
28	Wilmer Garcia Hurtado	16.483.525	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
29	Eusebio Orobio Salazar	12.798.086	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

2. Registro Fotografico de las actividades realizadas en obra relacionadas al area Seguridad y Salud en el trabajo de la semana correspondiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23


INFORME SEMANAL



Las charlas y pausas se realizan al inicio de la jornada laboral.

Inspeccion de equipos de emergencia (Camilla, extintores, botiquin de primeros auxilios)

Protocolos de Ingreso

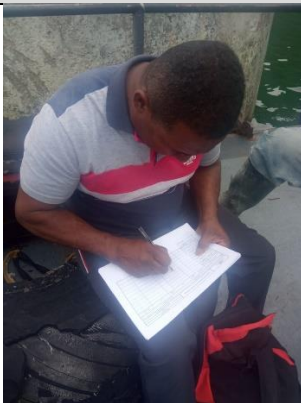



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Las inspeccion a los equipos se realizan diariamente con el proposito de identificar las averias y realizar los respectivos mantenimientos.

Punto de hidratacion

Señalizacion en obra

Clasificacion de residuos solidos en obra.

Se realizo jornada de Aseo en obra



Entrega de elementos de proteccion personal.



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Actividades Propuestas

3. CONCLUSIONES

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.
- Con ayuda del formato que se implementó de encuesta de autocuidado se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19, con este formato se autorizaba el ingreso de personal.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Se realizaron Inducciones de Ingreso al personal de la empresa Consorcio Mejoramiento 23.
- En la semana del 30 Noviembre al 06 Diciembre 2023 no se presentaron accidentes laborales.

INFORME SEMANAL SST

SEMANA DEL 07 DICIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2023.

**ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA
MALAGA”**



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Elaboró:

MARIANA GARCIA NEGRETE
SUPERVISORA HSEQ
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

Revisó y Aprobó:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL COVID.19.

1. Listado de personal que laboraron en obra de la semana del 07 Diciembre al 13 Diciembre 2023.

No	Nombre Y Apellido	Cedula	Empresa	Cargo	Estado	Frente de Trabajo	Ingreso	Egreso
1	Wilver Franciny Russey Ladino	80.212.380	Consorcio Mejoramiento 23	Director de Obra	ACTIVO			
2	Mariana Garcia Negrete	1.012.442.180	Consorcio Mejoramiento 23	Supervisora Hseq	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	08-11-2023	
3	Michael Steven Parra Leon	1012415534	Consorcio Mejoramiento 23	Residente De Obra	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	27-11-2023	
4	Yuber Albeiro Perez Rodriguez	80.199.653	Consorcio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
5	Gilmar Perea Berrio	1,107,090,634	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
6	Albrin Margrobin Ibarguen Gomez	1,077,633,517	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
7	Jesus David Valencia Torres	1,150,941,917	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
8	Aimer Yesid Garces Sinisterra	1,111,786,310	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
9	Arquimides Miranda Herrera	1,070,820,492	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	10-11-2023	
10	Luis Miguel Barrera Palacios	1,016,036,939	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
11	Oscar Gustavo Caro Saavedra	80,819,503	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
12	Carlos Eduardo Suarez Guerrero	1,019,01,410	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	21-11-2023	
13	John Edwing Ramirez Arguello	1.102.719.047	Consorcio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23


INFORME SEMANAL

14	Alex Ricardo Puello Pedreros	8,567,360	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	
15	Dario Riascos Waitoto	5,174,773	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
16	Wilson Torres Segura	79,774,751	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
17	Mario Robinson Perez Pacheco	84,094,073	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
18	Christian Arrollo Renteria	1,006,193,496	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	24-11-2023	
19	Kevin Quiñonez Torres	1,193,580,410	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
20	William Andres Alvarez De Los Reyes	1,070,810,107	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
21	Jhon Hurtado Ruiz	1,028,181,031	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
22	Jimmy Mosquera Pretel	1,028,181,149	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
23	Juan Camilo Valencia Guerrero	1,039,705,553	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
24	Juan Camilo Victoria Albornos	1,149,186,363	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
25	Carlos Arturo Suarez Forero	79.238.174	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	24-11-2023	
26	Leonel David Rueda Royero	1.068.976.760	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	02-12-2023	
27	Claudia Alexandra Daza Vargas	1.002.696.225	Consorcio Mejoramiento 23	Inspectora SST	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	02-11-2023	
28	Wilmer Garcia Hurtado	16.483.525	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
29	Eusebio Orobio Salazar	12.798.086	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
30	Edgar Julian Lasprilla Rodriguez	1.018.402.419	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial Instalador de Cubiertas	ACTIVO	Malaga	07-12-2023	

INFORME SEMANAL

2. Registro Fotografico de las actividades realizadas en obra relacionadas al area Seguridad y Salud en el trabajo de la semana correspondiente.


REGISTRO FOTOGRAFICO

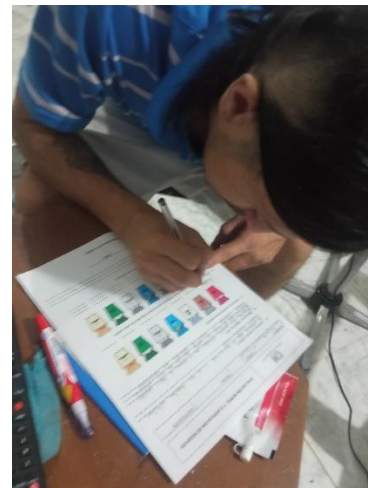



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

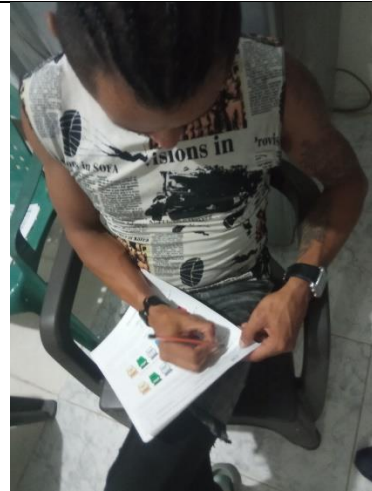



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Las charlas y pausas se realizan al inicio de la jornada laboral.





Inspeccion de equipos de emergencia (Camilla, extintores, botiquin de primeros auxilios)



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23




INFORME SEMANAL

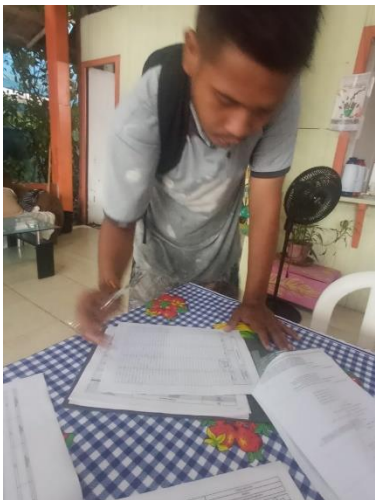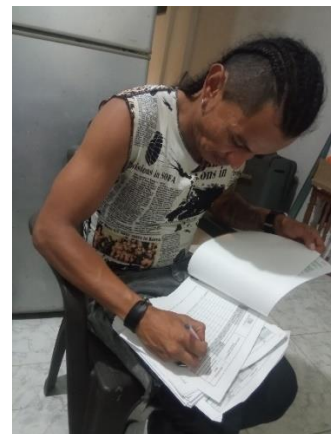



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23


INFORME SEMANAL

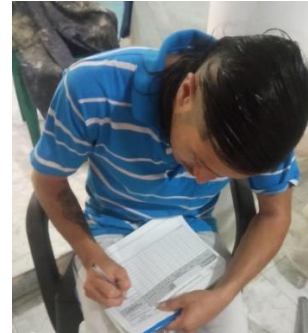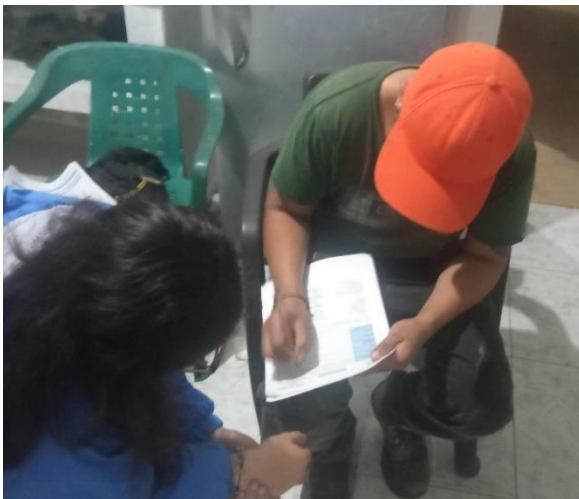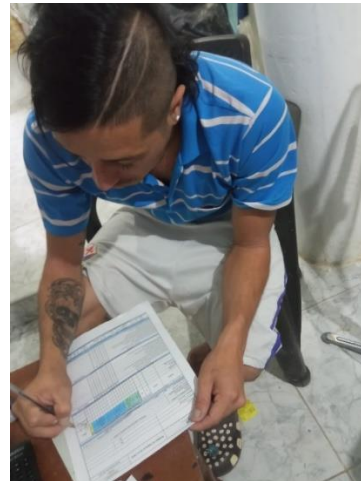



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

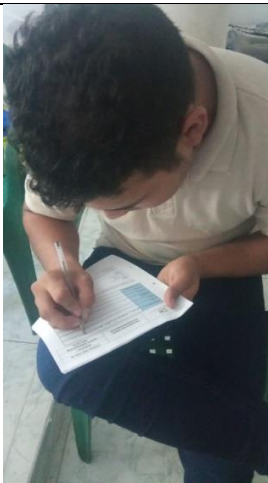

Protocolos de Ingreso



Las inspeccion a los equipos se realizan diariamente con el proposito de identificar las averias y realizar los respectivos mantenimientos.

Punto de hidratacion



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Señalización en obra

Clasificación de residuos sólidos en obra.




Se realizo jornada de Aseo en obra

CM

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

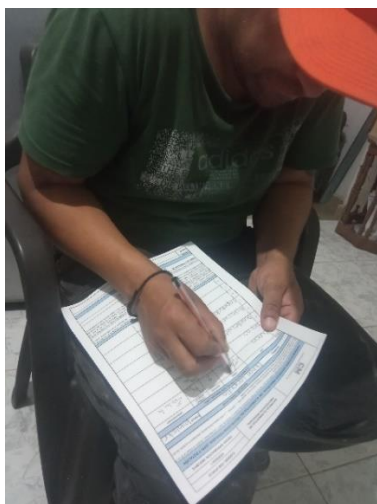



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Entrega de leelementos de proteccion personal.



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Actividades Propuestas

3. CONCLUSIONES

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.
- Con ayuda del formato que se implementó de encuesta de autocuidado se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19, con este formato se autorizaba el ingreso de personal.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Se realizaron Inducciones de Ingreso al personal de la empresa Consorcio Mejoramiento 23.
- En la semana del 07 Diciembre al 13 Diciembre 2023 se presentó 1 accidente laboral.

INFORME SEMANAL SST

SEMANA DEL 14 DICIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2023.

**ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA
MALAGA”**



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Elaboró:

MARIANA GARCIA NEGRETE
SUPERVISORA HSEQ
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

Revisó y Aprobó:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL COVID.19.

1. Listado de personal que laboraron en obra de la semana del 07 Diciembre al 13 Diciembre 2023.

No	Nombre Y Apellido	Cedula	Empresa	Cargo	Estado	Frente de Trabajo	Ingreso	Egreso
1	Wilver Franciny Russey Ladino	80.212.380	Consortio Mejoramiento 23	Director de Obra	ACTIVO			
2	Mariana Garcia Negrete	1.012.442.180	Consortio Mejoramiento 23	Supervisor Hseq	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	08-11-2023	
3	Michael Steven Parra Leon	1012415534	Consortio Mejoramiento 23	Residente De Obra	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	27-11-2023	
4	Yuber Albeiro Perez Rodriguez	80.199.653	Consortio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
5	Gilmar Perea Berrio	1,107,090,634	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
6	Albrin Margrobin Ibarguen Gomez	1,077,633,517	Consortio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
7	Jesus David Valencia Torres	1,150,941,917	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Baños Casa Azul	08-11-2023	15-12-2023
8	Aimer Yesid Garces Sinisterra	1,111,786,310	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
9	Arquimides Miranda Herrera	1,070,820,492	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	10-11-2023	
10	Luis Miguel Barrera Palacios	1,016,036,939	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
11	Oscar Gustavo Caro Saavedra	80,819,503	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
12	Carlos Eduardo Suarez Guerrero	1,019,01,410	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	21-11-2023	
13	John Edwing Ramirez Arguello	1.102.719.047	Consortio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	

INFORME SEMANAL

14	Alex Ricardo Puello Pedreros	8,567,360	Consortio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	
15	Dario Riascos Waitoto	5,174,773	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
16	Wilson Torres Segura	79,774,751	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
17	Mario Robinson Perez Pacheco	84,094,073	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
18	Christian Arrollo Renteria	1,006,193,496	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Malaga	24-11-2023	15-12-2023
19	Kevin Quiñonez Torres	1,193,580,410	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
20	William Andres Alvarez De Los Reyes	1,070,810,107	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
21	Jhon Hurtado Ruiz	1,028,181,031	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
22	Jimmy Mosquera Pretel	1,028,181,149	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
23	Juan Camilo Valencia Guerrero	1,039,705,553	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
24	Juan Camilo Victoria Albornos	1,149,186,363	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Malaga	22-11-2023	18-12-2023
25	Carlos Arturo Suarez Forero	79.238.174	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	24-11-2023	
26	Leonel David Rueda Royero	1.068.976.760	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	02-12-2023	
27	Claudia Alexandra Daza Vargas	1.002.696.225	Consortio Mejoramiento 23	Inspector a SST	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	02-11-2023	
28	Wilmer Garcia Hurtado	16.483.525	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
29	Eusebio Orobio Salazar	12.798.086	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
30	Edgar Julian Lasprilla Rodriguez	1.018.402.419	Consortio Mejoramiento 23	Oficial de Cubiertas	ACTIVO	Malaga	07-12-2023	

2. Registro Fotografico de las actividades realizadas en obra relacionadas al area Seguridad y Salud en el trabajo de la semana correspondiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Las charlas y pausas se realizan al inicio de la jornada laboral.





Inspeccion de equipos de emergencia (Camilla, extintores, botiquin de primeros auxilios)



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Protocolos de Ingreso



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Las inspección a los equipos se realizan diariamente con el proposito de identificar las averias y realizar los respectivos mantenimientos.

Punto de hidratacion

Señalización en obra

Clasificacion de residuos solidos en obra.



Acopio de Materiales



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Entrega de elementos de protección personal.



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Actividades Propuestas

3. CONCLUSIONES

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.
- Con ayuda del formato que se implementó de encuesta de autocuidado se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19, con este formato se autorizaba el ingreso de personal.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Se realizaron Inducciones de Ingreso al personal de la empresa Consorcio Mejoramiento 23.
- En la semana del 14 Diciembre al 20 Diciembre 2023 se presentó 1 accidente laboral.

INFORME SEMANAL SST

SEMANA DEL 21 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2023.

**ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA
MALAGA”**



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Elaboró:

MARIANA GARCIA NEGRETE
SUPERVISORA HSEQ
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

Revisó y Aprobó:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL COVID.19.

1. Listado de personal que laboraron en obra de la semana del 21 Diciembre al 27 Diciembre 2023.

No	Nombre Y Apellido	Cedula	Empresa	Cargo	Estado	Frente de Trabajo	Ingreso	Egreso
1	Wilver Franciny Russey Ladino	80.212.380	Consortio Mejoramiento 23	Director de Obra	ACTIVO			
2	Mariana Garcia Negrete	1.012.442.180	Consortio Mejoramiento 23	Supervisor Hseq	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	08-11-2023	
3	Michael Steven Parra Leon	1012415534	Consortio Mejoramiento 23	Residente De Obra	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	27-11-2023	
4	Yuber Albeiro Perez Rodriguez	80.199.653	Consortio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
5	Gilmar Perea Berrio	1,107,090,634	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	20-12-2023
6	Albrin Margrobin Ibarguen Gomez	1,077,633,517	Consortio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	08-11-2023	
7	Jesus David Valencia Torres	1,150,941,917	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Baños Casa Azul	08-11-2023	15-12-2023
8	Aimer Yesid Garces Sinisterra	1,111,786,310	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Baños Casa Azul	08-11-2023	
9	Arquimides Miranda Herrera	1,070,820,492	Consortio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Compañía De Seguridad	10-11-2023	
10	Luis Miguel Barrera Palacios	1,016,036,939	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
11	Oscar Gustavo Caro Saavedra	80,819,503	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	17-11-2023	
12	Carlos Eduardo Suarez Guerrero	1,019,01,410	Consortio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	21-11-2023	
13	John Edwing Ramirez Arguello	1.102.719.047	Consortio Mejoramiento 23	Maestro De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	

INFORME SEMANAL

14	Alex Ricardo Puello Pedreros	8,567,360	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	28-11-2023	
15	Dario Riascos Waitoto	5,174,773	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
16	Wilson Torres Segura	79,774,751	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
17	Mario Robinson Perez Pacheco	84,094,073	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
18	Christian Arrollo Renteria	1,006,193,496	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Malaga	24-11-2023	15-12-2023
19	Kevin Quiñonez Torres	1,193,580,410	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Malaga	27-11-2023	19-12-2023
20	William Andres Alvarez De Los Reyes	1,070,810,107	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	27-11-2023	
21	Jhon Hurtado Ruiz	1,028,181,031	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
22	Jimmy Mosquera Pretel	1,028,181,149	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	27-11-2023	
23	Juan Camilo Valencia Guerrero	1,039,705,553	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Malaga	22-11-2023	
24	Juan Camilo Victoria Albornos	1,149,186,363	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	RETIRADO	Malaga	22-11-2023	18-12-2023
25	Carlos Arturo Suarez Forero	79.238.174	Consorcio Mejoramiento 23	Instalador De Cubierta	ACTIVO	Gampa Cubiertas	24-11-2023	
26	Leonel David Rueda Royero	1.068.976.760	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Edificio Proa	02-12-2023	
27	Claudia Alexandra Daza Vargas	1.002.696.225	Consorcio Mejoramiento 23	Inspector a SST	ACTIVO	Todos Los Frentes De Trabajo	02-11-2023	
28	Wilmer Garcia Hurtado	16.483.525	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
29	Eusebio Orobio Salazar	12.798.086	Consorcio Mejoramiento 23	Ayudante De Obra	ACTIVO	Isla Naval	06-12-2023	
30	Edgar Julian Lasprilla Rodriguez	1.018.402.419	Consorcio Mejoramiento 23	Oficial de Cubiertas	ACTIVO	Malaga	07-12-2023	



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

2. Registro Fotografico de las actividades realizadas en obra relacionadas al area Seguridad y Salud en el trabajo de la semana correspondiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Las charlas y pausas se realizan al inicio de la jornada laboral.

Inspeccion de equipos de emergencia (Camilla, extintores, botiquin de primeros auxilios)

Protocolos de Ingreso





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

Las inspeccion a los equipos se realizan diariamente con el proposito de identificar las averias y realizar los respectivos mantenimientos.

Punto de hidratacion

Señalizacion en obra



Clasificacion de residuos solidos en obra.





CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL




Acopio de Materiales

Entrega de elementos de proteccion personal.



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL

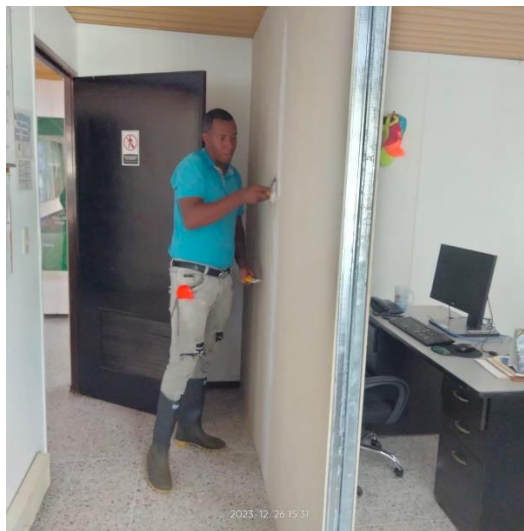



CONSORCIO MEJORAMIENTO 23

INFORME SEMANAL



Actividades Propuestas

3. CONCLUSIONES

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.
- Con ayuda del formato que se implementó de encuesta de autocuidado se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19, con este formato se autorizaba el ingreso de personal.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Se realizaron Inducciones de Ingreso al personal de la empresa Consorcio Mejoramiento 23.
- En la semana del 21 Diciembre al 27 Diciembre 2023 no se presentaron accidentes laborales.

1150-WR-2023

Bogotá, 18 de diciembre de 2023

0025-105-ARCMALAGA

Señor(es)

MDN-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA MALAGA”

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 105-ARC-CBNL02-2023 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”

ASUNTO: Informes semanales HSE

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar la siguiente documentación.

Informe Semanal 01 al 08 noviembre	Tres (3) folios
Informe Semanal 09 al 15 noviembre	Ocho (8) folios
Informe Semanal 16 al 22 noviembre	Ocho (8) folios
Informe Semanal 23 al 29 noviembre	Diez (10) folios
Informe Semanal 30 noviembre al 06 diciembre	Diez (10) folios
Informe Semanal 07 al 13 diciembre	Diecinueve (19) folios

Cordialmente,


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

1164-WR-2023

Bogotá, 20 de diciembre de 2023

0026-105-ARCMALAGA

Señor(es)

MDN-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA MALAGA”

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 105-ARC-CBNL02-2023 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”

ASUNTO: Informe semanal HSE

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar la siguiente documentación.

Informe Semanal 14 al 20 diciembre

Catorce (14) folios

Cordialmente,


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

1196-WR-2023

Bogotá, 28 de diciembre de 2023

0029-105-ARCMALAGA

Señor(es)

MDN-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BAHIA MALAGA”

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 105-ARC-CBNL02-2023 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”

ASUNTO: Informe semanal HSE

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar la siguiente documentación.

Informe Semanal 21 al 27 diciembre

Once (11) folios

Cordialmente,


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

1202-WR-2023

Bogotá, 29 de diciembre de 2023

0030-105-ARCMALAGA

Señor(es)

MDN-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC "BAHIA MALAGA"

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 105-ARC-CBNL02-2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES"

ASUNTO: ACLARACION TRABAJO IMPERMEABILIZACION TANQUE ISLA NAVAL

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia y de acuerdo con el proceso constructivo para la impermeabilización del tanque de la isla naval se aclara que son 3 días de secado y 12 de fraguado con un total de 15 días antes de que este tanque sea llenado. Que si se realiza uso de este tanque antes de estos tiempos no se dará garantía del producto y del trabajo realizado. Se anexa acta de reunión donde se plasma lo informado

Cordialmente,


CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

20230014843754413

No. 20230014843754413 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNP-CGRUPA-CEGBUN-SCEGBUN-DEPMAN-28.1

Buenaventura, Valle del Cauca 14 de Diciembre 2023

Señorita Teniente de Corbeta
Domínguez Zambrano Alejandra
Oficina de Ingeniería y Arquitectura
Bahía Málaga, Valle del Cauca

Asunto: Informe semanal de avance contrato 105-ARC-CBNL02-2023

Con toda atención me dirijo a la señorita teniente de corbeta Domínguez Zambrano Alejandra con el fin de informar el avance del contrato 105-ARC-CBNL02-2023 comprendido en el periodo 04 de diciembre al 14 de diciembre del 2023:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
04/12/23	<ul style="list-style-type: none"> No se reporta actividad por parte de los trabajadores debido a la falta de material sika para impermeabilizar el tanque. 	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
04/12/23	<ul style="list-style-type: none"> No se reporta actividad por parte de los trabajadores debido a la falta de material sika para impermeabilizar el tanque. 	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
05/12/23	<ul style="list-style-type: none"> Se recibe material en las horas de la tarde, cemento y arena, los productos sika aún no son recibidos durante el transcurso del día no se registran actividades en ningún frente. 	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
06/12/23	<ul style="list-style-type: none"> El personal inicia a resanar los tanques externos de entrada del agua. 	<ul style="list-style-type: none"> 4.3 	<ul style="list-style-type: none"> 26 m2
07/12/23	<ul style="list-style-type: none"> Se continúa resanando los exteriores de la cisterna principal Se inicia el desmonte de los perfiles de la estructura del GIM 	<ul style="list-style-type: none"> 4.3 3.1 	<ul style="list-style-type: none"> 55 m2 25m2

08/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • se recibe material de perfilaría para el voladizo del edificio comando 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
09/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • El personal realiza actividades hasta medio día impermeabilizando perfiles 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
10/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • No se reporta actividad por parte de los trabajadores debido a la falta de material sika para impermeabilizar el tanque. 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
11/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • se recibe material de teja para el cambio de cubiertas del GIM, herramienta menor y cuñetes de pintura. 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
12/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • Personal continua resanando canales, muros internos y externos de la cisterna principal 	<ul style="list-style-type: none"> • 4.5 	<ul style="list-style-type: none"> • 112m2
13/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • Personal desmonta la cubierta del GIM y retira unidades de teja 	<ul style="list-style-type: none"> • 3.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 46m2
14/12/23	<ul style="list-style-type: none"> • Personal inicia instalación de perfiles para colocación de tejas 	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2 	<ul style="list-style-type: none"> • 24m2

Respetuosamente,



Teniente de Corbeta JULIAN ALFONSO MORENO ALVAREZ
 Oficial operativo – supervisor local contrato 105-ARC

ANEXO A.

- **Registro fotográfico:**







