



OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE
REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTÓBAL"

**PAVIOBRAS S.A.S.**

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 1			
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	Pagina 1 de 7			
			FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
			8/06/2024	029-24	ALMACEN	LT	204
			11/06/2024	030-24	ALMACEN	LT	408
			11/06/2024	033-24	ALMACEN	LT	408
			18/06/2024	035-24	ALMACEN	LT	612
			20/06/2024	0707	ALMACEN	LT	204
			24/06/2024	041-24	ALMACEN	LT	204
			25/06/2024	042-24	ALMACEN	LT	204
			2/07/2024	04x-2024	ALMACEN	LT	204
						SUB TOTAL	



[illegible]

DADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 11/06/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 11/06/2024		NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001852	PK	204894
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO
BARRIO CORDOBA		LOCALIDAD SAN CRISTOBAL		LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL		Eje Vial KR 1A E		Desde 0+28615.5 Hasta CL 29A 5	
LONGITUD CIV (M)		ANCHO CIV (M)		ÁREA CIV (M2)		PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS	
51.58		7.38		381.28		INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL		Se realizaron las siguientes actividades:	
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR		TIPO DE INTERVENCIÓN							
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)		ANCHO INTERVENCIÓN (ML)		ÁREA INTERVENCIÓN (M2)		PARCHEO		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.	
4.00		3.50		33.80					

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Medición
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	12/06/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	2.73	4.80	3.50	0.150	2.10000	1.3000	14.0	
1.	11/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	2.83	4.80	3.50	0.150	2.10000	1.2500	14.0	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades: - Demolición de rodadura en asfalto. - Acople de material de demolición. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolición y nivelación.
Vibrocompactador	6			6		

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447626	Inspector	218
2	Juan Carlos Martínez	7:00	17:30	80809486	Conductor	178
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80309043	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Brito Vargas	7:00	17:30	1015396280	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leonizamon	7:00	17:30	18482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023836705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa		Recibo	Llegada	Temperaturas	Compactación
11/06/2024	MD-12	NA	SZO501	3	53004	10:00	11:00	Inicio	Fin	150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

Diego Sepulveda

ELABORO

Diego Sepulveda

REVISO

Diego Sepulveda

APROBO

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 11/06/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 11/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001892	PK	204978
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL		EJECUCIÓN	
CORDOBA		SAN CRISTOBAL		UP2		Desde Hasta	
				26 DE JULIO		C6 28015 5 KR LA E	
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		
95,41	6,51	621,47	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL				
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR				Se realizaron las siguientes actividades:			
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.		
21,80	12,10	33,90	PARCHEO				

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detalle de obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Medición
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	12/06/2024	Retiro de escombros	escombros	m3	9.75	8.20	8.10	0.150	7.50300	1.3000	50.0	
2	12/06/2024	Retiro de escombros	escombros	m3	15.91	13.80	6.00	0.150	12.24000	1.3000	81.6	
					25.67							
1.	11/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	9.38	8.20	6.10	0.150	7.50300	1.2500	50.0	
2	11/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	15.30	13.80	6.00	0.150	12.24000	1.2500	81.6	
					24.68							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Motocargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador	6			6		- Demolición de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolición. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolición y nivelación.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	INGRESO	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martínez	7:00	17:30	80808486	Conductor	179
3	Miguel Ángel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Becerra Vargas	7:00	17:30	1016309293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Josue Leuzamón	7:00	17:30	18482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023856705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	78702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023812127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepúlveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volu men	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa			Temperaturas			
								Inicio	Final	Carri l	Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
11/06/2024	MD-12	N/A	VE0839	14.5	53007		11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
11/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	10	53010	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
11/06/2024	MD-12	N/A	SZO601	0.18	53004	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CANTIDAD DE EMULSION

34.0	34.0
------	------

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

1

Diego Sepúlveda

ELABORO

2

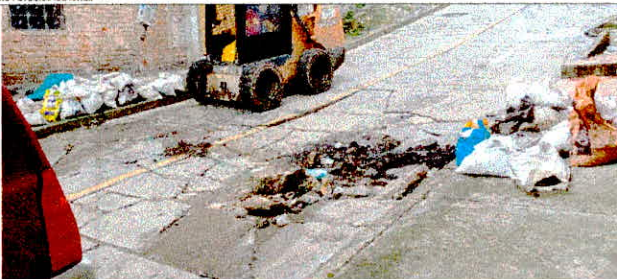
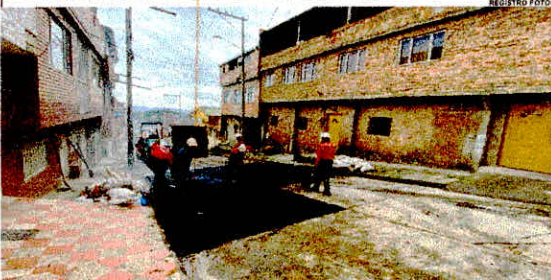
Diego Sepúlveda

REVISO

3

Diego Sepúlveda

APROBO

BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
FECHA DE INICIO: 05/06/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 12/06/2024		NOCTURNA	DIURNA	CIV	4004654	PK	209780		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL		Río Vial		Desde		Hasta	
LA GLORIA ORIENTAL		SAN CRISTOBAL		UP2 LA GLORIA		CL 438 S		CR 64 E		CR 66 E	
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS				
85,34	5,54	557,87	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL				Se realizaron las siguientes actividades:				
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR			1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.								
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN								
25,10	6,00	75,30	PARCHEO								
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)											
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		
						Largo	Ancho	Espeor	V (m3) Material Compacto	[%] Compactación	
1.	12/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	10,40	20,68	4,00	0,100	8,08000	1,3000	
2.	12/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	2,73	7,06	3,00	0,100	2,10000	1,3000	
					13						
1.	12/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	10,90	20,80	4,00	0,100	8,08000	1,2500	
2.	12/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	2,28	7,06	3,00	0,087	1,82700	1,2500	
					12						
MAGINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:											
Descripción		Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS				
Mixocargador		8			8		Se realizaron las siguientes actividades:				
Vibrocompactador		6			6		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acepto de material de demolicion. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Cargue de material de demolicion y nivelación.				
INFORMACIÓN DEL PERSONAL											
No	NOMBRES Y APELLIDOS		HORARIO		NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		CARGO	NUMERO DE CONTRATO			
			LLEGADA	SALIDA							
1	David Zuleta		7:00	17:30	1032447926	Inspector		218			
2	Juan Carlos Martinez		7:00	17:30	80809486	Conductor		179			
3	Miguel Angel Barreto		7:00	17:30	80390943	Conductor		179			
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas		7:00	17:30	1015390283	Conductor		179			
5	Jhon Jairo Solano Huertas		7:00	17:30	80101514	Oficial		180			
6	Jorge Leguizamón		7:00	17:30	19462247	Oficial		180			
7	Camilo Valbuena		7:00	17:30	1023936705	Ayudante		174			
8	Edwin Leguizamon		7:00	17:30	79702356	Ayudante		174			
9	Jefferson Posada		7:00	17:30	1023912127	Ayudante		174			
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero		7:00:00	17:30:00	1233661074	Inspector		218			
CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS											
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Temperaturas		Compactación	
								Inicio	Final		
12/06/2024	MD-12	N/A	S20501	8	53018	10:00	11:00	Recibo	Llegada		
12/06/2024	MD-12	N/A	ZRM328	4	53020	10:00	11:00	150°C	147°C	140°C	
								150°C	147°C	120°C	
EMULSION											
CANTIDAD DE EMULSION		GASTO TOTAL									
208,0		208,0									
BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES											
 											
REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES											
 											
REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES											
 											
BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO									
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ							

BOGOTÁ

GOBIERNO DE BOGOTÁ

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 13/06/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 18/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4077014	PK	91017322
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN
LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL BARRIO		CALLE		HASTA	
BARRIO		CALLE		CALLE		CALLE	
YOMBACA		LOS LIBERTADORES		CALLE 72 A ESTE		CALLE 72 A SUR	
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		
120	4	480.00	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL		Se realizaron las siguientes actividades:		
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR		TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.			
LONGITUD INTERVENCIÓN (M)	ANCHO INTERVENCIÓN (M)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	PARCHEO				
100.00	5.00	500.00					

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Módulo
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compactado	(%) Compactación		
1.	13/06/2024 al 18/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m2	100.00	100.00	5.00				500.0	
1.	13/06/2024 al 18/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación)	Asfalto	m3	168.80	100.00	6.00	0.244	121.82308	1.3000	600.0	
					168.80							

MADINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:							ACTIVIDADES REALIZADAS	
Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. Inicial	H. Final	Stand by	Se realizaron las siguientes actividades:	
Motociclista	5						- Demolición de rodadura en asfalto.	
Vibrocompactador	6						- Acople de material de demolición.	
							- Nivelación y compactación de subrasante.	
							- Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	
							- Carga de material de demolición y nivelación.	

INFORMACIÓN DEL PERSONAL						
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CUESTA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	David Miguel Zubita Goyeneche	7.00	17.30	10.34.7926	Inspector	219
2	Andrés Felipe Torres Olea	7.00	17.30	10.77.84399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepúlveda Caballero	7.00	17.30	12.33.8710.14	Inspector	220
4	Manfredo Enciso Vargas	7.00	17.30	10.15.299293	Conductor	173
5	Juan Carlos Martínez González	7.00	17.30	8.08.9468	Conductor	191
6	Miguel Ángel Barreto Gutiérrez	7.00	17.30	8.03.20543	Conductor	177
7	Jhon Jairo Solano Huertas	7.00	17.30	8.01.15114	Oficial	179
8	José Ernesto Leguizamón Alfaro	7.00	17.30	7.93.18453	Oficial	181
9	Juan Daniel Nieto Espinosa	7.00	17.30	10.23.444296	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7.00	17.30	7.50.97018	Asistente	172
11	Jefferson Posada Cruz	7.00	17.30	11.23.12127	Asistente	173
12	Orlando Camilo Velazquez Lobato	7.00	17.30	10.23.33105	Asistente	174
13	Edwin Leguizamón Ospina	7.00	17.30	10.10.22587	Asistente	175
14	Óscar Luis Benavides Salazar	7.00	17.30	5.18.63715	Asistente	176
15	Brian Humberto Velez Pineda	7.00	17.30	10.23.66919	Asistente	178
16	Jorge Fari Bermúdez Román	7.00	17.30	19.82.247	Asistente	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS													
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volu man	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Absorción		Temperaturas			
								Inicio	Final	Carri	Recibo	Llegada	Extensión
13/06/2024	MD-12	N/A	GUJ495	15	53033	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	TTX586	15	53026	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	ZK4328	15	53041	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	YSV058	8	53043	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	15	53044	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	ZK4328	15	53046	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	15	53048	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	EYV230	10	53052	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TSV059	15	53056	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	10	53061	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
18/06/2024	MD-12	N/A	ZK4328	15	53064	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
18/06/2024	MD-12	N/A	TSV059	15	53065	10:00	11:00			150°C	147°C	140°C	120°C
TOTAL						159							

EMULSION	
CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
204.0	204.0

BOGOTÁ

GOBIERNO DE BOGOTÁ

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES

BOGOTÁ

GOBIERNO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

GOBIERNO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 28/06/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 28/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000939	PK	202340						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100% INICIO							
						EJECUCIÓN							
						TERMINADO							
BARRIO	LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL	Baja Vial		Desde		Hasta						
VENTE DE JULIO	SAN CRISTÓBAL	79 DE JULIO	CALLE 30 A SUR		CARRERA B		CARRERA B A						
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS								
53.4	7.59	405.31	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL		Se realizaron las siguientes actividades:								
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR													
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parqueo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parqueo con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.								
18.08	7.89	65.62	PARCHEO										
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallarse obras de Arte y complementarias)													
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Medición	
1.	28/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	31.39	15.00	7.00	0.228	23.59154	1.3109	105.0		
1.	28/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	31.15	15.00	7.00	0.228	23.59154	1.3000	105.0		
MAGUNARÍA PARA LAS ACTIVIDADES:													
Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS							
Mixicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades: - Demolicion de rodadura en asfalto. - Acople de material de demolicion. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolicion y nivelación.							
Vibrocompactador	5			5									
INFORMACIÓN DEL PERSONAL													
No	NOMBRES Y APELLIDOS	POSSO	LEIDA	PAR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO						
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	219							
2	Andrés Felipe Torres Orla	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219							
3	Diego Fernando Sepúlveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220							
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179							
5	Juan Carlos Martínez González	7:00	17:30	80809496	Conductor	181							
6	Miguel Ángel Barreto Gutiérrez	7:00	17:30	80390943	Conductor	177							
7	Jose Ernesto Leguizamón Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181							
8	Juan Daniel Nieto Espinosa	7:00	17:30	1023944208	Oficial	177							
9	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097014	Ayudante	172							
10	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173							
11	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023935705	Ayudante	174							
12	Edwin Leguizamón Ospino	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175							
13	Olga Lucía Bernal Salazar	7:00	17:30	51943716	Ayudante	176							
14	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023999819	Ayudante	178							
15	Jorge Raúl Bermúdez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180							
CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS													
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abacías			Temperaturas		
20/06/2024	MD-12	N/A	TSV058	3.65	53073	10:00	11:00	Inicio	Final	Carril	Recibo	Llegada	Extendido
20/06/2024	MD-12	N/A	TTY572	11	53074	11:00	12:00				150°C	147°C	140°C
20/06/2024	MD-12	N/A	VE0839	16.5	53080	12:00	13:00				150°C	147°C	140°C
EMULSION													
CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL	1 CANECA											
204.0	204.0												

		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES															
FECHA DE INICIO: 31/05/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 21/06/2024		NOCTURNA		DIURNA		CIV		8033117		PS		307019			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%		INICIO		EJECUCIÓN		TERMINADO					
BARRIO		LOCALIDAD		UPE		LOCALIZACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL		Apto Vial		Señal		Hasta					
ATENAS		SAN CRISTÓBAL		30-pa		M. 701.5											
LONGITUD CIV (M)		ANCHO CIV (M)		ÁREA CIV (M2)		PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS									
25.82		0.82		141.26		INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL											
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR		Se realizaron las siguientes actividades:															
LONGITUD INTERVENCIÓN (M)		ANCHO INTERVENCIÓN (M)		ÁREA INTERVENCIÓN (M2)		TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsion asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.									
7.24		0.82		1.79		PARCHEO											
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Guíese sobre la foto y complétemente)																	
No	Fecha	Actividad				Tipo de Material		Unid	Cantidad		DIMENSIONES (m)			PORCENTAJE (%)		m2	Medición
						Largo		Ancho	Espeor	Y (m) Material Compacte		Compactación (%)					
1.	21/06/2024	Retiro de escombros				Asfalto		m3	0.58	2.24	0.82	0.285	0.44800	1.3500	1.8		
						0.58		25.00									
1.	21/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación)				Asfalto		m3	0.58	2.24	0.82	0.285	0.44800	1.3500	1.8		
						0.58											
MAGNIFICAR PARA LAS ACTIVIDADES:																	
Descripción		Móvil		H. móvil		H. fijas		H. trasladadas		Distancia		ACTIVIDADES REALIZADAS					
Motociclista		5						5				Se realizaron las siguientes actividades:					
Vibrocompactador		5						5				- Eliminación de rodadura en asfalto. - Acepto de material de demolición. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolición y trasladado.					
INFORMACIÓN DE PERSONAS:																	
No	NOMBRES Y APELLIDOS					EDADES (AÑOS)		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		CARGO		NOMBRE DE CONTACTO					
							LÍNEA		SABER								
1	David Zúñiga					7:00		17:30		102347706		Inspector		218			
2	Juan Carlos Martínez					7:00		17:30		8087848		Conductor		179			
3	Miguel Ángel Barreto					7:00		17:30		80890543		Conductor		179			
4	Ivan Ignacio Enciso Vargas					7:00		17:30		1215996299		Conductor		179			
5	Jhon Jairo Delano Huertas					7:00		17:30		80121514		Oficial		180			
6	Jorge Lugo Zamora					7:00		17:30		19482247		Oficial		180			
7	García Valverde					7:00		17:30		102379705		Ayudante		174			
8	Edwin Lugo Zamora					7:00		17:30		79792358		Ayudante		174			
9	Jefferson Posada					7:00		17:30		1026012127		Ayudante		174			
10	Diego Fernando Sepúlveda Ceballos					7:00:00		17:30:00		128805034		Inspector		218			
CONTROL Y ENTREGA DE MEDIDAS ANÁLISIS / COMPROBOS																	
FECHA	Tipo de Medida		No. de Medid	Paseo	Volumen a M3	No. de salida	H. Entrada		H. Salida		Área		Temperatura ambiente		Compensación		
											Inici		Final	Real	Llegada		
21/06/2024	MD-12		N/A	OCCISO	0.58	53593	30.00		11.00		Ejecución		150°C		147°C	120°C	
CANTIDAD DE EJECUCIÓN		GASTO TOTAL		MEDIDA CARICA													
34.5		34.0															
BOGOTÁ GOBIERNO																	
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES																	
REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES																	
REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES																	
REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES																	
1 JOSÉ BERNALDEA ELABORÓ																	
2 JOSÉ BERNALDEA REVISÓ																	
3 JOSÉ BERNALDEA APROBÓ																	

BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES													
FECHA DE INICIO: 24/06/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 25/06/2024		NOCTURNA		DIURNA		CIV		4003116		PK		207015	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%		INICIO		EJECUCIÓN		TERMINADO			
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL		Eje Vial		Desde		Hasta					
SAN VICENTE		SAN CRISTÓBAL		UPZ		25-Jul		CL 367 S		CL 367 S					
LONGITUD CIV (M)		ANCHO CIV (M)		ÁREA CIV (M2)		PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS							
112.74		7.88		797.82		INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL		Se realizaron las siguientes actividades:							
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR		ÁREA INTERVENCIÓN N (M2)		TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bandes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.									
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)		ANCHO INTERVENCIÓN (ML)		ÁREA INTERVENCIÓN N (M2)		PARCHEO									
122.00		0.80		99.60											
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)															
No	Fecha	Actividad			Tipo de Material		Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)		PORCENTAJES (%)		m2		Muestreo
									Largo	Ancho	Espeor	V (m3) Material Compacto	Compactación		
1.	24/06/2024	Retiro de escombros			Asfalto		m3	39.89	112.00	1.34	0.200	30.00000	1.3000	150.0	
1.	24-25/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).			Asfalto		m3	37.50	112.00	1.34	0.200	30.00000	1.2500	150.0	
								37.5							
MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:															
Descripción		Móvil	H. Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS								
Minicargador		0			0		Se realizaron las siguientes actividades:								
Vibrocompactador		0			0		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolicion y nivelación.								
INFORMACIÓN DEL PERSONAL															
No	NOMBRES Y APELLIDOS			PROMEDIO (HORA)		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		CARGO		NÚMERO DE CONTRATO					
				LEGADA	SALIDA										
1	David Zuleta			7:00	17:30	1023447026		Inspector		218					
2	Juan Carlos Martínez			7:00	17:30	80909466		Conductor		179					
3	Miguel Ángel Barrio			7:00	17:30	80390943		Conductor		179					
4	Ivan Ignacio Escobar Vargas			7:00	17:30	1015399293		Conductor		179					
5	Jhon Jairo Solano Huertas			7:00	17:30	80101614		Oficial		180					
6	Jorge Leguizamon			7:00	17:30	19482247		Oficial		190					
7	Camilo Valbuena			7:00	17:30	1023936705		Ayudante		174					
8	Edwin Leguizamon			7:00	17:30	79702358		Ayudante		174					
9	Jefferson Posada			7:00	17:30	1023912127		Ayudante		174					
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero			7:00:00	17:30:00	1235662014		Inspector		218					
CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS															
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abcisa		Temperaturas		Compactación			
								Inicio	Final	Carri	Recibo	Legada	Extendido		
24/06/2024	MD-12	N/A	ZMA328	10	53109	8:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C	
24/06/2024	MD-12	N/A	TJN817	5	53117	9:00	10:00				150°C	147°C	140°C	120°C	
24/06/2024	MD-12	N/A	ZMA328	15	53129	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C	
24/06/2024	MD-12	N/A	TJN829	7.3	53132	11:00	12:00				150°C	147°C	140°C	120°C	
EMULSION															
CANTIDAD DE EMULSION		GASTO TOTAL													
208 l		208 l													
BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES													
REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES															
REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES															
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES															
BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO									
BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO		BOGOTÁ GOBIERNO									

BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
FECHA DE INICIO: 28/06/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 28/06/2024		NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001201	PK	91032943		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL		Vial		Desde		Hasta	
SAN CRISTÓBAL SUR		SAN CRISTÓBAL		SAN BLAS		CL 13 A SUR		Sin Establecer		CR 22 ESTE	
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN			ACTIVIDADES REALIZADAS					
192,48	5,23	1005,58	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL			Se realizaron las siguientes actividades:					
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR			1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.								
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN								
	5,23		PARCHEO								
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)											
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	
1.	28/06/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m2	15,00	18,00	5,00	0,240	12,00000	1,3800	
					15,00	25,00				50,0	
1.	28/06/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	15,00	18,00	5,00	0,240	12,00000	1,2500	
					15,00					50,0	
MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:											
Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS					
Mixcargador	0			0		Se realizaron las siguientes actividades:					
Vibrocompactador	5			5		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelacion y compactacion de subrasante. - Instalacion de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). - Carga de material de demolicion y nivelacion.					
INFORMACIÓN DEL PERSONAL											
No	NOMBRES Y APELLIDOS			HORARIO		NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO			
				LLEGADA	SALIDA						
1	David Zuleta			7:00	17:30	1032447926	Inspector	218			
2	Juan Carlos Martinez			7:00	17:30	80809496	Conductor	179			
3	Miguel Angel Barreto			7:00	17:30	80390943	Conductor	179			
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas			7:00	17:30	1015399293	Conductor	179			
5	Jhon Jairo Solano Huertas			7:00	17:30	80101514	Oficial	180			
6	Jorge Leguizamón			7:00	17:30	19482247	Oficial	180			
7	Camilo Valbuena			7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174			
8	Edwin Leguizamón			7:00	17:30	73702356	Ayudante	174			
9	Jefferson Posada			7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174			
10	Diego Fernando Sepúlveda Caballero			7:00:00	17:30:00	1225603014	Inspector	218			
CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS											
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Módul	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abacisa		Temperaturas	
								Inicio	Final	Entendido	
28/06/2024	MD-12	N/A	ZM528	15	53177	10:00	11:00			140°C	
						EMULSION		Recibo			
								150°C			
								147°C			
								120°C			
CANTIDAD DE EMULSION						GASTO TOTAL					
338 l						338 l					
BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES											
REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES											
REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES											
 DIEGO CABALLERO ELABORO		 ROCIO QUINTERO REVISO		 DIEGO CABALLERO APROBO							

BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
FECHA DE EJECUCIÓN: 02/07/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 09/07/2024		NOCTURNA		CIV		A NOYUNA		PM	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%		BICID		EJECUCIÓN	
TERMINADO											
BARRIO SAN CRISTOBAL		LOCALIDAD SAN CRISTOBAL SUR		SAN BLAS		Eje Vial VR 19A E		Desde CL 19 S		Hasta VR 20 E	
LONGITUD CIV (M)		ANCHO CIV (M)		AREA CIV (M2)		PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			
90.88		5.87		533.74		INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL		Se realizaron las siguientes actividades:			
LONGITUD INTERVENCIÓN (M)		ANCHO INTERVENCIÓN (M)		AREA INTERVENCIÓN (M2)		TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica.			
1.90		2.60		3.97		PARCHEO					
ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detalles obras de Arte y complementarias)											
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	Compacción (%)	m2
1.	2/07/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	1.01	1.60	2.80	0.200	0.78000	1.3000	3.9
1.	2/07/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (nivelación y compactación).	Asfalto	m3	0.88	1.90	2.60	0.200	0.78000	1.2600	3.9
MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:											
Plasmadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minicargador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vibrocompactador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Se realizaron las siguientes actividades:											
- Demolición de rodadura en asfalto.											
- Asfalto (de material de demolición)											
- Nivelación y compactación de subrasante.											
- Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (nivelación y compactación).											
- Carga de material de demolición y nivelación.											
INFORMACIÓN DEL PERSONAL:											
No	NOMBRES Y APELLIDOS		EDAD	SEXO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO				
1.	David Zúñiga		7.00	M	1033447328	Inspector	218				
2.	Juan Carlos Martínez		7.00	M	80809498	Conductor	179				
3.	Miguel Ángel Barreto		7.00	M	00300943	Conductor	179				
4.	Ivan Ignacio Briceño Vargas		7.00	M	1015399293	Conductor	179				
5.	Jhon Jairo Solano Huertas		7.00	M	80101514	Oficial	180				
6.	Jorge Leguizamón		7.00	M	10422247	Oficial	180				
7.	Cristóbal Valbuena		7.00	M	1021908705	Asistente	174				
8.	Edison Leguizamón		7.00	M	10391148	Asistente	174				
9.	Jefferson Posada		7.00	M	1025012127	Asistente	174				
10.	Diego Fernando Sepúlveda Caballero		7.00.00	M	1233681214	Inspector	218				
FECHA: 2/07/2024											
Tipo de Mezcla: MD-12											
No. de Módulo: N/A											
Placa: 060716											
Volumen: 1											
No. de recibo: 52201											
H. Entrada: 10:00											
H. Salida: 11:00											
Abstracción: Inicie, Final, Carril, Recibo, Llegada, Temperaturas, Compactación											
Inicie: 10:00, Final: 11:00, Carril: 150°C, Recibo: 147°C, Llegada: 140°C, Temperaturas: 120°C, Compactación: 120°C											
CANTIDAD DE EMULSION: 34.0											
GASTO TOTAL: 34.0											

BOGOTÁ GOBIERNO		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES									
REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES											
											
REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES											
											
REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES											
											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  DIEGO CABALLERO ALFARO </div> <div>  DIEGO CABALLERO ALFARO </div> <div>  DIEGO CABALLERO ALFARO </div> </div>											

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/07/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 02/07/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003342	PK	207231
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100% INICIO	
LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL		LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL		LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL		LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL	
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta		
SANTA INÉS SUR	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS	Calle 36 H Sur	Carrera 5 Este	Carrera 5 Sur Este		
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		
109,85	7,34	806,97	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL		Se realizaron las siguientes actividades:		
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR		TIPO DE INTERVENCIÓN		1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Cargar los materiales en el área de producción. 3. Instalación de Carpetas asfálticas MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Orden y aseo del frente de obra.			
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	PARCHEO				
14,28	8,20	62,20					

ESQUEMA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN (USARSE DIBUJO DE AYUO Y COMPLEMENTARIOS)									
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Capacidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)
						Largo	Ancho	Espeor	V (m3) Material Compactado
1.	2/07/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	10.14	6.00	5.00	0.260	1.3000
1.	2/07/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	15.50	9.00	5.00	0.265	1.2800
					15.50				
1.	2/07/2024	Instalación de Carpetas asfálticas MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	9.75	5.00	5.00	0.260	1.3500
1.	2/07/2024	Instalación de Carpetas asfálticas MD-12 (Nivelación y compactación).	Asfalto	m3	14.91	9.00	5.00	0.265	1.2500
					15				

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:						ACTIVIDADES REALIZADAS:	
DESCRIPCIÓN	Móvil	Mano de obra	H. Total	H. Trabajadas	Grupos de	Se realizaron las siguientes actividades:	
Minicargador	8			8		- Demolicion de rodadura en asfalto y concreto - Acople de material de demolicion - Nivelación y compactación de subrasante - Instalación de Carpetas asfálticas MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolicion y nivelación.	
Vibrocompactador	6			6			

INFORMACIÓN DEL PERSONAL							
NO	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE SALIDA	IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTINUIDAD	
1	Andrés Felipe Torres	7:00	17:30	1032447826	Inspector	381	
2	Juan Carlos Martínez	7:00	17:30	80890486	Conductor	179	
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390843	Conductor	179	
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179	
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180	
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180	
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174	
8	Edwin Leguizamón	7:00	17:30	79702968	Ayudante	174	
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174	
10							

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETOS									
FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Temperatura	Compacción
2/07/2024	MD-12	N/A	TSW228	15	53202	17:00	19:30	150°C	140°C
CANTIDAD DE EMULSIÓN		CANTIDAD TOTAL							
34.0		34.0							

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES

		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES													
FECHA DE INICIO: 07/07/2024		FECHA FINALIZACIÓN: 07/07/2024		NOCTURNA		DIURNA		CV		4007383		PK		A75871	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%		INICIO		EJECUCIÓN		TERMINADO			
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL		Eje Vial		Desde		Hasta					
SAN VICENTE		SAN CRISTOBAL		UPZ		SAN BLAS		CL 3415		KR 8CE		KR 8FE			
LONGITUD CIV (M)		ANCHO CIV (M)		ÁREA CIV (M2)		PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS							
89.82		5.88		528.36		INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL		Se realizaron las siguientes actividades:							
				DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR				1. Nivelación y compactación del terreno. 2. Riego de imprimación en el área de parcheo. 3. Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). 4. Demarcación de bordes de parche con emulsión asfáltica. 5. Limpieza y recolección de escombros.							
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)		ANCHO INTERVENCIÓN (ML)		ÁREA INTERVENCIÓN (M2)		TIPO DE INTERVENCIÓN									
8.40		5.88		37.40		PARCHEO									
ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)															
No		FECHA		ACTIVIDAD		Tipo de Substrato		CANT.		MATERIALES		DIMENSIONES (m)		PORCENTAJES (%)	
												Largo Ancho Espesor		V. y M23 Muestreo Compactación (%)	
1.		2/07/2024		Retiro de escombros		Asfalto		m3		16.22		12.48 4.00 0.250		12.48000 1.3000 48.9	
1.		2/07/2024		Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación).		Asfalto		m3		15.80		12.48 4.00 0.250		12.48000 1.3000 49.9	
MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:															
Descripción		Modelo		H. Híbrida		H. Total		H. Tronadoras		Grado Liv		ACTIVIDADES REALIZADAS			
Minicargador		8						8				Se realizaron las siguientes actividades:			
Vibrocompactador		6						8				- Demolición de rodadura en asfalto. - Acople de material de demolición. - Nivelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Nivelación y compactación). - Carga de material de demolición y nivelación.			
INFORMACIÓN DEL PERSONAL															
No		NOMBRES Y APELLIDOS		LLEGADA (H.M.)		SALIDA (H.M.)		IDENTIFICACIÓN		CARGO		NUMERO DE CONTRATO			
1		David Zuleta		7:00		17:30		1032447928		Inspector		218			
2		Juan Carlos Martínez		7:00		17:30		80809486		Conductor		178			
3		Miguel Angel Barreto		7:00		17:30		80380943		Conductor		178			
4		Ivan Ignacio Briceño Vargas		7:00		17:30		1015389293		Conductor		178			
5		Jhon Jairo Solano Huertas		7:00		17:30		80101514		Oficial		180			
6		Jorge Leguizamón		7:00		17:30		19482247		Oficial		180			
7		Camilo Valbuena		7:00		17:30		1023938705		Ayudante		174			
8		Edwin Leguizamón		7:00		17:30		76702350		Ayudante		174			
9		Jefferson Posada		7:00		17:30		1023912127		Ayudante		174			
10		Diego Fernando Sepúlveda Caballero		7:00:00		17:30:00		1233691014		Inspector		218			
CAPITAL Y ENTREGA DE MATERIALES ASFALTICOS Y COMPLEMENTOS															
FECHA		Tipo de Mezcla		No. de Movil		Placa		Volu men		No. de recibos		H. Entrada		H. Salida	
2/07/2024		MD-12		3		O8G716		3		53201		2:00		3:00	
2/07/2024		MD-12		3		O8G716		3		53201		2:00		3:00	
EMULSION															
CAPACIDAD DE EMULSION		GASTO TOTAL													
M3		M3													
		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES													
REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES															
REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES															
REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES															
ELABORO		REVISO		APROBO											

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 31/06/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 23/04/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	5001636	PR	293432
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%		AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	
BARRIO		LOCALIDAD		LOCALIZACIÓN DEL SECTOR VIAL		Desde	
YOMASA		SAN CRISTOBAL SUR		LOS LIBERTADORES		CL 74A 5	
LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		
114,62	4,01	458,43	INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL		Se realizaron las siguientes actividades:		
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR			1. Replanteo				
LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)			2. Nivelación				
ANCHO INTERVENCIÓN (ML)			3. Instalación de sub base reciclada				
ÁREA INTERVENCIÓN (M2)			4. Compactación de sub base				
TIPO DE INTERVENCIÓN			5. Conformación de cunetas de desagüe				
100,00			6. Retiro de escombros				
3,40			NIVELACIÓN Y REPLANTEO E INSTALACIÓN DE SUB BASE				
346,08							

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Módulo
						Largo	Ancho	Espeor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	2/07/2024	Retiro de escombros	Material vegetal	m3	75,00	100,00	3,50	0,100	58,00000	1,2500	350,0	
					75,00							
1.	2/07/2024	Instalación de sub base reciclada (Nivelación y compactación)	sub base	m3	38,63	100,00	3,40	0,091	30,00400	1,2500	340,0	
					38,63							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H. Inicial	H. Final	H. trabajada	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Retiro excavadora	8			8		Se realizaron las siguientes actividades: - Apertura de vía - Acopio de material - Nivelación y compactación de base - Instalación sub base - Cargue de material.
Vibrocompactador	8			8		

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO
1	Andrés Torres	7:00	17:30	1033447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martínez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Ángel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Daniela	7:00	17:30	19482247	Oficial	173
7	Carmelo Valbuena	7:00	17:30	1023336708	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamón	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Juan pablo	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abstracción				Temperaturas	
								Inicia	Final	Carri	Recibo	Llegada	Extendido
21/06/2024	SUB BASE	N/A	EY230	8,57	R&V 00054809	8:00	9:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	SZO501	7	12978	9:00	10:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	TSV058	15	12988	10:00	11:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	EY230	9,06	R&V 00054842	8:00	9:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CANTIDAD DE EMULSION

N/A	GASTO TOTAL	N/A
-----	-------------	-----

BOGOTÁ

GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES

ANDRÉS TORRES

ELABORÓ

BOGOTÁ

GOBIERNO

DESGO CABALLERO

REVISÓ

DESGO CABALLERO

APROBÓ

BOGOTÁ GOBIERNO															INFORME FINAL DE ACTIVIDADES																			
FECHA DE INICIO: 05/06/2024					FECHA FINALIZACIÓN: 05/06/2024					NOCTURNA					DIURNA					CV					PK									
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					100%					AVANCE PORCENTAJES ACUMULADO DE OBRA					100%					INICIO					EJECUCIÓN					TERMINADO				
BARRIO					LOCALIDAD					UPZ					CALLE					CALLE					CALLE									
SAN PEDRO					SAN CRISTOBAL					SAN BLAS					CALLE 24524 Y 24525					CALLE 24524 Y 24525					CALLE 24524 Y 24525									
LONGITUD CV (M)					ANCHO CV (M)					ÁREA CV (M2)					PROGRAMA DE INTERVENCIÓN					ACTIVIDADES REALIZADAS														
110					5.0					550.00					INTERVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL					Se realizaron las siguientes actividades:														
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR					LONGITUD INTERVENCIÓN (M)					ANCHO INTERVENCIÓN (M)					ÁREA INTERVENCIÓN (M2)					TIPO DE INTERVENCIÓN														
					100.00					4.00					400.00					PARCHEO														
RESUMEN DEL ÁREA INTERVENIDA (Evaluar sobre de Área y cumplimiento)																																		
No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)			m2																						
						Largo	Ancho	Exposor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación																								
1.	3/07/2024	Revelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	14.74	28.00	4.00	0.000	11.5600	1.0000	136.0																							
1.	3/07/2024	Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Revelación y compactación)	Asfalto	m3	40.06	80.00	4.00	0.000	32.0400	1.0000	400.0																							
MAGNIFICAR PARA LAS ACTIVIDADES:																																		
Descripción	M4vil	H. Montal	H. Fretal	H. Trabajador	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS																												
Desempeño	8			8		Se realizaron las siguientes actividades: - Pausación de redacción en asfalto. - Acople de material de desbaste. - Revelación y compactación de subrasante. - Instalación de Carpeta asfáltica MD-12 (Revelación y compactación). - Carga de material de desbaste y revelación.																												
Motivación	8			8																														
Vibración	8			8																														
RESUMEN DE PERSONAL																																		
No	NOMBRES Y APELLIDOS			ESTADO	EDAD	VÍDEO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO																										
1	David Miguel Zúñiga Goyeneche			7.00	17.30	103647926	Inspector	218																										
2	Andrés Felipe Torres Ochoa			7.00	17.30	107791439	Inspector	219																										
3	Diego Fernando Segura Caballero			7.00	17.30	123619114	Inspector	220																										
4	Adrián Ignacio Briceño Vargas			7.00	17.30	101599299	Conductor	179																										
5	Juan Carlos Martínez Ochoa			7.00	17.30	80663486	Conductor	181																										
6	Miguel Ángel Barreto Guevara			7.00	17.30	80260843	Conductor	177																										
7	Jorge Iván Bermúdez Rueda			7.00	17.30	104474111	Oficial	181																										
8	Jorge Ernesto Leguizamón Arias			7.00	17.30	79519433	Oficial	177																										
9	Juan Carlos Nieto Espinosa			7.00	17.30	102984208	Oficial	177																										
10	Juan Pablo Cruz Cruz			7.00	17.30	7687914	Ayudante	172																										
11	Jefferson Posada Cruz			7.00	17.30	102812127	Ayudante	179																										
12	Cristian Camilo Velasco López			7.00	17.30	102956705	Ayudante	174																										
13	Edwin Leguizamón Chaparro			7.00	17.30	79752968	Ayudante	170																										
14	Ogier Luis Bernal Salazar			7.00	17.30	81843715	Ayudante	176																										
15	Brian Muscote Herrera Pino			7.00	17.30	102888819	Ayudante	179																										
16	Jorge Iván Bermúdez Rueda			7.00	17.30	19492047	Ayudante	180																										
CONTROL Y ENTRADA DE MEDIDAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS																																		
FECHA	Tipo de Material	No. de Bóveda	Punto	Velocidad (Km/h)	No. de mediciones	H. Entrada	H. Salida	Atmósfera			Temperaturas			Comprobación																				
								Inicio	Final	Carb.	Rebote	Temperatura	Temperatura																					
30/06/2024	MD-12	N/A	TTV086	15	5/214	3.00	4.00	100°C	147°C	147°C	147°C	147°C	147°C	120°C																				
30/06/2024	MD-12	N/A	TTV087	15	5/220	4.00	5.00	150°C	147°C	147°C	147°C	147°C	147°C	120°C																				
30/06/2024	MD-12	N/A	CH079	15	5/218	4.00	5.00	150°C	147°C	147°C	147°C	147°C	147°C	120°C																				
CANTIDAD DE CIRCULACIÓN				GASTO TOTAL																														
204.8				204.0																														

BOGOTÁ GOBIERNO															INFORME FINAL DE ACTIVIDADES														
REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES																													

BOGOTÁ
CLASIFICADO

BOGOTÁ
REVISADO

BOGOTÁ
APROBADO

