


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL				
Página: 1 de		DÍA	20	MES	1	AÑO	2024	
SEMANA N°		7	DEL	lunes, 15 de enero de 2024		AL	sábado, 20 de enero de 2024	
FECHA INICIO :		15/01/2024	FECHA TERMINO :		20/01/2024			
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023							
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS			NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S			NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284	
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO				
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO		PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO		ACTIVIDADES		MOTIVOS	
1.4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	100,00%		7,00%					
1.11 Retiro de sobrantes: Cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.	0,00%		10,00%					
2.11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%		17,00%		Se inicia resanes de pintura en casa cural			
2.12 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%		17,00%		Se inicia resanes de pintura en casa cural			
2.17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%		17,00%		Se inicia resanes de pintura en casa cural			
2.20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%		17,00%		Se inicia resanes de pintura en casa cural			
2.22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%		17,00%		Se inicia resanes de pintura en casa cural			
TOTALES								
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO		
	\$ 1.023.666.666,67	16.063.692,31	1.007.602.974,36		1,57%	18,74%		
IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA								
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	V.ESTADO DEL TIEMPO				
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS SI ☐ NO ☒
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00					
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES						
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO								



VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

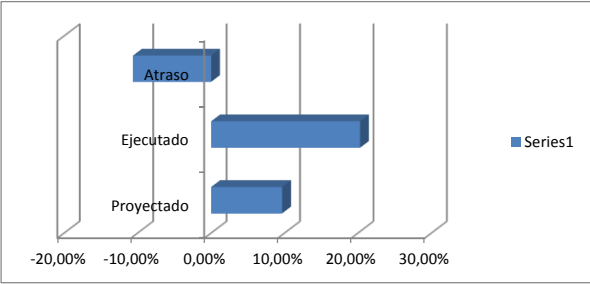

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL


Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:	
SEMANA N°	7	DEL	lunes, 15 de enero de 2024			AL	sábado, 20 de enero de 2024	
FECHA INICIO :	15/01/2024		FECHA TERMINACION :	20/01/2024				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO								
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS				NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S				NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral

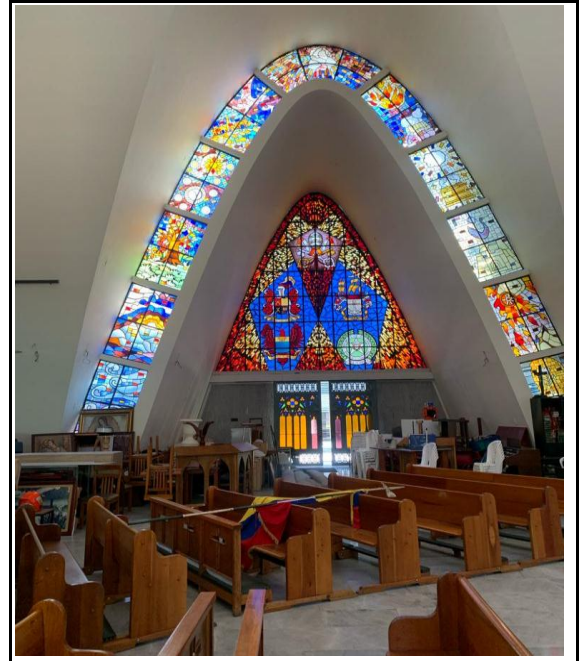

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se inicia resane en la catedral.




UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Excavacion de terreno hacia el tercer sendero peatonal



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Material sobrante de exvacaion.



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resanes en techo en el pasillo de la casa cural

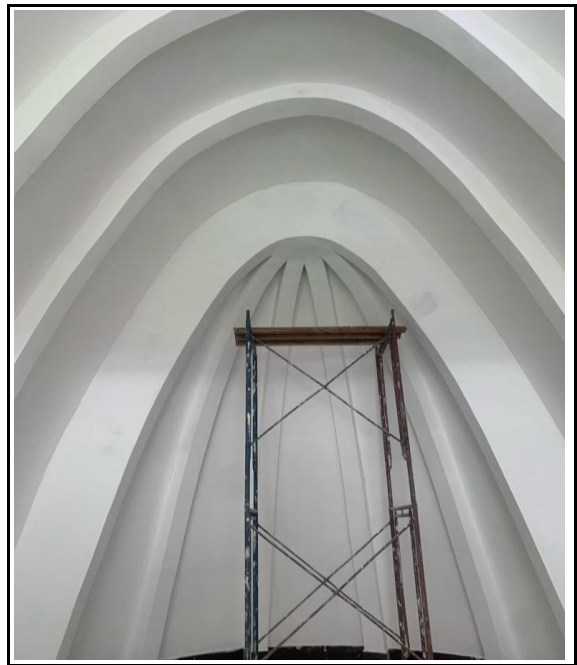

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Pintura en capilla en la casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Estuco y pintura



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Estuco y pintura
