

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 119 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	3,35%		93,35%	Obra Física Ejecutada (%)	3,94%		93,94%
Valor básico de la Obra	\$ 10.981.022,77	\$	305.993.574,74	Valor básico de la Obra	12.914.993,34		307.927.545,91
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		Interventor:		GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S	
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Actualizado:		\$ 352.258.326,00	
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:		5 MESES 16 DIAS		Plazo Actualizado:		6 MESES 29 DIAS	
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		15 DE ENERO DE 2024		Fecha de Vencimiento:		31 DE ENERO DE 2024	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


pintura final - vinilo
culminacion de instalacion de cubierta traslucida
finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso
Recoleccion de escombros y aseo en general



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta

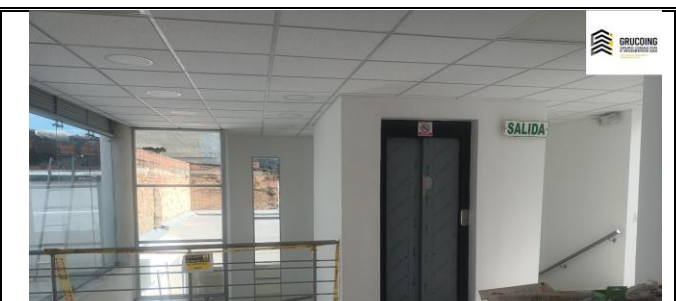



Instalacion de cubierta



finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso



aseo oficinas



pintura final hall 2do piso



pintura final escalera3



recoleccion de escombros y basura

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	 Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555
