

[illegible]

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se envió oficio al contratista recordándole los tiempos de ejecución del contrato y los Análisis de Precios Unitarios, programa de salud ocupacional, cronograma de obra, hoja de vida del residente de obra, especificaciones técnicas del proceso y estudios de seguridad del personal que laborara dentro de la Unidad mediante oficio No. 20199000005461

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 87.801.922,88	\$ 87.801.922,88	\$ 230.056,33	0,26%	\$ 87.571.866,55	99,74%
Obras Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL	\$ 87.801.922,88	\$ 87.801.922,88	\$ 230.056,33	0,26%	\$ 87.571.866,55	99,74%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 87.801.922,88	
VALOR ADICIONAL	\$ -	
VALOR FINAL	\$ 87.801.922,88	
ANTICIPO	\$ -	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ -	
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020	\$ -	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	NO ENTREGO	PDTE APROBACION	NO CUMPLIO	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA FIRMADO	NO ENTREGO	PDTE APROBACION	NO CUMPLIO	
PRESENTACION APORTES PARAFISCALES	NO ENTREGO	PDTE APROBACION	NO CUMPLIO	
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO ENTREGO	PDTE APROBACION	NO CUMPLIO	
PRESENTACION PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	NO ENTREGO	PDTE APROBACION	NO CUMPLIO	

14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI NO X)

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se le informa al contratista se allegue a la mayor brevedad la documentación requerida para cargarse en el plataforma secop II, así mismo se le recomienda al contratista informar con por lo menos un día de anterioridad el ingreso de vehículos o materiales para no afectar la seguridad de la Unidad.

16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:  ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor Técnico Firma y posfirma	
---	--


REGISTRO FOTOGRAFICO

ARREGLO DE MALLA PERIMETRAL


INSTALACION DE CONCERTINA




ADECUACIÓN DE BODEGA

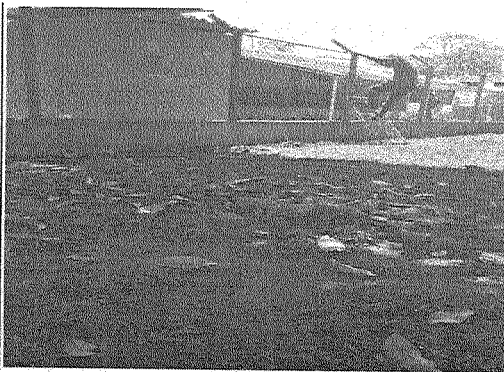

ADECUACIÓN DE BODEGA

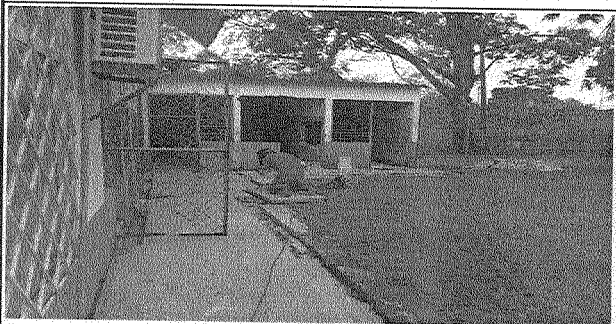

ADECUACION DE BODEGA

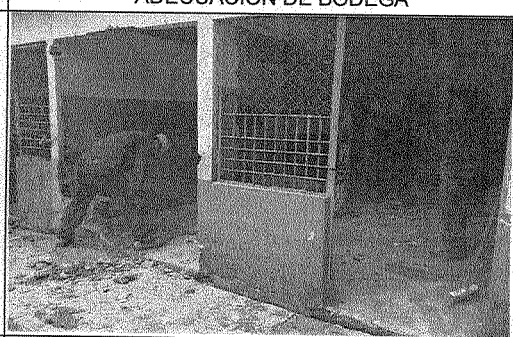

ADECUACION DE BODEGA

