


 Libertad y Orden	MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT. 800.095986-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
---	--	---

Página 1 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN LICITACION PUBLICA

MUNICIPIO DE SILVIA – CAUCA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Situación Ejecución del Contrato

CONTRATO 359 DE 2.023

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2081-2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Y EL MUNICIPIO DE SILVIA”

**INFORME CONSOLIDADO
PARA PAGO DE ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 Y FINAL**

**SUPERVISIÓN LICITACION PUBLICA
SUPERVISOR: ING. JESUS HERNAN TUNUBALA CALAMBAS**

Silvia Cauca, Diciembre de 2023

CONTRATO 359 DE 2.023

“MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA”

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel:(0928)251011 – 251168 Fax 251108
Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email: contactenos@silvia-cauca.gov.co. Código Postal 192070

1. INFORME DEL CONTRATO DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO


CONTRATO No:	CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 359 de 2023
Tipo de contrato:	Contrato de mínima cuantía
Objeto:	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2081- 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SILVIA"
Contratista:	CONSORCIO VIAL SILVIA 2023 NIT. 901769060-1 R/L ING. JAMES PIAMBA HOYOS
Dirección de notificaciones:	Calle 6 #11-83 POPAYAN
Tel / celular:	3007532311
Correo electrónico:	Ingjpambah@hotmail.com
Fecha del contrato:	Dos (02) días del mes de noviembre de 2023
Plazo de ejecución:	Hasta el treinta y uno de Diciembre a partir de la firma del acta de inicio
Valor inicial:	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONTE (391,993,728) de parte de la Gobernación del Departamento del Cauca
Acta de iniciación:	06 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2 Cuadro resumen de fechas del contrato:

FECHA DEL CONTRATO:	012 de noviembre de 2023	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Veinticinco días (25) contados a partir del Acta de Inicio
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	06 de diciembre de 2023	FECHA TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2023
REINICIO No		FECHA TERMINACIÓN FINAL:	29 de diciembre de 2023

"MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA"

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel:(0928)251011 – 251168 Fax 251108
Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email:cp.matenos@silvia-cauca.gov.co Código Postal 192070

 Libertad y Orden	MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT. 800.095986-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
---	---	---

Página 3 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

1.3 Control sobre pólizas:

1.3.1 Observación: Con fecha 02 de noviembre de 2023 se suscribe el Contrato contenido en la Carta de Aceptación de la Oferta No. 359 de 2023 entre el Municipio de Silvia Cauca y el CONSORCIO VIAL SILVIA 2023, con Nit 9017690601, representado legalmente por el ing JAMES PIAMBA HOYOS en calidad de contratista, en la cláusula OCTAVA, se hace la exigencia de las GARANTÍAS, el contratista presentó para su aprobación las pólizas que se describen a continuación:

Se presentan las pólizas garantes del cumplimiento y calidad del servicio prestado, según como se detalla a continuación.


ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	41-44-101278060	05/11/2023	30/04/2024
	Calidad del Servicio			05/11/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		05/11/23	31/06/28

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	Predios laborales y operaciones	41-40-101051151	05/11/2023	31/12/2023

"MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA"

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel: (0928)251011 – 251168 Fax 251108
Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email: contactenos@silvia-cauca.gov.co. Código Postal 192070

 <p>Libertad y Orden</p>	<p>MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA</p> <p>NIT. 800.095986-6</p> <p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	
---	---	---

Página 5 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

Valor y forma de pago

El valor del Contrato de mínima cuantía es de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (391,993,728)

El contratista hizo la entrega de todos los documentos que son indispensables para realizar el pago de acta de pago parcial No. 01 y final, se hizo la verificación del cumplimiento del objeto contratado, bajo las condiciones del Acta de recibo parcial 01 y final,

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Se hizo la revisión a toda la documentación que pueda soportar el informe de supervisión de la ejecución del contrato; consistente en la verificación de las actividades hasta la fecha ejecutadas bajo el Acta de Recibo Parcial No. 01. verificación de cantidades, el registro fotográfico como evidencia de y la verificación de los productos y su concordancia con lo solicitado en los estudios previos, con lo cual se proyecta el acta de recibo parcial No. 01 Y FINAL.

El proyecto parcialmente realizado consiste en lo siguiente:


CONTRATAR A MONTO AGOTABLE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2081- 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SILVIA"

3.1 Documentos que soportan el pago del acta de pago No. 01 y final Informe de ejecución parcial del contrato

3.2 Comités técnico

No.	FECHA	ASUNTO TRATADO	CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
1	15/12/2023	Para realizar revisión de documentación	Seguimiento al contrato
1	28/12/2023	Para dar los lineamientos para proceder con la terminación y liquidación del contrato	Liquidación del contrato

Las actividades ejecutadas se realizaron en coordinación con el personal encargado de la edificación objeto de intervención, de la secretaria de gobierno y supervisión. La modificación se describe a continuación

 <p>Libertad y Orden</p>	<p align="center">MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA</p> <p align="center">NIT. 800.095986-6</p> <p align="center">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	
---	--	---

Página 6 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

4. CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para el control de la ejecución (Supervisión) del contrato No. 347 de 2023, lo tiene a cargo la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Se le hizo el respectivo seguimiento a las actividades y elementos suministrados e instalados, realizando la revisión de los materiales suministrados y verificando las cantidades contratadas por el municipio y contratista.


A continuación, se describe de manera discriminada todos y cada uno de los ítems de los que se reciben en la presente acta. Los ítems de la presente acta son los siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNIDAD	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Retroexcavadora JD 510 o similar	Hora	488,00	100	14122000	100	14122000
2	Motoniveladora CAT 12.F o similar	Hora	384,00	100	1881600	100	1881600
3	Vibro compactador 950 TN o Similar	Hora	336,00	100	16464000	100	16464000
4	Volqueta de 5M3	Día	288,0	14	6130096	14	6130096
5	Volqueta doble troqué de 14M3	Día	73,00	10	6961920	10	6961920
6	Planchón Capacidad Hasta 10Ton	Día	4,00	4	2446080	4	2446080
7	Carro tanque de 5000LT o superior	Día	4,00	0	0	0	0
8	Camabaja	Hora	96,00	50	7.938.000	50	7938000

"MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA"

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel:(0928)251011 – 251168 Fax 251108

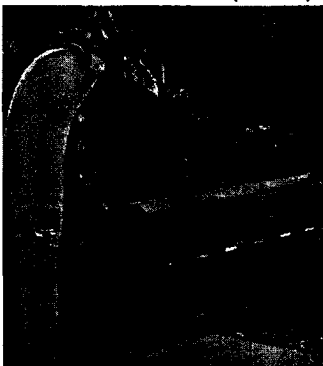



Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email: contactenos@silvia-cauca.gov.co. Código Postal 192070

 <p>Libertad y Orden</p>	<p>MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA</p> <p>NIT. 800.095986-6</p> <p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	
---	---	---

Página 7 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

Valor Total	391993728			\$72.868.096	\$72.868.096
-------------	-----------	--	--	--------------	--------------

Verificación de Actividades suministradas de acuerdo al proceso contractual

ITEM	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	La retroexcavadora realizo el cargue del material a la volqueta de 5M3 de la cantera Santa Clara para regarlos en los tramos de via Cruce 2602 A- Media Loma - Santa Clara -Silvia y se realizo el cargue de volqueta de 5m3 de la mina las palma para el accareo del material para el mejoramiento de los tramos de via Usenda- Valle Nuevo	<p>UNIDAD DE MEDIDA (HORA) CANTID: 100,00</p>  
2	Se realizo el regado del material estraído del la cantera Santa Cira, para el mejoramiento de los tramos de via Cruce 2602 A Media Loma -Santa Clara -Silvia	<p>UNIDAD DE MEDIDA (HORA) CANTID: 100,00</p>  
3	Se realizo la compactacion del material estraído del la cantera Santa Cira; para el mejoramiento de los tramos de via Cruce 2602 A Media Loma -Santa Clara -Silvia	<p>UNIDAD DE MEDIDA (HORA) CANTID: 100,00</p>  

"MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA"

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel: (0928)251011 - 251168 Fax 251108

Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email: contactenos@silvia-cauca.gov.co. Código Postal 192070

Usenda- Valle


 Libertad y Orden	MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT. 800.095986-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
---	--	---

Página 9 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023

6	Se realizo el traslado de la maquinaria para el mejoramiento de los tramos de via Cruce 2602 A Media Loma -Sa	UNIDAD (DIA) 4,00  
8	Se realizo el traslado de la maquinaria para el mejoramiento de los tramos de via Cruce 2602 A Media Loma -Santa.	UNIDAD (HORA) 50,00  

Valor total recibido según acta única y final , setenta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil noventa y seis pesos (\$ 72.868.096,00).

El presente contrato a la fecha esta en proceso de liquidación.






Libertad y Orden


MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA

NIT. 800.095986-6

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Página 10 de 10 supervisión del contrato No. 359 de 2023


ING. JESUS HERNAN TUNUBALA CALAMBAS
Supervisor del contrato


Proyectó: Ing. José Alberto Mosquera: Apoyo técnico de Infraestructura

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"MUJER HILANDO GOBIERNO PARA LA VIDA"

Calle 9ª No 2-49 Parque Principal Tel: (0928)251011 – 251168 Fax 251108

Pag. Web: www.silvia-cauca.gov.co/email: contactenos@silvia-cauca.gov.co. Código Postal 192070
