



CONSORCIO INTERCONSULTORES
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 901.450.714 - 9

Interventoría
SNR Bogotá - Funza

NSR- INTER-DIR-1651-0007

Bogotá D.C., 14 de junio de 2024

Señores:

Superintendencia de Notariado y Registro - SNR

Att: Ing. Jaqueline Guzmán Herazo.

Supervisión Superintendencia de Notariado y Registro - SNR

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 1653 de 2024

ASUNTO: RADICACIÓN DE PROGRAMACIONES INICIALES Y FLUJO DE CAJA.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, esta interventoría se permite presentar después de haber revisado y verificado las programaciones iniciales de obra y sus correspondientes flujos de caja.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

RICARDO J. MANSILLA B.

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

Anexo 1: Programación e obra de Bogotá Centro

Anexo 2: Programación de obra Bodega Funza

Anexo 3 Flujo de caja de Bogotá Centro.


Anexo 4: Flujo de caja de Bodega Funza

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tre	Semestr
1			PRESUPUESTO OFICIAL ORIP BOGOTA CENTRO	\$ 295.558.173,00	80 días	lun 17/06/24	vie 4/10/24			M J J A S O N
2			PRELIMINARES	\$ 29.288.439,00	80 días	lun 17/06/24	vie 4/10/24			
3			LOGISTICA Y ALISTAMIENTO DE MATERIA	\$ 0,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24			
4			DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	\$ 1.185.250,00	15 días	vie 23/08/24	jue 12/09/24	22		
5			DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	\$ 1.351.090,00	7 días	vie 23/08/24	lun 2/09/24	4CC		
6			DESMONTE DE CIELORRASO	\$ 8.579.000,00	11 días	vie 23/08/24	vie 6/09/24	4CC;5CC		
7			DESMONTE DE ALFOMBRA	\$ 551.520,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24			
8			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	\$ 128.682,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	7CC		
9			DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	\$ 1.950.300,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	7CC		
10			DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	\$ 58.036,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	7CC;9CC		
11			DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	\$ 4.696.740,00	29 días	mar 27/08/24	vie 4/10/24	22FC+2 días		
12			DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	\$ 4.001.100,00	7 días	vie 23/08/24	lun 2/09/24	22		
13			DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	\$ 371.096,00	15 días	mar 3/09/24	lun 23/09/24	12		
14			DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	\$ 313.225,00	15 días	vie 23/08/24	jue 12/09/24	22		
15			PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	\$ 1.567.600,00	5 días	lun 17/06/24	vie 21/06/24	7CC;9CC;10CC		
16			DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	\$ 893.280,00	7 días	vie 21/06/24	lun 1/07/24	22CC		

Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tre	Semestr
17		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	\$ 358.000,00	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	16		
18		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	\$ 737.000,00	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	17CC		
19		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	\$ 203.124,00	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	18CC		
20		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	\$ 1.369.000,00	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	19CC		
21		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	\$ 724.896,00	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	20CC		
22		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	\$ 249.500,00	45 días	vie 21/06/24	jue 22/08/24	15FC-1 día		
23		CARPINTERÍA EN MADERA	\$ 2.748.626,00	2 días	vie 21/06/24	lun 24/06/24			
24		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	\$ 1.746.498,00	1 día	vie 21/06/24	vie 21/06/24	10FC+3 días		
25		MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	\$ 660.510,00	1 día	vie 21/06/24	vie 21/06/24	24CC		
26		BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	\$ 341.618,00	1 día	lun 24/06/24	lun 24/06/24	25		
27		CARPINTERÍA METÁLICA	\$ 1.580.899,00	9 días	vie 26/07/24	mié 7/08/24			
28		BARRA DE SEGURIDAD 60CM	\$ 293.864,00	3 días	lun 5/08/24	mié 7/08/24	29		

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: vie 14/06/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tre	Semestr
29			BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	\$ 573.739,00	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	30		M J J A S O N
30			VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	\$ 713.296,00	5 días	vie 26/07/24	jue 1/08/24	44;36		
31			CIELORRASOS	\$ 126.635.000,...	20 días	lun 9/09/24	vie 4/10/24			
32			CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	\$ 126.635.000,00	20 días	lun 9/09/24	vie 4/10/24	6		
33			CONCRETOS Y MORTEROS	\$ 2.939.360,00	7 días	lun 1/07/24	mar 9/07/24			
34			PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	\$ 2.939.360,00	7 días	lun 1/07/24	mar 9/07/24	16FC-1 día		
35			ENCHAPE MUROS	\$ 9.028.832,00	29 días	lun 17/06/24	jue 25/07/24			
36			CERÁMICA FORMATO 25X35CM	\$ 3.563.152,00	15 días	vie 5/07/24	jue 25/07/24	16FC+3 días		
37			CERÁMICA FORMATO 20X20CM	\$ 5.465.680,00	15 días	lun 17/06/24	vie 5/07/24			
38			PINTURAS	\$ 20.823.564,00	73 días	mar 18/06/24	jue 26/09/24			
39			ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	\$ 235.980,00	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	10		
40			TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	\$ 371.536,00	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24	39CC		
41			VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	\$ 20.216.048,00	12 días	mié 11/09/24	jue 26/09/24	32CC+2 días		
42			PISOS	\$ 20.049.555,00	42 días	vie 28/06/24	lun 26/08/24			
43			DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	\$ 17.504.130,00	40 días	mar 2/07/24	lun 26/08/24	16		

Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		


Página 3

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tre MJ J A S O N	Semestr
44			PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	\$ 1.909.675,00	8 días	mar 2/07/24	jue 11/07/24	16		
45			ALISTADO DE PISO 2CM	\$ 635.750,00	5 días	vie 28/06/24	jue 4/07/24	16FC-2 días		
46			RED ELÉCTRICA	\$ 76.141.755,00	8 días	mar 10/09/24	jue 19/09/24			
47			LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	\$ 16.624.900,00	5 días	vie 13/09/24	jue 19/09/24	32CC+4 días		
48			SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	\$ 16.820.700,00	5 días	mar 10/09/24	lun 16/09/24	47CC-3 días		
49			CANAleta PLASTICA 100X45MM	\$ 9.567.390,00	5 días	mar 10/09/24	lun 16/09/24	48CC		
50			TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS	\$ 352.540,00	5 días	mar 10/09/24	lun 16/09/24	48CC		
51			PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	\$ 30.414.180,00	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	50CC		
52			SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	\$ 276.975,00	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24	50CC		
53			SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT. 6A	\$ 2.085.070,00	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24	51CC		
54			RED HIDRÁULICA	\$ 2.457.285,00	52 días	lun 8/07/24	mar 17/09/24			
55			VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	\$ 24.933,00	3 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24	14		
56			PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	\$ 144.183,00	3 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24	14;55CC		
57			PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO. Promedio 3 ml	\$ 46.645,00	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24	56CC		

Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tr	Semestr
58			PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	\$ 192.244,00	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24	57CC	M	J
59			TAPA REGISTRO 20X20CM	\$ 73.911,00	1 día	lun 8/07/24	lun 8/07/24	37	J	A
60			JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	\$ 291.639,00	1 día	lun 8/07/24	lun 8/07/24	59CC	A	S
61			LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	\$ 774.396,00	1 día	lun 8/07/24	lun 8/07/24	60CC	S	O
62			LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería	\$ 909.334,00	1 día	lun 8/07/24	lun 8/07/24	61CC	O	N
63			RED SANITARIA	\$ 2.381.298,00	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24		N	
64			SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	\$ 815.918,00	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24	44		
65			SANITARIO TIPO AHORRADOR	\$ 1.565.380,00	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24	64CC		
66			ASEO-SEÑALIZACIÓN	\$ 1.483.560,00	76 días	vie 21/06/24	vie 4/10/24			
67			ASEO GENERAL DE OBRA	\$ 1.483.560,00	76 días	vie 21/06/24	vie 4/10/24	22CC		

Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

<div>Proyecto: PROGRAMACION FU</div> <div>Fecha: vie 14/06/24</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			ORIP BODEGA No. 2 ARCHIVO SNR - FUNZA (Cundinamarca).	\$ 852.756.720,00	80 días	lun 17/06/24	vie 4/10/24	
2			PRELIMINARES	\$ 30.724.750,00	19 días	lun 17/06/24	jue 11/07/24	
3			LOGISTICA Y ALISTAMIENTO DE MATERIALES Y PERSONAL OPERATIVO	\$ 0,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
4			CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	\$ 375.150,00	2 días	lun 17/06/24	mar 18/06/24	
5			RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	\$ 30.349.600,00	19 días	lun 17/06/24	jue 11/07/24	4CC
6			CIELORRASOS	\$ 136.095.300,...	30 días	vie 12/07/24	jue 22/08/24	
7			SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar)	\$ 136.095.300,00	30 días	vie 12/07/24	jue 22/08/24	9CC
8			ENCHAPE MUROS	\$ 893.200,00	15 días	vie 12/07/24	jue 1/08/24	
9			RESANE	\$ 893.200,00	15 días	vie 12/07/24	jue 1/08/24	5
10			FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	\$ 7.737.800,00	20 días	lun 5/08/24	vie 30/08/24	
11			PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	\$ 7.737.800,00	20 días	lun 5/08/24	vie 30/08/24	9FC+1 día

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: vie 14/06/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
12			IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 5.329.650,00	15 días	lun 5/08/24	vie 23/08/24	
13			SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM	\$ 5.329.650,00	15 días	lun 5/08/24	vie 23/08/24	11CC
14			PINTURAS	\$ 643.485.434,...	61 días	vie 12/07/24	vie 4/10/24	
15			PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	\$ 128.911.010,00	7 días	vie 2/08/24	lun 12/08/24	9
16			PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO, 3 CAPAS	\$ 136.213.300,00	7 días	vie 12/07/24	lun 22/07/24	5
17			PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS	\$ 22.438.962,00	7 días	mar 23/07/24	mié 31/07/24	16
18			RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	\$ 675.512,00	7 días	jue 1/08/24	vie 9/08/24	17

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: vie 14/06/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

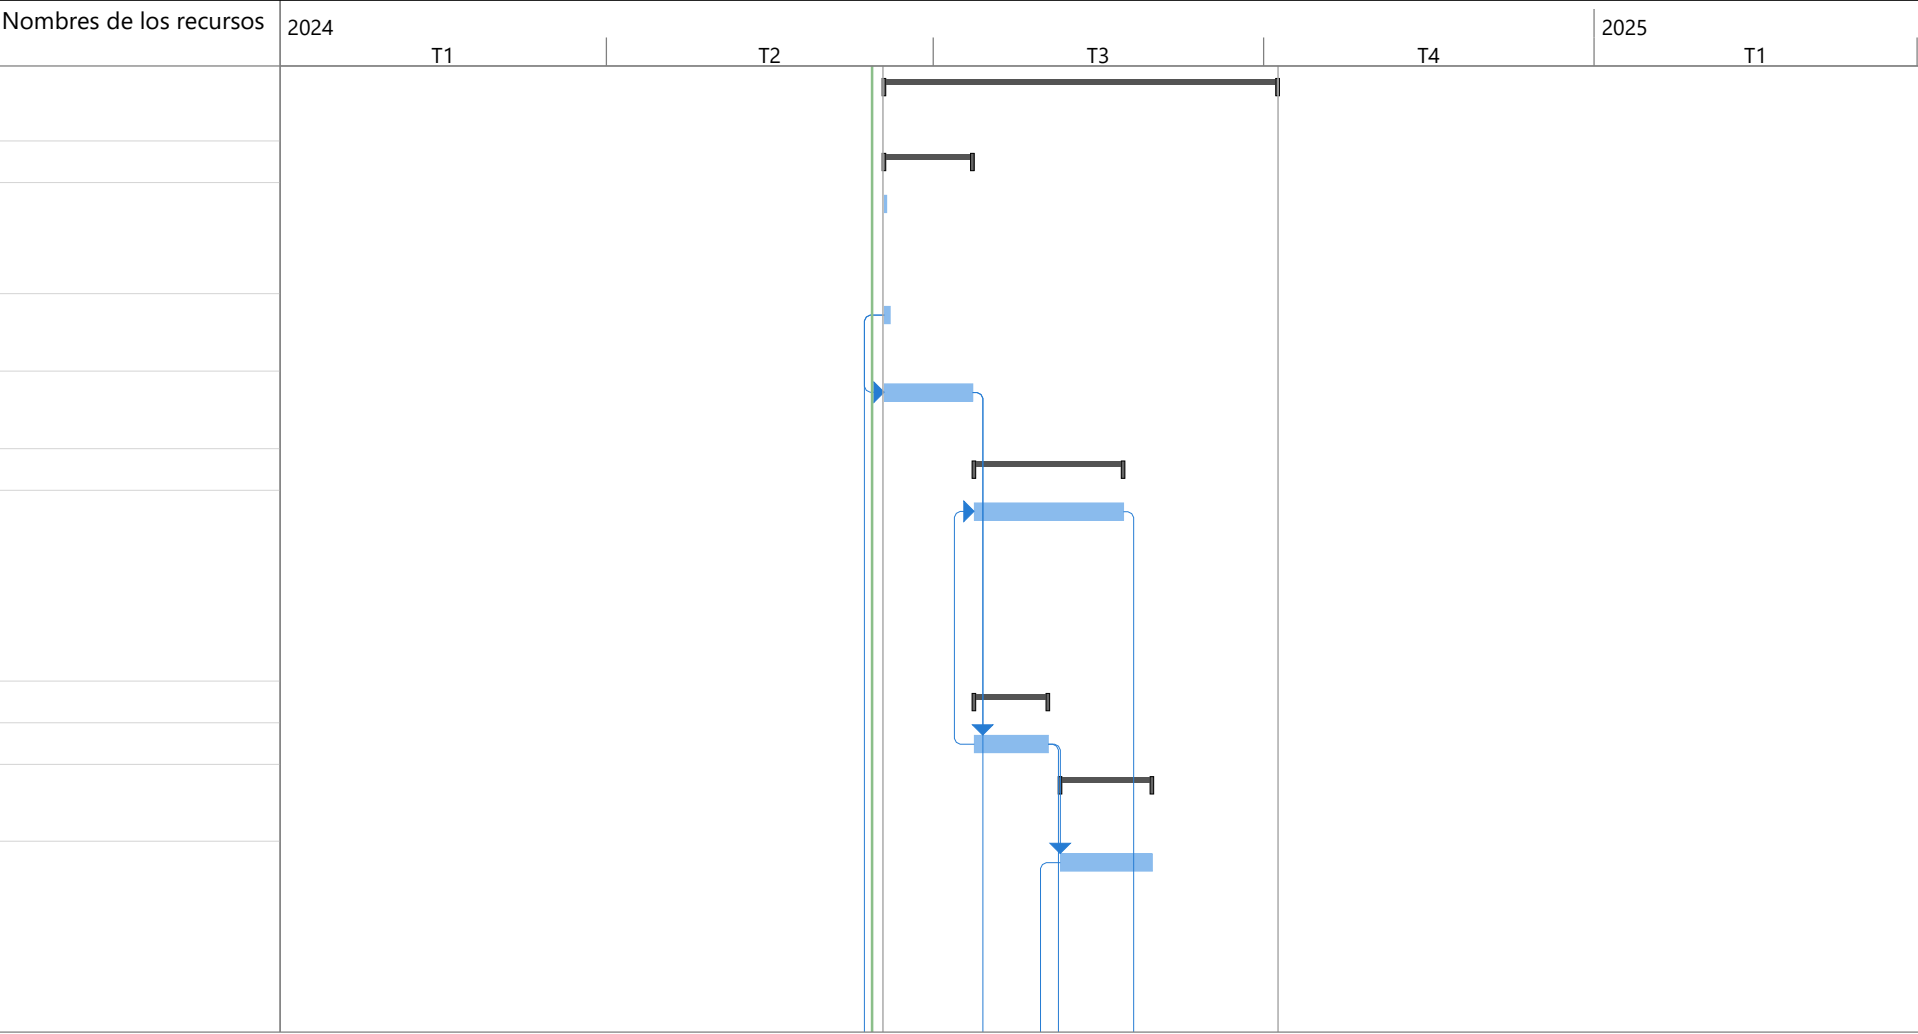
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
19			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE BASE ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y preparación de la superficie y elementos para trabajo en alturas. Se debe cubrir las superficies horizonta	\$ 355.246.650,00	45 días	lun 5/08/24	vie 4/10/24	13CC
20			RED ELÉCTRICA	\$ 6.774.008,00	14 días	mar 6/08/24	vie 23/08/24	
21			INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	\$ 45.572,00	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24	19CC+1 día
22			SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	\$ 3.372.300,00	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	7
23			BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	\$ 237.616,00	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	22CC
24			SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	\$ 3.118.520,00	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	23CC
25			ASEO-SEÑALIZACIÓN	\$ 21.716.578,00	76 días	lun 17/06/24	lun 30/09/24	
26			ASEO GENERAL DE OBRA	\$ 3.814.000,00	76 días	lun 17/06/24	lun 30/09/24	4CC
27			CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	\$ 9.131.000,00	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	24CC
28			PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	\$ 560.010,00	13 días	vie 23/08/24	mar 10/09/24	27CC
29			PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	\$ 5.123.940,00	13 días	vie 23/08/24	mar 10/09/24	28CC

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: vie 14/06/24

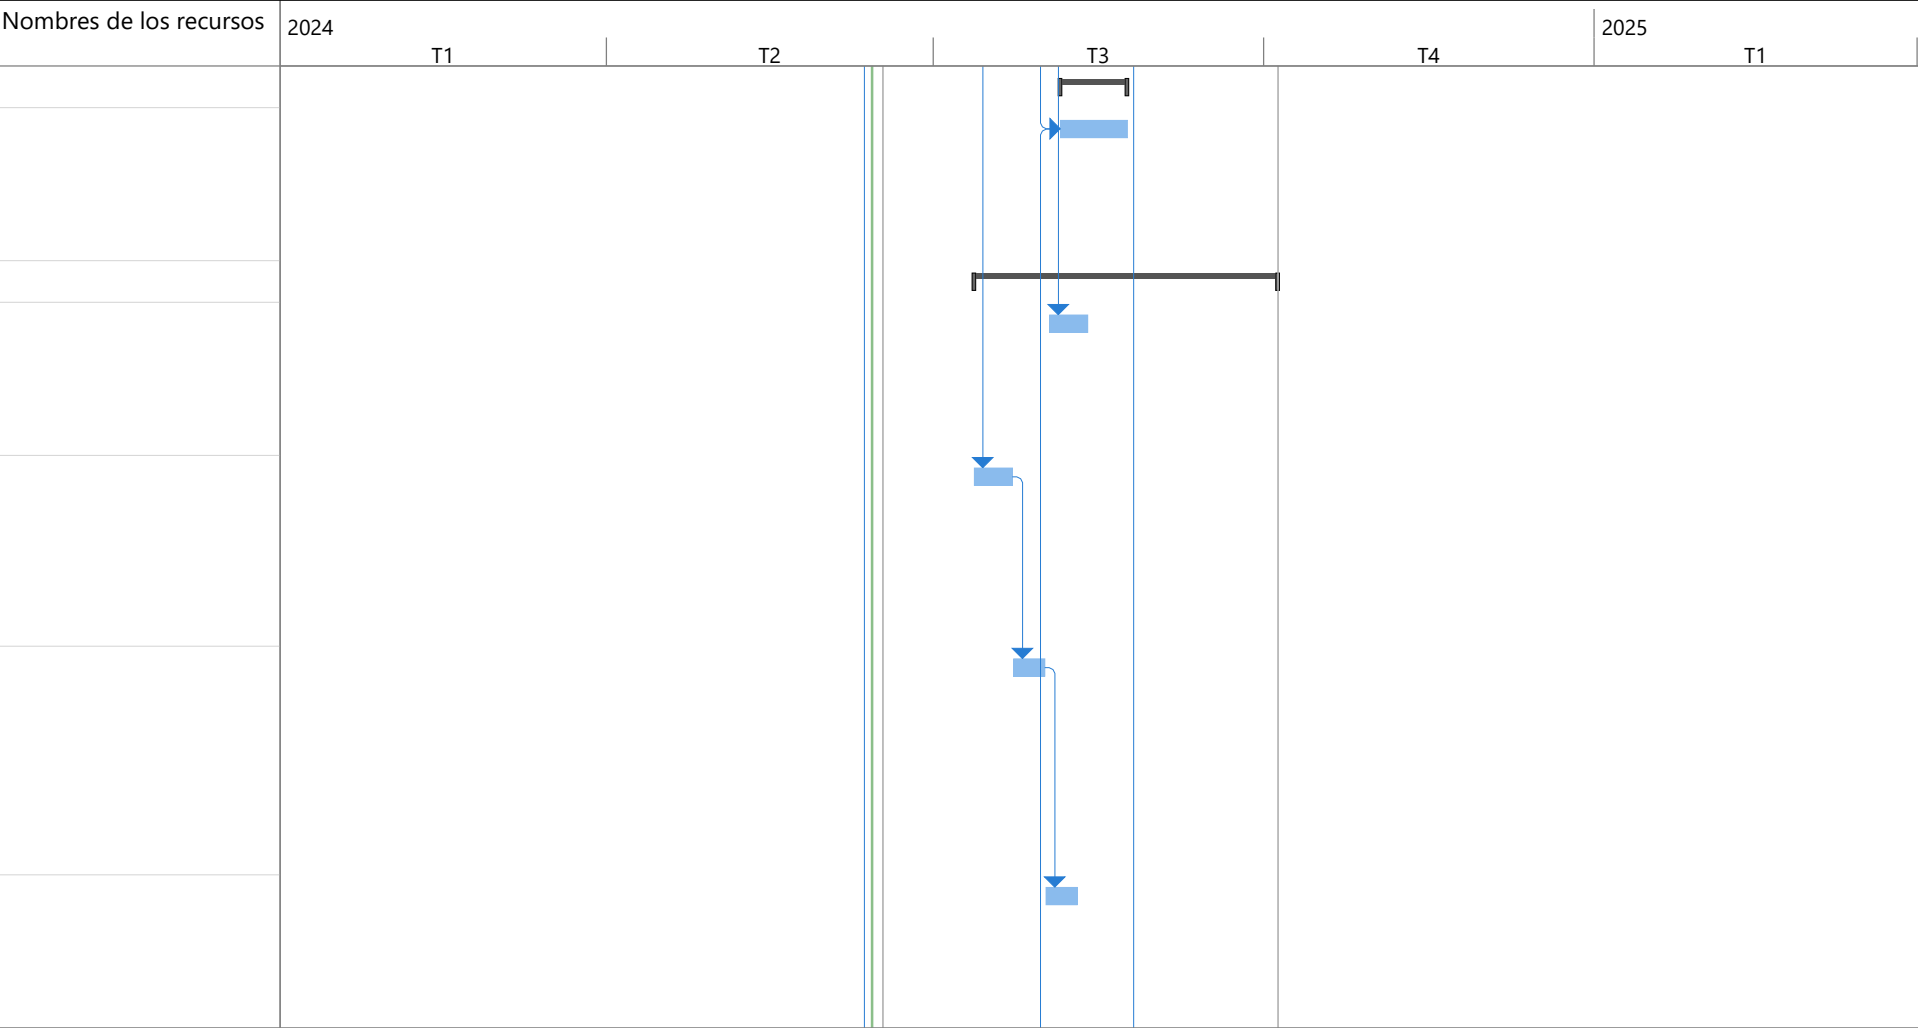
Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
30			SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	\$ 3.087.628,00	3 días	vie 23/08/24	mar 27/08/24	29CC

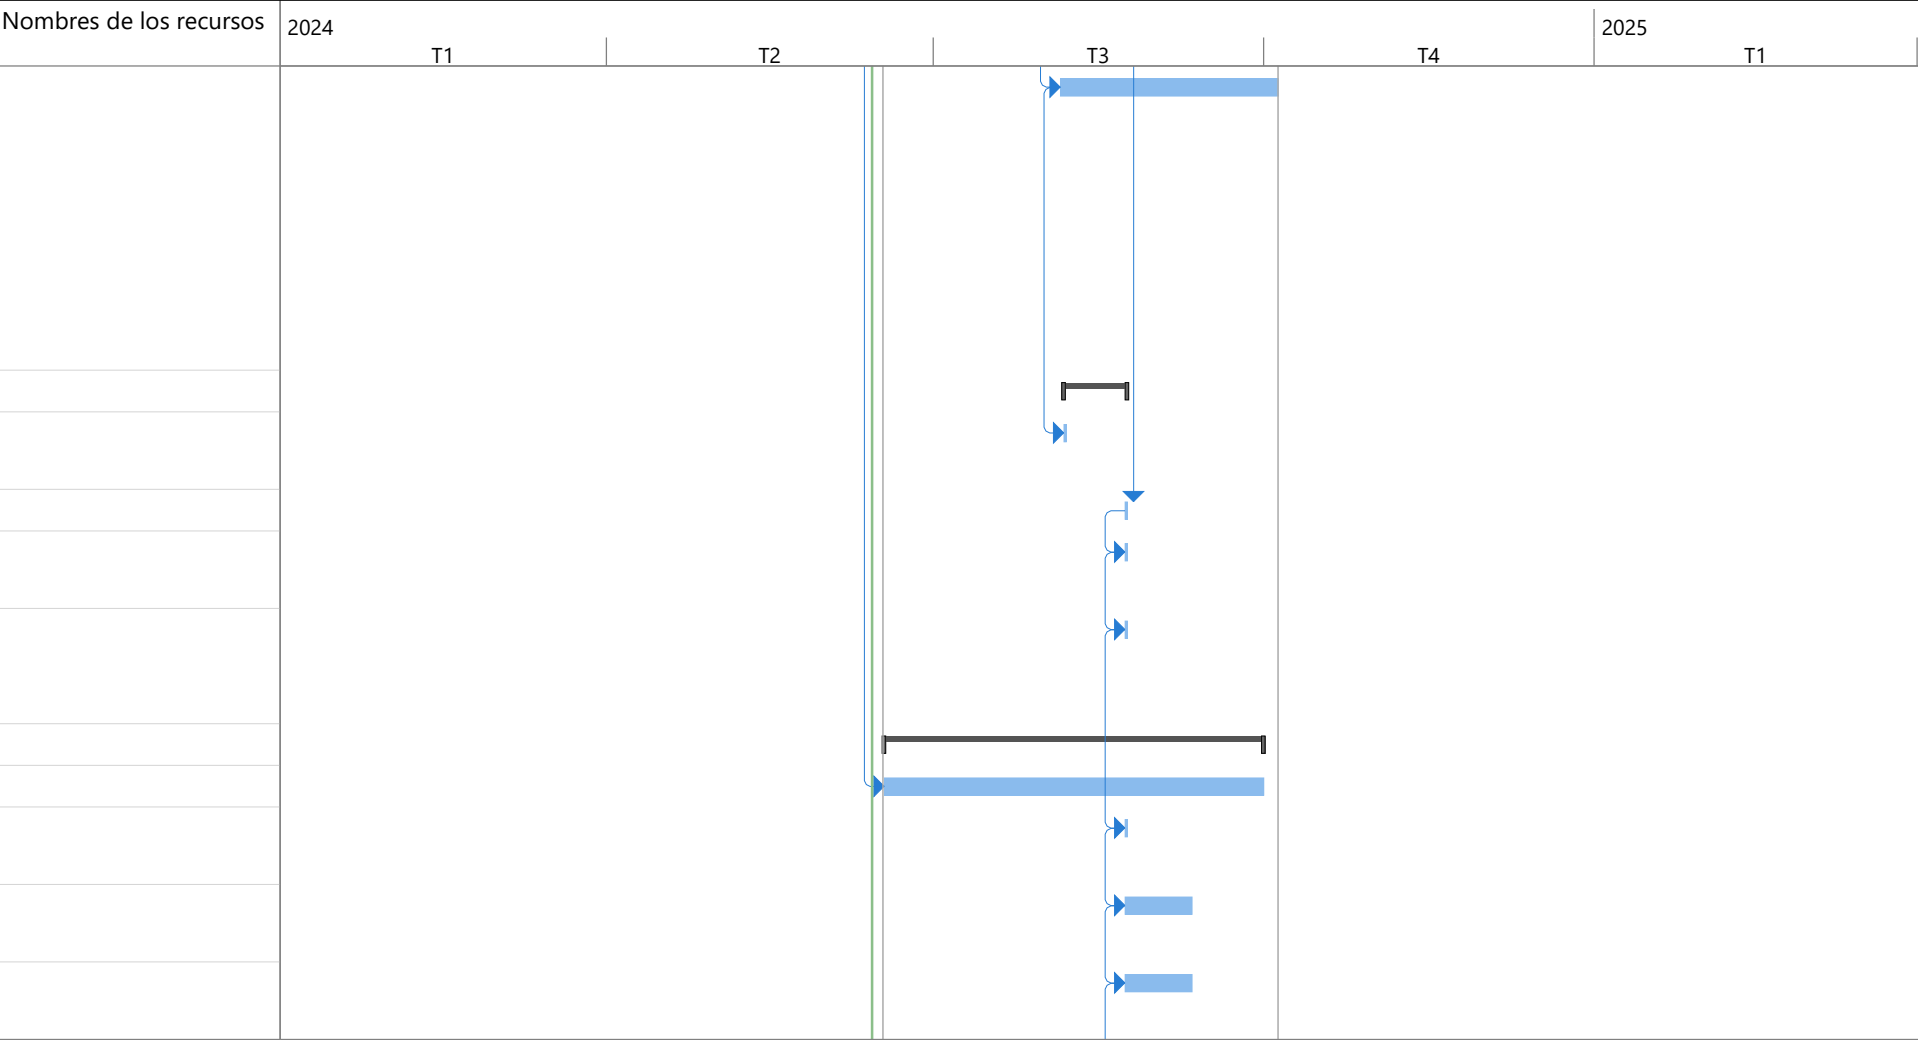
Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: vie 14/06/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Nombres de los recursos	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1



Proyecto: PROGRAMACION FU Fecha: vie 14/06/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
