

Fecha 11.06.2024

Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada.

- 1 Arquitecto residente
- 1 Ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional ASE - residente SST
- 1 profesional social

Mano de obra no calificada.

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficio varios
- 5 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 Ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional ASE

Maquinaria en obra

- 1 Mezcladora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rona.

Estado del tiempo.

Mañana soleado M. Dia Nublado Tarde lluvia.

SI SO MA - se realiza reunion de comité de veedores
se registra el ingreso de personal a obra
se identifica uso adecuado de dotación y
EPP

se realizan pausas activas al interior de la
obra

Se realizó inspección de equipo y herramientas en obra.

Se hacen rondas de inspección y se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada.

Actividades.



Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 ha comenzado la instalación del acero de refuerzo, según las especificaciones de los diseños. Además se han cobrado dovelas para la transferencia de cargas transversales y se han instalado los pasadores longitudinales para las placas de pavimento de concreto en la zona de descarga del proyecto.

La cuadrilla N°2 se encargó de la instalación de la (formación) formata metálica longitudinal para proporcionar un espesor de al menos de 0 a las placas de concreto, tal como lo indican los diseños.

La cuadrilla N°3 se continúa el replanteo y excavación del río como en la zona de descarga, cuya función será recolector el agua pluvial de las áreas exteriores. Este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluente situado en el costado norte del proyecto.



Fecha 12-06-2024

Personal en obra por parte de contratista,
Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil- residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional Social.

Mano de obra no calificada.

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de Oficio varos.
- 5 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoría.

- 1 ingeniero civil- residente de interventoría
- 1 profesional HSE.

Maquinaría - Equipos en obra

- 1 Tranzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo

Mañana soleado mañana nublado tarde lluvia

Sistema

Se registra el ingreso de personal a obra
se identifica por parte y uso adecuado de

dotación y epp

Se realizaron rondas de inspección y se verificó que las actividades se realicen de forma segura y adecuada.

Se realizaron inspecciones de Maquinaria y herramientas.

Se identifica cenamiento total del área del proyecto.



Actividades.

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1. se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de $f'c$ 4000 psi, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la plaza para el pavimento, esta plaza se ubicará en la zona de descarga del proyecto el procedimiento se realizó en áreas longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades, logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.

La cuadrilla N°2. se continúa el replanteo y excavación del cárcamo en la zona de descarga, cuya función será recolectar el agua pluvial de las áreas exteriores, este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluyente situado en el costado norte del proyecto.



Fecha 13-06-2024.

personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente.

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SSR

1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de construcción

1 Ayudante

4 obreros de oficio veter.

8 oficiales

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra

1 transportadora

1 Mezcladora.

1 vibro de concreto

1 vibro compactador tipo roma

Estado del tiempo.

Mañana soleado M. dia soleado Tarde. soleado

SI BOMA.

se registra el ingreso de personal a obra

se identifica porte y uso adecuado de obra

con y epp.

se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada.

se realiza inspección de maquinaria y herramienta.

se identifican jornada de Orden y aseo y adecuada disposición de residuos y desechos de obra

Actividades.

Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 procede con la elaboración del concreto con una resistencia de $F'c$ 4.000 PSI, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa para el pavimento. Esta placa se ubicará en la zona de descarga del proyecto. el procedimiento se realizó en área longitudinal debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.

La cuadrilla N°2. se continúa el replanteo y excavación del cárcamo en la zona de descarga, cuya función será recolectar el agua pluvial de las áreas exteriores. Este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluente situado al estado norte del proyecto

lider

La cuadrilla N°3. se llevó a cabo una jornada de orden y aseo al perímetro de la obra puesto que en el cuarto donde se almacenaban los retazos de madera provenientes de la construcción. Esto se realizó con el fin de preparar el área para el mejoramiento de la losa del contrapiso, que será esmaltada y pulida.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14-06-2024

personal en obra por parte de contratista.
Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil- residente de obra
- 1 profesional ASE- residente SRT
- 1 profesional social

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficio varios
- 5 oficiales

er

personal en obra por parte de interventoría.
 1 ingeniero civil- residente de interventoría.
 1 profesional HRE

Maquinaria - Equipo en obra.

- 1 Tronzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibrador de concreto
- 1 vibrador compactador tipo rana.

Estado del tiempo.

Mañana Nublado Medianoche Nublado Tarde Nublado.

SIEMPRE.

Se registra el ingreso de personal en obra.

Se realiza una jornada recreativa para promover el descanso y concentración de los colaboradores del proyecto.

Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.

Se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

Se identifica inspección de herramientas y equipos utilizados en obra.

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se comienza con la figuración y el corte del acero de refuerzo para el corrimón de acceso, el cual recogerá el

líder

agua de escorrentía de las obras exteriores. La cuadrilla N°2. se continua el replanteo y excavación del cárcamo en la zona de descarga, cuya función será recolectar el agua pluvial de las áreas exteriores. Este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluente situado en el costado norte del proyecto.

La cuadrilla N°3 se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de $F'c$ 3000 Psi. el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso esmaltado y pulido, esta placa se ubicará en las zonas de la rampa de minusválidos. El procedimiento se realizó en arcos longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en esta área. La cuadrilla N°4 se procede a suministrar y verter el concreto de solado de limpieza en el área del cárcamo. Este proceso es esencial para asegurar una base uniforme y estable, que facilite la correcta instalación de los elementos estructurales posteriores y garantice la durabilidad y resistencia del cárcamo.



GRUCOING
GRUPO CONSULTOR
E INGENIEROS SAS



GRUCOING
GRUPO CONSULTOR
E INGENIEROS SAS

[Signature]

[Signature]

Fecha 15-06-2024.

Personal en obra por parte de contratista

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil residente de obra

1 profesional HSE - residente SSR

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 obreros de oficios varios.

5 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil residente de interventoría.

1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipos en obra

1 Trazadora

1 Mezcladora

1 Vibro de concreto

1 Vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo.

Mañana lluvia Noche. Nublado Tarde. Nublado.

Observaciones

- Se registro el ingreso de personal a obra

- se identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP durante la ejecución de actividad.

líder

se realiza cambio o reparación de los eqp. donados o vendidos.

se verifica que las actividades se realicen de manera adecuada y segura.

se realiza inspección de herramientas y equipos.

se realiza jornada de Orden y aseo.

Actividades.

Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 continúa con el corte y la fragmentación del acero de refuerzo de la doble parilla del cárcamo que estará ubicado en el acceso del proyecto, el cual recogerá el agua de escorrentía de las obras exteriores y las conducirá hacia el cauce natural ubicado en el costado norte del proyecto.

La cuadrilla N°2. se continúa con la aplicación del pañete impermeabilizado sobre la mampostería levantada y confinada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua lluvia en el proyecto.

Nota. El personal operativo del contratista llevó a cabo una jornada de Orden y aseo en toda el área de la obra, con el objetivo de armonizar los ambientes laborales y ampliar la zona de ejecución en el área exterior.

Durante esta actividad, se seleccionaron los residuos según lo explicado en la

charla diaria, y se dispuso adecuadamente del exceso de material o escombros.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 17-06-2024

Personal en obra por parte del contratista

- 1 Arquitecto residente
- 1 Ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional social

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoria

- 1 ingeniero civil - residente de interventoria
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra.

líder

- 1 Trocadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo

Mañana soleado mañana soleado Tarde soleado

SISOMA.

Se registra el ingreso de personal a obra.

Se identifican a horas de inicio de turno para realizar las diferentes actividades laborales se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.

Se hacen recorridos en obra y se realizan recomendaciones en materia de SST.

Se realiza inspección diaria de herramientas y equipos utilizados en obra.

ACTIVIDADES:

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las áreas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se continua con el corte y la figuración e instalación del acero de refuerzo de la doble parrilla del cárcamo que estará ubicado en el acceso del proyecto. el cual recogerá el agua de escorrentía de las áreas exteriores y las conducirá hacia el cauce natural ubicado en el costado norte del proyecto.

La cuadrilla N°2 se continua con la aplicación del pañete impermeabilizado sobre la membrana levantada y confinada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.

La cuadrilla N°3 Después de instalar y nivelar las varillas de acero de refuerzo del cárcamo, se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia $F'c 4.000$ PSI para la losa del fondo del cárcamo, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días.

La cuadrilla N°4 se continua con la recuperación de las áreas de las obras exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el arco con una losa del pavimento con una resistencia de $F'c 4.000$ PSI a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.



Nota: se realizan pruebas de cilindros a las muestras del concreto de $F'c 4.000$ PSI utilizado para la fundación cárcamo.



17 jun 2024 8:52
centro de acopio mineral y mazona 18-11-19

17 jun 2024 2:38:09 p. m
centro de acopio mineral y mazona 18-11-19

lider

Fecha. 18-06-2024.

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 Ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional Ase - residente SST.
- 1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

- 1 maestro de obra.
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 Obreros.

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría.
- 1 profesional Ase.

Maquinaria - equipos en obra.

- 1 Tronzadora.
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo.

Mañana soleado M. día nublado tarde. lluvia.

SI DMA

Se registra el ingreso de personal a obra
Se identifica porte y uso adecuado de

dotación y EPP.

Se realiza reposición de EPP dañados o vendidos, y señalización y demarcación de áreas de trabajo. Se identifica adecuada disposición de dotación y EPP a la hora de realizar las actividades laborales.

Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra.

Se identifica cerramiento total del área del proyecto.

Actividades

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se procede a la elaboración del encofrado del corcama, configurándolo según la geometría especificada en el diseño. Adicionalmente, se instala el ángulo que servirá de soporte para la plantilla del corcama, siguiendo estrictamente los planos y diseños preparados. Este proceso asegura que todas las dimensiones y especificaciones estructurales se cumplan de acuerdo con las normativas establecidas. La cuadrilla N°2, con la placa del corcama ya fundida y las paredes encofradas, se procede a la elaboración y suministro del concreto con una resistencia de $F'c 4.000 \text{ psi}$ a los 28 días, siguiendo estrictamente los parámetros establecidos en las especificaciones y diseños.

La cuadrilla N°3 se continúa con la aplicación del punte impermeabilizado sobre la

líder

mampostería levantada y confinada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua lluvia en el proyecto.

La cuadrilla N° 9, se continúa con la reevaluación de las áreas de las obras exteriores del proyecto para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de $F'c$ 4.000 psi a los 28 días con el objetivo de avanzar en esta tarea.

Nota: se realizan pruebas de cilindro a las muestras del concreto de $F'c$ 4.000 psi utilizada para la fundación del cárcamo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 19-06-2024

Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada

Arquitecto residente

- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional social.

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

- 1 Franzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo

Mañana soleado M. Día soleado Tarde lluvia

SI SOMA:

Se registra el ingreso de personal en obra
se identifica parte y uso adecuada de
dotación y EPP.

se verifica que las actividades se realicen
de forma adecuada y segura.

se realiza el control de entrada y salida
de vehículos a obra en compañía de los
auxiliares de tránsito

se identifica inspección de equipos y herramientas

lider

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera:

La cuadrilla N°1 continúa con el corte y la figuración e instalación del acero de refuerzo de la parrilla del cárcamo que estará ubicado en el acceso peatonal del proyecto, el cual recogerá el agua de escorrentía de las obras del proyecto exterior y las conducirá hacia el cauce natural ubicado en el costado norte del proyecto. La cuadrilla N°2, después de instalar y nivelar las parrillas de acero de refuerzo en el cárcamo, se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia $F'c: 4000 \text{ psi}$ para la losa del fondo del cárcamo, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días.

La cuadrilla N°3 se continúa con la reevaluación de las áreas de obras exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de $F'c: 4000 \text{ psi}$ a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°4 se procede a instalar el cerramiento completo al concluir las obras exteriores, dado que se ha realizado la remoción del material en el área exterior con el objetivo de protegerla de

acceso de personal ajeno a la obra.
 Nota. se realizan pruebas de cilindros
 a las muestras del concreto de $f'c$ 4000
 psi utilizado para la Fundición del
 c/có como.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 20-06-2024

personal en obra por parte del contratista
 Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil- residente de obra
- 1 profesional HSE- residente SSR
- 1 profesional social.

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 oficial

líder

personal en obra por parte de interventoria
 1 ingeniero civil - residente de interventoria
 1 profesional Hse

Maquinaria- Equipos en obra

1 Trozadora

1 Mezcladora

1 vibro de concreto

1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo

Mañana Nubado Media soleado Tarde soleado

SIDMA.

Se registra el ingreso de personal a obra
 se realiza charla de inicio de turno antes
 de iniciar actividades

se verifica el porte y uso adecuado de
 dotación y epp

se verifica que las actividades se reali-
 cen de manera adecuada y segura

se identifica adecuada señalización y
 demarcación de áreas de trabajo

se identifica inspección de herramientas
 y equipos

se realiza la debida disposición y
 desechos de obra.

se identifican pausas activas dirigidas
 a los colaboradores del proyecto.

se identifica cerramiento total del área del proyecto

ACTIVIDADES.

Durante la jornada diaria, se coordina-
 ron los cuadrillas para dar continuidad

a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera



La cuadrilla N°1 después de instalar y nivelar las parrillas de acero de refuerzo, y una vez que se halla vertido la losa de concreto en el acceso peatonal, se procederá a encofrar las paredes del cárcamo, asegurando así que cumplan con los requisitos de resistencia necesaria a los 28 días, una vez se suministre el concreto de resistencia $F'c$ 4000 psi para la losa del fondo del cárcamo.

La cuadrilla N°2, se continúa con la evaluación de las áreas de las obras exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de $F'c$ 4000 psi a los 28 días con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°3 continúa con el corte y figuración de las dovelas de transferencia de carga de las losas del pavimento con una resistencia de $F'c$ 4000.

Nóta. Se realizan pruebas de cilindros a las muestras del concreto de $F'c$ 3000 psi utilizado para la fundación del cárcamo en acero peatonal.

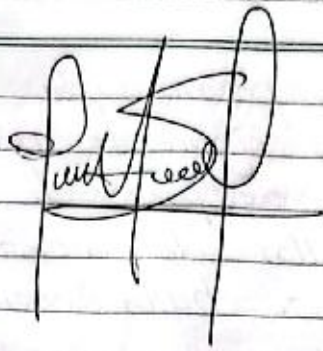

Fecha 21-06-2024.

Personal en obra por parte del contratista.

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SOR

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 obreros de oficios varios

5 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

1 Toneladora

1 Mezcladora

1 vibro de concreto

1 vibro compactador tipo ranura

Estado del tiempo

Manana soleado M. p. a soleado tarde soleado

ir

SIEMMA.

se identifican charlas de inicio de turno
se realizan pausas activas al interior del
proyecto dirigidas a los colaboradores para su
desconcho.

se realizan jornadas de orden y aseo y
se identifica adecuada disposición de resi-
duos y desechos de obra.

se identifica porte y uso adecuado de
dotación y EPP.

se identifica que las actividades se realizan
de forma segura.

Actividad: El día de hoy se reabrió
la visita del director de intervención
al proyecto de construcción centro de
acopio para realizar el comité de obra
N° 034. y efectuar un recorrido general
con el objetivo de revisar los procesos
constructivos en distintas zonas del proyecto.
El recorrido inicia en la bodega princi-
pal de almacenamiento donde se verifica-
ron las estructuras ya construidas y se re-
visaron los acabados de las mismas.
se confirma que los niveles de los pisos
y plomadas de la mampostería continuada
cumplen con las especificaciones demon-
strando que el proceso constructivo ha sido
adecuado y que la calidad estética es
excelente.

El director de obra indaga sobre el progreso
de las actividades de instalación eléctrica ya
que según el avance del proyecto, algunos

lider

cistas están listas para estas labores, se le informa que se han enviado múltiples comunicaciones al contratista para iniciar estas actividades, dado que es un aspecto crucial y los trámites con los proveedores de servicios requieren tiempo y son complejos. El responsable del proyecto explicará que esta semana se ha comenzado con la instalación de salidas para estas labores de luminarias de gas y que actualmente se está a la espera de material necesario para completar la instalación de las demás luminarias. El director de intervención indica que, al finalizar el recorrido se debe dejar un compromiso para que la próxima semana se inicien estas actividades, con el objetivo de mostrar avances en el aspecto del proyecto. Otro punto a tratar será la ubicación y la fabricación de los portones enrollables. El profesional del contratista informa que ya se han tomado las medidas necesarias para su fabricación en el taller, adicional se le reitera al contratista que debe de pasar de manera formal los items no previstos de las puertas y los portones enrollables para ser verificados y aprobados por la supervisión de obra. Al llegar a la zona del patio, donde se encuentra el tanque de almacenamiento y el acortado de máquina, se verifican los espesores de la tapa, luego se procedió a revisar el acortado de bombas, donde el director sugirió la instalación de una ventana para proporcionar ventilación

evitando que las bombas se saturen y colapsen por falta de aire.

posteriormente, al llegar al área de oficina, el director hizo una recomendación al contratista antes de realizar el acabado de los muros, asegurándose de eliminar las rebabas del pañete, esto mejorará la apariencia y evitara problemas con los juegos en las paredes, la eliminación puede realizarse con cualquier herramienta adecuada para garantizar un acabado uniforme y limpio.

se procede al área de segundo patio donde se hacen mención, que se debe realizar un protector en el vano entre la estructura metálica y la mampostería para dejar sellada el área interna y los obrajes exteriores, donde se enlaza el acceso al mezanino. se establece que la empresa Alfesag S.A.S. encargada de labrar e instalar la estructura metálica que soporta la cubierta del techo, debe realizar resaca de pintura general.

Adicionalmente se detecta oxidación en uno de los perfiles transversales de la estructura, indicando la falla de recubrimiento con anti corrosivo. por lo tanto se debe restaurar este elemento y luego aplicar un retoque de pintura.

También se observa que el contraviento instalado en el área de manipulación de carga está destensado y no cumple su función. se informa al contratista que debe re-

lider=

litor las modificaciones necesarias para que la estructura destaque y mejore su apariencia estética, adicional se le reitera al contratista que debe realizar con prontitud el recibo de la instalación de la banda protectora. Para culminar el recorrido, el director de la intervención estará dispuesto a los puntos de la construcción, pero entiendo que es necesario mejorar los puntos mencionados anteriormente. Indico que estas acciones deben realizarse de la mejor manera y siguiendo las especificaciones técnicas.

Se procede a la segunda parte del recorrido de obra donde se pasa a la revisión documental en las diferentes áreas: SISO, Ambiental y Social para verificar el cumplimiento de las normas aplicables. Se procede con la revisión del área de Seguridad y Salud en el Trabajo donde el ingeniero director de obra examina los documentos de todos los colaboradores, cada trabajador tiene una carpeta con su documentación completa, desde su ingreso al proyecto hasta la emisión de su paz y salvo al momento de su salida, adicional el profesional resalta la labor de la SISO donde se exponen cartelera con temas de normativas sobre el honor y actividades ambientales realizadas en obra.

En el área ambiental se procede a la revisión de documentos legales de botaderos de escombros certificados por el municipio.

legibilidad de contener que están suministrando el material de acarreo y piedra en la obra se verifica que el contratista cumple con esta documentación. se verifica el punto ecológico y se continúa con la acuerdo de las empresas encargadas de la recolección de residuos.

En el ámbito social la profesional expone que se ha estado interactuando con la comunidad rural y urbana sobre el avance de la construcción del proyecto. señala que se recibió al comité de veeduría ciudadana conformada por la asociación que solicitó a la gobernación del Cesar la construcción de esta sede en el municipio. La necesidad de esta sede es urgente para la distribución de la materia prima de los campesinos del municipio y la región. adicional se verifica que los pertenecientes a los diferentes comités sean colaboradores existentes en obra y halla sublevado al personal saliente. por último se concluye que los cambios a la real conda incendios debe realizarse conforme a la normativa vigente y presentarse formalmente para la revisión y aprobación por parte de la entidad contratante. así mismo, se debe realizar una limpieza exhaustiva de la placa de contrapiés y llevar a cabo las reparaciones necesarias en los puntos identificados durante el recorrido.

La actividad N°1. se continúa con la reevaluación de las áreas de las obras extendidas del proyecto, para ajustar la nueva

líder

ción y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de F'c 4000 PSI a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°2 se continúa con el corte y figuración de las placas de transferencia de carga de las losas del pavimento con una resistencia de F'c 4000.

La cuadrilla N°3 se realiza el desecho de la formaleta del corcama transversal en el acceso peatonal del proyecto, el cual recolectará las aguas de escorrentía de las obras exteriores posteriormente, se procederá con el fraguado y curado del concreto con el objetivo de alcanzar una resistencia de F'c 2500 PSI en el tiempo estipulado.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 22-06-2024

Personal en obra por parte contratista

Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil residente de obra
- 1 profesional HSE residente SST
- 1 profesional social

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

- 1 tanzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo

Manana Nublado Media Nublado Tarde lluvia

SISTEMA.

- se registra el ingreso de personal
- se verifica el porte y uso adecuado de dotación y epp
- se verifica la adecuada disposición de residuos y desechos de obra
- se realizan jornadas de orden y aseo
- se identifica adecuada señalización y demarcación de áreas de trabajo.

lider

Se recibe documento de afiliación a ARL por parte de un colaborador perteneciente a la empresa INSUMATEC que más adelante realizará labores en obra, sin embargo se identifica que la clasificación de riesgo es categoría uno, dado que las actividades de construcción y eléctricas son consideradas de alto riesgo, se insta a que el trabajador se afilie nuevamente en riesgo 5 para que tenga una adecuada cobertura en caso de un accidente, es necesario presentar afiliación actualizada con el riesgo correspondiente para evitar posibles inconvenientes.

Se realiza capacitación en SST.

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 después de instalar las clovelas que funcionan como cerco de transferencia de cargas del pavimento en el inicio de la rampa de acceso vehicular del proyecto, se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia $F'c$ 4000 PSI para la base del pavimento de la rampa del acceso vehicular del proyecto cumpliendo así con la resistencia necesaria al 18 días.

La cuadrilla N°2 se continúa con la ejecución de las áreas de las obras externas del proyecto para ajustar la nivelación

er

y compactación donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de $F'c$ 4.000 psi a los 28 días con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La actividad A1.3 se procede con la instalación y ubicación de las formateas metálicas en el área previamente nivelada y compactada. Este proceso es fundamental para garantizar que las losas de pavimento se coloquen correctamente y se realicen de manera adecuada. La correcta alineación de las formateas asegura que las losas de pavimento mantengan la uniformidad en su espesor y la rigidez estructural necesaria para soportar los cargas esperadas.

Anota. Se realizan pruebas de cilindros a las muestras del concreto de $F'c$ 4.000 psi utilizada en la fundición del cárcamo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 24.06.2024

Personal en obra por parte de contratista líder

mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SSR
- 1 profesional social.

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 Oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Mayoría - equipo en obra

- 1 Tronzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo man

Estado del tiempo

Mañana soleado x1. Día soleado tarde soleado

Si suma

- Se registra el ingreso de personal en obra
- se identifica inspección de equipos y herramientas
- se identifican charlas de inicio de turno
- se hacen recorridos en obra y se verifica que las actividades se realicen de manera adecuada y segura

er

se identifica parte y uso adecuada de botines y EPP.

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera:



La cuadrilla N°1. Después de instalar las dovelas que funcionan como arco de transferencia de cargas del pavimento en el arco de la rampa de acceso al proyecto, se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia $f'c$ 4.000 psi para la losa de la rampa de acceso vehicular del proyecto, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días.

La cuadrilla N°2. se continúa con la nivelación de las áreas de las obras exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno se mejora el arco con una losa de pavimento con una resistencia de $f'c$ 4.000 psi a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°3 ya con el arco de la losa mejorada se realiza el levante de la manpostera de la jardinería ubicada en la rampa de acceso vehicular del proyecto.

Además se realizan pruebas de cilindros a las muestras del concreto de $f'c$ 4.000 psi utilizado para la fundación del cárcamo.



Fecha 25-06-2024

Personal en obra por parte del contratista

- 1 Arquitecto residente
- 1 Ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional SGA

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 Oficiales

Personal en obra por parte de Interventoría

- 1 Ingeniero civil - residente de Interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra

- 1 Tanzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo ranura

Estado del tiempo

Amaneció lluvioso, truenos, alborado torpe, lluvia

SIGMA

- Se registra el ingreso de personal
- Se identifica por parte y uso adecuado de EPP
- Se realizan recorridos de inspección en obra

líder

Se realizan recomendaciones en materia de SST
- se rotan y fijan jornadas de orden y aseo.

ACTIVIDADES


Durante la jornada diaria, se coordinan las actividades para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se continúa con la instalación de dovelas que funcionan como acceso de transferencia de cargas del pavimento en el área de la rampa de acceso al proyecto.

La cuadrilla N°2 se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia F'c 4.000 PSI para la losa de las rampas en el acceso vehicular del proyecto, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días sobre el área compactada y nivelada anteriormente.

La cuadrilla N°3 se procede a la aplicación del ponete impermeabilizado a la mampoltena previamente levantada que servirá como jardinería en el acceso vehicular N°1. Se realizan pruebas de abridos a las muestras de concreto de F'c 4.000 PSI utilizado para la fundación del cárcamo.



Fecha 26-06-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SSR
- 1 profesional social

Mano de obra no calificada

- 1 ingeniero civil residente de obra no
- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios
- 5 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

- 1 Toneladora
- 1 Mecladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo ana

Estado del tiempo

Mañana nublado Mediodía nublado Tarde lluvia

SI DMA

Se registra el ingreso de personal en obra

- se identifica por lo y uso adecuado de datación y epp.
- se realizan inspecciones de herramientas y equipo en obra
- se identifica con charlas de inicio de turno
- se hacen recomendaciones en materia de SST.

Actividades

Durante la jornada diaria se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades del programa de la siguiente manera:

La cuadrilla N°1 se procede con el corte, trazo y instalación del acero de refuerzo del bordillo longitudinal que separará el acceso vehicular del peatonal en el proyecto. Posteriormente, se suministra el concreto con una resistencia $F'c = 3000$ psi, requiriendo a los 28 días para la construcción del bordillo longitudinal.

La cuadrilla N°2 se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de $F'c = 3000$ psi, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de las estructuras en el área de acceso vehicular del proyecto, asegurando una base plana y dewater que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los mutam lo manejados en estas áreas.

La cuadrilla N°3 se continúa con la instalación de las obvelas que funcionan como acero de transferencia de carga del pavimento en el área de la rampa de acceso al proyecto.

La cuadrilla N°4 se procede con la elaboración

líder

La acardilla N°1: se procede con el corte, figuración e instalación del acero de refuerzo del bordillo longitudinal que separará el acceso vehicular del peatonal en el proyecto. Posteriormente, se suministra el concreto con una resistencia $F'c$ 3000 psi, requiriendo a los 28 días para la construcción del bordillo longitudinal.



La acardilla N°2 se procede con la colocación y vertido del concreto de resistencia a los 28 días, (para la construcción) $F'c$ 4000 psi para la losa de las rampas de acceso vehicular del proyecto, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días, sobre el área compactada y nivelada anteriormente.

La acardilla N°3 se continúa con la excavación de las áreas de las obras exteriores del proyecto, para ajustar nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área de rampas y escalinatas en el acceso peatonal del proyecto con una resistencia de $F'c$ 3000 psi a los 28 días con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La acardilla N°4, se inicia con la instalación de la baldosa cuadrática 40×40 que va entre el área de círculo y la rampa de escalinatas del proyecto.

Nota: se realizan pruebas de cilindros a las muestras de concreto de $F'c$ 4000 psi utilizado para la fundación del carrero.



Fecha 28-07-2024.

Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada

- 1 Arquitecto asistente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SSR
- 1 profesional social-

Mano de obra no calificada.

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficio varios
- 5 oficiales de obra

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Herramienta en obra.

- 1 Tronadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo.

Mañana soleado M. día soleado tarde soleado

Sierra

Se registra el ingreso de personal

Se identifican charlas de inicio de turno

líder

al interior de la obra se realizan pausas activas para el descanso de los colaboradores. se identifica inspección de herramientas y equipos.

Actividades

durante la jornada diaria, se coordinaron las actividades para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La actividad N°1 se continúa con la ejecución de las áreas de obras exteriores del proyecto para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área de rampa de acceso vehicular del proyecto con una resistencia de F'c 4.000 para a los trabajos con el objetivo de utilizar en esta tarea.

La actividad N°2. se continúa con la instalación de dovelas que funcionan como apoyo en el área de la rampa de acceso del proyecto.

Además se realizan pruebas de cilindros de los muestros del concreto de F'c 4.000 para utilizar para la fundación del carcamo.



fecha 29-06-2024.

personal en obra por parte de contratista
plano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional social

plano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficio varios
- 4 oficiales

personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

- 1 Tronzadora
- 1 Mezcladora
- 1 vibro de concreto
- 1 vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo

Mañana Nubado Media Nubado Tarde Nubado

Sierra.

Se registra el ingreso de personal

se relaciona con jornada de orden y aseo.

líder

se realiza inspección de magnitud y altura
se verifica que las actividades se realicen
de manera adecuada y segura.

ACTIVIDADES.

Desde la formata plana, se coordinaron
las gradallas para dar continuidad a la
actividad programada, distribuyendo las
tareas de la siguiente manera.

La gradilla N°1 se procede con la colocación
y vertido de concreto de resistencia
de $F'c$ 4.000 PSI para la losa de las
tampas en el acceso vehicular del proyecto
cumpliendo así con la resistencia necesaria
a los 28 días, sobre el área compactada y
nivelada anteriormente.

La gradilla N°2 se continúa con la instalación
de las dovelas que funcionan como apoyo
de transferencia de cargas de pavimento
en el área de la rampa de acceso del
proyecto.

Además se realizan pruebas de cilindros
a los morteros de concreto de $F'c$ 4.000
PSI utilizado para la fundación del concreto.



der

[Handwritten signatures]

fecha 02-07-2024

personal en obra por parte de contratista-bra
Mora de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SIT

1 profesional social

Mora de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 obreros de oficios varios

4 OAJAL

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Máquina - Equipo en obra

1 tractora

1 mezcladora

1 vibrador de concreto

1 vibrador compactador tipo ram

Estado del tiempo

Mañana nubado mañana lluvia tarde lluvia

Sierra

se registra ingreso de personal

se realiza reposición o control de EPP

lider

dañados o vencidos.

se identifica parte y uso adecuado de dotación y epp.

se realicen pausas activas y charlas de inicio de turno.

Actividades.

Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N° 1 se continúa con la instalación de dovelas que funcionan como accesorio de transferencia de cargas del pavimento en el área de la rampa de acceso del proyecto. La cuadrilla N° 2 se procede con la elaboración y vertido del concreto de resistencia FIC 4.000 psi para la losa de las rampas en el acceso vehicular del proyecto, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los rodillos sobre el área compactada y nivelada anteriormente.

Nótese. En el proceso de mejora de acceso vehicular, y considerando los niveles tomados desde la calle existente, se ha determinado que, en las inmediaciones de la calle peatonal N° 5 del barrio la quinta, es necesario construir un pequeño colector. Este colector estará conectado al cárcamo del acceso peatonal y facilitará la evacuación de agua de escorrentía proveniente de la calle que aun falta por mejorar, con una losa de pavimento que esté fuera de los límites del

ider

proyecto del centro de acopio mineral y
mayorista del municipio de Ma. de O. de C.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha - 03-07-2024

Personal en obra por parte de contratista
mano de obra calificada

- 1 Arquitecto - residente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional ASE - residente SST
- 1 profesional mural

Mano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficio varios
- 4 oficiales

Personal en obra por parte de interventora

- 1 ingeniero civil - residente de intervención
- 1 profesional ASE

Maquinaria - formadores, mezcladores, obra de concreto - rana

lideres

Estado del tiempo.
 Monona soleado M. dia soleado tarde soleado

SISMA.

Se registra el ingreso de personal
 se identifica cada una disposición de de
 sector y residuos generada en obra
 se identifica inspección de herramientas y grado
 de trabajo
 se realizan jornadas de Orden y aseo.

Actividades

durante la jornada diaria, se coordinan la
 cuadrilla para dar continuidad a las
 actividades programadas, distribuyendo las
 tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se procede a la nivelación
 y compactación de los gradas que servirán
 como acceso peatonal al proyecto, seguidamente
 se marcan los paños y contrapuntos para
 luego ser encofrados y posteriormente sumen-
 trar el concreto con la resistencia requerida
 la cuadrilla N°2. se procede con el corte e
 instalación de la malla electrosoldada que
 servirá como acero de refuerzo de los rampas
 y escalinatas de acceso peatonal al proyecto
 que será fundida con concreto de una
 resistencia de $F'c$ 3000 PSI, requerida a los 28
 días, para la construcción de bordillo longi-
 tudinal.

La cuadrilla N°3 se procede con la elaboración
 y vertido del concreto de resistencia $F'c$
 3000 PSI para la losa de las escalinatas.

el acceso peatonal del proyecto, cumpliendo así con la resistencia necesaria a los 28 días sobre el área compactada y nivelada anteriormente.

Nota. se realizaron pruebas de cilindros a las muestras del concreto de $f'c$ 3000 psi utilizado para la fundación de las escalinatas acceso peatonal del proyecto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fecha 09.-07-2024

personal en obra por parte de contratistas:

Plano de obra calificada

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil residente de obra
- 1 profesional HSE-residente SST
- 1 profesional social

Plano de obra no calificada

- 1 maestro de obra
- 1 Ayudante
- 4 obreros de oficios varios

lider=

4. O A c r a l e

personal en obra por parte de interventoría
 1 ingeniero civil - residente de interventoría
 1 profesional HSE.

Maquinaria en obra - Equipos

1 Tanzaadora
 1 Mecladora
 1 Vibro de concreto.
 1 Vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo.

Mañana soleado mañana soleado tarde soleado

SISOMA.

- Se registra ingreso de personal
- Se verifica el porte y uso adecuado de dotación y EPP.
- Se verifica que el personal realice las actividades de forma adecuada y segura
- se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra.
- se realizan jornadas de Orden y aseo.

Actividades

Durante la jornada de mañana, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas de la siguiente manera.
 La cuadrilla N°1 se prosigue con el marcado y corte de las dilataciones del concreto realizado en las áreas de la obra interna y externa para cumplir con los parámetros establecidos

en la normatividad vigente la cuadrilla N°2 se realiza la instalación del cordón de espuma para fondo de junta 10. mm, especialmente indicado como respaldo o suplemento de juntas, limitando la profundidad y evitando que el sellador se adhiera sobre el fondo de la misma.

La cuadrilla N°3. se inicia con la aplicación del producto sello de poliuretano elastomérico de alto desempeño, la construcción elastomérica le confiere la capacidad de adaptarse a diferentes geometrías y compensar las variaciones dimensionales, asegurando una conexión hermética.

La cuadrilla N°4. se procede con la instalación del sistema de circulación del tanque de almacenamiento, mejorando su funcionamiento con el sistema de bombas regulado para la red contra incendios.



GRUCOIN
GRUPO CONSULTORES
E INGENIEROS S.A.

4 jul 2024 10:44

centro de acopio minorista y mayorista - inter



GRUCOING
GRUPO CONSULTORES
E INGENIEROS S.A.



4 jul 2024 9:23:20 a. m

centro de acopio minorista y mayorista - interventoría

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

líder

Fecha 06-07-2024.

Personal en obra por parte de contralista
1 MANO DE OBRA CALIFICADA

- 1 Arquitecto residente
- 1 ingeniero civil - residente de obra
- 1 profesional HSE - residente SST
- 1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

- 1 maestro de obra
- 3 obreros de oficios varios
- 3 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

- 1 ingeniero civil - residente de interventoría
- 1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

- 1 Topografía
- 1 mezclador
- 1 Taladro
- 1 pulidor
- 1 vibrador de concreto
- 1 vibrador compactador tipo mini

Estado del tiempo

Amaneció soleado mañana soleado tarde soleado

Sierra

Se realizaron rondas de inspección

líder

se registra el ingreso de personal
 se diligencia paz y salvo del personal
 retirado de la obra
 se identifica a parte y uso adecuado de
 dotación y epp.
 se realizan inspecciones en obra

Actividades

durante la jornada diaria, se coordinaron las
 cuadrillas para dar continuidad a las acti-
 vidades programadas, distribuyendo las tareas
 de la siguiente manera.

La cuadrilla N°2 se prosigue al marcado
 y el corte de las dilataciones del concreto
 realizado en las áreas de los obrajes internos
 y externos para cumplir con los parámetros
 establecidos en la normatividad vigente.

La cuadrilla N°2 se realiza la instalación del
 cordón de espuma para fondo de la junta
 a 10 mm, especialmente indicada como respor-
 do o suplemento de juntas, limitando la profun-
 didad y evitando que el sellador adhiera
 sobre el fondo de la misma.

La cuadrilla N°3 se inicia con la aplicación
 del producto selb poliuretano elastomero
 de alto desempeño, la construcción elastome-
 rica le confiere la capacidad de adap-
 tarse a diferentes geometrías y compen-
 sar las variaciones dimensionales, asegurando una
 unión hermética.



[Signature]

[Signature]

08-07-2019 - fecha

personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente de obra

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

3 obreros de oficio varios

3 oficiales

personal en obra por parte interventoría

1 ingeniero civil - residente interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

1 tractor de obra

1 mezcladora

1 taladro

1 pulidora

1 vibro de concreto

1 vibro compactador tipo ana

Estado del tiempo

mañana soleado media soleado tarde nublado

llova - lluvia en la noche

si roma

se registra ingreso de personal

- Se realizan charlas de inicio de turno dirigidas al personal de obra
- Se identifica adecuado uso de dotación y EPP.
- Se verifica que la documentación en obra este debidamente actualizada.
- Se identifica con carteleras informativas referentes a SST, Area ambiental y social

ACTIVIDADES

Durante la jornada diurna, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se prosigue al marcado de y el corte de las dilataciones del concreto realizado en las areas de la obra interna y externa para cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

La cuadrilla N°2 se realiza la instalación del cordón de espuma para fondo de junta o 10 mm especialmente indicado como respaldo o suplemento de juntas, limitando la profundidad y evitando que el sellador se adhiera sobre el fondo de la misma.

La cuadrilla N°3 se inicia con la aplicación del producto sellador de poliuretano elastomérico de alto desempeño, la construcción elastomérica le confiere la capacidad de adaptarse a diferentes geometrías y compensar las variaciones dimensionales, asegurando una conexión hermética.

La cuadrilla N°4 se inicia con la aplicación del estuco plástico sobre los muros exteriores e interiores de las oficinas a la altura de instalación de cielo raso.

líder=



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha 04-07-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil residente de obra

1 profesional HSE residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

3 obreros de oficios varios

3 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil residente de interventoría

1 profesional (social) HSE

Fluaguinana - Equipos en obra

1 transportadora

1 mezcladora

1. Talado
1. Vitró de concreto

Estado del tiempo.

Mañana soleado mañana soleado tarde soleado

Si sona

Se registra ingreso de personal

Se verifica porte y uso adecuado de botación y EPP

Se realiza jornada de orden y usco al interior y exterior de la obra

Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos generados en obra

ACTIVIDADES

durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se prosigue al marcado y el corte de las dilataciones del concreto realizado en las áreas de la obra interna y externa para cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

La cuadrilla N°2. se realiza la instalación del cordón de espuma para fondo de junta de 10 mm, especialmente indicado como respaldo o suplemento de junta, limitando la profundidad y evitando que el sellador se adhiera sobre el fondo de la misma.

La cuadrilla N°3 se continúa con la aplicación del producto sello de poliuretano elastomérico

líder=

de alto desempeño la construcción elástico
mismo le confiere la capacidad de adaptar
se a diferentes geometrías y compensar las
variaciones dimensionales, asegurando una conexión
hermética.

La aradilla N°4 se inicia con la aplica
ción del estuco plástico sobre los muros
exteriores e interiores de las oficinas a la
altura de instalación del acb 198.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
