

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO COMPRA VENTA:

CONTRATO No: 193 de 2019.

NOMBRE CONTRATISTA: CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PUERTA EN VIDRIO
TEMPLADO PARA EL ACCESO PEATONAL UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL EL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC"

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 de diciembre de 2019

3. PRÓROGAS: SI: NO: ☒

4. ADICIONES: SI: NO: ☒

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2019

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 2.356.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO : \$ 2.356.000

9. El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO ☒

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En este informe general se identifican las actividades ejecutadas dentro del objeto del contrato No 193 de 2019, según registro fotográfico adjunto, al igual se ejecutó lo siguiente:

No 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.356.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.356.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.356.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No aplica

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, los cuales se están verificando por dudas presentadas en la verificación de la información.


Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de Junio de 2020.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Inspector Jefe, JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA



CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinador Grupo Logístico


FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

Nº 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO

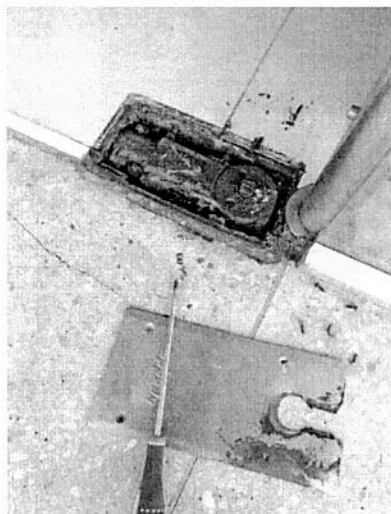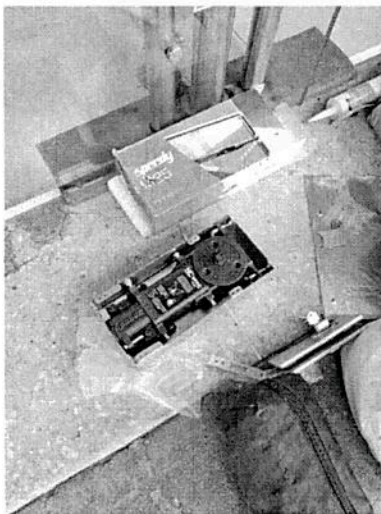

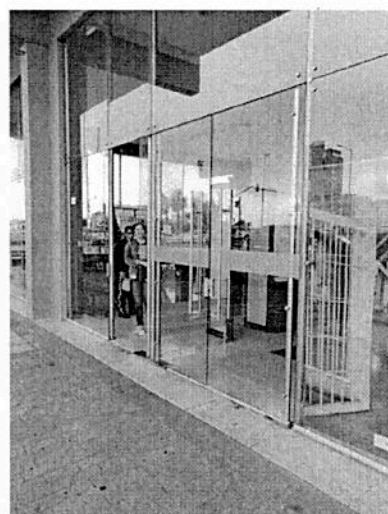



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHALOZANOC ALEXANDER LOZANO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-26-5:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1423019	Valor Total:	2.356.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Idad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900633259	Tercero:		CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

	LOA - CARTA ACEPTACION	Número:	193	Fecha:	17/12/2019 0:00:00
--	------------------------	---------	-----	--------	--------------------

OBJETO

CTO 193 ADQUISICION E INSTALACION PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE ACCESO PEATONAL UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO

RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

UNTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
63020	2.356.000,00	376.168,07	131220	2.356.000,00	2020-02-27	22037620	2.356.000,00	154.743,00	2.201.257,00	38831131770	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	2019E00254434	CTO 193 ADQUISICION E INSTALACION PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE ACCESO PEATONAL UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO

Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

