

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	47	Lugar y Fecha	27-enero-2025 – Obra Alojamiento de cadetes
Asunto	Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo SISOMA)		
Oficina Productora	Interventoría Mario de Jesús Gil Cardona		
Hora Inicio	9 : 30 am	Hora Finalización	10:30 am
Ausentes	0		
Participantes:	Contratista: Jhon Reyes Talero Interventoria Ana Wilma Jaimes Rico		

Orden del día:
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental de ingresos personal en obra (Personal propio y subcontratado semana 13 al 18 de enero 2025. • Verificación de acciones de gestión ambiental en obra según el Plan de Manejo Ambiental (PMA LAM CONSTRUCCIONES aprobado). • Verificación de acciones de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado. • Recorrido en obra mutuo contratista LAM e Interventoría en la supervisión de actividades en obra con cumplimiento SST y Ambiental. (Edificio 1 y 2). • Análisis de soportes complementarios paz y salvo personal retirado mes de abril, mayo y durante el avance constructivo 2024. Seguimiento LAM-138-347-2024 – IFA 175 • Seguimiento en relación al cumplimiento de medidas de seguridad para actividades de alto riesgo (Altura). • Seguimiento compromisos SISOMA semana N° 46

Desarrollo:
<p>Se realiza mesa de trabajo SISOMA para revisar/validar el cumplimiento de los requerimientos del Plan de seguridad y Salud en el trabajo y Plan de manejo Ambiental (PMA) en la obra de construcción de alojamiento de cadetes – EMAVI. Semana N°47 comprendida del lunes 20 al sábado 25 de enero 2025 en la gestión SST y Ambiental por el Contratista LAM Construcciones.</p>

Esta interventoría informa las siguientes actividades ejecutas en la semana N° 47:

- **COMPONENTE AMBIENTAL**

Se verifican actividades cumplidas y otras en proceso de cumplir en obra:

- Retiro de material RCD para disposición final en áreas autorizadas (En proceso)
- Mantenimiento cerramiento de obra (Polisombra) (En Proceso)
- Organización zona temporal de almacenamiento de cemento (Realizada)
- Organización zona temporal de almacenamiento de cerámica (Realizada)
- Conservación de señalización puntos de acopio de material de relleno (Realizada)
- Jornada de orden y aseo en Edificio 1 y 2 (Realizada)
- Se continúa seguimiento en relación a lavado, limpieza y señalización en la zona de ingreso de tubería eléctrica autorizada en la excavación externa. (Realizada)
- Verificación de documentación de operadores de vehículos
- Preparación de mezcla de concreto en tinajas y desplazadas en carretilla mitigando la preparación en superficies no autorizadas. (Realizada)
- Seguimiento en la supervisión entre Contratista e Interventoría en el proceso constructivo en Edificio N°1 y N° 2 (Realizada)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

- Se continúa con actividad de orden y limpieza en relación a la recomendación realizada de acopio temporal de residuos que puedan ser desplazados al área de operaciones aéreas de la FAC-EMAVI. (Realizada)
 - Socialización de riesgos, peligros y medidas de control en el desplazamiento de vehículos.
 - Mantenimiento en la conservación de la protección de individuo arbóreo ubicado en diagonal de Bomberos EMAVI y lateral a la zona de acopio del cemento dentro del perímetro de obra. (Realizada)
 - Inspección preoperacional de equipos utilizados en la semana reportada. (Realizada)
 - Protección de material agregado con plástico y Polisombra para preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. (En proceso)
- Verificación de documentación de vehículos como: soat, Tecno mecánica y de conductor como seguridad social o aporte correspondiente a ARL

- **COMPONENTE SST**

Se verifican actividades cumplidas y otras en proceso de cumplir en obra:

- Instalación de señales preventivas SST en puntos identificados en necesidad de realizar la actividad. (En proceso)
- Recorrido en obra en conjunto con personal SST, Profesional SISOMA Contratista LAM y Profesional de Interventoría. (Realizada)
- Evaluación y verificación cumplimiento medidas de seguridad durante armado y desarmado de andamios utilizados en obra. (Realizada)
- Supervisión en actividades constructivas sobre andamios ubicados en obra. (Realizada)
- Verificación de seguridad social de subcontratistas. (Realizada)
- Se continúa con el seguimiento del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) en relación a actividades a diferente nivel o trabajo seguro Altura (TSA). Como: aseguramiento de personas, uso completo y adecuado de equipos de protección contra caídas. Se realiza por parte del contratista entregas por reposición a personal que se identifique la necesidad de hacerlo.
- Supervisión continua Contratista e Interventoría en las diferentes actividades en obra ante el control de riesgos y peligros. (Realizada)
- Socialización de riesgos, peligros y medidas preventivas a personal externo subcontratado como: visitantes, asesores, proveedores etc.
- Verificación en el uso adecuado de los elementos de protección personal directo e indirecto en las diferentes actividades ejecutadas en el proceso constructivo. (Realizada)
- Supervisión en el ingreso de vehículos con personal dentro del perímetro de ejecución
- Verificación de documentos de seguridad de operario de vehículos y documentación legal de vehículos relacionados en el proyecto. (volqueta, minicargador, camiones y demás vehículos)
- Verificación documentación de ingreso de personal propio y subcontratado relacionado con el proyecto. (Realizada)
- Contratista cuenta con stock para personal en obra como: dotación, guantes de carnaza, nitrilo, botas de seguridad, gafas de lente oscuro y blanco, líneas de vida, cinta de señalización, etc.)
- Verificación de insumos de emergencia disponibles en obra. (Realizada)
- Verificación manejo sitios de almacenamiento temporal de productos químicos. Por parte de interventoría se dejan las recomendaciones de mejora del caso. (Realizada)
- Verificación de cumplimiento requisitos aplicables SST para actividades críticas acorde a legislación. (Realizada)
-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Actividades a Realizar semana N° 45		
Actividad	Responsable	Fecha verificación
Entrega de paz y salvos de personal retirado a la fecha según el comunicado IFA-097-IFA-095., IFA 132, IFA 175. <u>Se informa al contratista que hace falta personal que ya ha sido retirado del proyecto</u> <u>En fecha enero 21 se reciben 25 documentos de paz y salvo.</u>	LAM-SISOMA	Comunicado Interventoria IFA-132 – IFA 175 Seguimiento LAM-138-347-2024 LAM-138-325-2024 LAM-138-237-2024 LAM-138-237-2025 <u>En seguimiento</u>
Entrega de certificados, competencia y/o autorización de soldadura, personal de montaje de estructura. (Solicitadas desde el 29 julio en el ingreso de este personal). (Falta completar soportes personales que integra cuadrilla de estructura)	LAM-SISOMA	Comunicado IFA-132 Interventoria Seguimiento LAM-138-325-2024 04-01-2025
Gestión en autorización de trabajo suplementario o de horas extras por parte del Mintrabajo. Teniendo en cuenta que se reporta por correo electrónico la extensión de trabajos en jornadas adicionales.	LAM-SISOMA	Comunicado IFA-132 Interventoria Seguimiento LAM-138-325-2024 07-12-2024 Pendiente 04/01/2025 Pendiente 27/01/2025
Gestión en competencia de Trabajo Seguro en Altura y/o Reentrenamiento del siguiente personal: Mampostería, Instalador de Estructura, ayudantes de obra, Estucadores.	LAM-SISOMA	En seguimiento Bitácora de obra
Completar soportes de seguridad social de personal del contratista como: mamposteros, pañeteadores, estucadores, enchapadores, (Salud, Pensión y Caja de pensión en caso de aplicar), <u>Se informa que hace falta soporte de personal vinculado al proyecto.</u>	LAM-SISOMA	En seguimiento Comunicado IFA-167-175 Seguridad Social personal de obra
Habilitar zonas de circulación en obra: sendero peatonal, vías circulación vehicular y rutas de evacuación de emergencia. (Se encuentra pendiente mantenimiento sendero peatonal).	LAM-SISOMA	En seguimiento comunicado Interventoria IFA-161-Bitacora de obra Cumplido
Señalización, mantenimiento zona temporal de acopio con gestión de RCD a sitio autorizado	LAM-SISOMA	27-diciembre-2024 IFA-176 Cumplido
Gestión en competencia andamiero certificado Entrega certificado que lo avala como tal.	LAM-SISOMA	En seguimiento Bitácora de obra Pendiente al 27/01/2025
Gestión en competencia de Trabajo Seguro en Altura y/o Reentrenamiento del siguiente personal nuevo ingresado presente semana	LAM-SISOMA	En seguimiento Bitácora de obra Pendiente al 27/01/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

CONSECUTIVO DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES INTERVENTORIA

- **Observación 26 marzo 2024:** Observación la cual se le reitera de forma continua al contratista y que corresponde a: es necesario que el contratista LAM Construcciones presente con anterioridad los documentos de personal que se tiene previsto el ingreso a la obra de construcción. Soportes como planillas de seguridad social o soportes de afiliación, documentos de vehículos como: Soat, Tecnomecanica, licencia de conducción, tarjeta de propiedad y todos aquellos soportes que sean aplicables a personal propio, subcontratado o de proveedores de servicio o insumos.
- **Recomendación 20 abril 2024:** Contratista LAM debe tener presente que a la fecha se cuenta con **26 personas autorizadas para realizar trabajo seguro en altura basado en la verificación de vigencia de los certificados de cursos de altura.** Si durante el proceso constructivo se requiere personal para realizar actividades en altura, se deberá presentar el certificado de formación del personal, para tenerse en cuenta en el siguiente cuadro de relación de trabajadores autorizados para esta **actividad de alto riesgo.**

Ítem	Nombre trabajador	Cargo	Cedula	Ente de formación	Vigencia	Novedad
1	Luis Aguirre Sánchez	Aux Ingenieria	1087422363	FENIX ALTURA	16/02/2025	
2	Felipe Martínez Orejuela	Arquitecto	1072656954	FENIX ALTURA	02/04/2025	
3	Jhon Edgar Reyes Talero	SISOMA	94503184	FENIX ALTURA	15/02/2025	
4	David de los Ríos Díaz	Ayudante	72283808	FENIX ALTURA	26/02/2025	
5	Sergio Altamiranda Ariza	Ayudante	72055786	FENIX ALTURA	10/04/2025	
6	Ermy Ortiz Rivera	Ayudante	1193201081	FENIX ALTURA	29-02-2025	
7	Gabriel Andres de los Ríos	Ayudante	1007463606	FENIX ALTURA	8/04/2025	
8	Jaminton Angulo	Ayudante	14471511	FENIX ALTURA	1/04/2025	
9	Luis Hernández Carrillo	Ayudante	1070952606	FENIX ALTURA	29-02-2025	
10	Oscar Sinisterra Mina	Ayudante	16498518	FENIX ALTURA	5/04/2025	
11	Yiner Castillo Rivas	Ayudante	1111770369	FENIX ALTURA	5/04/2025	
12	Jairo Villamizar Salcedo	Director	84034926	FENIX ALTURA	23-02-2025	
13	Cesar Alejandro Rúales Pantoja	Arquitecto Asesor	1082657794	GLOBAL SIO SAS	19-05-2025	
14	Eulises Junior Valencia Ortiz	Ayudante	1192918079	GLOBAL SIO SAS	19-05-2025	
15	Jairo Andres Martínez Orozco	Ayudante	91355161	GLOBAL SIO SAS	19-05-2025	
16	Luis Arboleda Alegría	Ayudante	12915795	GLOBAL SIO SAS	19-05-2025	
17	Nelson Hurtado Góngora	Ayudante	16945139	GLOBAL SIO SAS	03-06-2025	
18	Eduin Giovanni Achicanoy	Ayudante	12750459	GLOBAL SIO SAS	03-06-2025	
19	Yonatan Mosquera Garces	Ayudante	1151197141	GLOBAL SIO SAS	03-06-2025	
20	Víctor Alfonso Acosta González	Ayudante	1003192542	GLOBAL SIO SAS	20-07-2025	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

21	Diego Alexander Rodríguez Bejarano	Mampostero	1058324787	GLOBAL SIO SAS	12-07-2025	
22	Jhon Edilson Bejarano Daza	Mampostero	1058324010	GLOBAL SIO SAS	17-07-2025	
23	Rodolfo Montiel	Mampostero	1151458102	GLOBAL SIO SAS	12-07-2025	
24	Xavier Alberto Villera Pantoja	Mampostero	1010164490	GLOBAL SIO SAS	12-07-2025	
25	Juan Gabriel Fernández Sánchez	Estructura	16936507	GLOBAL SIO SAS	25-07-2025	
26	José Jevinson Perea	Estructura	1030421581	GLOBAL SIO SAS	27-07-2025	
27	Jhon William Segura Trejos	Subcontratista (Tinta)	1113648515	TECNACEL	03-01-2025	
PERSONAL RETIRADO						
1	Juan Carlos Zea Mateus	Inge Residente	79578936	FENIX ALTURA	16/02/2025	Retirado de la Empresa ABRIL
2	Mairo Romero Medina	Ayudante	1082997978	FENIX ALTURA	10/04/2025	Retirado de la Empresa ABRIL

- Observación 27 abril 2024:** Se realiza inspección de equipos contra caídas en conjunto con contratista, se determinó fuera de servicio 4 Arnés y 6 eslingas, quedando habilitado el total de 5 arnés. Registro fotográfico de muestra.






FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-AYUGE-FR-021

FORMATO ACTA GENERAL

Versión N°:

3

Vigencia:

25-08-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

- **Observación 27 abril 2024:** Se registra en Bitácora viernes 26 de abril 2024
- **Observación 25 mayo 2024:** Se registra en Bitácora recomendación de seguridad para actividades en altura. A su vez se remite oficio IFA-080 con asunto: “incumplimiento de normas de seguridad para actividades de alto riesgo. (Altura).
- **Observación 25 mayo 2024:** Se protege individuo arbóreo que se encuentra ubicado al frente de Bomberos EMAVI y aledaño a la zona temporal de acopio de cemento en perímetro interno en obra.
- **Observación 25 mayo 2024:** Se informa desde área SST que el control climatológico por parte del área de Interventoría se realiza a cargo del Profesional Ingeniero Residente, por lo tanto, cualquier novedad en tiempo, esta información será brindada por este profesional de Interventoría.
- **Observación 07 junio 2024:** Se remite comunicado IFA-082 con asunto: Gestión medidas de restricción en actividades a diferente nivel (Altura). TSA.
- **Observación 15 junio 2024:** Se remite comunicados el viernes 14 junio 2024. IFA-090 con asunto de medidas para Trabajo Seguro en Alturas (TSA). A su vez se remite comunicado IFA-091 con asunto de actualización de énfasis medico de personal relacionado a las actividades en altura.
- **Observación 22 junio 2024:** Se remite comunicado el viernes 21 junio 2024 IFA-095 en solicitud de documentos complementarios de personal retirado. A su vez comunicado IFA-096 en recomendaciones de acopio adecuado de residuos que puedan ser desplazados por corriente de aire a la zona de operaciones aérea de la EMAVI-FAC.
- **Observación 06 julio 2024:** Se remite IFA 102 con asunto: Inspección anual de equipos de protección contra caídas – solicitud Entidad.
- **Observación 12 julio 2024:** Se anexa registro fotográfico en el proceso de seguimiento de medidas preventivas implementadas en actividades a diferente nivel (Altura).
- **Observación 27 julio 2024:** Se remite comunicado IFA-114 con asunto: seguimiento, gestión y reiteración en medidas de seguridad para Trabajos a diferente nivel (Altura-TSA). A su vez se anexa cuadro de seguimiento por parte de esta Interventoría en el cumplimiento de la Resolución 4272-2021.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023



Observación 12 julio 2024: Todo personal que ingrese previamente a obra, deberá portar casco de seguridad y demás elementos de protección personal. Teniéndose en cuenta la aplicabilidad de estos EPP durante horario de actividades constructivas.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Observación 17 julio 2024: Se remite IFA-128 en relación a gestión, reiteración medidas de seguridad para trabajos en altura.

Observación 23 agosto 2024: Se solicita los documentos en los cuales se certifique por ente avalado teniendo en cuenta la competencia requerida (Soldadura). Documento presentado no cumple con los requerimientos normativos. A la fecha se revisa documentación desde la fecha solicitada de ingreso del personal de estructura el 29 julio 2024.

Se solicita soporte en autorización de trabajo suplementario o de horas extras por parte del Mintrabajo. Teniendo en cuenta que se reporta por correo electrónico la extensión de trabajos en jornadas adicionales.

Observación 31 agosto 2024: Se remite comunicado IFA-132 con el asunto: Solicitud soportes compromisos pendientes consolidados actas mesas de Trabajo SISOMA.

Observación 21 septiembre: Se realiza segunda inspección de equipos de protección contra caídas disponibles en obra.


Contratista realiza las siguientes acciones:

- Inspección de equipos contra caídas
- Actualización hoja de vida de equipos de protección contra caídas
- Clasificación de equipos autorizados y no autorizados para uso en obra
- Embalaje adecuado de equipos no autorizados (Arnes y eslingas)

Observación 28 septiembre 2024: Se remite comunicado IFA-152 con el asunto en relación a gestión, reiteración medidas de seguridad para trabajos en altura.



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

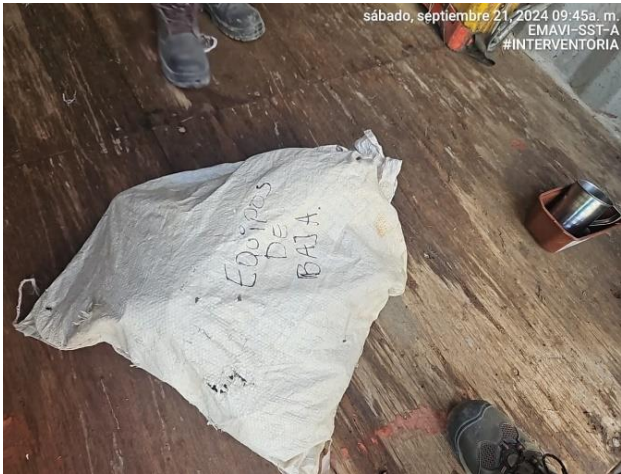

Observación 26 octubre: Se remite comunicado IFA-160 con requerimientos SISOMA de obra

Observación 29 noviembre: Se remite comunicados IFA-167 y IFA-173 en relación a soporte de parafiscales de personal propio y subcontratado.

Observación 14 diciembre: Se remite comunicados IFA175 con asunto Paz y salvos y soportes de parafiscales pendientes de personal en obra, IFA-176 con asunto Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023


Observación enero 8 de 2025: Se realiza inspección de equipos contra caídas en conjunto con contratista, los cuales se ubican en el almacén donde se evidencia que los arneses identificados con número 1 y 2 no son autorizados para su uso dado que no cumplen la recertificación del caso. (Obsoletos). Igualmente se realiza verificación de equipos de seguridad anticaídas directamente en puestos de trabajo validando que efectivamente estén actualizados y en buen estado para su uso.

Observación enero 8 de 2025: Se hace necesario según se ha notificado reiterativamente en la presente semana que se realicen las inspecciones a los equipos de seguridad anticaída, que exista en obra, la presencia del vigía de trabajo en alturas, y todos aquellos requisitos mencionados en legislación nacional vigente para los fines, **lo cual incluye uso de andamios el cual debe estar a cargo de un andamiero certificado.**

Observación enero 9 de 2025: Se verifico en frentes de obra la tenencia y uso de EPP, se recomienda realizar entregas por reposición en especial gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de seguridad acorde a tareas constructivas que van adelantando. Se incluyo personal administración de obra por interventoría y LAM construcciones.



Observación enero 10 de 2025: Se realiza verificación visual enfrentes de obra del funcionamiento de los equipos menores, se solicita al contratista presentar documentación diaria de las inspecciones preuso las cuales no están dispuestas para su validación. El contratista se compromete a actualizar esta documentación y presentarla a interventoría en fecha subsiguiente a esta observación.

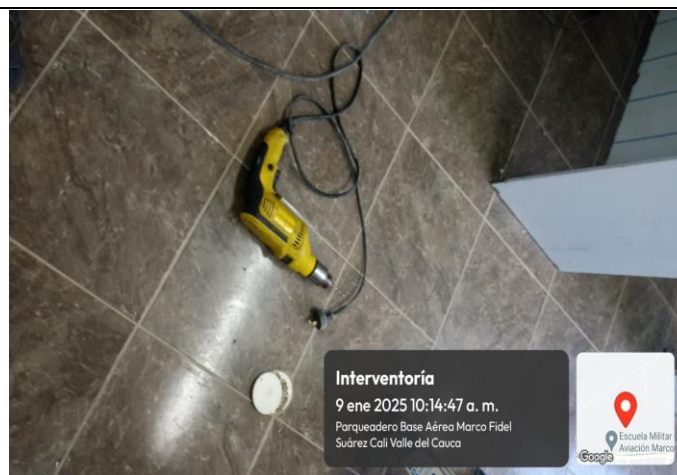

Aspectos no conformes diarios identificados en obra se están notificando por bitácora y se realiza seguimiento a través del mismo documento.

Observación enero 11 de 2025: Se realiza recorrido de verificación cerramiento aspectos no conformes notificados al contratista a través de correo electrónico el día 9 de enero de 2025 según se ilustra a continuación:

<div><div>MARIO DE JESÚS GIL CARDONA</div><div>Ingeniero Civil MATR. PROF. 2525 ANT</div><div>REPORTE ASPECTOS NO CONFORMES SST MA</div><div>Fecha recorridos toma evidencias: enero 9 y 11 de 2025</div><table><tr><th>No.</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Tuberías eléctricas provisionales.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Espacios con alturas de 3.15 metros, aproximadamente, en señalizar advertir o asegurar el riesgo.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.</td></tr></table><div>Carrera 51 No. 51-17 Oficina 700 - 808 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 08 73 E-mail: mariogilcardona@gmail.com Medellín - Antioquia</div></div>	No.	REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE	OBSERVACION	1		Tuberías eléctricas provisionales.	2		Espacios con alturas de 3.15 metros, aproximadamente, en señalizar advertir o asegurar el riesgo.	3		Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.	4		RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.	<div><div>MARIO DE JESÚS GIL CARDONA</div><div>Ingeniero Civil MATR. PROF. 2525 ANT</div><table><tr><th>No.</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Equipos eléctricos provisionales sin lista de chequeo preoperacional.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.</td></tr></table><div>Carrera 51 No. 51-17 Oficina 700 - 808 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 08 73 E-mail: mariogilcardona@gmail.com Medellín - Antioquia</div></div>	No.	REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE	OBSERVACION	4		Equipos eléctricos provisionales sin lista de chequeo preoperacional.	5		Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.	6		RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.	<div><div>MARIO DE JESÚS GIL CARDONA</div><div>Ingeniero Civil MATR. PROF. 2525 ANT</div><div>Adicionalmente se solicita</div><div>1 Realizar mantenimiento preventivo al cual se evidencia se halla muy deteriorado. 2 Durante los recorridos conjuntos personal SST de las partes tener en físico a mano para su respectiva verificación en sitio de los permisos de trabajo del día, lista de chequeo preoperacional de equipos menores, lo que sujeta las actividades que sea ejecutando. 3 Dar cumplimiento a instalación señalización preventiva informativa obligatoria SST MA, dado que no se evidencia en sitio de obra recorridos la instalación de la misma. 4 Organizar y acoplar debidamente los productos químicos que se evidencian tener en el almacén principal de obra. En esa línea no se evidencia existir tampoco existe copia de las fichas de seguridad de productos químicos la persona a cargo del almacén desconoce que hacer en caso de un accidente durante la manipulación de los mismos, no conoce las fichas de seguridad. 5 Se solicita realizar jornadas de orden y aseo debido a que en la mayoría de sitios de trabajo se evidencian elementos de trabajo varios materiales dispersos. 6 Se solicita dar adecuado cumplimiento al tema de requisitos trabajo en altura dado que no se evidencia en sitio cumplimiento según se evidencian y comunico durante los dos recorridos SST MA realizados de forma conjunta los días enero 9 y 11 de 2025. Se espera se sustenten las mejoras de lo reportado a través de este medio y que las responsabilidades y compromisos SST MA continúen adquiridos.</div><div>Ana W. James Residente de Interventoría SISOMA Empresa: Interventoría Mario de Jesús Gil Cardona Cali / Valle del Cauca</div><div>Carrera 51 No. 51-17 Oficina 700 - 808 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 08 73 E-mail: mariogilcardona@gmail.com Medellín - Antioquia</div></div>
No.	REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE	OBSERVACION																											
1		Tuberías eléctricas provisionales.																											
2		Espacios con alturas de 3.15 metros, aproximadamente, en señalizar advertir o asegurar el riesgo.																											
3		Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.																											
4		RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.																											
No.	REGISTRO FOTOGRAFICO SOPORTE	OBSERVACION																											
4		Equipos eléctricos provisionales sin lista de chequeo preoperacional.																											
5		Personal realizando trabajos en altura no se realiza lista de chequeo preoperacional al equipo de seguridad para alturas, utilizados por el personal asignado. No se evidencia en sitio de ejecución labores en altura y vigia de seguridad para trabajo en alturas.																											
6		RCD de obra con inadecuado manejo. Materiales sin cubrir lo que genera dispersión de material particulado con los vientos que se evidencia actualmente. Se incumple PMA aprobado.																											

Observación enero 18 de 2025: en esta fecha se evidencia jornada de seguridad orden y aseo, acciones a través de las cuales se reconoce mejoras de los aspectos reportados a través de bitácora y el comunicado ilustrado en pagina que antecede. Se deja constancia a través de registro fotográfico de lo propio:



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023



Observación enero 18 de 2025: sin embargo, las mejoras reportadas en la presente fecha se insisten al contratista en dar cumplimiento a los aspectos contemplados en la Resolución 4272 de 2021 – TSA. Y demás aspectos legislativos aplicables al proyecto en temas SST. Dar cumplimiento constante al PMA aprobado para ejecutar en obra.

Observación enero 20 de 2025: se requiere al Contratista LAM construcciones dar cumplimiento en la entrega de documentos de ingreso personal nuevo (certificados de seguridad social completos y diagnósticos de aptitud ocupacional), dado que solo entregaron copias de las ARL. En Seguimiento por Bitácora.

Observación enero 20 de 2025: se requiere al Contratista LAM construcciones dar cumplimiento al PMA y SGISST de obra debido a que se evidencia que no hay constancia en lo pertinente.

Observación enero 25 de 2025: a fecha de esta notificación se evidencia que el contratista LAM cumple parcialmente los aspectos SSTMA, cumple parcialmente las entregas documentales de seguridad social de los trabajadores que van ingresando, no se cumple con lo solicitado en forma reiterada de hacer entrega de los mencionado con mínimo un día de anticipación lo que ha conllevado a hacer retirar personal de obra por responsabilidad frente a la atención médica y otras que pueda necesitar un colaborador afectado en su integridad física.



Despuntillar Madera reutilizable – delimitar / asegurar (En proceso)

Segregar y disponer residuos solidos (En proceso)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023



lunes, 20 de enero de 2025 15:35:13
Cali


Contratista cumple aseguramiento espacios con riesgo caída al vacío según lo solicitado




**Mario Gil Cardona -
Interventoría**
20 ene 2025 9:55:39 a. m.
Parqueadero Base Aérea Marco Fidel
Suárez Cali Valle del Cauca




Se solicita cambio y no uso de escaleras subestándar en cumplimiento Resolución 4272/21

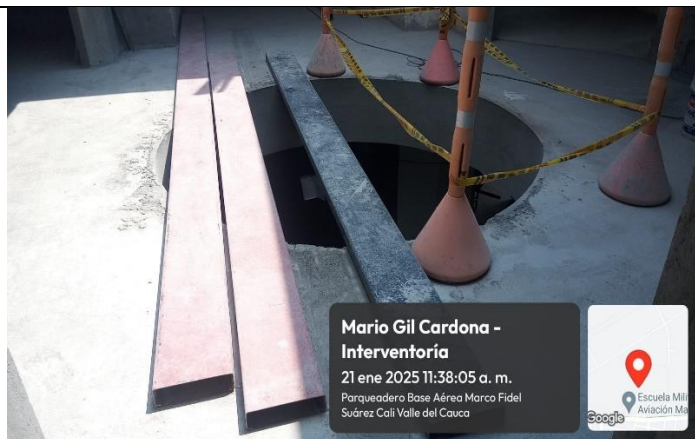


**Mario Gil Cardona -
Interventoría**
21 ene 2025 11:38:05 a. m.
Parqueadero Base Aérea Marco Fidel
Suárez Cali Valle del Cauca



Se solicita al contratista LAM aseguramiento espacios con riesgo caída al vacío según lo solicitado (Plafonar) en seguimiento por bitácora.

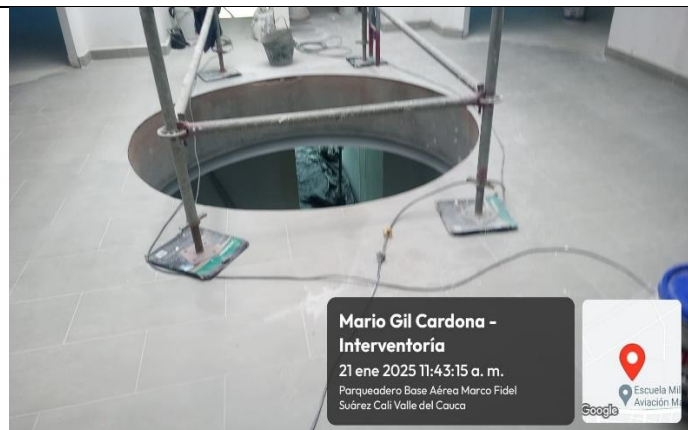

**Mario Gil Cardona -
Interventoría**
21 ene 2025 11:43:15 a. m.
Parqueadero Base Aérea Marco Fidel
Suárez Cali Valle del Cauca



Se solicita al contratista Lam aseguramiento espacios con riesgo caída al vacío según lo solicitado (Plafonar) en seguimiento por bitácora.




Contratista LAM Construcciones realiza actividad de inducción SST / MA preingreso a puntos de obra.



Contratista LAM Construcciones realiza actividad de evaluaciones inducciones SST / MA preingreso a puntos de obra.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo SISOMA)		
Fecha - Hora	Sábado febrero 1 de 2025	Lugar	Obra CTO 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FIRMAS			
<div style="margin-bottom: 20px;">  <p>Firma electrónica Inspector de SISOMA Ana Wilma Jaimes Rico Interventoría Mario de Jesús Gil Cardona</p> </div> <div>  <p>Firma electrónica Residente de Contratista LAM Construcciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental Jhon Edgar Reyes Talero Contratista LAM Construcciones</p> </div>			
<p>Enviado por correo electrónico viernes 17 de enero de 2025</p> <p>LAM Construcciones</p> <ul style="list-style-type: none"> lamconstrucciones.am@gmail.com jairo.villamizar@yahoo.es alojamiento de cadetes@gmail.com <p>EMAVI</p> <ul style="list-style-type: none"> Angie.blanquicett@fac.mil.co Oscar.apraez@fac.mil.co Erika.mora@fac.mil.co Yeimy.rios@fac.mil.co 			
