

No se registra personal ni actividades en este tramo.

V. *[Signature]*

06-08-022 clima: Despejado

No se registra personal ni actividades en este tramo

V. *[Signature]*

Voto Comitee en este obra

06-08-022 clima: Despejado

No se registra personal ni actividades en el tramo

V. *[Signature]*

Voto Comitee en este obra

07-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes

No se registra personal ni actividades en el tramo

V. *[Signature]*

Voto Comitee en este obra

10-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes

No se registra personal, ni actividades en este tramo

Voto Comitee en este obra

1-11-08-022 Clima: Despejado

No se registra personal, ni actividades en este tramo

Urb. Calles de
Residente de Obra

12-08-022 Clima: Despejado

No se registra personal, ni actividades en este tramo

Urb. Calles de
Residente de Obra

13-08-022 Clima: Despejado

No se registra personal, ni actividades en este tramo

Urb. Calles de
Residente de Obra

15407

CIV 5000309

FISCALA

Libro de Actas

1/2 Oficio 80 Hojas



7 707294 370699

Un Producto MARFIL

servicioalcliente@productosmarfil.com.co

www.productosmarfil.com.co

144

28-01/22 Se da inicio con el lavado de las redes sanitaria
y pluvial con bacter
CRA 2.º entre Diagonal 62 Sur - CIV: 5000309
Clima seco y soleado
Personal: Inspector ; 3 operarios bacter.

Vo Andrei Prosta

31-01/22 Se adelanto la inspeccion con camara CCTV de
las redes sanitarias
Clima seco y soleado
Personal: Inspector ; 3 operarios de camara.

Vo Andrei Prosta

24-03/22 Se inicio con la instalacion del PMT.
Tiempo seco y parcialmente soleado.
Personal: 3 Boal. Ingensero Ambiental.

Vo Andrei Prosta

25-03/22 Se continua con la instalacion de PMT
 Tiempo seco parcialmente soleado.
 Personal: 2 Boal; Ingeniero Ambiental.

Vo Andri Acosta

01-04/22

30-03/22 Tiempo seco parcialmente soleado.
 Personal: 1 Ayudante
 Actividad: Se adelanta la instalacion de la madera
 rolliza para el cerramiento.

Vo Andri Acosta

31-03/22 Tiempo seco parcialmente soleado.
 Personal: Inspector; Ayudante, Boal; Topografo; Cadenero
 Actividades: Se adelanta la nivelacion del Terreno natural.
 Levantamiento, replanteo ejes de via diseño. referenciación

epes/ 146 Andri Acosta

02-04

01-04/22 Tiempo seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector; Topografo; Cadenero; Celador;
Operario de retro y conductor volquete.

Actividades: Se da inicio a la excavacion mecanica
caja via. Transporte y disposicion final de escombros.
Control de excavacion.

Los trabajos se ejecutan lentamente por el riesgo
que toca realizar por el retro de materiales

Via Habilitada

02-04/22 Tiempo seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, Topografo, Cadenero, Boal. Ayudante,
Operario de retro y conductor volquete.

Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte y
disposicion final de escombros, control de excavacion, ajuste y
arreglo de cerramiento.

Va. [illegible] [illegible]
 [illegible]

04-04/22 Tiempo seco y soleado.

06-04/22

Personal: Inspector, Topografo, Cadenero, Boal, Ayudante
 Operario de retro, 3 conductores de volqueta.

Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte y
 disposicion final de escombros. Perfilado manual caja via.
 Arreglo acometida domiciliaria agua potable. Control de
 excavacion mecanica. En visita en conjunto con interventores se
 evidencio que el terreno en la zona de la calzada a - 0.67 m.
 se evidencia aun material de escombros. por tal razon se autoriza
 estabilizar esta zona (calzada) con piedra rajon 25-30 cm. y
 10 cm de sello.

Va. los Andes [illegible]

05-04/22 Clima frio y lluvioso en las horas de la mañana. Seco y
 parcialmente soleado en las horas de la tarde.

Personal: Inspector, Ayudante, Boal y Operador. retro

Actividades: Excavacion mecanica caja via, Transporte y dispo-
 sicion final de escombros. Excavacion manual agujeros.

Se realiza retro de agua en la zona sur del
seymento por las lluvias que se presenta en el sector.

Vn Andrés Arce

06-04/22 Clima: La noche anterior y en las horas de la madrugada
llovió copiosamente generando empobrecimientos de agua en
el frente de obra. Frío y húmedo en las horas de la
mañana. Tarde seca parcialmente soleada.

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario retro y
conductor de volqueta.

Actividades: Excavación mecánica caja vía. Transporte
y disposición final de escombros. Perfilado manual caja
vía.

Es de notar que los trabajos se realizan lentamente
por el retraso de los materiales y por las constantes
lluvias en razón a tipo de agua que se presenta
de su parte: culpa del seymento

Vn Andrés Arce

07-04/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario mini-exav.
Conductor volqueta.

Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte
y disposicion final de escombros. Perfilado manual caja
via.

Va. Rodri. Prost
Btes-Dr

08-04/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario mini-exav.
Conductor volqueta.

Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte
y disposicion final de escombros. Perfilado manual caja via.

Va. Rodri. Prost
Btes-Dr

09-04/22 Clima seco parcialmente soleado
Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario mini excav.
Conductor volquete.
Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte y disposicion final de escombros.

Va Adrián

10-04/22 Clima: parcialmente soleado y seco
Personal: Inspector, ayudante, boal, operario excavadora,
conductor de volquete.
Actividades: Excavacion mecanica via, transporte y disposicion
final de escombros. Cuadrilla de topografia realiza revision
de calzada (planimetria y altimetria). Se le solicita al contratista
Consorcio Vial CVP tomar las medidas necesarias para no afectar
la cimentacion de las viviendas en los sectores donde se esta
(77) realizando la excavacion ya que dicha cimentacion esta quedando
expuesta. Por lo tanto medidas como entiblar o acodalar estos
sectores pueden ser tenidas en cuenta o entre otras que puedan
contemplarse para asegurar estos tramos frente a posibles asentamientos u otros efectos a los que pueda haber lugar.

18-04/

12-04/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Topografo, Boal, Ayudante,
Operario retro,

Actividades: Excavacion mecanica caja via para
instalacion de piedra rajon

Vn. Rdr. Asst
Co. Car

13-04/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Boal, Operario retro, Conductor 19.
de volqueta.

Actividades: Excavacion mecanica caja via. Transporte
y disposicion final de escombros. Suministro y acopio
de piedra rajon. extendido de piedra con la retro.

Vn. Rdr. Asst
for - order

18-04/22 Clima seco y parcialmente soleado en las horas de la mañana. Lluvias moderadas después de las 11:45 a.m. Aguacero fuertes después de las 4:50 p.m. Generando saturación del terreno y enpozamientos de agua.

Personal: Inspector, Boal, Operario retro.

Actividades: Acomodación de piedra con retro y suministro y acopio de material mejoramiento para sello.

Por Ocho
Dadi Aust

19-04/22 Clima seco en las horas de la mañana. Lluvias fuertes después de las 11:30 a.m. y durante toda la tarde moderada. Personal: Inspector, Inspectora SST, Ayudante, Boal y operario retro.

Actividades: Retiro manual de enpozamientos de agua y arreglo de cerramiento.

Por Ocho
Dadi Aust

20-04/072 Clima:

Personal Contratista: 01 residente, 01 inspector
01 residente SST, 01 residente social, 01
residente ambiental

Personal Interventora: 01 residente SST-MA, 01
residente tecnico, 01 inspector SST-MA, 01 inspector

Actividades: No registra

OBSERVACIONES:

- Debido a la excavacion realizada y en ocasion a la lluvia se presenta sacudida del terreno, lo cual presenta afectacion a las placas en concreto existentes via adyacente. Se solicita de manera inmediata realizar la implementacion de las medidas de mitigacion de la afectacion ocasionada.
- El material de piedra rajon suministrado hasta la fecha presenta sobretamaños, se observa que el suministro es insuficiente.
- Se evidencian riesgo de afectacion estructural al piecho notorio a notozo costado izquierdo por exposicion de la cimentacion.
- No se evidencia personal operativo y se

240

419

evidencia retroexcavadora inactiva desde el
18-04-22 por falta de repuestos

- se evidencia alto riesgo de accidentes por
colapso del paso peatonal costado derecho
K0+033 al K0+045 predio 61-04.4

V. And. Acst.

21-04/22 Clima seco en la mañana, parcialmente soleado en la
tarde.

Personal: Inspector, Boal, Operario retro.

Actividades: Extendida de piedra rajon con la retro, actividad
bastante dispendiosa debido a los empozamientos de agua
ocasionado por las constantes lluvias.

V. And. Acst.

22-04/22 Clima: En la noche anterior y a primeras horas del día se presentaron lluvias permanentes generando saturación del terreno y empobrecimientos de agua. Clima seco después de las 9:00 a.m. y parcialmente soleado en la tarde.

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario retro.

Actividades: Se realizó el entibado del andén frente al N. 67-04 y se llenó con base reciclada para dar acceso a las personas que viven en estos predios. Arreglo de cerramiento y extendida manual y con máquina de la piedra rajón.

Vb. And. Post

Interventoría

23-04/22 Clima: húmedo

Personal: Inspector Técnico, Boal, Operario retro, Ayudante y conductor volqueta.

Actividades: Acomodación manual de rajón, retiro y disposición final de escombros.

Horario 7:00 a.m. - 12:00 a.m.

Vb. And. Post

Interventoría

24-04/22 Clima: Lluvias en las horas de la mañana hasta el medio día. Tarde seca parcialmente soleada.

Durante el fin de semana Sábado y Domingo se presentaron lluvias fuertes permanentes generando saturación del terreno y empozamientos de agua.

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, Operario retro.

Actividades: Entruddo de andén para protección del sendero peatonal. Acomodación manual de piedra rapn. Arreglo de cerramiento.

Vs. Rudi. Agust

25-04/22 Clima: Lluvias permanentes desde el día de ayer

Personal: Inspector, Ayudante, Boal, operario retro.

Actividades: Acomodación manual de piedra rapn y arreglo de cerramiento.

Las actividades son las por las constantes
lluvias. en la zona

✓ Sr. Andres Acosta
Res. Obr.


Interventor


26-04/22 Clima: Seco en las horas de la mañana. Lluvias fuertes y permanentes despues de las 2:30 p.m.

28-04/2

Personal: Inspector, Boal, Operario retro, Ayudante.

Actividades: Suministro y extendido de piedra rajon.

Partido manual y acomodacion de piedra rajon.


Sr. Obr.


Interventor

27-04/22 Clima: Seco y parcialmente soleado en las horas de la mañana.

29-04/

Lluvias fuertes y permanentes en la tarde despues de la 12:50 p.m.

Personal: Inspector, Ayudante, Topografo, Cadenero, Boal, Operario de retro y mini.

Actividades: Suministro de piedra rajon, material de mejoramiento.

Extendido de piedra rajon y material de mejoramiento. sello.

Va Andre Acosta

Interventor

28-04/22 Clima: Lluvias leves en la mañana y en la tarde.

Personal: Inspector, Boal, Operario de mini, Operario retro y Celador.

Actividades: Acomodacion de piedra ripon, limpieza y refiro de material excavado para acopio. Arreglo de cerramiento

Las actividades se hacen lentas por las lluvias en la zona y por el invierno que hace sentir

Va Andre Acosta

Interventor

29-04/22 Clima: Lluvias en las horas de la mañana. Tarde seca.

Personal: Inspector, Boal, Operario de mini, Operario de retro y Celador.

Actividades: Suministro y extendida material de mejoramiento.

Va Andre Acosta

Interventor

30-04/22 Clima: Lluvias leves en las horas de mañana.
 Personal: Inspector, Boal, Operario mini y Celador
 Actividades: Suministro y acopio material de mejoramiento.

V/a Adrián Acosta

Interventoría

04-0

02-05/22 Clima: Lluvias leves hasta las 8:00 a.m. mañana seca y tarde soleada.
 Personal: Inspector, Boal, Operario retro, Operario mini, conductor de volqueta y Celador.
 Actividades: Transporte y disposición final de RCD. extendida de piedra y material de mejoramiento, compactación.

V/a Adrián Acosta

Interventoría as

03-05-22 Clima: Seco
 Personal: 1 Inspector Técnico, 1 Boal, 1 operador de Retro, 1 conductor de volqueta, 1 ayudante, 1 celador.
 1 topógrafo.

Actividades: Se ejecuta replanteo general de muros y ardenes.

Vb Andrés Acuña

Interventor

24-05-22 Tiempo: Seco

Personal: 1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST,

1 Boal, 1 operador de retro, 1 colador, 1 conductor.

Actividades: Extendido y compactación de material de mejoramiento en la calzada.

Vb Andrés Acuña

Interventor

05-05-22 Tiempo: Lluvias intermitentes de 8:00 am a 12:00.

Personal: 1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST,

1 Boal, 1 operador de minicargador, 1 colador,

1 Topógrafo.

Actividades:

Se continúa con extendido y compactación de

materiales de mejoramiento en la calzada.

En visita a este frente de obra, realizada el día de hoy 5 de Mayo se determinaron los siguientes puntos por parte del Arquitecto IVAN AYALA, Supervisor de la Caja de Vivienda Popular:

1- Se dará continuidad a la rasante proyectada desde el CIV contiguo en la parte baja de la obra, tanto en andenes como en la calzada.


2- Instalar bordillo A-10 en ambos costados de la vía.

3- Eliminar la cañuela diseñada por el eje de la calzada y cubrir la pendiente transversal hacia el costado derecho de la calzada, para formar la escorrentía de aguas lluvias por ese costado.

4- Se consultará con la EAAB la construcción de un sumidero lateral en la esquina inferior derecha del tramo, para recoger las aguas lluvias, así como su entrega a un pozo de inspección existente allí mismo.

5- Construir cordón por el costado izquierdo de la calzada a continuación del cordón existente, con las dimensiones establecidas en los planos. En el cerco

adyacente al andén proyectado se autoriza construir un espacio con zona dura.

Va Andrs Acosta.  Interentoria.

06-05-22 Tiempo: Se presentan lluvias de 08:00 a 9:30 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.

Personal: 1 Inspector técnico, 1 Boal, 1 operador de minicargador, 1 ayudante, 1 celador.

Actividades: Continúan con extendido y compactación de material de mejoramiento.

Va Andrs Acosta.  Interentoria.

07-05-22 Tiempo: Lluvias constantes todas la mañana.

Personal: 1 Inspector técnico, 1 Boal, 1 operador minicargador

Actividades: Por lluvia no se ejecutan actividades.

Va Andrs Acosta.  Interventoria.

09-05/22 Clima: Lluvia parcialmente soleado.

Personal: Inspector tecnico, Topografo, Ayudante, Boal, Operario mini, Celador.

Actividades: Se adelantaron obras para mitigar el impacto de inundacion presentada en el predio N. 2-36 ocasionado por el fuerte aguacero del día anterior. Instalacion conexion de tuberia pvc. aguas lluvia y pozo esquina frente al N. 61-04 en diferentes diámetros.

V. Rodri Acosta

Interventor

11-05/22

10-05/22 Se solicita construcción pozo en la parte baja de CIV. inspeccionada la tubería pluvial. y hacer construcción de sumidero conectado al pozo con tubería de 12". Se solicita hacer limpieza de los pozos que se encuentran colmatados. hacer nivelación del pozo que está en andén en la parte baja del CIV, conservando el campo existente. Teniendo en cuenta que se va a construir el pozo aguas abajo del pozo perdido se recomienda condenarlo instalando tubería para darle continuidad al tramo. por lo cual no hay necesidad de nivelarlo.

H-60 4 m de altura
H-1 m de altura
2.6 m de altura

Clima: Seco en las horas de la mañana. Aguacero fuerte después de la 1:00 p.m. y durante toda la tarde. Suspensión de actividades:

Personal: Inspector técnico, Ayudante, Boal, Operario mini.

Actividades: Excavación manual para buscar y detectar pozo de Aguas Lluvias. Transporte y disposición final de RCD.

Las actividades se hacen lentas por las constantes lluvias en el sector.

Vc Andri Acosta

Andri Acosta

Interventoría

11/05/22 Clima: Seco parcialmente soleado

Personal: Topógrafo, Oficial, Ayudante, Operario mini, Celador y Boal.

Actividades: Excavación manual andén costado izquierdo. excavación manual pozo Aguas Lluvias.

Vc Andri Acosta

Interventoría

12-05/22 Clima: Seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, tecnico, Topografo, Ayudantes, Operario mini Celador.

Actividades: Excavacion manual anden costado izquierdo y demolicion manual. Acopio de material excavado.

Vº Andri Acosta

Interventor

13-05/22 Clima: Lluvias leves en las horas de la mañana. Tarde seca parcialmente soleada.

Personal: Inspector tecnico, Oficial, 2 Ayudantes, Operario mini, Boal y Celador.

Actividades: Excavacion manual anden costado izquierdo. demolicion manual pasas en concreto esalera esquina casa N. 2-25. Acopio de material excavado y Transporte y disposicion final de RCD.

Vº Andri Acosta

Interventor

4/25/22 Clima: Seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector técnico, Oficial, 2 Ayudantes, Operario mini, Boal, Conductor de volqueta

Actividades: Excavación manual para carga andén costado izquierdo. Suministro y acopio de mejoramiento. Transporte y disposición final de RCD.

Va Andri Acosta

Interventor

6/25/22 Clima: Lluvias de 7:00 a 9:00 horas. Después de las 9:00 con tiempo seco, parcialmente soleado.

Personal: Inspector técnico, Oficial, 2 ayudantes, 1 operador de minicargador, 1 Boal, 1 inspector SST.

Actividades: Se instala concreto de limpieza para Muro T-2 (Zalpa). Se inicia excavación manual para Muro T.1 en la parte superior del trazo.

Va Andri Acosta

Interventor

17-08-22 Clima: Tiempo seco, particularmente soleado

Personal: 1 Inspector Técnico, 1 Topógrafo, 1 Motorista,
1 Oficial 2 ayudantes, 1 Operador de Minicargador,
1 Bomal, 1 conductor de volquete.

Actividades: Replanteo general, Excavación manual
para Muro T-1 y retiro de Material RCD.

En visita técnica a obra se determinó por parte
del Arquitecto LUIS AYALA, Supervisores de la CUP
de vivienda popular:

1- En relación con la recomendación del Ing.

Ituro Larrota de la EABO, y teniendo en cuenta

que en el pozo que se encuentran a mitad
de 1 trazo presenta una diferencia de cota

considerable entre las tuberías de llegada y de salida,

Se determina por parte del Supervisor de la CUP


revelarlo hasta la rasante proyectada, utilizando
el cargue existente, siempre y cuando se encuentre
en buen estado.

2- El contratista manifiesta que no se cambian
la tubería pluvial de 10" a 12" como se soli-
citó en planos, debido a que a partir de
pozo de entrega la tubería existente con

ligna en 10'. De lo anterior, el contratista informará a la EAAB mediante carta en la cual se incluyen también las instrucciones y recomendaciones Registrados en Bitácora el día 10-05/22 por el Ing. Hugo Larsoy, Supervisor de la EAAB. Esto por solicitud de Supervisor de la CUP.

3- Con respecto a los muros que se requiere construir en el tramo vial, El Supervisor de la CUP manifiesta que entregará un formato para "Modificación del Diseño", donde se deberán registrar los cambios que se requieran para ajustar la construcción de los muros a las condiciones encontradas en la vía, lo cual queda autorizado por el Arquitecto IVAN AYALA de la CUP.

4. El contratista deberá hacer un levantamiento topográfico para determinar el empalme del tramo en construcción con el CIV 5000312 (DG. 61.501).

 Andrés Acosta




Interventor

16-18-05/22 CLIMA: Se presentan lluvias de variada intensidad de 3:30 pm a 5:00 pm y lluvias de 3:00 pm a 5:00 pm.

Personal: 1 Inspector técnico, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Bolal, 1 operador de minicargador, 1 conductor.

Actividades: Se continúa con excavación manual para zonas de Muro T-2, predio 2-25 y T3, predio 2-18. Se ejecuta sitio de Material R.C.D.

Va Andri Acosta

Interventor 4

17-05/22 CLIMA: Día seco, parcialmente nublado

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 oficial, 1 ayudante, 1 Bolal, 1 operador de minicargador.

ACTIVIDADES: Traslado de material proveniente de la excavación. Corte y figurado de aseo para Muros.

Va Andri Acosta

Interventor 4

20-05-22 CLIMA: Tiempo seco. Día nublado.

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 1 operador de minicargador, 1 celador.

ACTIVIDADES: Armado de paletas para zarpas.

El laboratorio de la Interventoría ejecuta toma de densidades en la capa de material de mejoramiento en la calzada.

1- K01024 Ese % compactación 90.21%.

2- K01032 Derecha % compactación 90.63%.

Se solicita al Contratista se compactar y volver a tomar densidades asegurando que cumpla con los valores de compactación requeridos, antes de continuar con el proceso de construcción de la estructura.

Va André Acosta

Interventoría

21-05/22 CLIMA: Tiempo seco, parcialmente nublado.

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 1 operador de minicargador,

18-

el celador.

ACTIVIDADES: Se realiza la fundición del bolón para zapatas de muro T-1, frente a la placa 2-18. Se hace asco General de la obra.

Llega Sardiní A-10 para la obra.

En visita al frente La Fiscala realizada hoy sábado 21 de Mayo por el Señor EVER de Codensa, se informó que la maniobra para reinstalar el poste de energía ubicado dentro del CIV en intervención, ya que se encuentra desaplomado. El Representante de CODENSA programó esta maniobra para el día Lunes 23 de Mayo.

19-

Va Andrei Acosta

Intervención

23-05/22 Clima seco y parcialmente soleado. después de las 4:00 p.m. Lluvia leve.

Personal: Inspector técnico, Topógrafo, Oficial, 3 Ayudantes, Boal, Operario mini, Celador, Conductor.

Actividades: Excavación manual para muro T2. Corte y figurado de hierro. Amarre de hierro para

1728

zarpa y muro T1 frente al N. 2-18.; zarpa T2
frente al N. 2-25. Transporte y disposición final
de R.C.D.

Vb Rad-Aguilera

Interventoría

24-05/22 Clima: Seco en la mañana, lluvias después de las
4:30 p.m.

Personal: Inspector, técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes
Boal, Celador y operador mini.

Actividades: Corte, asegurado, armado de hierro zarpa
y muro T2 frente al N. 2-25. Transporte y disposición
final de R.C.D.

Vb en. Acuña

Interventoría

25-05/22 Clima: Lluvias leves de 10:00 - 11:00 a.m.

Personal: Inspector técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes
Boal, Operario de mini y Celador.

Actividades: Amarre de hierro muro T2 frente al N. 2-25.
Fundida en concreto 3.000 p.s.f. zarpas de muros T1 y T2
Se tomaron tres muestras de concreto para ensayos de

Laboratorio. Relleno con mejoramiento en la esquina de la casa N. 61-04 en vía, compactación.

V.B. [Signature]

[Signature]
Interventoría

26-05/22 Clima: Lluvias leves de 9:00-10:00 a.m.

Personal: Inspector Técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes, Boal, Operario de mini y Celador.

Actividades: Instalación tubería pvc sanitaria 3" a caja de inspección aguas negras N. 2-25. Construcción mampostería caja de inspección aguas negras. Nivelación mampostería en ladrillo pozo de inspección. Excavación manual costado izquierdo muro T5 esquina casa N. 2-18

Codensa hizo la instalación del poste metálico galvanizado, reemplazando el poste en concreto que se había deslizado en el andén de la esquina de la Cra 2 con diagonal 61 Sur.

Actividad que se realizó el día anterior en las horas de la noche, retirando acometidas de los predios aledaños y volviendo a conectar estas acometidas.

V.B. [Signature]

[Signature]
Interventoría

27-05/22 Clima: seco parcialmente soleado

Personal: Inspector técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes.

Boal, Operario de mini y Celador.

Actividades: Excavación manual zarpa muro T5 N. 2-18.

Acepio de material excavado. Cerezo y compactación de mejoramiento

vía. Arreglo de sendero peatonal en anden esquina casa 2-18.

Amarre de hierro zarpa muro T5 frente al N. 2-18.

Va Dado: Asst

Interventor

28-05/22 Clima seco y nublado

Personal: Inspector técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes.

Boal, Operario mini, y Celador.

Actividades: Corte y figurado de hierro muro T1 frente al

N. 61-04. Cerezo y compactación mejoramiento vía. Excavación

para nivelación mampostería pozo.

Va Dado: Asst

Interventor

31-03/22 TIEMPO: Tiempo seco, parcialmente soleado

PERSONAL: 1 Topógrafo, 1 oficial, 2 ayudantes

1 Boal, 1 inspector técnico, 1 operador de mml, 1 celador

ACTIVIDADES: Excautación manual retirar cargue
y ejecutar realce de pozo.

Nivelación y realce de mampostería en pozo
de inspección.

Interventor

Por [Firma]

01-06/22 TIEMPO: Parcialmente soleado

PERSONAL: 1 inspector técnico, 1 topógrafo,

1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 1 operador de
minicargador, 1 celador.

ACTIVIDADES: Extensión de base granular por
en calzada. Instalación de Geotextil tejido
en calzada. Realce de mampostería en
pozo de inspección.

Interventor

Por [Firma]

02/06/22 CLIMA: Tiempo seco, parcialmente nublado.

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 topógrafo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boral, 1 operador de mini

ACTIVIDADES: Demolición y construcción caja de aguas negras, caja 2x2.5.

Compactación capa de subbase pea, en laría.

Por [Firma]

[Firma] Interventoría.

03-06/22 VISITA para determinar que tipología de muro es la más conveniente para la contención del lote donde se ubica una huerta sector oriental del CIV5000309.

la recomendación es que se implante un muro tipo 1 del diseño estructural.

Máxima altura del vástago 1.90m, zarpa de 1.5m, dentellón y respetar los espesores, refuerzos que aparecen en los planos.

la máxima longitud sin juntas se puede manejar hasta 9.0 metros.

Por [Firma]

[Firma]
ASESOR ESTRUCTURAS
ING. RAUL E. LOZANO

Por lo anterior, el consorcio sujeto a
intervención le entregó la información de
este con el fin programar las actividades
relacionadas a los mismos ("excavación, relleno
y armado de tierra")

Responde Obra,

Interventor

Andrés Tumb

CLIMA: Se presentaron lluvias intermitentes durante
todo el día.

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 topógrafo, 1
oficial, 2 ayudantes, 1 Boral.

ACTIVIDADES: Construcción caja de aguas negras
en casa 2-25.

Llegó fumalata metálica, cemento, tubería
PVC.

Res Obra,
Andrés Tumb

Interventor

04/06/22 CLIMA: Tiempo seco, densamente nublado.
PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 oficial,

2 Ayudantes, 1 Boal, 1 Topógrafo.

Actividades: Construyendo cajas de inspección de aguas negras.

Demolición de andén frente a casa 2-18.

Lluvias fuertes a partir de las 11:15 hrs.

Ferrides L. Ojeda

Interventor C.

Antes de la lluvia.

06-06/22 Clima: Seco en las horas de la mañana. Aguacero fuerte con granizo después de las 3:20 p.m.

Personal: Inspector técnico, Oficial, 2 Ayudantes, Operario mini y conductor volquete.

Actividades: Demolición manual andén en concreto. Exaración manual andén N. 61-04. Transporte y disposición final de RCO.

V. nos. Rodríguez

Interventor C.

07-06/22 Clima: Mañana seca parcialmente soleada. Lluvias moderadas de 12:30 - 1:10 p.m.

Personal: Inspector técnico, Topógrafo, Oficial, 2 Ayudantes Boal, Operario mini y Celador.

Actividades: Excavacion manual anden N. 61-04.
 Demolicion caja de inspeccion aguas negras N. 61-04.
 Retiro de material excavado al sitio de acopio-Trasego.

[Signature]
 No. 10 Proyectista

[Signature]
 Interventor/a

08-06/22 Clima: Loco, parcialmente soleado con lluvias esporadicas.
 Personal: Inspector tecnico, 2 Ayudantes y Boal.
 Actividades: Excavacion manual anden N. 61-04 Sur
 Descargar formaleta metalica muros.

[Signature]
 Proyectista

[Signature]
 Interventor/a

09-06/22 Clima: Loco y parcialmente soleado en las horas de la mañana. Aguacero fuerte de 12:30 - 1:00 p.m.
 Personal: Inspector tecnico, Oficial, 2 Ayudantes, Boal.
 Actividades: Excavacion manual muro T1 casa N. 61-04 Sur.
 Instalacion formaleta metalica muro T2 casa N. 2-25

[Signature]
 Proyectista

[Signature]
 Interventor/a

10-06/22 Clima: Seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector Técnico, Oficial, 2 Ayudantes, Boal.
Topógrafo, Operario mini y Celador.

Actividades: Excavación manual para zarpo muro T1
Instalación y ajuste formaleta metálica muro T2.

[Signature]

[Signature] Entenentor 5a

11-06/22 Clima: Seco parcialmente soleado

Personal: Inspector Técnico, Oficial, 2 Ayudantes, Boal,
Operario mini, Topógrafo y Celador.

Actividades: Excavación manual dentellón muro T1 frente
al N. 64-04. Nivelación formaleta muro T2. Acopio
de material excavado.

[Signature]

[Signature] Entenentor 5a

13-06/22 CLIMA: Se presentan lluvias esporádicas
todo el día.

Personal: 1 Inspector Técnico, 1 Oficial, 2
ayudantes.

Actividades: Excavación manual para cambiar tubo
sanitario de 6" en casa 61-04.

[Signature]

[Signature] Entenentor 5a

14-06/22 CLIMA: Tiempo seco, parcialmente nublado
 PERSONAL: 1 inspector técnico, 1 topógrafo, 1
 oficial, 1 ayudante, 1 operador de minicargador, 1
 Boral, 1 celador.

ACTIVIDADES: Excavación para zanja y drenaje T-1,
 casa 61-04. Acopio de material excavado, fundición
 de suelo, zanja T-1.

Residente Don
 Antel, Quisla

Interventoría

15/06/22 CLIMA: Tiempo seco, parcialmente soleado.

PERSONAL: 1 inspector técnico, 1 topógrafo, 1 oficial,
 1 ayudante, 1 Boral, 1 operador de minicargador, 1 celador.

ACTIVIDADES: Corte y Aguado de hierro. Armare y
 armado de zanja y muro T-1, casa 61-04 Boral.
 Armare de hierro para Muro T-5, casa 7-13.

Residente Don

Antel, Quisla

Interventoría

16/06/22 CLIMA: Tiempo seco, parcialmente nublado

PERSONAL: 1 Inspector técnico, 1 topógrafo,
 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boral, 1 celador.

ACTIVIDADES: fundida de concreto de 3000
psi, en alzado de muro T-2, casa 2-75 Sur,
fundida de concreto de 3000 psi en zapata de
muro T-5, casa 2-18 Sur.

Instalación tubería sanitaria de 4" con 2-18 Sur
a pozo de inspección.

Residente Obra

Andrés P. S. L.



Interventor.

17-06/22 Tiempo: Parcialmente nublado. Se presentan lluvias
de 10:15 am a 11:30 am.

PERSONAL: 1 inspector técnico, 1 topógrafo, 1 oficial,
2 ayudantes, 1 boyal, 1 operadora de mini, 1 colador

ACTIVIDADES: Desmoldado de formacón en muro T-2
casa 2-75 Sur.

Transporte y disposición final de material RCP.

Construcción de muro T-5 en mampostería estructural.

Casa 2-18

Residente Obra

Andrés P. S. L.



Interventoría

18/06/22 Tiempo: Sin parcialmente nublado.

PERSONAL 1 Inspector técnico, 1 topógrafo, 1 oficial,
2 ayudantes, 1 boal, 1 operador de mini, 1 celador.

ACTIVIDADES: Excavación manual andén 179.00,
frente a casa 2-10; Reteno del mismo trazo con
material seleccionado.

Retiro de material R.D.C.

Res. Int. J. J.
Andrés J. J.

Interventor J. J.

21/06/22 Tiempo: Parcialmente nublado

Personal 01 inspector técnico, 01 Topógrafo, 01
oficial, 02 ayudantes, 01 boal, 01 operador mini,
01 celador,

ACTIVIDADES Inicio excavación manual para pozo
de inspección nuevo. Fijado de acero de
refuerzo para zarpa de muro de contención T-1.
Replanteo de muro contención T-1 frente a
huerta

Res. Int. J. J.
Andrés J. J.

06-08-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial
01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: se continuan remates generales y
pariete de sacos.

Visto
Carli Guevara
Residente de obra

08-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 02 oficial
07 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: se funde concreto de 3000 psi en
escaleras frente a predio 2-25 y escaleras de
acceso a huerta.

Visto
Carli Guevara
Residente de obra

09-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: Se realiza lavado de la via con hidrolavadora y se desancofran escaleras fundidas.

Vbo
Carril (P) ten
Residente de obra

10-08-022 clima: Lloviznas intermitentes

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 boal
01 oficial, 01 ayudante

Personal Interventor: 01 inspector tecnico

Actividades: Se inician cortes y sello de juntas en avance parcial.

Vbo
Carril (P) ten
Residente de obra

11-08-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial
01 ayudante, 01 boal, 01 operador

Personal Interventor: 01 inspector tecnico

Actividades: se ejecuta parte interna de pozo de inspeccion en w+0+008 y sello de juntas

Vbo
Carril (P) ten
Residente de obra

12-08-022 Clima: Despejado

personal Contratista: 01 inspector topografico, 02 ayudantes, 01 local

personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: Se realiza correccion a empozamiento prelo 61-04 sobre Dg 61 mediante la ejecucion de piso en concreto y se continuan remates generales de paneles y zocalos.

Visto
Contratista
Residente de obra

13-08-022 Clima: Despejado

personal Contratista: 01 inspector topografico 01 ayudante


personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: se realiza cinta de ajuste en concreto en orden derecho y remates de concretos en muros

Visto
Contratista
Residente de obra

15929

Bilacora
San Isidro
CIV: 5003488



136

14-01/22 Se da inicio con la inspeccion y lavado de las redes sanitarias y pluvial con Bactor CIV: 5003488

Andrés Acosta


Andrés Acosta

18-01/22 Se adelanto la inspeccion con camara CCTV de las redes sanitaria y pluvial.

Andrés Acosta



Andrés Acosta

29-01/22 Se da inicio a la instalacion del pmt en el frente de obra.

Personal: 2 boal.

Tiempo: seco y soleado

Andrés Acosta


Andrés Acosta

31-01/22 Se continua con la instalacion del pmt; replanteo y nivelacion del area instalacion de cerramiento

Personal: 2 boal; Comision de topografia. 1 Of. 2 Ay.

Tiempo: seco y soleado

(2)

01-02/22 Se continua con la instalacion del cerramiento.
 Nivelacion del terreno natural comision de topografia.
 Se da inicio con la excavacion manual del terreno natural en
 la via.

Personal: Comision de topografia; 1 boal; 1 Oficial y
 2 Ayudantes

Tiempo: Seco y soleado

Andrés Acosta



 David M. M.

02-02/22 Se continua con las excavaciones manuales y retiro del
 material excavado al sitio de acopio para disposicion final.
 Perfilado del terreno natural con minicargador. Arreglo de
 acometidas domiciliarias agua potable.

Personal: 1 Oficial; 2 Ayudantes; 1 boal; 1 Operario

Tiempo: Seco y soleado

Andrés Acosta


 David M. M.

07.02.2022

Se realiza visita con el Ing CESAR
NUÑEZ Representante de la empresa de
Acueducto de Bogotá el cual informo:

Se debe descubrir la tubería en la parte
baja para la instalación de una valvula 7
de control, la tubería existente o red
debe quedar por encima de la zona de
las muros u construir para cubrir
cubierta tanto de la misma; en la zona
alta se debe realizar el diseño del poste
en 45° aduciendo la red del acueducto debe
quedar por fuera de los muros, ~~quedando la~~
~~instalación de la tubería~~, de igual manera la
tubería debe quedar en una proximidad
mínima de 50 cm. de la resaca.

CESAR NUÑEZ
E. RAMÍREZ
I-42
Resaca

[Signature]

(9)

Se continua con la excavacion manual y retiro del material excavado. Demolicion andamios en concreto quiceros despues de las 12:30 - 2:00 p.m.

Maquinaria: minicargador y volquete

Personal: 1 Oficial; 4 Ayudantes; inspector, 1 boal.

Andrés Amador

[Signature]

05-02/22

Se continua con la excavacion manual y retiro del material excavado. arreglo acometidas domesticas de agua potable.

Tiempo seco: maquinaria: minicargador y volquete.

Personal: 1 Oficial; 4 Ayudantes; inspector, 1 boal.

Andrés Amador

[Signature]

07-02/22

Tiempo seco parcialmente nublado. Personal: Inspector, 1 Oficial; 3 Ayudantes; 1 boal.

Se continua con la excavacion manual y retiro del material excavado. Maquinaria: Minicargador

Andrés Amador

[Signature]

08-02/22 Excavacion manual y retiro de material excavado. Se suspenden actividades debido a aguacero fuerte y lluvia permanente entre las 9:45 a.m hasta las 2:00 p.m.
 Personal: Inspector, 1 Oficial; 3 Ayudantes; 1 botl.
 Maquinaria: Minicargador y volqueta.

Andrés Acosta

~~Intendente~~

09-02/22 Excavacion manual para andenes. Amarre de hierros para zarpas. Demolicion manual andenes en concreto.
 Tiempo - Clima seco, parcialmente soleado.
 Personal: Inspector, 3 Oficiales; 4 Ayudantes; 1 botl.
 Maquinaria: Minicargador.

Andrés Acosta

~~Intendente~~

10-02/22 Se continua con la excavacion manual zarpas en andenes y el amarre de hierro de las zarpas. Arreglo manguera de gas natural frente al # Aguacero fuerte de 2:45-3:05 p.m. Personal: Inspector, 3 Oficiales; 4 Ayudantes; 1 botl. Maquinaria: Minicargador

Andrés Acosta

~~Intendente~~


(6)

11-02/22 Excavacion manual andenes para zarpas y cajas de inspeccion aguas negras. Se continua con el amarrado de hierro zarpas. Aguacero fuerte despues de las 2:00 p.m. y lluvias permanentes durante toda la tarde. Se suspenden actividades. Personal: Inspector, 3 oficiales, 4 Ayudantes, 1 boal. Maquinaria Minicargador.




12-02/22 Clima seco y soleado.
Personal: Inspector, 3 oficiales, 4 Ayudantes, 1 boal.
Fundida zarpas en concreto 3000 psi. 6 m³ 5" de asentamiento. Se tomaron muestras de concreto para ensayos de laboratorio.
Maquinaria: Minicargador

Rodriguez Asta
Voz



14-02/22

11 horas fuertes después de las 3:00 p.m.

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 boal.
Se adelanta la excavación manual para cajas de inspección
aguas negras y zarpas en andén. Maquinaria: Minicargador.

Andrés Acosta



15-02/22

Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 boal.
Excavación manual zarpas y cajas de inspección aguas
negras. Construcción mampostería cajas de inspección A.N.

Andrés Acosta



16-02/22

Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 boal.
Excavación manual zarpas y cajas de inspección A. Negras
Construcción mampostería cajas de inspección. Retiro
material de escombros para disposición final.

Andrés Acosta



③

17-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector; 2 Oficiales; 5 Ayudantes; 1 bond
 Construcción mampostería cajas de inspección aguas
 negras. Instalación de formaleto para muros en
 concreto. Armar de hierro vigas y muro.

Andrés Acosta
 C. Exp. Ing.

Victor Hugo B
 Del V. M. M.

18-2-22 CUMA SECO - lluvia leve

Personas: 1 inspector - 2 oficiales - 5 ayudantes - 7 bond
 2 pañete

Se continúa con armado de hierro de
 cierre de vigas en la parte alta, se
 continúa con actividades de excavación manual
 de zapatas para armado de muros de contención.

Andrés Acosta
 Jefe de Obra

③

(9)

19-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 boal.
Amarre de hierro zarpas y viga de hierro parte alta
excavacion manual para cajas de inspeccion aguas negras y
zarpas.

Residente Obr

(D)

21-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 4 Ayudantes; 1 boal.
Construccion mamposteria en ladrillo cajas de inspeccion de
aguas negras. Amarre de hierro zarpas. Excavacion manual
zarpas.

Residente Obr

(D)

22-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 boal; 1 Operario
Excavacion manual zarpas. Amarre de hierro zarpas.
corte y fraguado. Maquinaria: Montacargas

Residente Obr

(D)

70

23-02/22 El clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 boal, 1 Operario. Maquinaria: Minicargador. Volqueta.

Excavacion manual cajas de inspeccion aguas negras y zarpas. Amarre de hierro zarpas y muro de contension fundida canchales en concreto cajas de inspeccion aguas negras. Retiro material de excavacion para disposicion final.

Orden arco y limpieza a componentes, Canchales, auditor, parte de hidrocarburos

y botiquin estantes; Implementacion de PMT; Retiro de PCD

Tarea de sintoma COVID, verificacion de uso de EPP

Mauricio Torres - Soc. Botiquin
Hercia Gatoño

Ferdinando Chir



24-02/22 El clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 boal, Operario

Maquinaria: Minicargador

Excavacion manual zarpas, construccion mamposteria caja de inspeccion aguas negras. Amarre de hierro zarpas.

Acopio material de excavacion.

Implementacion de PMT en parte de obra; Acopio de PCD;

orden arco y limpieza, Mantenimiento a sumidero; Componente

argamasa y señalizado; Verificacion de uso adecuado de

EPP y toma de síntomas

Manual - Ingres - Res. Ambiental.
Marcela Cateiro

Resolución de

Resolución de

- 25-02-22 - Verificación y uso adecuado de EPP; Toma de síntomas COVID, monitoreo a cuarentenas; orden uso y limpieza en campamento; Check a personal oficial y ayudante para monitoreo organizado el campamento; Implementación de PMT.

Manual Tarea Res. Ambiental. Marcela Cateiro

Tiempo seco parcialmente soleado en la mañana. aguacero fuerte después de las 3:00 p.m hasta las 4:00 p.m.

generando saturación del terreno y encharcamientos de agua.

Personal: Inspector. 2 oficiales, 5 Ayudantes, Operario, 1 boal. Maquinaria: Minicargador.

Se adelanta demolición manual de andenes en concreto.

Excavación manual zarpas y amarre de hierro zarpas.

Resolución de

Resolución de

(12)

26-02/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 1 Oficial, 1 Operario, 7 Ayudantes
1 Operario, 1 local. Maquinaria: Minicargador.Demolicion manual andenes. Excavacion manual de
zarpas.F. J. J. J.
F. J. J. J.

F. J. J. J.

28-02/2002 clima lluvioso en horas de la
mañana 7:00 - A. 9:00 amPersonal: 7 Ayudantes - 2 Oficiales - 1 local
equipo = mini - herramienta menor - Inspector -
F. J. J. J.Se continua con armado de hierro en
zapatas y armado de muros en zone
ante del CIV, se realiza retiro de
cayuca en excavaciones por lluvia, se
cubierta figuredo de hierro y excavacion
manual.F. J. J. J.
F. J. J. J.

F. J. J. J.

01-03-022 PERSONAL CONTRATISTA: 07 ayudantes, 02 oficiales
01 trafico, 01 inspector tecnico, 01 residente tecnico

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector tecnico, 01 inspector
SST-MA, 01 residente social, 01 residente tecnico

CLIMA: Lluernas 07:00 - 09:00


ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavacion para construccion de cajas de inspeccion
de alcantarillado, excavacion para construccion de
muros, instalacion de acero y encofrado para
muros y zarpas 10-40^E, 10-41^E, 10-47^E, 10-35^E, 10-28^E
y 10-34^E en avance parcial.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar
el respectivo control y seguimiento a las activi-
dades ejecutadas en conformidad a los diseños
de cada frente de obra, de igual manera cualquier
modificacion debe ser debidamente soportada
documental y tecnicamente y a su vez, deber
ser revisada y avalada con antelacion por
esta interventoria.

Se evidencia uso adecuado de EPP,
mantenimiento del cerramiento así como

Orden y aseo del campamento, se realizó la toma de síntomas covid, se evidenció la completa implementación del PMT y se realizó el acopio de RCD.


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA INTERVENTORIA

02.03-2022 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 07 Ayudantes, 03 oficiales, 01 BOAL, 01 Inspector

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 residente técnico, 01 residente social, 01 Inspector técnico, 01 Inspector SST-MA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continuó demolición y excavación para construcción de cays de inspección. Se continuó excavación para construcción de muros. Se continuó instalación de acero y encofrado para muros y zapatas muros 10-40E, 10-41E, 10-47E, 10-35E, 10-28E Y 10,34E


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA INTERVENTORIA


03-03-22 TIEMPO SOLO

Personal: 4 oficiales a accidentes, 1 BOAL, 1 DIENARIO

Se continuó con recuperación manual en zona de zonas parte baja del CIV, se adelantó armado de hierro para muros, de igual forma se realizó fundido de concreto en muro y zonas de la parte alta (6 m² aprox)

Se evidenció uso adecuado de EPP, se realizó mantenimiento al cerramiento y orden y aseo al campamento. Se evidenció acopio de RCD. Se realizó toma de síntomas COVID.


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA INTERVENTORIA.

04-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 BOAL, 01 inspector

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA, 01 inspector técnico.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continua excavación para construcción de muros. Se funde concreto para elevaciones muro 10-53E y Zarpas muros 10-28E, 10-34E

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista garantizar el recubrimiento de acero y realizar la limpieza de las estructuras a fundir así como también el bombeo del agua lluvia empozada.

Se realizó orden y aseo del campamento y de la vía por la que se transportó el concreto, se realizó el registro de síntomas COVID.

[Firma]
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORA

05-03-2022 / CLIMA NUBLADO, PERSONAL 3
OFICIALES, 7 AYUDANTES, 1 BOPE, INSPECTOR
TECNICO, 551. REMANTE OBR., 1 OPERARIO

Se continúan con trabajos de

Excavación manual en zona de zapatas en
zona intermedia y base del sormento;
se adelanta actividades de ligando y armado
de hierro para conformar muros de contención,
se realiza coseo general de obra y
acopio de materiales.

Andrés Resto
Presidente Obra

07-03-22 CLIMA: Lluvia moderada 7:00 am a 11:50 am
PERSONAL CONTRATISTA: 07 ayudantes, 03 oficiales,
01 BOAL, 01 inspector
PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA,
01 inspector técnico.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa excavación
para construcción de muros. Se realiza
desencafrado para elevaciones muros 10-53E y
10-46E.

- El día de hoy el sitio de disposición CEMEX.
Reporta que no estaba en funcionamiento de Puntos
Ayuda se dejó Soporte



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas

Informamos las operaciones de Flete y Tanqueo se encuentran suspendidas el día de hoy 7 de marzo, en lo que se realiza mantenimiento de pailas, estaremos informando de reanudar en el transcurso del día y no presentarse mayores afectaciones por el clima

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realizan actividades de Mto de Cerramiento,
Limpieza Nias, Adecuación Punto ecológico.
Organización y Limpieza Campamento.
Se realiza implementación Protocolo de
Biosseguridad.

Adelc
Rep SST

08-03-22

Se reporta que el sitio de disposición final de RCD
se encuentra sin servicio debido a las condiciones climá-
ticas presentadas en la zona



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas durante esta semana

Informamos las operaciones de Fiscalá y Tunjuelo se encontrarán suspendidas el día de hoy 8 de marzo de 2022, en lo que se realiza mantenimiento de patios y adecuaciones del terreno.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Implantar nuevo adoquero de PHT, Componente organizativo y
estructural, verificación de un adoquero de PHT, Toma de
muestras para el 14 y 15 de EPP.

Nuevo zona Perimetral

Clima despejado

Personal Obra: 01 ayudantes, 02 operarios, 01 boal
01 inspector

Personal Interventores: 01 inspector, 01 residente terreno
01 inspector SRT-HA

Actividades: Se realiza instalación de acero
y encofrado para muro predio # 10-47^E y Zarpas
predios 10-31^E, 10-22^E y 10-24^E se continúa
corte y figurado de acero


09-03/22 clima: despejado

Personal de obra: 07 ayudantes, 03 oficiales
01 boal, 01 inspector

Personal Interventoria: 1 residente, 1 inspector
1 inspector SST-HP, 1 residente Social

Actividades: Se funda concreto de 300 pi
asentamiento 5-5" para elevaciones muro
10-47" y zapas 10-41", 10-22" y 10-29"

Observaciones: El contratista no garantiza el
recubrimiento del acero cerca inferior zapas
y no se realiza el retiro de agua empujada
en las excavaciones al momento de fundir, se
solicita atender las observaciones realizadas
por la interventoria


Residente Obra

10/03/02. Clima: Lluvias fuertes 14:40 - 17:00

Personal Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 boal
01 inspector, 01 topógrafo

Personal Interventoria: 1 inspector 1 inspector SST-MR

Actividades: Se realiza instalación de acero
en vigas y encofrado para elevaciones muros
medios 10-41^E y 10-34^E y se continua excavaciones
para muros y cajas de inspección alcantarillado

Observaciones: Se reitera al contratista realizar
el respectivo control y seguimiento a las actividades
ejecutadas en conformidad a los diseños de
cada frente de obra donde cualquier modificación
debe ser debidamente soportada documental y
técnicamente y debe ser revisada con antelación
por esta interventoria. Lo anterior, ya que se
evidencian modificaciones a los muros y diseño
propuesto sin aprobación previa.


Fabián Ota



11-03/22 Clima despejado

Personal Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales
01 boal, 01 inspector, 01 topógrafo, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 1 inspector SST

Actividades: Se funda concreto de 3000 psi asentamiento 3" para elevaciones muros 10-41^E y 10-34^E, se continúa excavación para muros e instalación de geodren en muros anteriormente construidos.

OBSERVACIONES: Se reiteran observaciones realizadas los días 09 y 10 de marzo.


Verónica Ordoñez

12-03/22 Clima despejado

Personal Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales
01 boal, 01 inspector, 01 topógrafo, 01 operador

Personal interventoria: 1 inspector 1 inspector SST

Actividades: Se realiza desmoldado de muros, se continúa excavación para muros y se inician llenos posteriores en

muros ya contruidos, se realiza replanteo para escaleros y acopio de material de excavacion

~~Revisado~~

22

14-03/22 Clima: lluvia moderada 11:25 - 14:10

Personal Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales
01 baal, 01 inspector, 01 topografo, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se realiza encofrado y fundido de elevaciones muro 10-28⁶ en concreto 3000psi y se continuan llenos compactados posteriores a muros anteriormente contruidos.

~~Revisado~~

15-03/22 Clima: despejado - lluvia 11:25 / 14:10

Personal Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 baal
01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continúan rellenos en material granular compactado e instalación de geotextil para andenes en avance parcial. Se continúa excavación y construcción de cajas de inspección para acometidos de alcantarillado e instalaciones de tuberías para acometidos sanitarios, se funde concreto de limpieza para vigas de confinamiento avance parcial.

[Firma]

16-03/22 Clima: despejado

Personal Obras: 07 ayudantes, 03 oficiales, 1 bond 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoría: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se finaliza excavación para muro pedregio 10-29^E y se realiza figurado y de acero para zarpas pedregio 10-29^E y elevación muro 10-22^E, se funden solados para zarpas muros 10-29^E y 10-29^P, se realiza instalación de acero para vigas de confinamiento en

avance parcial, se continua instalacion de material de mejoramiento para relleno en andenes.

[Signature]

17-03/27 clima: despejado

Personal obra: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 bol
01 inspector, 01 operador

Personal intercentro: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se finaliza encofrado para muro 10-22^E
y se funde concreto de 2000 psi para traves
muros 10-29^E y 10-29^{E'} y se funde elevacion para
muro predio 10-22^E, se realiza recorte de para
de alcantarillado existente, se continuan excava-
ciones para muros de contencion en avance parcial.
Observaciones: Se solicita al contratista mejorar el
vibrado de concreto para evitar borrigueos.

[Signature]

18-03/2022 Clima: despejado

Personal de obra: 07 ayudantes, 03 oficiales,
01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua construcción de cajas
de inspección para alcantarillado, se
realiza instalación de geotextil en muros y lloro
en material granular compactado se continua instala-
ción de geotextil y material granular compactado en
zona central en tramo superior avance parcial

[Firma]

19-03/2022 Clima: despejado

Personal de Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 boal
01 inspector, 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua excavación para muro
se continua construcción de cajas de inspección de
alcantarillado. Se realiza cargue y retiro de
escombros, se realiza corte y figurado de

acero para zarpas de muros se continua lero
en material granular compactado con superior
peatonal en avance parcial



22-03/02 clima: despejado

Personal de Obra: 07 ayudantes, 03 oficiales, 01 boal
01 inspector, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MN

Actividades: Se realiza corte y figurado de acero
para zarpas muros 10-35^{±3} y 10-26, se continua
excavacion para muros, se continua construcccion
de cajas de inspeccion acometidas alcantarillado



23-03/022 clima: despejado

Personal en obra: 08 ayudantes, 03 oficiales, 01
inspector, 01 residente, 01 boal, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector asistente,
01 residente técnico, 01 residente social, 01 residente asistente

Actividades: Se finaliza instalación de acero
Zapatas 10-35^E, 10-26^E y zapata 10-47/40 intermedia.
Se funde concreto 3000 psi para zapatas 10-35^E,
10-26^E y zapata intermedia 10-47/40.

OBSERVACIONES: Se realizan tomas de densidades por
interventoria en anden piedra.

Los cuales no cumplen y se solicita al contratista
corregir y subsanar dicha actividad.

Forjador

24-03-2022 TIEMPO NOBLADO: Personal Forjadores 2 ayudantes

1 BUAL T INSPECCION REC-RESIDENTE - MAQUINAL - SIT,
1 OPERARIO.

Se continúan con forjados de armado
y formateados de muros en zona media,
Se realiza corte y aguada de hierro para
zapatas y muros, se continúan con ejecución
manual de zapatas, construcción de cajer de
inspección y armado de muros ~~especificados~~
en detalles de igual forma se continúan
con el fido de material de mejoramiento.

y competencias de la misma.

V. Rodríguez
P. Rodríguez

25-03-2022. TIEMPO NORMAL

GERENTE GENERAL - 7 INGENIEROS - 1 ACAL - 1 INGENIERO

1 OPERARIO - 1 PC - 1 EC - 1 INGENIERO - 1 ST.

Se continuó con el estudio de material existente
en zona de "Muros y Arco" y zona de "Academia",
se realizó el estudio de "Proyecto" en zona del "Custodio"
Muro, se realizó el estudio de material existente.

V. Rodríguez
P. Rodríguez

26-03-2029 tiempo seco

PERSONAL 4 OFICIALES 7 AYUDANTES 1 BURE

INSPECTOR 1 VIGILANTE 1 GUARDIA TECNICO 521 HORA

Se realiza extendido de material g.p. en zona de andenes, excavacion manual en zona de desperos, fogueo y armado de Hierro en zona de desperos y muros, conformacion de vigas de acero en andenes, se realiza fundido de concreto en muros y desperos, se continua con compactacion de sub base g.p. en zona de escaleras, se adelanta armado de muro T.4 en zona de escaleras, se realiza extendido de solado en zona de escaleras con el fin de comparar con armado de Hierro para esta zona, se continua con demolicion de andenes en parte baja, se realiza fogueo de densidades en andenes y zona de escaleras

0803-2022 TIEMPO SELU

PERSONAL 2 AYUDANTES, 1 OBRERO - 1 BOAL - 2 OPERARIO
RESIDENTE TCC - 5ST - AMBIENTAL

Se continúan con labores de armado de
hierro en zona de muro, conformación de
cadenas del costado norte, se realiza conformación
de caja de inspección en zona oriental, se
continúa con ajuste de cadenas y cadena de quita
en cadena sur.

Se realiza eseo general de obra.

Se realiza visita de los especialistas estructurales
de la caja de vivienda popular, inspecciona y
conferencia con el fin de verificar el segmento
500 5572 en relación con la propuesta del muro.


J. P. G. Ochoa

29-03-2022 TIEMPO MURADO - PERSONAL 4 OBREROS

11 AYUDANTES - 1 BOAL - 2 OPERARIO, 4 INSPECTOR
RESIDENTE TCC - 5ST - AMBIENTAL

Se contina con labores de compactación
en zona de carbón con y sin agua, se
continúan trabajos de corte y segunda
de hierro por miner y repara de
igual forma se sigue con el trabajo de carbón
en parte alta, se contina con el trabajo
mineral de repara en parte baja.

Problemas
Problemas

27-03-202 HEMPE WILSON

PERSONAL DE OBRA: 4 OPERARIOS Y 94444444

1 BOMBA - 1 RIGIDO - 1 INSPECTOR 551 - 1 BOMBA 120

551 - 1 BOMBA

Se contina con labores de compactación
de hierro en repara y miner de carbón
en parte media del Sargento, se
continúan trabajos de corte de
hierro por repara de igual forma
de repara compactación de nuevo a trabajar

En zona control "señal alta", se continúan con demoliciones y construcciones de casas de maderas como de madera en parte baja, se continúan con compactación de material granular.

Parque & Urban
Protección Forestal

30.03-2022 TI C440 5000

PERSONAL 3 OPERARIOS - AYUDANTES 10 - 1 BOMBA
Y GRUPO - INSPECTOR - RESIDENTE - TEC-557
MATERIAL:

Se continúan con armado de Herrer en zona de escuridera control, instalaciones de muro en bloque estructural en cruceta, se aceptan trabajos de colocación de escurideras en zona baja del segmento, se continúan con compactación de escuridera parte media, se realiza en armado de muros para propiciar mejor drenaje de las mismas. Se realiza retiro de material de construcción.

15906

No further work.

3403 022 TLEAD V. 600

PERSONAL & OFFICIAL 10 MINUTES 2 HOUR
7 OPERARIO - 2 ES - SUB-GERENTE - TECNICO.

Se continua con excavación de zapatas en cunetas segun del sermanto, se adelanta retiro de material de excavación. Se continua con corte y esparado de Hierro para zapatas y muros perimetrales del sermanto, se realiza retiro de material de excavación.

02-0F-20

~~10~~

01-01-2022 7/64PD SECD

PERSONAL. 4 OFICIALES - 12 AYUDANTES. 7
BOAL. 1 OPERARIO RGO - TCC. SSS - AMBICOM

153

Se contina con construcciones de curvas
de inspeccion, instalaciones de geodas por
muros y conformacion de fallas para
conexiones de geodas a curvas de inspeccion ya
que no es posible el resto lateral de las
estructuras por el tipo de cultivos, se
adelanta trabajo de compactacion de muros
y muros, se contina con armado de fierro en
zona de curvas y zarpas.

Se realiza retiro de material de escombros.

Fuente: Ocho

02-08-2022. TIEMPO NUBLADO

PERSONAL 4 OFICIALES 12 AYUDANTES. 1 OPERARIO
1 OPERARIO 2 BOAL. RESIDENTE TEC-SS7. HABITACIONAL

Se contina con ejecuciones muros en
zarpas y muros en parte baja del segmento.
se contina con corte y armado de fierro
para zarpas y muros y muros, se adelanta
fundido de concreto en zarpa y muros;
en zona media del segmento construido son
7 m³ de 3000 psi.

Se adelanta trabajo de conformación
de escaleras en zona alta, de
igual forma adecuación de ejes de
inspección, se informa que el día
01-04-2022 se instala válvula de corte
en la parte baja del segmento por
parte de la ENAB, y se realizan
represiones en acometidas domiciliarias
el cual presenta escape

Fausto L. Obr.
Vladimir Acosta

05

04-04-2022. TIEMPO SECO

Personal 4 oficiales 13 ayudantes
10 personas 7 boal- RES-TEC-SSI-MANUTEN

Se continúa con excavaciones manuales
en zona alta, se sigue en conformación
de ejes de inspección,

Se adelantan trabajos de mantenimiento y arreglo para zócalos, muros y escaleras, se continúa con armado de escaleras, se adelantan actividades de conformación de filtros para recolección de aguas en zona de drenaje y conexión de las mismas, se trabaja en relleno y compactación de material sub-base tipo 1BA en drenaje.


Ferdinand Obrador

05-04-2022 TIEMPO NUBLADO.

Personal. 5 OFICIALES - 13 AYUDANTES - 1 BICAL -

1 OPERARIO - 1 INSPECTOR RESIDENTE - TGC - SST - AMBIENTE

Se adelantan trabajos de compactación en zona de drenaje, de igual forma se trabaja en formulación de escaleras para programar fundido de estas, se adelantan trabajos de armado de hierro en muros y zócalos para muro T-4, se adelantan trabajos de conexión de aguas lluvias.

en la parte alta del segmento
y conformación de este mismo según
con especificaciones manuales.
Se realiza retiro de material de
excavación y esbozo general de obra
fe

[Signature]
Director Obra

06-04-2022. TIEMPO NUBLADO - LLOVIAS EN LA MAÑANA


07-04-22

Personal 3 OBREROS, 7 AYUDANTES - 1 BOAL
1 OPERARIO, 1 BOAL - PES - TEC.

Se trabaja en excavación manual en
zona de zarpas. ~~de~~ demolición de exterior
en parte baja del segmento, se
trabaja en corte y figurado de hierro
para escultura, zarpas y muros, se
continúa con construcción de curva de
inspección de trabajo en

extendido y compactados de material
tipo ICA en zona de céntrica y
excéntrica con el fin de proporcionar.

Forma de construcción, se adelanta trabajo
de. Acercado de excéntrica y topografía.


Pascual Obra

07-08-2022 TIEMPO SOLADO

Person-1 SUFFICIENTES, 10 AYUDANTES 1 OPERARIO,
18072. INSPECTOR - RES TEC-PAVIMENTAL-SSR.

Se continúa con corte y piqueteo de
hierro para zona de trípode y muro, se
adelanta trabajo de céntrica de excéntrica. para
programa finalizado, se realiza inspección
de gases y geotextil. en zona de céntrica
y zona central para excéntrica se
adelanta compactación de los asientos

se advierte que en la parte de
cubierta norte, se evidencian el peso
de la fibera de red sintética el
cual no deja controlar la zona
del muro T-3 por lo anterior
se solicita al ing. estructural el
apoyo para reevaluar este o presentar
una alternativa y contar con
estas actividades.

Andrés C. Ordoñez

09-0

08-07-2022. Personal 6 OBREROS 12 OBREROS
1 MAGISTRO - 1 OPERARIO. PENDIENTE
TEC- SST. PREVENTIVA.

Se continúa con excavación de zanja
y muro en zona norte. Se realiza
pundido de escalar y zona de
descargas en parte alta del
segmento.

Se aceleraron trabajos corte y armado de Hierro, se trabajó en apuntalamiento de parte del cubeto sur y n. por actividades, este ya estuvo desmontado y con riesgo de caídas, se aceleró trabajo de demolición de columnas parte sur.

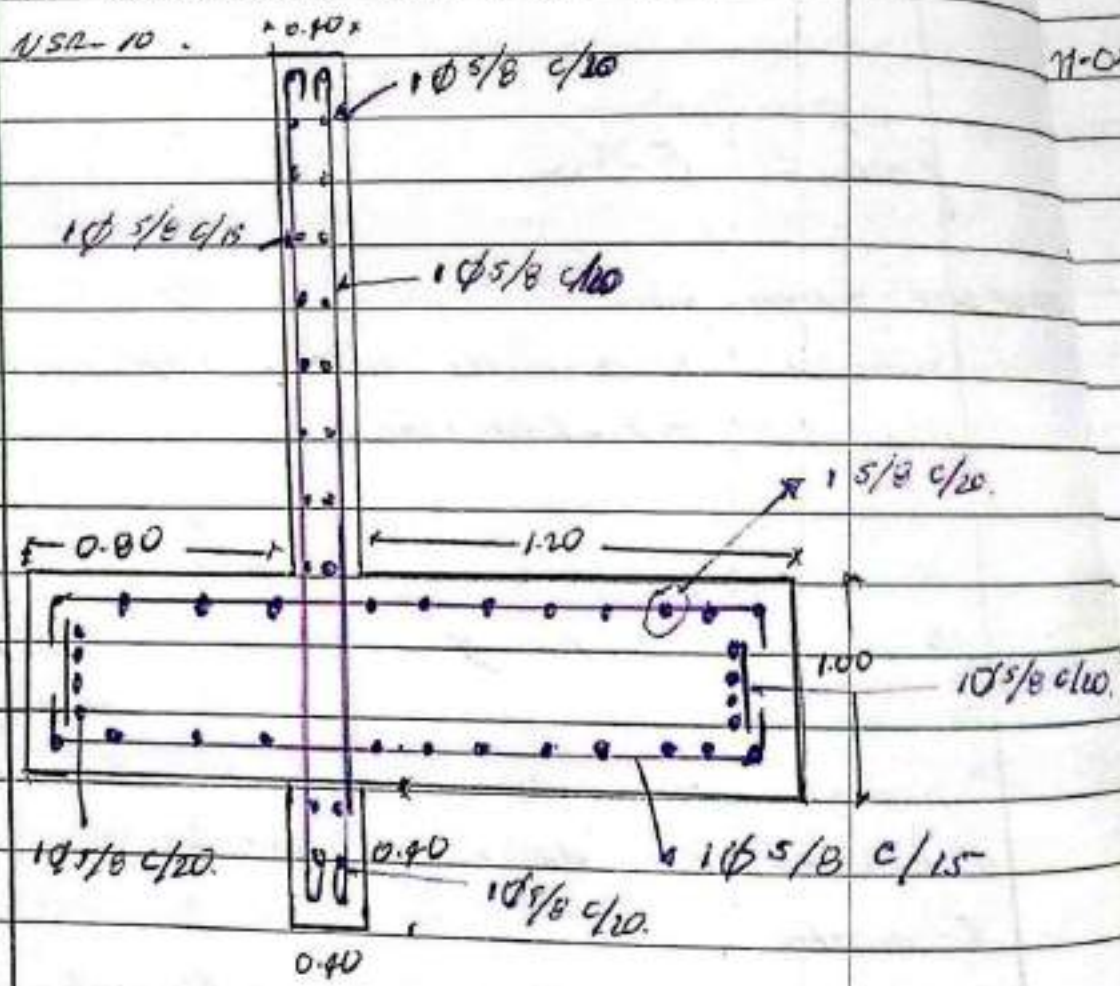
Andrés Acosta
Presidente Obre.

09-07-2022 TIEMPO NUBLADO

SOFIALES - 10 AYUDANTES - 1 BOMBA - 1 OPERARIO INSPECTOR
RCS - TEC - SST - AMBIENTALES

Se continúa con corte y armado de Hierro por zapar y murar y alambres, se continúa con construcción de cimbra de inspección, se realiza actividades de construcción y armado de murar del cubeto sur del Sementro.

Se presenta muro para el cual
presente al piso de la tubería el
cual en zona del muro T-3 no
se puede realizar, para lo anterior se
presenta el siguiente muro para
su construcción cumpliendo con las
NSR-10.




Se rec
y se

11-04/022 Cl.

Perse
cl
Perse
cl
Al
m
c

se reutiliza resto de material de excavación
y se realiza eseo general de obra.



11-04/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 residente SST-MA
01 operador, 05 oficiales, 10 ayudantes, 01 local

Personal interventor: 01 residente técnico, 02 inspectores
01 inspector SST-MA

Actividades: Se continúa excavación manual para
muros predio 10-10^E, se realiza excavación manual
y solado para muro en mampostería central para
escaleras frente a predios 10-34^E y 10-41^E, se
continúa figurado en instalaciones de acero para
muros predio 10-17^E y 10-22^E, se realiza lleno
en material granular compactado en anden predio
10-29^E y se realiza instalación de geotextil

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista verificar
y corregir los acabados de las escaleras y
descansos entre predios 10-34^E y 10-41^E hasta

10-16^c y 10-53^c teniendo en cuenta los diseños y que se evidencian irregularidades verticales y horizontales de control de nivelación de encofrado y nivelación de concreto. Por otra parte se reitera al contratista dar celeridad a la construcción de los muros de los predios 10-10^c y 10-17^c por las niegas presentes en las zonas. Se requiere también la correcta implementación de accesos a viviendas ya que los mismos se encuentran en regular condición.

Se atienden observaciones por parte de interventores en relación a los accesos e intervención de muros de los predios mencionados.

Resolución

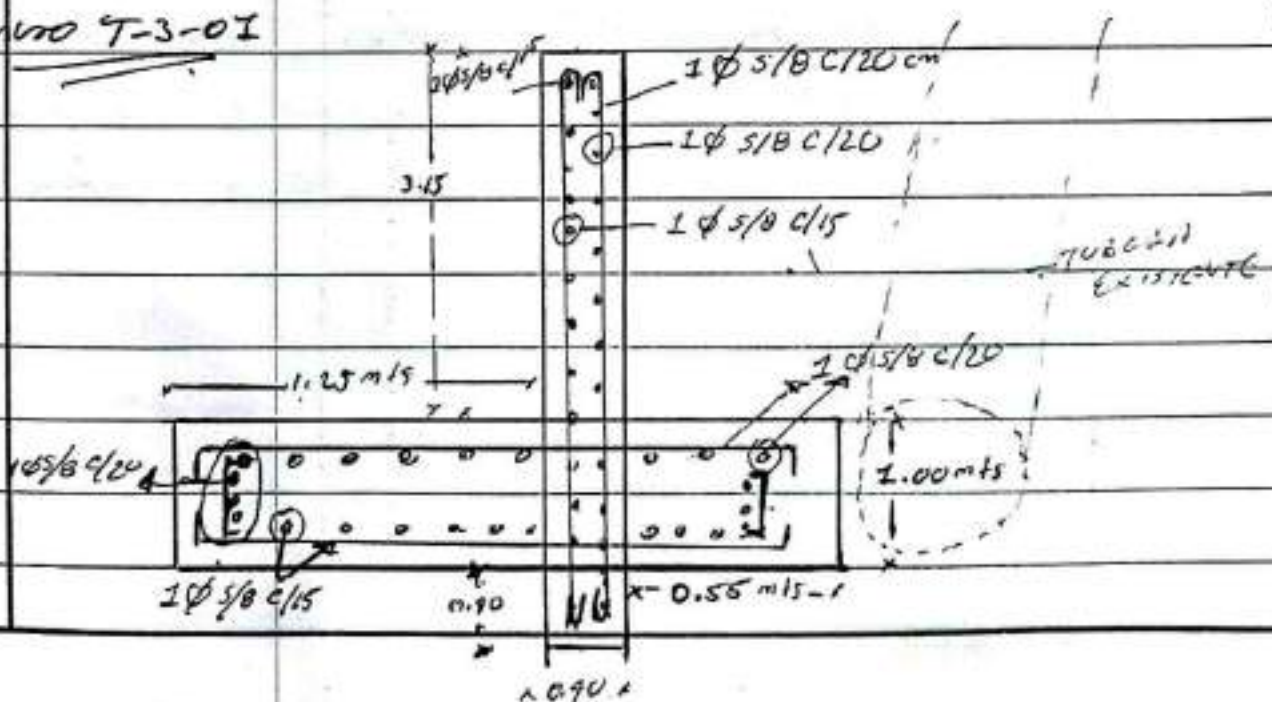
12-01-2022 TIEMPO NUEVO

PRESENTE Y OFICIALES 12 AYUDANTES 2 BOAL

10667416 Y INSPECTOR REG. TEC. SST. ANA MARIA

Se adelanta trabajo de armado de muros y
 por la zona baja del sótano, se continúa
 con armado de vigas de cierre, se continúa con
 excavaciones menores en zonas parte baja, y
 refiro de material de excavación, se continúa
 con armado de escaleras concretas y muros T-5.
 En atención a que en el prebto en el cual se
 adelanta armado el muro T-3-1 del día 09-07-2022
 según diseño estructural se evidencio en terreno que
 la tubería no permitía realizar la zanja a 1.20 mts
 por lo cual se realizó nuevamente el diseño ~~del~~ y
 modificaciones del muro correspondiente garantizando
 que cumple con la Norma NSR-2010.

MURO T-3-01



Se le indica que la altura del muro
puede variar entre 1.40 m a 1.60 m.

[Signature]
F. C. O. S.

18-07-2022 716

PERSONAL

LET SST

13-09-2022 TIEMPO SECO

PRESUNTA DE OFICIALES ILICUENTES Y BOMBA

2 OPERARIO LES - TEE - SST - AMBIVITA

SC de

Alto de

SC de

CSC de

CSC de

CSC de

CSC de

SC de

Se trabaja en el muro de concreto de
muro y zapatas, se adelanta la obra
de excavación en zona bajo el CIV.

Se realiza fundición de zapatas para
nuevo costado, se realiza cerco general
retiro de material y esbozo de zona
propuesta reemplazando a la cimentación.

[Signature]
F.

[Signature]
F. C. O. S.

19-07-2

MA

F.

F.

14, 15, 16, 17. Semana Santa

18-04-2022 TIEMPO AMPLIO

PERSONAL 6 OFICIALES, 12 AYUDANTES Y 2 BOQL. 7 OPERARIO,
1 ES SST. AMBULATORIO - TEC.

Se adelantan trabajos de instalación de
bloque estructural en cimiento para nueva capilla,
se adelantan actividades construcción de
escultura, se continúa con armado de sillería
en vigas de escultura, se trabaja en excavación
en furer parte baja en los dos costados, se
realiza corte y fondeado de Hierro para muro 7-3-01,
se realiza retiro y fondeo de murete.

Federico A. Obi

19-04-2022. TIEMPO LLUVIOSO EN HORAS DE LA
MAÑANA.

PERSONAL 6 OFICIALES, 13 AYUDANTES - 2 BOQL
7 REVISOR SST. AMBULATORIO - TEC. 7 OPERARIO.

Se trabajó en instalaciones de gasoductos en muros caídas, relleno y compactación de material de mejoramiento en zona de cendres, se efectuó los trabajos de conformación de muros con bloques T-5, fundido de solados para escaleras y rampas. Se continuó con excavación de zanja para muro T-301 con el fin de adelantar trabajo de fundido en esta zona de alto impacto en relación a las cimentaciones de las casas, se trabajó en corrido de tierra para zanja y muros. Se informó sobre el cierre de acueducto.

[Signature]

20-09-2022 TIEMPO LLUVIOSO.

PERSONAL 30 FICIALES 10 AYUDANTES 2 BOAL

2 OPERARIO - R63-TEC-SS7-AMBIENTAL

2.

Por tener de lluvia se adelantó trabajo de conformación de cayer de inspección, relleno en zonas de cendres y en trazo de excavaciones

expuestas, se informa sobre el cierre
de escombreras y despacho de material
por lluvias en el sector.



Importante

Estimado cliente


Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 20 de
abril de 2022.

 Informamos se suspende temporalmente el servicio en
nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar
operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.


Pedro A. Ochoa

21-04-2022. TIEMPO LLUVIOSO EN HORAS DE LA MAÑANA
PERSONAL: SOFICIALES 11 AYUDANTES 1 RUAL
1 OPERARIO RES-TEC-SSA-AMBIENTAL

Se realizó armado de muro T-3-01 en
zona baja del segmento con el fin de

programa pendiente de obra, se cubren los
trabajos, se cubren pendientes en zona central
de andares, de descenso, se cubren con
construcción de ejes de inspección y
compartimentación de andares, se cubren
con excavaciones de zona en parte baja
del segmento.

Reserva Obra.
de Hacia Norte.

22-09-2022. Tiempo LLUVIOSO

PERSONAL. 9 OFICIALES 12 AYUDANTES
1 BOCA Y OPERARIO.

Se continúa armado de muros y revestido
de los muros en zona central del
segmento, se cubren trabajos de compartimentación
en andares, se realiza acopio de material
sobrante ya que por cierre de
excavaciones no es posible despojar y/o
refinar el material, se continúa
con armado de muros. parte baja



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 22 de abril de 2022,

Se suspende temporalmente el servicio de atención en escombreras Tunjuelo y fiscal,

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario

23-04-2022

TIEMPO SECO

PERSONAL: 40 OFICIALES 6 AYUDANTES Y 200

1 OPERARIO. 551 - MAQUINARIA - TCC.

Se realizó formulario de control de la
parte baja y se comunicó con el área de
programa para la de estos, se pedirá
en caso de caso de inspección.

se realice adecuación de acceso y
seguridad, correspondiente, se realice
csoo general de obr

[Signature]
Hernán P. S. L.

25-01-2022 - TIEMPO NUBIADO

PERSONAL 3 OFICIALES 6 AYUDANTES
1 BOAL 2 OPERARIOS DEJ - TEE - 937- SUBVENCION

Se adelanta ~~transferencia~~ fundida de muro cortado
Nur - occidental del segmento T-3-01. de
igual forma fundida de escalera central
se adelanta frubier de formulado
y adecuación de muro, se trabajó en
construcción de caja de inspección en parte
central del CIV, se realiza acopio
de material de excavación, se
informa sobre cierre de excavación
por lluvia.

26-01



Importante

Estimado cliente

Debido a las fuertes lluvias presentadas el día domingo 24 de abril, EL
LUNES 25 DE ABRIL

 **NO SE PRESTARÁ** el servicio de escombrera en
tunjuelo y fiscalá

Durante el día estaremos informando de poder retomar operación en horas de la tarde.

Agradecemos su comprensión.

Hacer extensivo este mensaje a quien sea necesario.

*Ferdinand Obi
Andrés Anacleto*

26-04-2022 TIEMPO NUBLADO

PERSONAL 20 OBREROS, 7 AYUDANTES 2 BOAL
7 OPERADOR - RES-TEC, EST-AMBIENTAL

Se realizó fudida de muro y escueros
controler, se adehate frentes de retiro de
material de excavacion, se continuan con
conformacion de zapen, muros y escueros,
se señaliza bucos señores y planificade de
cuya de igual forma ajuste y
adeuacion de excosor en viviendas.

*Ferdinand Obi
Andrés Anacleto*

27.04/022 Clima: Despejado

Personal: 03 oficiales, 07 ayudantes, 01 boal, 01 inspector

Personal interventor: 01 inspector, 01 inspector SST-IA

Actividades: Se realiza desencofrado de muro predio 10-10^B, se continua excavación y conformación de terreno para construcción de escaleras en avance parcial

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista corregir 29.04/022 e implementar pasos seguros de acceso a viviendas para residentes

le Nadri Acosta

28.04/022 Clima: Despejado

Personal: 03 oficiales, 07 ayudantes, 01 boal
01 inspector, 01 residente SST, 01 residente ambiente
01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se realiza reposición de red sanitaria principal adyacente a predio 10-10^B.
Se realizan conexiones de geobeben mediante

instalacion de filtro tipo frances, se realiza instalacion de geodren y material granular compactado para relleno muro 10-10.5

Vb Rodri Agust

104/022 clima: lluvia moderada 08:35 / 10:30
Personal: 03 oficiales, 02 ayudantes, 01 boal, 01 inspector, 01 operador
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: Se realiza conformacion y excavacion para construccion de escaleras, se continua la instalacion de geodren y material granular compactado para muros, se continuan conexiones de geodren mediante la construccion de filtros tipo frances en tramo de avance parcial.

Vb Rodri Agust

30-04/022

Clima: despejado

Personal: 03 oficiales, 07 ayudantes, 01 local
01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SOT-HA

Actividades: Se continua excavacion manual
en los costados para muro, se continua
relleno contra elevacion muro predio 10-10^ESe continua relleno en orden predio 10-53^E 03-05/022

i/o J. P. Pach. Fort.

02-05/022

Clima: despejado

Personal: 03 oficiales, 08 ayudantes, 01 local
01 inspector, 01 operadorActividades: Se realiza conformacion y rellenos
para construccion de escaleras centrales entre
predios 10-29^E a 10-22^E, se continua instalacion
de geotextil y material granular compactado
para muros 10-23^E, 10-10^E, figurado e instalacion
de alero para zarpa muro 10-17^EObservaciones: se solicita al contratista realizar 04-05,
la correcta implementacion y mantenimiento

30.04/022

clima: despejado

personal: 03 oficiales, 07 ayudantes, 01 local
01 inspector, 01 operador

personal interventor: 01 inspector, 01 inspector SOT-HA

Actividades: Se continua excavacion manual
en los costados para muro, se continua

relleno contra elevacion muro predio 10-10^E

Se continua relleno en orden predio 10-52^E

03-05/022

1/2 (Fms. Ruchi Vort.



02-05/022

clima: despejado

personal: 03 oficiales, 08 ayudantes, 01 local
01 inspector, 01 operador

Actividades: Se realiza conformacion y rellenos

para construccion de escaleras centrales entre

predios 10-29^E a 10-22^E, se continua instalacion

de gradren y material granules compactado

para muros 10-23^E, 10-10^E, figurado e instalacion

de ceras para zanja muro 10-17^E

Observaciones: se solicita al contratista realizar 04-05,

la correcta implementacion y mantenimiento

de los componentes de pmt. lo anterior
teniendo en cuenta que no se evidencia el
cerramiento perimetral en pal.sombra.

Vk Int. Nda. Aut. 




03-05/22 Clima:

Personal Contratista: 03 oficiales, 08 ayudantes, 01
boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

Actividades: Continúan con excavación manual
para muros predio 10-11^E, se continúa compacta
ción y relleno en predio 10-22^E, se realiza
figurado e instalación de acero para escaleras
centrales 10-24^E a 10-22^E en avance parcial

Vk Nda. Aut. 



04-05/22 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 08 ayudantes

01 local, 01 inspector, 01 operador
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividades: Se realiza figurado e instalacion
de acero para construccion de escaleras central
predios 10-23^E a 10-10^E, se realiza excavacion
figurado e instalacion de acero para zanja
muro 10-19^E, se continua excavacion muro predio
10-11^E, se realiza realce de piso predio 10-23^E 06-05/022
Se finaliza instalacion de geotextil y material
granular compactado para muros 10-23^E y 10-10^E



Ver in. Norte
06-05/022 Clima: ~~Despejado~~

Personal Contratista: 03 oficiales, 08 ayudantes
01 local, 01 inspector, 01 operador
Personal Interventoria: 01 residente tecnico, 01 residente
SST-MA, 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividades: Se finaliza figurado e instalacion
de acero para construccion de escaleras
se funda escalera central entre predios
10-29^E a 10-22^E concreto 3000 psi, se
realiza excavacion, figurado e

instalacion de acero para zarpa muro 10-17^E
y se realiza excavacion para muro 10-11^E
en avance parcial

16.05/2022
Ing. Andres Acosta
CIVIL

16-05/2022 clima: Nubiosas leves 08:00/09:30 y 15:00/16:00

Personal Contratista: 03 oficiales, 08 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalacion de acero para zarpas muros 10-17^E y 10-11^E, se inicia excavacion manual para escaleras tramo 2 entre predios 10-29^E a 10-22^E en tramo de avance parcial.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar mantenimiento al P.M.T.

Ing. Andres Acosta
Res. Obra

07-05/022	Clima: Lluvia moderada intermitente	10-05/022	Cli
	Personal Contratista: 03 oficiales, 08 ayudante		pers
	01 local, 01 inspector, 01 operador		01
	Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA		pers
	ACTIVIDADES: Se pinta concreto de 3000 psi		Ar
	para torres en predios 10-11 ^E y 10-17 ^E		de
			co
	Por las Mañanas		2
			3

09-05/022	Clima: Despejado		
	Personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes		
	01 local, 01 inspector, 01 operador		
	Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST		
	ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalaci-	11-05/022	
	on de acero para elevacion muro 10-11 ^E		
	Se continua excavacion manual y perfilado		
	por construccion escaleras tramo 2 10-22 ^E /10-29 ^E		
	Por las Mañanas		

10-05/022

Clima: Lluvia fuerte 13:00 / 17:00

Personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalacion
de acero para elevacion muro 10-11^E, se
continua excavacion manual para tramo 2
escaleras centrales predios 10-22^E y 10-24^E,
se realiza instalacion de cajillas de acue-
tidos de acueducto en tramo de avance parcialLa una nro. nro. nro.
Le Ofre

11-05/022

Clima: Despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realiza encofrado para
elevacion muro predio 10-17^E, se continua
excavacion manual en predio 10-11^E en
tramo de avance parcial, se realiza

cargue y retiro de material excavado

13-05/22

Andrés Aguirre
por OMR

12-05/22 Clima: despejado

personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

personal intercuatoria: 01 inspector, 01 inspector

Actividades: se funde concreto de 3000 psi

para descansar escaleras contacto izquierdo

Predios 10-28^E, 10-22^E y 10-29^E, se funde

viga de cierre descanso adyacente a predio

10-23^E, se funde concreto 3000 psi para zarpa

muro TS adyacente a predio 10-23^E, se

funde elevacion para muro predio 10-17^E

se funde zarpa en muro predio 10-11^E en 14-05/

concreto de 3000 psi


Andrés Aguirre

13-05/22

clima: lluvia leve mañana, tarde despejada
 Personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
 01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realiza alcido muro T5 en
 bloque para centro andén entre predios 10-16^E
 y 10-23^E, se inicia excavación manual y
 perfilado para zarpa muro central T5 entre
 predios 10-10^E y 10-17^E, se realiza relleno
 compactando con material de mejoramiento
 en descanso frente a predios 10-53^E y 10-47^E
 en avance parcial.



J. Ochoa



14-05/22

clima: despejado

personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
 01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: se funde concreto de 3000 psi
 para viga muro T2 predio 10-17^E y se funde

zarpa muro TS central entre predios 10-10^E y 10-17^E

Asesor
V.B. 15.05.22
[Signature]




15-05/22 Clima: Lluvia leve 07:00 / 08:30

personal contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
01 inspector, 02 boal, 01 operador

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-

Actividades: Se realiza grouting para muro
TS central entre predios 10-10^E y 10-17^E, se realiza
conformación y compactación de material granular
y se funde solado para escalera central
entre predios 10-16^E a 10-22^E

Asesor
V.B. 15.05.22
[Signature]



17-05/22 Clima: Despejado

personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

personal interventoria: 01 residente técnico, 01

residente SST-MA, 01 residente social, 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se continua conformacion para construcción de escalera central tramo 2 entre predios 10-29^E y 10-22^E y se funde concreto para solado, se continua instalacion de acero para elevacion muro predio 10-11^E.

OBSERVACIONES: En recorrido en obra se autoriza por parte de la supervision del contrato, la construcción de un muro T-1 para cierre del cv en la parte alta y para contencion de la via adyacente garantizando la correcta delimitacion del area a intervenir.

Va (NO) *Arce's Acost*

8.



18-05/07 clima: lluvia fuerte 08:00 / 15:30

Personal Contratista: 07 oficiales, 02 ayudantes 01 local, 01 inspector

Personal Interventoría: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se continua instalacion de

cajillas para acometidas de acueducto, se realiza conformación para construcciones, escaleras y decanados predios 10-16^E y 10-22^E, se continua instalación de acero para elevación muro predio 10-11^E.

V.º Andrés Astor

17-05/022

clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes 01 boal, 01 inspector

Personal Interventoria: Se continua instalación de cajillas para acometidas de acueducto, se continua conformación y compactación de relleno granular para escalera central predios 10-16^E a 10-23^E se finaliza instalación de acero y se realiza encofrado para elevación de muro predio 10-11^E en avance parcial.

V.º Andrés Astor

17-05-022 clima
Despejado
Es
Despejado
Se
Se
Se
1/6

21-05-022

20-05-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector

Personal Interventorica: 01 inspector, 01 inspector SUT-HA

ACTIVIDADES: Se funde cobido escalera central
y se inicia figurado e instalacion de acero
para escalera central entre piedad 10-16^E a 10-23^E
Se finaliza encapado para muro elevacion
Piedad 10-11^E

V. Luis Rios

21-05-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 operador

Personal Interventorica: 01 inspector, 01 inspector SUT-HA

ACTIVIDADES: Se funde concreto de 3000 psi para
elevacion muro piedad 10-11^E y viga 10-17^E

V. Luis Rios

23-05-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se continua instalacion de cajillas
para cajillas para acometidos red de acueducto
se funde solado para escalera central predios
10-16^E a 10-23^E, se inicia figurado e instalacion
de acero para escalera central predios entre
10-16^E y 10-23^E.

Ja. Adrián Hurt



24-05/022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se continua instalacion de cajillas
para acometidos de red de acueducto, se
funde solado predio 10-19^E escalera, se
inicia figurado e instalacion de acero
para escalera central entre predios

10-76 a 10-23^E en tramo de avance parcial.

✓ *Ing. Anselmi Rios*

25-05-022 Clima: Lluvia Moderada 09:30 / 11:30

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficial, 02 ayudantes, 01 boal
01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORA: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: Se continua figurada e instalacion
de acero para escaleras centrales entre predio
10-16^E y 10-23^E y acero para escalera predio
10-17^E en avance parcial.

✓ *Ing. Anselmi Rios*

26-05-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes, 01 boal
01 inspector, 01 operador

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORA: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de acero

y encofrado para escaleras y se funde
concreto de 3000 psi para escaleras centada
10-16^E a 10-23^E y predio 10-17^E

Vb Andrius
R-1 Cor



Acti
Per
Exc
de:

27-05/022 clima: despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SST 31-05/0

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de acero
para muro y zanja predio 87c-42sur, se
realiza conformacion y compactacion de material
granular e instalacion de geotextil para escale-
ra y descansos zona central predios 10-10^E a 10-11

Vb Andrius
R-1 Cor



28-05/022 clima: despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se continua instalacion de acero para muro y zarpa predio 87f-42^{sur}, se continua excavacion y conformacion para escalera y descansos zona central predios 10-10^e a 10-13^e en avance parcial.

Vb *[Signature]*

[Signature]

31-05/022 clima.: Despejado

Personal contratista.: 03 oficiales, 01 boal, 06 ayudantes 01 operador

Personal interventoria.: 01 inspector, 01 inspector SUMA

Actividad: Se finaliza instalacion de acero y Para muro zarpa predio 87c-42sur. Se continua -

Confirmacion y compactacion de material granular

e instalacion geotextil para escalera y descansos

Zona central predios 10-10E a 10-13E. Se realiza

instalacion de malla electrosoldada y se funde

concreto estampado tipo MR-41 Para andén

Predios 10-29E, 1035E y 10-41E

[Signature]

01-06-022 clima: Despejado
Personal contratista: 01 boal, 02 oficiales
01 inspector de obra.
Personal interventora: 01 inspector, 01 inspector sst
Actividad: Se finaliza confirmacion y compacta-
cion de material granular e instalacion de
geotextil para escalera y descansos zona central
predios 10-10E a 10-17E. Se realiza instalacion
de malla electrosoldada y se fonde concreto
estampado tipo MR-41 para andén predios
10-28E, 10-39E y 10-40E y 10-47.

✓. *Amos Fols*

02-06-022 clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector de obra, 01
boal, 02 oficiales
Personal interventora: 01 inspector, 01 inspector sst-11
Actividad: se inicia instalacion de acero para
vigas, escalera y descansos zona central predios
10-10E a 10-17E. Se realiza instalacion de malla
electrosoldada y se fonde concreto estampado
tipo MR-41 para andén predios 10-23E, 10-17E,
10-10E, 10-27E y 10-16E.

✓. *Amos Fols*

03-06-022 clim
perse
01
Pers
A
ace
zor

04-06-022 Cl
o
F
A
F

06-06-022

- 03-06-022 clima: Lluvias intermitentes todo el día
 Personal contratista: 01 inspector de obra,
 01 boal, 02 oficiales
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA
 Actividad: Se continua la instalacion de
 acero para vigas, escalera y descansos
 Zona Central Piedras 10-10E a 10-17E
 V. *[Signature]* *[Signature]*
- 04-06-022 Clima: Despejado
 Personal contratista: 01 inspector de obra
 01 boal, 02 oficiales
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA
 Actividad: Se continua instalacion de acero
 para escalera y descansos zona central Piedras
 10-10E a 10-17E
 V. *[Signature]* *[Signature]*
- 06-06-022 clima: Lluvia fuerte 15:20 / 17:00
 Personal contratista: 01 inspector de obra, 01
 boal, 02 oficiales
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA
 Actividad: Se continua instalacion de acero y encofrado
 para vigas, escalera y descansos zona central

Medios 10-10E a 10-17E

07-06-022 clima

07-06-022 clima: Lluvias 12:50 / 13:00

Personal contratista: 01 inspector de obra

01 bnd, 02 oficiales

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Se Funde concreto 300psi escalera Zona

central Medios 10-10E a 10-17E, concreto en 2chPa.

T-5, Frente a Casas 10-46E y 10-53E

10-06-022 cl

V. Andrés Arce

08-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 01 bnd, 02 oficiales

06 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Se inicia excavacion manual para muro

T4 parte alta de civ aprobado por la Supervision del contrato.

V. Andrés Arce

09-06-022

Clima: Lluvia fuerte 12:30 / 13:00

Personal Contratista: 01 inspector, 01 local, 01 operador
02 oficiales, 06 ayudantes

Personal Interventora: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: Se continua excavacion manual

Para muro T+ Parte alta del civ.

V. Andres P. A. S. L.

06-022

Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 local, 01 operador
02 oficiales, 06 ayudantes

Personal Interventora: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: continua excavacion manual para

Zarpa de muro T-1 en la parte alta del

Segmento vial, Frente a casas 10-46E / 10-53E

Y armado de parrilla para Zarpa T-1

V. Andres P. A. S. L.

11-06-022

clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 01 boal, 01 operador
02 oficiales, 06 ayudantes, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Concreto Para zapata T-1, Frente a
casas 10-46E/10-53E, Concreto en descansos,

casas 10-10E/10-17E y 10-16E/10-23E

15-06-022

U. Andres Bello

13-06-022

clima: Lluvias intermitentes

Personal contratista: 01 inspector, 01 boal, 01 operador
02 oficiales, 06 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

actividad: armado de acero para alzado de
muro en la parte alta del segmento vial

U. Andres Bello

16-06-

14-06-022

clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 01 boal
01 operador, 02 oficiales, 05 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividades: excavacion mecanica para en la

calzada. Armado de acero de refuerzo para vigas de escaleras. Armado de acero de refuerzo en alzado de Muro T-1.

V. Andrés G. S. L.

15-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales, 08 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector STHA

Actividades: excavación manual para estructura en la calzada. Parete de cayas domiciliarias de aguas negras. Reparación de fuga de agua en terraza construida en casa 10-29E.

V. Andrés G. S. L.

16-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales, 08 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SS

Actividades: construcción muro T-5 en bloque estructural, 10-46E/10-53E. Excavación manual para reparar fuga de agua potable, 10-29E.

Relleno terrazas, material de mejoramiento, 10-26
Armado de acero de refuerzo para zapata,
870-92.

V. A. L. J. S. L.

Insta
Vo

17-06-022 clima: Lluvias de 10:15 / 11:35
Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
08 ayudantes, 01 operador
Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: Armado de acero e instalacion
de formaleta para muro T-1, 10-46E/10-53E.
Armado de acero para zapata, 870-925.

V. A. L. J. S. L.

18-06-022 clima: Despejado
Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
08 ayudantes, 01 operador, 01 boal
Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: Instalacion de formaletas para muros
T-1, 10-46E/10-53E, Relleno y compactacion en anden
10-29E, donde se ejecuto reparacion de fugas
de agua. Armado de acero de refuerzo e

06-08-022

Per
01
Per
01
G

instalacion de formaleta para muro, 87c-42s

Vb. Andres Flores



08-02 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 02 oficiales
08 ayudantes, 01 operarios, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSR

Actividades: Se funde concreto de 3000 psi
para alzado de muro 10-46^E y 10-53^E y alzado
de muro medio 87c-42sur.

Vb. Andres Flores



08-02 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografico, 01 boal
01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: Se continua puesta de zocales y
continuan con remates concretos de muros y calzada

Vb.

Comité de Supervision de Obra



08-08-022 Clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial
02 ayudantes
Personal Interventora: 01 inspector tecnico
Actividades: se realiza lavado con hidrolavadora y asco general, se continua con pañete de zocalos y remates de concreto 11-08-
Vbo
Camilleto
Residente de obra



09-08-022 Clima: Lloviznas leves intermitentes
Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial
02 ayudantes
Personal Interventora: 01 inspector tecnico
Actividades: se continua pañete de zocalos y remates generales en escaleras y muros. 12-08-
Vbo
Camilleto
Residente de obra



10-08-022 Clima: Lloviznas leves intermitentes
Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial, 01 ayudante, 01 boral

Actividades: Continúan remates, acabados generales y se continúa pañete de zocalos en escaleros y muros

Visto
C. M. G. G. G.
Residente de obra



11-08-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo, 01 oficial
01 ayudante, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: Continúan con remates en muros de concreto y escaleros, se continúa con pañetes de zocalos

Visto
C. M. G. G. G.
Residente de obra



12-08-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo, 01 oficial
01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: Continúan con remates en muros y escaleros, se continúa pañete de zocalos

Visto
C. M. G. G. G.
Residente de obra



13-08-022 clima: despejado

personal contratista: 01 inspector topografico, 01 oficial
01 ayudante

personal interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: Continuan remates de muros y escaleras
en concreto.

Uso
Civillan
Residente de obra



15971

5003567

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.



☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

478

08-01/22 Se da inicio con el lavado de las redes sanitaria y pluvial con bactor.

CIV: 5003561

Clima: seco y soleado

Personal: Inspector. Maquinaria: Bactor.


Roderick C. Cordero

11-01/22 Se adelanto la inspección con camara CCTV de las redes sanitaria y pluvial.

Clima: Seco y soleado


Personal: Inspector.


Roderick C. Cordero

12-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 1 boal

Se da inicio a la instalacion de la madera rolliza para el cerramiento.


Roderick C. Cordero

14-02/22 Clima seco y soleado en las horas de la mañana
 lluvias fuertes despues de las 3:00 p.m.

Personal: Inspector, 3 Ayudantes, topografos 3
 Instalacion de madera rolliza para cerramiento.
 Nivelacion y seccionamiento de via.

- Mantenimiento a cerramientos, señalizaciones de material, orden caso y limpieza en campamento y frente de obra, Puntos de hidratación, comida y extintor señalizados, senderos peatonales garantizados - Nelson Torres Paz Ambiental

Nelson Torres

15-02-22 Se mantiene cerramiento y sendero peatonal, se ajustan estalones de senderos peatonales, señalización PNT al día, orden caso y limpieza, carga de RCD adecuada, Verificación continua a personal de obra, EPP's

Nelson Torres - Paz Ambiental ; Marcelo Caceres

Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 3 Topografos, 1 local.
 Se continua con la instalacion del cerramiento, nivelacion y seccionamiento de via.

Nelson Torres

16-02-2022

Mantenimiento a cementerios con polisorbia, diseño de baches para acceso del frente de obra; Orden uso y limpieza general, PNT implementado. Se reemplazan algunos EPP's, tomas de síntomas a personal en obra.

Manuel Torres - Res. Ambiental

Marcela Caceres

Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 3 Topógrafos, 1 local

Instalación de cerramiento. Nivelación y seccionamiento de vía.

Pendiente Obra



19-2-2022

Mantenimiento orden uso y limpieza general en frente de obra, Insumos, insumos laborales cubiertos; PNT implementado; Toma de síntomas con adecuado de EPP de personal de obra.

Manuel Torres - Res. Ambiental

Marcela Caceres

Clima seco y soleado

Pendiente Obra



18-01-2022

Se realiza mantenimiento a circuitos del prete de obra; PMT implementado, jornada de alto orden y limpieza, material acilado de resina para de sistemas y verificación de EPP en trabajadores.

Nemes Torres - PDI Ambiental

Marcela Catano

Clima seco en la mañana. Lluvias en las horas de la tarde.

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, cadenero, 1 boal.

Construcción escaleras en madera senderos peatonales. Excavación mecánica caja vía. Retiro material excavado para disposición final. Maquinaria: Retroexcavadora y volquetes.

Perchlor de obra

19-02-2022

Cerramiento adecuados en zona de intervención, señalización adecuada, senderos peatonales garantizados; PMT implementado, jornada de alto orden y limpieza; Verificación de personal uso adecuado de EPP y sistemas de

Nemes Torres - PDI Ambiental

Marcela Catano

Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, cadenero, 1 boal.

Construcción escaleras en madera senderos peatonales. Excavación mecánica caja vía. Retiro material excavado para disposición final. Suministro de BGR-PA. Maquinaria: Retroexcavadora y volquetas

Reserva Ch

21-02-2022 Implementación de PMT; mantenimiento a cerramientos y senderos peatonales orden aseo y limpieza a componente, Señalización a material, Verificación y uso adecuado de EPP, Verificación de síntomas

Manuel Torres - Res. Ambiental. Marcela Catano.

La noche anterior llovió fuertemente generando saturación del terreno por tal razón se inician actividades después de las 11:00 a.m.

Personal: Inspector, Cadenero, 3 Ayudantes, 2 boch.

Maquinaria: Retroexcavadora y volquetas. Excavación mecánica. Retiro y disposición final de escombros. Suministro base granular

Reserva Ch

27-02-2022 Jornada de aseo y limpieza; Implementación de PMT; Punto ecológico, Área de hidratación, casilla rectoría y baños sanitizados. Material desinfectante e insumos aseo estrictos. Manuel Torres - Res. Ambiental.

Toma de síntomas a trabajadoras en obra - pausas activas -- Marcela Catano

Clima seco y soleado

Personal: Inspector, Cadenero, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 boal.
 Maquinaria: Retroexcavadora y volquetas. Excavación
 mecánica y disposición final de escombros.

[Signature]

23-02-22

Mantenimiento a cornisas, sanderas peatonales y escaleras; Limpieza
 RCD y descarga de material; orden, uso y limpieza; implementación
 de PNT; Toma de síntomas COVID y verificación de uso adecuado
 de EPP. Manuel Torres - Eco-Ambiental - Marcela Coto

Clima seco parcialmente soleado.

Maquinaria: Retroexcavadora y volquetas. Excavación me-
 cánica, disposición final de escombros.

Personal: Inspector, Cadenero, 2 Ayudantes, 1 boal.

[Signature]

14-02-22

Implementación de PNT; Orden, uso y limpieza en campamento; Seali-
 zación de arboles y material; Mantenimiento a escombros, canilla, es-
 tator y canilla aislantes; Mantenimiento a sanderas peatonales y

Estaciones, corte de RCD. Manual Tronco. Res. Ambiental
Horcela Catón

Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, Cadenero, 2 Ayudantes, 1 local.

Maquinaria: Retroexcavadora y volquetas. Excavación mecánica.

Retro RCD para disposición final. Suministro de bas. granular
reciclado.

Ferdinando Obispo

22-07-22

Verificación de sistemas COVID, uso adecuado de EPP y repuestos, repintados
ambulatorios, Muestreros o cerramientos y senderos peatonales; Corte de

RCD y disposición de material.

Manual Tronco. Res. Ambiental. Horcela Catón

Tiempo seco parcialmente soleado en la mañana. Lluvia fuerte
puerto después de 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. generando
saturación del terreno y empapamientos de agua.

Personal: Inspector, cadenero, 2 Ayudantes, Operario, 1 local.

Maquinaria: Retroexcavadora - volqueta.

Excavación mecánica. Retro RCD para disposición final.

Ferdinando Obispo

26-02/22 Clima seco parcialmente soleado
 Personal: Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, Operario
 Maquinaria: Retroexcavadora y Volqueta.
 Excavacion mecanica y retiro RCD para disposicion
 final.

Ferdinand Obr

28-02/22 Clima seco en las horas de la mañana. Lluvia de
 2:45 p.m - 3:30 p.m.
 Personal: Inspector, cadenero, 1 Ayudante, 1 Boal.
 Se continua con la excavacion mecanica y perfilada
 manual, retiro RCD para disposicion final.


Ferdinand Obr

01-03-2022 CLIMA: Lluvias 07:00 - 09:00
 PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 01 oficial
 01 topografo, 01 cadenero, 01 boal
 PERSONAL INTERVENCIONISTA: 01 inspector SST-MA, 01
 inspector tecnico, 01 residente social, 01 residente

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se continúa excavación mecánica y perfilado para la vía en avance parcial, se realiza reparación de acometida de gas por operarios Vanti, suministro y extendido de material granular en avance parcial KOTOYO a KOTOS.

Se realizó mantenimiento a cerramientos y senderos peatonales, cargue de RCD y cargue de material. Se realizó la toma de síntomas cardiovascular y se verificó uso de EPP así como del PMT que se encuentra completo.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

02-03-22 CLIMA. DESPEJADO

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 01 oficial, 01 BOAL.

Se continúa excavación mecánica, manual y perfilado para la vía avance parcial y retiro de sobrantes

Se realizó mantenimiento a cerramientos y accesos viales. Se realizó el cargue de RCD y disposición de material. Se verificaron síntomas y se evidenció el uso adecuado de EPP. Se evidenció PMT instalado y completo.

Jordan Acosta
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

03-03-22 CLIMA: DESPEJADO

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 01 Oficial, 01 BOAL.

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 Inspector SST-MA, 01 Inspector técnico

Se continúa excavación manual y perfilado para la vía avance parcial y suministro de material granular para mejoramiento.

Se solicita al contratista mantenimiento de la palisombra debido a perfilamiento,

se realizó mantenimiento de accesos a viviendas. Se realizó toma de síntomas covid y verificación de EPP.

Andrés Restrepo
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

04-03-22 CLIMA: DESPESADO

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 01 oficial,
01 BOAL

Actividades Ejecutadas: Se continua excavación manual y perfilado para la vía avance parcial y suministro de material granular para mejoramiento

Se realizó descargue de material en el frente de obra y se realizó mantenimiento a los accesos a viviendas.

Andrés Restrepo
FIRMA CONTRATISTA


FIRMA INTERVENTORIA.

25-03-22 TIEMPO WORK

PERSONAL Y OPERARIO Y OFICIAL.

2 AYUDANTES 1 BOAL 1 INSPECTOR SST -
AMBIENTAL - TECNICO - RESIDENTE.

Se trabajó en actividades de
 extendida de material de mejoramiento
 y compactación en zona canteo del
 Segmento, en parte baja se trabajó en
 retiro de material producto de excavación,
 se realizó aseo general de obra,
 mejoramiento de cercamientos y accesos.



Andrés Rojas
 Gerente de Obra

07-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 01 oficial,
01 BOALPERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico,
01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se finaliza excavación manual y perfilado de la vía y se continúa suministro de material granular para mejoramiento avance K0+091/020. Se realiza reparación de ductería de redes secas afectada durante procesos de excavación en K0+080.

El día de hoy el sitio de disposición final. Notifica que no habrá atención ya que se encuentra en Hto.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas

Informamos las operaciones de Ficala y Turquesa se encuentran suspendidas el día de hoy 2 de marzo, en lo que se realiza mantenimiento de pátios, estaremos informando de reanudarse en el transcurso del día y no presentarse mayores afectaciones por el clima.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realiza Hto cerramiento, Limpieza, orden y aseo en el frente de obra

Se realiza implementación Protocolo de Bioseguridad.
Pdte k

Re. SST. Combati.

8-05-22

Se notifica que el sitio de disposición final para RCD se encuentra sin servicio debido a las condiciones climáticas de la semana.



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas durante esta semana

Informamos las operaciones de Fiscala y Tunjuelo se encontrarán susp de 2022, en lo que se realiza mantenimiento de patios y adecuaciones

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realiza mantenimiento a cerramientos, senderos peatonales y escaleras; Jornada de orden, limpieza y aseo; Campamento organizando. - Manuel Torres Res. Ambientales.

Se realiza registro de síntomas COVID y verificación de uso adecuado de EPP.

Ver INE AND24

Personal de obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, Topografo, cadenero, Inspector, 1 boal, 2 Operarios.

Clima: Lero parcialmente soleado.

Actividades: Cerec y compactacion de base granular.

Excavacion manual e instalacion ductos 4" pvc telefonico. Se cambiaron los dos ductos superiores.

Releno de excavacion con arena de peña, sobre la ducteria

Va con Asesor
CVR

09-03/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal de obra: Topografo, cadenero, 1 Ayudante, 1 boal, Inspector, 2 Operarios.

Actividades: Cerec y compactacion de base granular reciclada.

Retiro material de escombros para disposicion final.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista verificar la actividad de mejoramiento en desarrollo ya que se presentan acolchonamientos en varias zonas del area intervenida.

Va con Asesor Asesor

10-03/22 Clima seco parcialmente soleado en las horas de la mañana. Lluvia fuertes despues de las 2:40 p.m. suspension de actividades.

Personal de obra: Topografo, cadenero, 1 Ayudante, 1 boal, Inspector, 2 Operarios.

Actividades: Cerec y compactacion de base granular.

OBSERVACIONES: Se reitera realizar verificaciones y correccion de los acopleamientos mientras pros- 14
tados sobre el material de mejoramiento instalado.
Se define observancia.

Va no A. deli A. deli

11-03/22 Clima seco, parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, Topografo, cadenero, 1 boal, 2 operarios.

Actividades: Cerec y compactacion de base granular via.

Se solicita realizar mantenimientos periodicos al cerramiento perimetral y accesos a viviendas.

Va A. deli A. deli

12-03/22 Clima seco, parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, 1 Operador.

Actividades: Compactación de base granular vía.

No se realizó trabajo

14-03/22 Clima: despejado

Personal de obra: 01 inspector, 01 operador

Actividades: Se continúa compactación de material granular de mejoramiento instalado en tramo de avance parcial

No se realizó trabajo

15-03/22 Clima: despejado - Lluvia 11:25 / 14:10

Personal de obra: 01 inspector, 01 operador

Actividades: Se continúa compactación de material granular de mejoramiento en tramo de avance parcial

OBSERVACIONES: Se solicita realizar la

adecuación y mantenimiento de accesos a viviendas ya que se evidencian en regular estado y algunos sueltos o mal anclados.

Va por parte de

6-03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 operador, 01 boal

Personal interventoria: 01 inspector - 01 inspector SPT-MA

Actividades: se continua compactación de material de mejoramiento en avance parcial.

Va por parte de

03/022 Clima: despejado.

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador
01 oficial, 01 ayudante, 01 boal

Actividades: Se realiza compactación de material de mejoramiento en bombas de la vía y se realiza toma de densidades

por parte del contratista #4 notoso 100%
#3 notoso 97.1%, #2 notoso 100% y #1
notoso 99.2%. se realiza instalacion de
geotextil en tramo de avance parcial, se
inicia suministro de material granular tipo PEA.

V. M. Andrés Arce

18-03/2022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador, 01 oficial
01 boal, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SAT-RA

Actividades: se continua instalacion de geotextil
y se continua suministro de material granular
tipo PEA en avance parcial

V. M. Andrés Arce
JCV

14-03/2022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador

01 ayudante, 01 topografo

Personal Interventoria: 01 inspector 307-MA, 01 inspector de obra

Actividades: Se realiza extendido y compactacion de material granular tipo PEA en tramo de avance parcial.

Va cos. Ind. Aut.

22-03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 cadenero, 01 ayudante, 01 boal, 01 operador

Personal Interventoria: Se continua extendido y compactacion de material granular tipo PEA

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar la compactacion con conguia sobre los hombros de la via para garantizar las densidades en dichas zonas.

for. Arto. Aut.

23-03/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 cadenero, 01 oficial
01 ayudante, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: No se evidencian actividades,

OBSERVACIONES: Se realiza toma de densidades por
interventoria #5 K01060 98.55% y #4 K01030 97.08%

Va. Rdr. Aceto

24-03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador, 1 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: se continua conformacion de material
granular tipo P6A en avance parcial.

Va. Rdr. Aceto

25-03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector ~~ST-AD~~
 Actividades: Se continua extendido y conformacion
 de material granular FCA en avance parcial.

V. Rodriguez

26-03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 operador, 01 bol

Personal Interventoria: 01 residente, 01 inspector

Actividades: Se continua extendido y conformacion 24
 de material granular FCA en avance parcial

Observaciones: Se solicita al contratista garantizar
 la compactacion de la zonas de hombre ya que
 se evidencian zonas sin compactar.

V. Rodriguez

28/03/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 ayudante, 01 operador, 01
 bol, 01 operador, 01 cadenero

Personal Interventoria: El inspector SST-MA, el inspector
Actividades: Se continua conformacion y compactacion
de material granular tipo PEA en avance parcial
OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar
mantenimiento periodico al cerramiento perimetral
y accesos temporales a viviendas
Se afunde solicitud per interventoria.

V/a Raulo Rast
B

24/03/2022 Chimo: despejado

Actividades ejecutadas: Se continua compactacion
de material granular PEA y se inicia demolicion
de concreto en anden izquierdo norte en avance parcial
Personal Contratista: 01 oficial, 01 ayudante, 01 boal
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
OBSERVACIONES: Se solicita al contratista proteger el
material granular de la via para evitar su contaminacion
con material de demolicion y excavacion del anden.

V/a Raulo Rast
B

30-03/022 clima: despejado
 Personal de obra: 01 cadenero, 01 topografo
 01 oficial, 02 ayudantes, 01 boal
 Personal interventoria: 01 topografo, 01 cadenero
 01 residente SST-MA, 01 residente tecnico, 01
 inspector SST-MA, 01 inspector tecnico
 Actividades: Se continua demolicion de concreto
 en anden costado izquierdo en avance parcial
 Va Ande Past

31-03/022 clima: despejado
 Personal de obra: 01 topografo, 01 cadenero
 01 oficial, 02 ayudantes, 01 boal
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
 Actividades: Se continua demolicion de
 anden en concreto y excavacion manual en
 avance parcial costado izquierdo.
 Va Ande Past

21-01/22

Clima: despejado

Personal Contratista: 01 oficial, 03 ayudantes, 01
bual, 01 operador, 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: Se continuo demolicion de andes
y excavacion manual costado izquierdo
en tramo de avance parcial.

Vº en Blat. Pae


21-04/22

Clima: despejado

Personal Contratista: 01 oficial, 03 ayudantes, 01
bual, 01 operador, 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: Se continua demolicion de concreto
y excavacion manual en andes costado izquierdo
en tramo de avance parcial.

Vº en Blat. Pae


04.04/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 oficial, 03 ayudantes
01 boal, 01 operador, 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: se continua demolicion de andenes
concreto y excavacion manual en costado
izquierdo tramo de avance parcial

06.04/01

Observaciones: Se solicita al contratista
corregir los accesos temporales a vivienda

✓ a LV Andes Fort -


05.04/022 clima: despejado

Personal contratista: 01 oficial, 03 ayudantes
01 boal, 01 operador, 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continua demolicion de concreto
en andenes y excavacion manual en ambos
costados en tramo de avance parcial

Observaciones: se solicita al contratista
implementar pases peatonales debidamente

07.04/1

señalizadas libres de obstáculos.

V_h (r) Rda. Acosta

06-04/022 clima: despejado

personal contratista: 01 oficial, 03 ayudantes, 01
basil, 01 operador, 01 inspector topografo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector
SST-MA, 01 residente tecnico, 01 residente SST-MA
01 inspector topografo, 01 cadenero

Actividades: Se realiza revision topografica por
la comision de interventoria en conjunto con
la comision del contratista. Se continua
demolicion y excavacion manual en cimientos
en ambos costados en avance parcial.

V_h (r) Rda. Acosta

07-04/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 oficial, 05 ayudantes

01 boal, 01 operador, 01 inspector topografo
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: Se continua demolicion de andenes
 en concreto y excavacion manual en ambos
 costados en avance parcial.

✓/01 MS Andes Aroba

[Signature]

11

08-04/022 clima: despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo
 01 oficial, 03 ayudantes, 01 operador, 1 boal
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: Se continua demolicion de
 andenes y excavacion manual avance parcial


✓/01 MS Andes Aroba

09-04/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 cadenero, 01 inspector
 01 oficial, 03 ayudantes, 01 operador, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua demolicion de concreto en andén y excavacion manual en ambas costados en tramo de avance parcial.


Carlos Amador

11-04/022 Clima: despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo, 01 cardenero, 01 oficial, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se finaliza demolicion y excavacion manual en andén para ambas costados.

Se realiza replanteo y se inicia excavacion para muros costado izquierdo en predios 70-70^E, 70-64^E y 70-60^E en tramo de avance parcial.


Carlos Amador


12-04/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo
01 cadenero, 01 oficial, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continua excavacion manual
para muros costado izquierdo en avance
parcial para predios 70-70^E, 70-64^E y 70-60^E

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista
realizar mantenimiento a los componentes del
PMT, a su vez realizar la implementacion 18-04/18
adecuacion de los accesos a viviendas.


J. R. R. R.

13-04/022 clima: despejado


Personal Contratista: 01 inspector topografo
01 cadenero, 01 oficial, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continua excavacion manual
para construccion de muros en predios
70-60^E, 70-64^E y 70-60^E en tramo de

avance parcial,

OBSERVACIONES: Se reitera al contratista realizar la implementacion adecuada de los accesos a vivienda los cuales no garantizan un paso seguro para los residentes.


John Arch


8-04/07 Clima: Lluvia Fuerte 04:30 pm a 05:30 pm

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero, 02 oficiales, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SITMA

Actividades: Se continua excavacion de zarfos y dentellones para construccion de muros entre predios 70-70^E a 70-60^E en avance parcial

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar mantenimiento a los componentes del PHT


John Arch

19-04/022 Clima: Lluvia moderada 11:30 a 17:00
 Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01
 cardenero, 02 oficiales, 04 ayudantes, 01 bol
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST/MA
 ACTIVIDADES: Se continua excavacion manual
 para zarpos para construccion de muros,
 se punde salado en dentellon y zarpos muros
 predios 7D-64^E y 7D-70^E

Vd 11-6 Nube

20-04/022 Clima: lluviznos 07:00 a 11:15 am
 Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01
 cardenero, 02 oficiales, 05 ayudantes, 01 bol
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 SST-MA, 01 residente tecnico, 01 residente MA
 ACTIVIDADES: Se continua excavacion y
 perfilado manual para construccion de
 muros predios 7D-64 a 7D-70^E, se inicia
 figurado de acero para muro 7D-64^E
 OBSERVACIONES:

- Se autoriza por parte de la supervisión de la CVP el cambio de muros T5 a muros T1 manteniendo los niveles descritos en los diseños.
- Se autoriza la construcción de muro adicional costado derecho predio 7D-69^E ya que en diseños no se contempla el cambio de nivel por lo cual, se requiere un muro adicional el cual es aprobado por la supervisión de la CVP sin embargo, el tipo de muro a ejecutar se determinará en campo de acuerdo a la nivelación del terreno y la altura del mismo.

1015 Radio-Post

21-04/027	clima: despejado
-----------	------------------

personal Contratista: 01 inspector topógrafo, 01
cadenero, 02 oficiales, 03 ayudantes, 01 local
personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: Se continua figurada e instalacion de acero para muro 70-64² y se funde zarpa en concreto de 3000 psi zarpa y dentellon.

se continua excavacion manual para muros en avance parcial

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar el retiro del agua empozada en las excavaciones con atelacion a la fundida del elemento.

✓ A las 10:00 hrs

22-04/022 clima: Lloviznas 07:00 a 08:00

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero, 04 oficiales, 02 ayudantes, 02 local

Personal Interventora: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalacion de acero para muro 70-64^E y se continua excavacion manual para muros avance parcial. realiza orden y aseo general.

✓ A las 10:00 hrs

25-04/02

Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero, 04 oficiales, 02 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalacion de acero para muros 70-64^E y 70-70^E y se continua excavacion manual para muros averse parcial

[Signature]

25-04/02

Clima: Choviznos 07:00 / 11:30

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero, 03 oficiales, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continua figurado e instalacion de acero para muros 70-70^E, 70-64^E y 70-60^E y Se continua excavacion manual para muros.

[Signature]

26-04/22 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo
01 cadenero, 03 oficiales, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continua instalacion de acero para muros predios 70-60^E y 70-70^E y se funden zargos y dentellones en concreto de 3000 psi, se continua excavacion para muros en avance parcial.

28-04/22

1/4 Asa. Ant. ta

27-04/22 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo
01 cadenero, 03 oficiales, 04 ayudantes, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: se continua excavacion manual para muros costado izquierdo y se inicia encofrado para elevaciones predio 70-64B

OBSERVACIONES: se solicita al contratista realizar la implementacion del PMP conforme a lo

aprobado por la SDH, a su vez se solicita garantizar la permanencia del personal auxiliar de trafico y contar con el COZ publicado en el frente de obra del PHT vigente.

U^o Ing. Nohelí A. A.

28-04/22

Clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 04 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se continua instalacion de acero para muros preslios 70-60^E elevaciones y 70-58^E Zarpa y elevaciones, se continua excavacion manual y perfilado para muros 70-52^E, 70-50^E y 70-44^E. Se realiza encofrado para elevaciones muro piedio 70-63^E avance parcial.

U^o Andri Acuña

29-04/022 Clima: Lluvias moderadas 08:35 / 10:30

Personal Contratista: 02 oficiales, 04 ayudantes
01 boal, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector sst

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de acero para muros predio 70-58^E elevaciones y se funda zapata en concreto de 3000 psi, se continua excavacion y perfilado para muros 70-40^E, 70-50^E y 70-44^E. se realiza encofrado para elevaciones muro predio 70-63^E

02-05/022

Vn. Ndir Ndir

30-04/022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 04 ayudantes
01 boal, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector sst


ACTIVIDADES: Se continua perfilado y excavacion manual para muros, se continua encofrado para elevaciones predio 70-63^E

03-05/022

OBSERVACIONES: se solicita al contratista

implementar accesos temporales seguros ya que se evidenciaron algunos predios sin los mismos

Vn Andri Acosta



02-05/22 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

personal interventoria: 01 inspectores, 01 inspector SST

Actividades: Se realiza instalacion de acero para muro predio 70-52^e elevaciones y zarpa. Se continua excavacion y perfilado para muros 70-40^e - 70-50^e y 70-44^e. Se realiza encopado para elevacion muro predio 70-70^e.

Vn Andri Acosta



03-05/22 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

implementar accesos temporales seguros ya que se evidencian algunos predios sin los mismos

Vn. Andre Acosta



02-05/022 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se realiza instalacion de acero para muro predio 70-52^E elevaciones y zarpa. Se continua excavacion y perfilado para muros 70-40^E - 70-50^E y 70-44^E. Se realiza encofrado para elevacion muro predio 70-70^E.

Vn. Andre Acosta



03-05/022 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

Personal intervectoria: 01 inspector, 01 inspector
Actividades: Se funde zarpa muro predio
70-52^E en concreto 3000 psi y se funden
elevaciones 70-70^E y 70-64^E, se continua
excavacion manual para muros avance parcial
J. Andres Jua de



Ja Naldi Auto

04-05/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo,
03 oficiales, 05 ayudantes, 01 boal

Personal intervectoria: 01 inspector, 01 inspector

Actividades: Se realiza instalacion de
acero para predio 70-50^E elevacion y zarpa,
Se continua excavacion y perfilado para
muros 70-40^E, 70-50^E, 70-44^E y 70-43^E, se
realiza encofrado elevacion muro predio 70-60^E

Ja Naldi Auto



337 05-05/22 clima: lluvia Fuerte 07:30 / 10:40
 2 Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
 01 boal, 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
 Actividades: Se realiza instalación de acero
 para muro predio 70-50^E elevaciones y zapa, se
 continua excavación y perfilado para muros de
 predios 70-40^E, 70-50^E, 70-44^E y 70-43^E, se realiza
 encofrado para elevaciones muro predio 70-60^E
 Observaciones: Se evidencia ausencia de cerro-
 miento perimetral en polísombra, se solicita
 al contratista subsanar el hallazgo conforme
 a lo establecido dentro de PMT.

Vo. Rm. 2 *[Firma]*



3 06-05/22 clima: Lluvias 08:00/09:30 y 14:00/17:00
 Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
 01 boal, 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
 Actividades: Se funde de 3000 psi para

elevaciones en predios 70-60^E, 70-58^E y 70-52^E
se funde en concreto de 3000 psi para
zarpa muro predio 70-50^E, se continua
excavacion manual para muros costado
izquierdo en avance parcial

Vs. Andres J. Huete



07-05/022 Clima: Lluvia permanente todo el dia
Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero
Personal Interventoria: 01 inspector SST, 01 inspector
ACTIVIDADES: Se realiza retiro de pormen
predios 70-52^E, 70-58^E y 70-60^E, se realiza
instalacion de acero para elevaciones mu-
predio 70-50^E en avance parcial, se
realiza cargue y retiro de material excavado

Vs. Andres J. Huete



09-05/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 boal, 01 cadenero, 01 inspector, 03 oficiales, 03 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector SST, 01 inspector

ACTIVIDADES: Se realiza figurado e instalacion de acero para muros predios 70-40^E y 70-44^E, se inicia encofrado para elevacion muro predio 70-50^E en avance parcial.

J. Puntos Pash



10-05/022 clima: Lluvia fuerte 13:00 / 17:00

Personal Contratista: 01 boal, 01 cadenero, 01 inspector 03 oficiales, 03 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: Se continua figurado e instalacion de acero para elevaciones y zarpas muros predios 70-40 y 70-44^E, se continua encofrado para elevacion muro predio 70-50^E, se continua excavacion para muros costado izquierdo y se inicia instalacion de

gradren muros 70-60^E, 70-64^E y 70-70^E en
avance parcial.

U. Andrés Bello



11-05/022 clima: Despejado

personal Contratista: 01 boal, 01 cadenero, 01
inspector, 03 oficiales, 03 ayudantes

13-05/022

personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se funde concreto de 3000 psi para
elevación muro predio 70-50^E y se funden
zarpas para predios 70-40^E y 70-44^E, se continúa
excavación para muros costado izquierdo avance parcial

U. Andrés Bello



12-05/022 clima: Despejado

personal Contratista: 02 boal, 01 cadenero
01 inspector, 03 oficiales, 03 ayudantes

14-05/

personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se continua excavacion manual para muros costado izquierdo para predios 70-32^E y 70-28^E, se funke solado de limpieza para tarpa y dentellon predio 70-34^E

Vd. Andres Fuenti

13-05/022 Clima: lluvia en la mañana, tarde despejada
Personal Contratista: 02 local, 01 cadenero, 01 inspector
03 oficiales, 03 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector SST, 01 inspector

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de encofrado para muro predio 70-44^E y se continua excavacion para muros costado izquierdo predio 70-^E en avance parcial.

Vd. Andres Fuenti

14-05/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 02 local, 01 cadenero, 01 inspector

03 oficiales, 05 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector SST - 01 inspector

Actividades: Se funde concreto de 3000 psi para elevaciones muros predios 70-40^E y 70-44^E se funde concreto de 3000 psi para zarpa muro predio 70-34^E y se realiza excavacion manual para muro predio 70-28^E avance parcial.

Vs. Andres J. J.



16-05/022 Clima: Lluvia leve 07:00 / 08:30

Personal Contratista: 03 oficiales, 05 ayudantes, 01 boal, 01 inspector, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se realiza instalacion de acero y encofrado para muro predio 70-34^E elevaciones y zarpa, se continua excavacion y perfilado para muros 70-32^E, 70-28^E, 70-22^E, 70-43^E y 70-16^E, se continua instalacion de geotextil y relleno compactado posterior para muros 70-70^E, 70-64^E, 70-60^E, 70-58^E, 70-52^E, 70-50^E, 70-44^E

y 70-40^E en tramo de avance parcial.

V. Andrés Flores



7-05/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 04 oficiales, 06 ayudantes
02 boal, 01 inspector, 01 cadenero, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector SIT, 01 inspector

ACTIVIDADES: Se realiza instalación de acero y encofrado para muro preclia 70-34^E elevaciones y zarpa, se continua excavacion y perfilado para muros 70-32^E, 70-28^E, 70-22^E y 70-16^E, se realiza instalacion de geodren y relleno granular compactado para muros 70-70^E, 70-64^E, 70-60^E, 70-58^E, 70-52^E, 70-50^E, 70-44^E y 70-40^E, se inicia construccion de cajas para acometidas de alcantarillado en avance parcial cotado izquierdo.

V. Andrés Flores




18-05-022 Clima: Lluvias fuertes 08:00 / 15:00

Personal Contratista: 01 oficial, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de acero
y encofrado para muro predio 70-34^E elevacion
y zarpa, Se continua excavacion y perfilado
para muros 70-32^E, 70-28^E, 70-22^E y 70-16^E, se
realiza instalacion de geodren y relleno granular
compactado para muros en avance parcial, se
continua construccion de caja para acometidas
de alcantarillado costado izquierdo.

Va. la Ing. J. A. M.



19-05/022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de acero
para muro y zarpa predio 70-32^E, se

continua excavacion y perfilado para muros 70-32^E, 70-28^E, 70-22^E y 70-16^E, se continua instalacion de geodren y relleno granular compactado para muros, se continua construccion de cayo para acometidos de alcantarillado en avance parcial.

Uo. A. n. de J. A. n. t.



20.05/22 Clima: Despejado

Personal: 03 oficiales, 03 ayudantes, 01 boal, 01 inspector, 01 cadenero, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspecta, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: se continua instalacion de acero para muros y zarpas Predios 70-32^E y 70-28^E. Se continua excavacion para muros predios 70-22^E, 70-16^E, se continua instalacion de geodren y relleno para muros, se continua construccion de cayo para acometidos de alcantarillado

Uo. A. n. de J. A. n. t.



21-05-022 clima: despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 03 ayudantes
01 boal, 01 operador, 01 cadenero


Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se funde concreto de 3000 psi

Para elevacion muro predio 70-34^E y se
funden zapcos muros predios 70-32 y 70-28^E

Se continua construccion de cayas para circun-
dadas de alcantarillado.

Vd. *Michus Aust*



23-05-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 03 oficiales, 09 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST/HA

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de acero
para muro y zapcos predio 70-22^E, se continua

instalacion de acero y encofrados para
muros 70-28^E y 70-32^E, sea continua excavacion

y perfilado para muros y se realiza
solado en predios 70-04^E, 70-10^E y 70-16^E

se continua instalacion de geodien y relleno granular compactado para muros costado izquierdo para predios entre 70-70^E y 70-34^E en avance parcial,

1/0 Alvaro Puch
J

24-05-077 Clima: Despejado

Personal contratista: 03 oficiales, 09 ayudantes, 01 boal 01 inspector, 01 cadenero

Personal interventora: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de acero para muro predio 70-22^E, se continua instalacion de acero y encofrado para muros predios 70-28^E y 70-32^E, se fondea concreto de 3000 psi para elevaciones muros predios 70-28^E, 70-32^E y zarpa 70-22^E, se continua excavacion y perfurado para muros y solados 70-40^E, 70-10^E y 70-16^E, se inicia excavacion manual para muros costado derecho, se continua instalacion de geodien y relleno compactado en predios 70-70, 70-64, 70-60, 70-58, 70-52, 70-50, 70-44, 70-40 y 70-34, se

continua construcción de cajas de acometidas
de alcantarillado en avance parcial. 261

Uo Andrés Bello



25-05/022 Clima: Lluvia MODERADA 09:30 / 11:30

PERSONAL CONTRATISTA: 03 oficiales, 07 ayudantes, 01 bol
01 inspector, 01 cadenero

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: Se finaliza instalación de acero para
muro predio 7D-22^E y se inicia encofrado para
elevación, se realiza instalación de acero zarpa
muro 7D-16^E, se continua excavación y perfilar
para muros 7D-04, 7D-10, se continua instalación
de relleno granular compactado para muros
7D-70, 7D-64, 7D-60, 7D-58, 7D-52, 7D-50, 7D-44, 2
7D-40 y 7D-34, se continua construcción de
cajas de acometidas de alcantarillado.

Uo Andy Arce



26-05/077 clima: Despejado
 Personal Contratista: 03 oficiales, 07 ayudantes
 01 bol, 01 inspector, 01 cadenero
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 ACTIVIDADES: Se funde concreto de 3000 psi para
 zarpa 7D-16^E y elevaciones 7D-22^E, se continua
 excavacion y perfildado para muros costado
 derecho predios 7D-59^E, 7D-36^E y 7D-69^E costado
 derecho, se continua instalacion de relleno
 granular para muros, se continua construccion
 de cajas para cuatrimotos de alcantarillado en
 avance parcial.


V. Nativ Am...




27-05/077 clima: Despejado
 Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes, 01 bol
 01 inspector, 01 operador
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
 ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de acero
 para muros predios 7D-16^E y 7D-10^E, se inicia instalacion
 de acero para zarpa predio 7D-04^E

Se continua excavacion y perfurado para muros
predios 7D-53^E, 7D-59^E, 7D-63^E y 7D-69^E costado dese-
cho en tramo de avance parcial.

V. Andre Plus



28-05-022 clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se finaliza instalacion de acero
para muro predio 7D-04^E y se realiza enco-
frado muro predio 7D-16^E en avance parcial.

V. Andre Plus




31-05-022. clima. Despejado

Personal contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Se realiza encofrado para elevaciones
muros Predios 7D-16E y 7D-10E, se funde concreto

3000psi para elevacion predio 7D-16E y zapatas para muros 7D-10E y 7D-04E. Se realiza instalacion de acero para elevacion 7D-04E. Se continua excavacion y Perfilado para muros predios 7D-53E, 7D-59E, 7D-63E y 7D-69E costado derecho.

V. An...





01-06-022 climar: Despejada

Personal controlista: 02 oficiales, 02 ayudantes 01 boal, 01 inspector, 01 operador

Personal interventional: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Se realiza un encofrado para elevaciones muros predios 7D-04E y 7D-10E. Se Finaliza instalacion de acero para elevacion 7D-04E. Se continua excavacion y Perfilado para muros predios 7D-53E, 7D-59E, 7D-63E y 7D-69E costado derecho.

V. An...




02-06-022

Clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
10 ayudantes, 02 bcal, 01 operador, 01 cadenero

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector sst

Actividad: Se finaliza encofrado para elevaciones.

Muros Predios 7D-04E y 7D-10E. Se continua
excavacion y perfilado para muros Predios 7D-69E
a 7D-19E costado derecho en avance parcial

V. Arango / A. A.

g

D

07-06-022

03-06-022

Clima: Lluvias intermitentes todo el dia

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
09 ayudantes, 01 operador, 02 bcal

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector sst

Actividad: Se funde concreto 3000psi para elevaciones.

Muros Predios 7D-04E y 7D-10E. Se continua
excavacion y perfilado para muros Predios 7D-69E
a 7D-19E. costado derecho en avance parcial. Secontinua construccion de cajas de inspeccion
para red de alcantarillado

V. Arango / A. A.

D

06-0

04-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
01 ayudantes, 01 operador, 02 boal

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Se continua excavacion y Perfilado Para
Muros Predios 7D-69E a 7D-89E Costado derecho en
avance Parcial. Se continua construccion de caps.
de Inspeccion para red de alcantarillado en
costado izquierdo, se continua Figurado de acero
Para muros

Vb. In Ing. Awt.



06-06-022 clima: Lluvia fuerte 15:20 / 17:00

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
02 boal, 09 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSHA

Actividad: Se desenfocan elevaciones muros

Predios 7D-09E y 7D-10E, se continua excavacion.

y perfilado para muros predios 7D-59E a 7D-19E

costado derecho en avance parcial. Se realiza

Figurado e instalacion de acero Para muros

Pedidos 7D-04E y 7D-10E

Vs. Ant. y Ant.

07-06-022 clima: Lluvias 12:30 / 13:00

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
02 boal, 01 boal, 09 ayudantes

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspecta SST-NA

Actividad: concreto en zarpas T-1, Frente a
casas. 7D-69E y 7D-68E

Vs. Ant. y Ant.

08-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
02 boal, 09 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspecta SST

Actividad: concreto en alzado de muro, casa 7d-59
costado derecho, concreto en zarpa de casas

7d-63 y 7d-53. se continua con excavacion manual
para zarpas se funde solados zarpas en andén
derecho

Vs. Ant. y Ant.

09-06-022 clima: lluvia fuerte 12:50 / 13:00

Personal contratista: 01 inspector, 02 boal
01 cadenero, 03 oficiales, 07 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: concreto en alzado de muro, casa
7d-59 costado derecho, concreto en zarpa de casas
7d-63 y 7d-53. Se continua con excavacion
manual para zarpas se funda soldados zarpas
en anden derecho

U. An. L. An. L.



10-06-022 clima. Despejado

Personal contratista: 01 inspector, 02 oficiales
07 ayudantes, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: Armado acero de refuerzo para
zarpas, casas 7D-39E / 7D-35E. Excavacion manual
para zarpas en anden izquierdo, formaleta para
alzado de muro, casas 7D-63E.

U. An. L. An. L.



11-06-022. clima: ~~Despejado~~

Personal contratista: 02 oficiales, 01 ayudante
01 boal, 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector

Actividad: instalacion de formaleta para muros,
casas 7D-63E/7D-59E/7D-57E. Almado de acero
de refuerzo para muros, casas 7D-39E/7D-35E,
excavacion manual para zarpas, andén derecho

✓. *Arturo...*



13-06-022 clima: Lluvias intermitentes

Personal contratista: 02 oficiales, 01 ayudante
01 boal, 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector

Actividad: Se funde concreto de 3000psi
para muros predios 7D-63E/7D-59E/7D-57E y
concreto 3000 psi para zarpas predios 7D-53E/
7D-39E y 7D-35E

✓. *Arturo...*



14-06-077 clima: Despejado

Personal contratista: 02 oficiales, 09 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: Armado de acero para muros predios 70-31^E/70-27^E y 70-19^E. Armado de formaleta para alzado de muros predios 70-35^E/70-30^E. Se realiza relleno de terrazas de anden izquierdo. Instalacion de geodren y filtros anden izquierdo. Se realiza excavacion manual para traslado de red etb en anden derecho.

Va. Andres Pareda




15-06-077 clima: Despejado

Personal Contratista: 02 oficiales, 09 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: Armado de acero de refuerzo muros predios 70-29^E, 70-27^E Figurado de acero y excavacion manual para traslado de red de ETB.

16. Junio 2022



16-06-22 clima: Despejado
personal contratista: 02 oficiales, 09 ayudantes
01 boal, 01 inspector topografo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-RL

Actividad: Construcción de cajas de inspección de
alcantarillado 70-57^E. Excavación manual para
cajas de inspección 70-33^E. Armado de acero
para zarpa predio 70-13^E. conformación de
capa de subbase en la calzada

16. Junio 2022



17-06-22 clima: Lluvias de 10:15 / 11:30

personal contratista: 02 oficiales, 09 ayudantes 21-06-22
01 boal, 01 inspector topografo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-RL

Actividad: Se funde concreto de 3000 psi
para elevaciones de muros predios 70-39^E y
70-35^E y concreto para zarpas muros predios

70-31^E / 70-27^E y 70-19^E. Relleno y compactación de terrazas en anden izquierdo.

V. Andrés Arista



18-06-022

clima: Despejado

Personal contratista: 02 oficiales, 09 ayudantes, 01 boal, 01 inspector topógrafo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: Excavación manual para caje de inspección de alcantarillado 70-53^E. Desencofrado muros 70-39^E / 70-35. Instalación de formleta para elevaciones muros predios 70-31^E / 70-27^E / 70-19^E. Relleno y compactación de terrazas con base granular

V. Andrés Arista



21-06-022

clima: Despejado

Personal contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes, 01 boal, 02 trafico, 01 inspector, 01 operador, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector

Actividad: Se funde concreto de 3000 psi para elevación muro predio 70-31^E y concreto de

de zarpa predio 70-13^E. Se realiza excavación manual para cambio de tubo sanitario 70-33

V. Andrés Puch



09-08-022 clim
pers
01
pers
Actu

06-08-022 clima: Despejado

personal contratista: 01 inspector topógrafo, 01 ayudante

personal interentaria: 01 inspector técnico

Actividades: se realiza levantamiento topográfico para elaboración de planos record, se continua lavado de la vía con hidrolavadora, se continúan pañetes de zocalos y remates de cayas de inspección de alcantarillado

V. Andrés Puch

V. Roberto
Comis. Alca
Residente de obra



08-08-022 clima: Despejado

personal contratista: 01 inspector topógrafo, 01 ayudante

personal interentaria: 01 inspector técnico

actividades: se continua con pañetes de zocalos y remates de muros de concreto

V. Roberto
Residente de obra

<p>clima: 09-08-022</p> <p>53°</p> <p>ante</p> <p>efico</p>	<p>clima: Lloviznas leves intermitentes</p> <p>personal contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial 01 ayudante</p> <p>personal interventoria: 01 inspector tecnico</p> <p>Actividades: se continuo con pañete de zocalos y remates en el concreto, se funde para en concreto 3000 psi en acceso a predio # 876-043</p> <p>Visto Emilio Gutierrez Residente de obra</p> 
<p>financ 10-08-022</p> <p>espe-</p> <p>nte</p> <p>40</p>	<p>clima: Lloviznas leves intermitentes</p> <p>personal contratista: 01 inspector topografo 01 oficial, 02 ayudantes</p> <p>personal interventoria: 01 inspector tecnico</p> <p>Actividades: se realiza verificacion de cajas de inspeccion de alcantarillado y se conti- nuan zocalos y remates generales para muros en concreto.</p> <p>Visto Emilio Gutierrez Residente de obra</p> 

11-08-022 Clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 oficial 13-0
01 ayudante
Personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: Se realiza instalacion de varillas
5/8" para ventana de sumideros, se continuan
paredes de cajas de alcantarillado, se con-
tinuan remates en muros de concreto

Visto
Civil (Panteon)
Residente de obra



12-08-022 Clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01
oficial, 01 ayudante
Personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: Continuan paredes de cajas de
inspeccion y remates en muros, se finalizan
instalacion de varillas 5/8" para ventanas de
sumideros (resillas).

Visto
Civil (Panteon)
Residente de obra



13-08-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo

Personal interventor: 01 inspector tecnico

Actividades: No registra

Uso
Carta de
Registro de obra



5003584


5003584

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.




☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


08-01/22 Se da inicio con el lavado de las redes sanitarias y pluvial con bactor
 CIV: 5003584
 Clima seco y soleado
 Personal: Inspector, 2 Ayudantes
 Maquinaria: Bactor


 Presidente Cbr

11-01/22 Se adelanto la inspeccion con camara CCTV de las redes sanitaria y pluvial.
 Clima seco y soleado
 Personal: Inspector


 Presidente Cbr

10-02/22 Clima seco parcialmente nublado
 Personal: Inspector, 3 Topografos.
 Nivelacion y seccionamiento de via, con la comision de topografia


 Presidente Cbr

14-02/22 Clima seco y soleado en las horas de la mañana.

lloviznas fuertes despues de las 3:00 p.m.

Personal: Inspector, 2 Topografos, 3 Ayudantes, 1 boal

Se da inicio con la instalacion de la madera rolliza para el cerramiento. Nivelacion y seccionamiento de via.


Ricardo Oro

15-02/22 Clima seco parcialmente soleado


Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 1 boal.

Se adelanta la instalacion del PRT.

16-02/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 2 boal.

Se adelanta la proteccion de individuos arboreos con durmiente y malla.



Ricardo Oro

22-02/22

Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 boal, 2 Ayudantes.

Se adelanto la instalacion de la polisombra del cerramiento.



24-02/22

Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Operario.

Se adelanto la perfilacion de la via para poder movilizar las volquetas y retirar el RCD.




25-02/22

Clima seco parcialmente soleado en la mañana. aguacero fuerte despues de las 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. generando saturacion del terreno

Personal: Inspector, Operario

Se tenia material acopiado del civ contiguo para el retiro y disposicion final



26-02/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, Operario.

Se adelanta el retiro del material RCO acopiado en el frente de obra.

[Signature]

28-02/22 Clima seco en las horas de la mañana. Lluvias de 2:45 p.m. - 3:30 p.m.

Se continua con el retiro del material excavado del crv contiguo para disposición final.

[Signature]

01-03-022 CLIMA: Lluvioso 07:00 - 09:00


PERSONAL CONTRATISTA: 01 operador, 01 retrocarga

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA, 01 inspector técnico, 01 residente social, 01 residente

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica y retiro de sobrantes para la vía en avance parcial.

Se evidenció cerramiento completo, PMT instalado y completo, además de la cobertura y protección de los individuos arbóreos.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.


2-03-22 CLIMA: DESPEJADO

PERSONAL CONTRATISTA: 01, operador, 01 retro-cargador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA

Se continúa excavación mecánica para vía en tramo de avance parcial.

Se evidenció cerramiento completo, PMT instalado y completo e individuos arbóreos correctamente cubiertos, se evidencia acceso a viviendas.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.


03-03-22 CLIMA. DESPEJADO

PERSONAL CONTRATISTA: 01 operador, 01 retro-cargador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA, 01 inspector tecnico.

Se continua excavación mecánica para vida en tramo de avance parcial y cargue y retro de escombros.

Se realizó mantenimiento a algunos accesos a viviendas, mantenimiento de polsombra debido a la actividad de excavación. Registro de síntomas covid y verificación EPP.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

04-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 01 operario, 01 retro-cargador

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa excavación mecánica para vía en tramo de avance parcial y cargue y retiro de escombros.

Se evidenció cerramiento completo, PINT completo y acceso a viviendas.

Andrés Acosta

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

05-03-2022 TIEMPO VOCADO

PERSONAS Y VICERREO Y BOAL Y INSPECTOR
SSI - AMBIENTAL - TECNICO.

Se adelanta trabajo de retiro de material de excavación, se realiza uso general de obra, mejoramiento de cerramiento y acceso a predio.

Andrés Acosta
Andrés Acosta

07-03-22 CLIMA: Lluvia moderada 7:00 am a 11:50 am

PERSONAL CONTRATISTA: 01 operador, 01 retro-cargador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa excavación mecánica para vici en tramo de avance parcial y cargue y retiro de escombros.

Se notifica que el día de hoy Cemex reporta cierre de Sitio de disposición final por Hto. patio.



Importante

Estimado cliente

Gracias y los cordiales saludos de despedida

Desafortunadamente las operaciones de Ficala y Turquoise se encuentran suspendidas el día de hoy 7 de marzo, es lo que se realiza mantenimiento de patio, estamos informando de inmediato en el transcurso del día y no presentarse mayores afectaciones por el clima.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realizó jornadas de Hto. de cercamiento, Limpieza Vías. Se realiza implementación del Protocolo de Bioseguridad en el frente de Obra.

16010

Polyc/ Prof. SGT.
Contratista

8-3-22

Se notifica que el sitio de disposición final de RCD no se encuentra en servicio por condiciones climáticas.



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas durante esta semana informamos las operaciones de Fiscala y Tunjuelo se encontrarán suspendidas de 2022, en lo que se realiza mantenimiento de patios y adecuaciones de

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

- Se mantienen cercamientos y sonderos peatonales, implementados o adecuado de PNT, Cubrimiento de sumideros en mantenimiento; Se realiza toma de muestras COVID y uso adecuado de EPP.

Manuel Torres - Res. Ambiental.

Clima seco parcialmente soleado

Se suspende actividad de excavación ya que el operador de la retroexcavadora no llega.

09-03/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal de obra: Topografo, Inspector, 1 Operario, 1 boch.

Actividades: Se adelanto el retiro de un viaje de escombros para disposición final.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar mantenimiento periodico al cerramiento perimetral.

*Juan
Ochoa*

10-03/22 Clima seco parcialmente soleado en las horas de la mañana. Lluvia fuerte despues de las 2:40 p.m. suspension de actividades.

Personal de obra: Topografo, Inspector, 2 Operarios.

Actividades: Suministro, colocacion y compactacion parcial de base granular via.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar el retiro del material de excavacion para evitar contaminar el material de mejoramiento instalado.

11.03/22 Clima seco, parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, Topografo, cadenero, 1 boal,
1 Operario.

Actividades: Excavacion mecanica caja via.

OBSERVACIONES: Se requiere culminar la actividad de perfikado de excavacion con el fin de no contaminar el material de mejoramiento instalado

[Signature]

12.03/22 Clima seco, parcialmente soleado

Personal de obra: Inspector, Topografo, cadenero, 1 Ayudante,
1 boal, 1 Operario.

Actividades: Excavacion manual para apiques tubo pvc agua potable. Excavacion mecanica caja via y Transporte y disposicion final de escombros.

[Signature]

14-03/22 clima: Lluvias 11:25 / 14:10

Personal obra: 01 inspector, 01 topografo, 01 ayudante, 01 operador

Personal intervectoria: 01 inspector, 01 inspector SST-M

Actividades: Se continua excavacion mecanica en tramo de avance parcial y se realiza compactacion de material granular instalado

[Signature]

15-03/22 clima: despejado

Personal obra: 01 inspector, 01 cadenera, 01 efector, 01 ayudante, 01 local

Personal intervectoria: 01 inspector, 01 inspector SST-M, 01 residente social

Actividades: Se realiza perfilado manual costado izquierdo y se realizan accesos a viviendas en madera


[Signature]

16-03/022

clima: despejado

Personal de obra: 01 cadenero, 01 inspector
01 oficial, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST


Actividades: Se finaliza excavacion mecanica
costado oriental area adyacente a pozos de
inspeccion en avance parcial.


17-03/022

clima: despejado

Personal de obra: 01 oficial, 01 ayudante
01 boal, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-RA

Actividades: Se realiza perfilado de excava-
cion costado oriental area adyacente a pozos
en tramo de avance parcial.


18-03/22 Clima: despejado
Personal de Obra: 01 local, 01 inspector, 01
oficial, 01 ayudante
Personal Interventoria: Inspector 01, 1 inspector S. J. J.
Actividades: Se finalizo excavacion mecanica
costado occidental y se realiza carga
y retiro de sobrantes.
OBSERVACIONES: Se solicita al contratista rea-
lizar mantenimiento periodico al cerramiento
perimetral de obra.

Va 14 Arq. J. J.

03/022 Clima: despejado
Personal de Obra: 01 inspector, 01 local
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector S. J. J.
Actividades: No se generan actividades.

Va 14 Arq. J. J.

22-03/22 clima: despejado

Personal de Obra: 01 inspector, 01 oficial
01 ayudante, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

Actividades: se continua perfilado manual de excavacion en costado norte avance parcial.

Vn Mr. Mr.


23-03/22 clima: despejado

Personal de Obra: 01 oficial, 01 cadenero


Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

Actividades: se realiza reparacion de ducteria afectada de redes secas costado noroccidental y se realiza cargue y retiro de escombros.


OBSERVACIONES: Se solicita la implementacion de los accesos temporales a vivienda lo antes posible.

g/o Mr. Mr. Mr.


24-03/022 clima: despejado
Personal de Obra: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: No registra actividades
Se realiza toma de densidades por parte del
contratista Koto30 #1 97.9% y Koto15 #2
100% para material de mejoramiento en la via.




25-03/022 clima: despejado:
Personal de Obra: 01 oficial, 01 ayudante, 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividades: Se continua extendido, conformacion
y compactacion de mejoramiento en avance parcial



26-03/022 clima: despejado
Personal de Obra: 01 oficial, 01 ayudante

Personal interventoria: 01 residente, 01 inspector

Actividades: Se continua conformacion y compactacion de material granular de mejoramiento en tramo de avance parcial.




3-03/022 Clima: despejado

Personal de obra: 01 cardenera, 01 oficial, 01 ayudante
01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector SST-MA-01 inspector

Actividades: Se continua conformacion y compactacion de material granular en tramo de avance parcial, se realiza instalacion de geotextil y se inicia suministro y extendido de material tipo P6A en avance parcial.




29-03/22 Clima: despejado

Personal de obra: 01 cadenera, 01 oficial, 01 local

Personal Interventoria: 01 inspector SST-MA, 01 inspector

Actividades: Se continua suministra y conformacion de material tipo PEA en la via en tramo de avance parcial.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista garantizar la correcta compactacion en los hombros de la via.




30-03/22 Clima: despejado

Personal de obra: 01 oficial, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua conformacion y compactacion de material granular tipo PEA en tramo de avance parcial.



31-03/022 clima: despejado

Personal de obra: 01 oficial, 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector sst-ria

Actividades: Se continua compactacion de material granular tipo PEA avance parcial

[Signature]
J. Antón Arred.

02-04/022 clima: despejado

Personal de obra: 01 operador

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector sst-ria

Actividades: Se finaliza compactacion de material granular tipo PEA

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista mejorar la compactacion sobre los hombros de la via con el equipo adecuada que garantice la densidad del terreno en el costado

[Signature]
J. Antón Arred.

02-04/022 Clima: despejado
Personal contratista: 01 inspector topógrafo
Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividad: No registra.

Es de notar que el segmento se tiene
grande en razón a que es el único soldado
del segmento 5003561. *Por favor Dr.*

04-04/022 Clima: despejado *Andrés*
Personal Contratista: 01 cadenero
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividad: No registra.

Como se informó en comite el avance del frente
es mayor por tener este como soldado del segmento
5003561. *Por favor Dr. Andrés*

05-04/022 Clima: despejado
Personal Contratista: 01 cadenero, 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividad: No registra
OBSERVACIONES: Se solicita al contratista,
realizar mantenimiento de cerramiento

perimetral a su vez, se solicita al contratista retomar las actividades en el frente de obra, no se evidencia personal en el civ.

[Signature] *[Signature]*
F. A. A. Aust.

06-04/022 Clima: despejado
personal contratista: 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividad: No registra.

Se debe mencionar que se trabajó en el segmento
5003561 ya que por ahí es la salida de
los volquetes. *[Signature]* F. A. A. Aust.

07-04/022 clima: despejado
Personal Contratista: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA
Actividad: No registra

[Signature] *[Signature]*
F. A. A. Aust.

08-04/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo

Personal Interventoria: 01 inspector - 01 inspector SST

Actividad: No registra


 Andrés Pineda

09-04/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra

 Andrés Pineda

11-04/022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra.

 Andrés Pineda

12-04/2022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra.

Jose Carlos Anel

13-04-2022. Tiempo seco

Personal 7 BOM 7 OPERARIO 7 TOPOGRAFO.

EN ATENCION A LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA EN LOS DIAS ANTERIORES EL COMANDO INFORMA QUE EN RELACION A QUE SOLO SE HAYE SALIDA DEL MATERIAL DEL CIV 5003561 POR ESTE SECTOR NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES DE ZANJAS Y MUROS YA QUE ESTO GENERARIA CERRAR LA SALIDA DE VOLQUETAS DEL CIV 5003561 POR TAL RAZON UNA VEZ CULMINADA LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE ZANJAS Y MUROS DEL CIV 5003561 SE CONFUNDEN CON EL CIV 5003584. ESTO CON EL FIN DE. ESTER ACTIVIDADES NO SE DEFUNGEN. POR TAL CULMINADA

del CIV 5003584, por otra parte
las lluvias continúan en la zona
hacen que no se inicien las
actividades de excavación de cadáveres
y con frecuencia de menor ya que
las cimentaciones de los cester gradientes
expuestas

A-15-16-17 SEMANA SANTA

18.7.22 La Srta. Andrea Ruiz y J. de O.

27-04-2022 El consorcio informa que las
actividades se vienen ejecutando de una
forma pausada, tal como se ha
informado en cortes de obra
Este CIV es la única salida de
material del CIV 5003561, el cual se
encuentra activo en excavaciones de
zapatos y conformación de muro de
andamios.

Por lo anterior, es importante tener presente
que el plan de construcción es
adelantar las obras de mayor escala

DEL SECTOR 5003561 Y PROCEDER CON
EL INICIO DE DEMOLICION DE ANDARTE DEL CUS 5003582

[Signature]
Freddy Rivera

28-04/022 clima: Despejado

Personal: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MO

Actividades: No registra

Rescaté Orden

[Signature]

29-04/022 clima: Lluvia moderada 08:35 / 10:30

Personal: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MO

Actividades: No registra

Rescaté Orden

[Signature]

30-04/022 No registra actividades

01-05/022 No registra actividades

02-05/022 No registra actividades

03-05/022 No registra actividades

04-05/022 No registra actividades

[Signature]

05-05-22 Clima: Lluvias 08:00 a 12:00

Actividades: No registra.

Reg. Lule Osun
Andrés Díaz



06-05-22 Clima: Lluvias 08:00 / 09:30 y 14:00 / 17:00

Actividades: No registra.

Reg. Lule Osun
Andrés Díaz



07-05-22 Clima: Lluvia permanente durante todo el día

Actividades: No registra.

Reg. Lule Osun
Andrés Díaz



04-05-22 Clima: despejado

Actividades: No registra.

Reg. Lule Osun
Andrés Díaz



10-05-22 Clima: Lluvia fuerte 13:00 / 17:00

Actividades: No registra.

Residente Obra
Rueda y Puerta.

11-05-22 clima: Despejado
Actividades: No registra.

Residente Obra
Rueda y Puerta.

12-05-22 clima: Despejado
Actividades: No registra.

Residente Obra
Rueda y Puerta.

13-05-22 clima: Lluvia leve mañana, tarde despejada
Actividades: No registra.

Residente Obra
Rueda y Puerta.

14-05-22 clima: Despejado
Actividades: No registra.

Residente Obra
Rueda y Puerta.

15-05/22 clima: N/A
Actividades: No registra (DOMINGO)
Residuo Obra
Andarujos Lr.



16-05/22 clima: Lluvia leve 07:00 / 08:30
Actividades: No registra
Residuo Obra
Andarujos Lr.



17-05/22 clima: Despejado
Actividades: No registra
Residuo Obra
Andarujos Lr.



18-05/22 clima: Lluvia fuerte 08:00 / 15:00
Actividades: No registra
Residuo Obra
Andarujos Lr.



19-05/22 clima: Despejado
Actividades: No registra



OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar orden y aseo general, se solicita el retiro del material de excavación en el cual esta acopiado con un tiempo mayor a 24 hrs, superando el tiempo mínimo para su retiro y deposición final.

Regente Omar

Andrés Proaño



20-05-22 Clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector

Personal Interventor: 01 inspector SST, 01 inspector

ACTIVIDADES: No registra

Regente Omar

Andrés Proaño



21-05-22 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventor: 01 inspector SST, 01 inspector

ACTIVIDADES: No registra

Regente Omar

Andrés Proaño



23-05/22

clima: Despejado

Personal Contratista: 01 operador, 01 inspector, 01 bsc

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-H

ACTIVIDADES: Se realiza cargue y retiro de material de excavacion de cu adyacente.

Residente Oror

Andres Pineda



26-05/

24-05/22

clima: Despejado

Personal Contratista: 01 operador, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-H

ACTIVIDADES: Cargue y retiro de material de excavacion de cu adyacente

Residente Oror

Andres Pineda



27-05

25-05/22

clima: Lluvia moderada 09:30 / 11:30

Personal Contratista: 01 operador, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-H

ACTIVIDADES: No registra

Residente Oror

Andres Pineda



28-5

26-05/022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: No registra.

Resulfo Ovi
Inches Jucho



27-05/022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: No registra.

Resulfo Ovi
Inches Jucho



28-05/022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA

ACTIVIDADES: No registra

Resulfo Ovi
Inches Jucho



31-05-022

clima: Despejado
Personal Contratista.

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector ss-03
Actividad: No registra actividades.

Visitante
Inspector



01-06-022

clima: Despejado
Personal Contratista.

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector ss-04
Actividad: No registra actividades.

Visitante
Inspector



02-06-022

clima: Despejado
Personal Contratista.

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector ss-06
Actividad: No registra actividades.

Visitante
Inspector



03-06-022 clima: Lluvias intermitentes todo el día

Personal Interventoria:

Personal Contratista: 01 inspector, 02 local
02 ayudantes

Actividades: Se retoman actividades mediante
la demolición de andenes en concreto costado
izquierdo en avance parcial

Atestado por
[Firma]

[Firma]

04-06-022 clima: Despejada

Personal Contratista: / /

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: NO registra actividades.

Atestado por
[Firma]

[Firma]

06-06-022 clima: Lluvia fuerte 15:20 / 17:00


Personal Contratista: 01 inspector, 02 local
02 ayudantes

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se continúa demolición en

concreto y excavacion manual de andenes
costado izquierdo en avance parcial
3D-28, 3D-34, 3D-22, se realiza cargue y
retiro de material sobrante

Res. Luis G. Jaro
Andrés J. Jaro



07-06-022 clima: Uuorias 12:30 / 13:00

Personal contratista: 01 inspector topografo
02 boal, 02 ayudantes

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector ss

Actividades: se continua la demolicion de
andenes en costado izquierdo

Res. Luis G. Jaro
Andrés J. Jaro



08-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo
02 boal, 02 ayudantes

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector ss

Actividades: se realiza excavacion manual
para andenes costado izquierdo.

- 09-06-022 clima: lluvia fuerte 12:30 / 13:00
 Personal contratista: 01 inspector topografo,
 02 boal, 02 ayudantes
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: Se continua excavacion manual de
 andenes en costado izquierdo en avance parcial
 ple y L4 Obran
 Andres Pineda S.
- 10-06-022 clima: Despejado
 Personal contratista: 01 inspector topografo
 02 boal, 02 ayudantes
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: se continua excavacion manual de
 andenes en costado izquierdo en avance
 parcial
 Resilva Geny
 Andres Pineda S.
- 11-06-022 clima: Despejado
 Personal contratista: 01 inspector topografo
 01 boal, 02 ayudantes
 Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra actividades.

Residente Obra
Andrés Pineda



15-

13-06-022 clima: Lluvias intermitentes


Personal contratista: 01 inspector topógrafo
02 ayudantes, 01 operador

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: excavación manual para andén

Retiro material RCD.

Residente Obra
Andrés Pineda



16-

14-06-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topógrafo
01 operador, 02 ayudantes

Personal interventoria.

Actividades: continúan con excavación manual
en andén

Residente Obra
Andrés Pineda



16024

15-06-22 / clima: Despedada

Personal cartografista: es inspector topógrafo
o ayudante, es operador

Personal Interventions: as inspector, as inspector 237

Actividades: excavacion manual para zarpa3.

Rev. L. L. Dyer
F. L. Dyer

16-06-022	clima: Despejado
-----------	------------------

Personal contralista: 01 Inspector topografo
02 ayudantes, 01 boal, 01 operador

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: excavación manual para zarpas en andén (izquierdo). Movimiento de material en calzada, con retro

August, 1891

17-06-022	clima. lluvias de 10:15 / 11:30
-----------	---------------------------------

personal Contratista: 01 inspector topografo
01 operador, 04 ayudantes

Personal interventoría: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: continua excavacion manual para
zarpas, andén izquierdo, cargue y retiro de

entonces garantizando una altura de zanja que funcione como guardarrueda. Lo anterior a ejecutarse a ambos costados de la calzada.

Regente Ojeda
J. M. S. J. M. S.

06-08-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero 01 oficial, 01 ayudante, 01 local

Personal interuenteria: 01 inspector tecnico

Actividades: se realiza levantamiento topografico para elaboracion de planos record, se realiza lavado de la via con hidrolavadora

Regente Ojeda
J. M. S. J. M. S.

Voto
Concedido

08-08-022 clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo, 01 cadenero 01 oficial.

Personal interuenteria: 01 inspector tecnico

Actividades: se realiza construccion de pasos en concreto para escalera de

acceso al predio # 7c-04^E

Res. L. A. Góngora

Prin. J. M. S. T.

Udo
Cm-100000 Residuo de obra

09-08-022 Clima: Lloviznas leves intermitentes

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo
01 baal, 01 operador, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: Se inicia sello de juntas sobre
Pavimento rígido, se funde concreto 3000p.
para pasar acceso a predio # 7c-04^E, se
realiza instalación de tapa valvula de acuerdo
retiro de material sobrante.

Res. L. A. Góngora

Prin. J. M. S. T.

Udo
Cm-100000 Residuo de obra

10-08-022 Clima: Lloviznas leves intermitentes

Personal Contratista: 01 inspector topógrafo 01
ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: Se continua ejecución de
zocalos y remates de concreto en muros,

Se realiza inspección a cajas de distribución.

Res. Jefe Obra
Andrés Faust

Urb. Carlos Ochoa
Residente obra



11-08-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topográfico

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: No registra.

Res. Jefe Obra
Andrés Faust



12-08-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 oficial

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: Se realiza instalación de varillas 5/8" para rejilla sumidero

Res. Jefe Obra
Andrés Faust

Urb. Carlos Ochoa
Residente obra



13-08-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 oficial

Personal Interventoria: 01 inspector técnico

Actividades: se continúan remates y paños
en caja de inspección de abanqueado.

Res. L. O. 100
C. 100
C. 100
C. 100



1602X

BITACORA DE OBRA
CIV 5003670

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.




☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


534

①

07-01/22 Se da inicio con la limpieza de las redes sanitaria y pluvial con Bactor CIV: 500.3670


J. Amador Acosta
= VIAE

08-01/22 Se adelanto la inspeccion con camara CCTV de las redes sanitaria y pluvial.


Residente Ocas

27-01/22 Se da inicio a la instalacion de la madera rolliza para el cerramiento del area. Se adelanta nivelacion del area con la comision de Topografia.

Tiempo seco y soleado.

Personal: Inspector, 3 Topografia; 2 boal


Residente Ocas

28-01/22 Se continua con la instalacion del cerramiento del area. Se adelanta la inspeccion de la red de aguas lluvias con el bactor.

Tiempo seco y soleado

②

Personal: Inspector, 2 local.


Residente ORE.

10-02/22 Aguacero fuerte de 2:45 - 3:05 p.m.

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 0

Se adelantaron apiques para la inspección de la tubería pvc. agua potable y manguera gas natural en ambos costados.


Residente ORE

11-02/22 Aguacero fuerte después de las 2:00 p.m. y lluvias permanentes durante toda la tarde. Se suspenden actividades

Personal: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Operario

Maquinaria: Retroexcavadora y Volquetes

Se da inicio con la excavación mecánica c/a vía. Retiro RED para disposición final d


Residente ORE

12-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Operario

Maquinaria: Retroexcavadora y volquetes.

Se continua con la excavacion mecanica capa via y el retiro RCO para disposicion final.

[Signature]
Per. Ger. Ob.

14-02/22 Lluvias fuertes despues de las 3:00 p.m.

Personal: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Operario.

Maquinaria: Retroexcavadora y volquetes.

Excavacion mecanica capa via y retiro RCO para disposicion final.

[Signature]
Per. Ger. Ob.

16-02/22 Clima seco parcial

Personal: Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Operarios

Maquinaria: Minicargador y compactador.

Suministro, colocacion y compactacion de base granular reciclada. capa via. Sobre capa piedra rajon-zello.

[Signature]
Per. Ger. Ob.

④

21-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, Topografo, 2 Ayudantes, 2 Operarios

Maquinaria: Minicargador y vibro-compactador

Cerec y compactacion de base granular reciclada.

Resoluto Ch.

22-02/22 Clima seco y soleado

Personal: Inspector, Topografo, 2 Ayudantes, 2 Operarios

Maquinaria: Minicargador y vibro-compactador

Se continua con el cerec y compactacion del material granular reciclado.

Resoluto Ch.

26-02/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, Operario volqueta

Suministro y acopio base granular reciclada.

Resoluto Ch.

28-02/22 Clima seco en las horas de la mañana. Hora de 2:45 - 3:30 p.m.

Se realizó el trabajo de muestreo tipo IA a nivel de estratificación de densidad de árboles.

[Firma]
Ferdinand P. P.

01-03-22 CLIMA: Lluvias 07:00 - 09:00

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 operador, 01 vibro compactador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA, 01 representante social, 01 residente técnico

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se inicia demolición de anillos costado derecho en tramo de avance parcial

Se solicita al contratista realizar el acceso a viviendas ya que en su momento no estaban, se realizó la toma de síntomas COVID y se verifica el uso de los EPP.

(6)

16030

Se evidenció el cerramiento completo del frente y la completa implementación del PMT. Se realizó el acopio de RCD.


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

02-03-22 CLIMA:


PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 Operador, 01 vibracompaactor

Se continua demolición de andenes costado derecho en avance parcial y se realiza extendido y compactación de material granular costado derecho.

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA, 01 residente técnico, 01 residente social.

Se solicita al contratista realizar el acceso a viviendas ya que en su momento no estaban, se realiza toma de síntomas covid y se verifica el uso de los EPP.

se evidencia mantenimiento al cerramiento.
Se realiza acopio de material y cargue de RCA


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

03-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
01 operador, 01 vibrocompactador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 residente tecnico,
01 residente social, 01 inspector SST-MA, 01 inspector
tecnico.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continua
demolicion de andenes costado derecho
en avance parcial y se continua extendido
y compactacion de material granular costado
derecho avance parcial.

No se evidencia el acceso a vias
debido a demolicion de andenes, se realizo
toma de sintomas con y verificacion de EPP


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

04-03-22


CLIMA:

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA,
01 inspector técnico, 01 residente social.

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
01 operario, 01 vibrocompactador.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa demolición
de andenes costado derecho e izquierdo en
avance parcial y se continúa extendido y
compactación de material granular costado
derecho avance parcial.

Se realizó cerramiento con cinta debido
a demolición de andenes en el frente
de obra, se registraron síntomas covid y
se verificó EPP y se realizó acceso a
viviendas.


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

05-03-22

TIEMPO VUELVO

PERSONAL 2 ayudantes 1 oficial 1 operario
1 BPAE. - INSPECTOR SST - AMBIENTE TRABAJO

Se realizan actividades de demolición de cinderes en el costado occidental del segmento, se adelanta asco general de Obra y retiro de material de excavación, se ejecutan actividades de limpieza y reparación de todo posible.

Adm. Asist.
Res. de Obra.

07-03-22 CLIMA: Llovía moderado 7:00 am a 11:50 am

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
01 operador, 01 vibracompactor

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 Inspector SST-MA,
01 inspector técnico

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se finaliza demolición de cinderes costado derecho e izquierdo en avance parcial y se continúa extendido y compactación de material granular costado derecho avance parcial.

10

16052

El día hoy el sitio de disposición final Notifica que se encuentra cerrado por Hto.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas

Informamos las operaciones de Fical y Turquesa se encuentran suspendidas el día de hoy 7 de marzo, en la que se realiza mantenimiento de partes, así como el abastecimiento de resacas en el transcurso del día y no presentarse mayores afectaciones por el clima.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realiza mto. Cerramiento, orden y aseo en el frente de obra.

Se realiza Implementación de Protocolo de Bioseguridad y de las actividades del SS-SST.

Develo

Prof SST. Conza

8-3-22

Se notifica que el sitio de disposición final de RCD se encuentra sin servicio por condiciones climáticas; Se establecen señalizados punto de riesgo, Compuesto organizado y señalizado, Puntos ecológicos, Uso adecuado de EPP y toma de síntomas COVID 19.

Munel Torres - Res- Ambiental

539

(14)



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas durante esta semana

Informamos las operaciones de Fiscalá y Tunjuelo se encontrarán suspendidas el día de hoy 3 de mayo de 2022, en lo que se realiza mantenimiento de patios y adecuaciones del terreno.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Clima seco parcialmente soleado

*Personal de obra: Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 botal
1 Operario.*

Actividades: Excavación manual andenes.

Observaciones: Se solicita al contratista realizar el retiro del material de mejoramiento continuado durante el desarrollo de actividades de excavación sobre andenes. Se solicita implementar de forma adecuada los accesos a viviendas.

(12)


1653

09-03/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, 1 boal, 1 Operario.

Actividades: Transporte y disposición final de escombros.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar la adecuación de accesos y pasos peatonales seguros para los residentes de la zona en intervención.



10-03/22 Clima seco, parcialmente soleado en las horas de la mañana. Lluvias fuertes después de las 2:40 p.m. generando empobramientos de agua.

Actividades: No se realizó ninguna.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar mantenimiento a cerramientos perimetrales y realizar el cambio de la polisombra que se encuentra en mal estado.



546

11-03/22 Clima seco, parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 1 boal, 1 Operario

Actividades: Suministro y acopio de base granular para andenes.


Res. J. L. C. B.

12-03/22 Clima seco, parcialmente soleado

Personal: Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 boal.
1 Operario.

Actividades: Excavacion manual andenes y suministro de base granular reciclada andenes. - Rellenos,

Se continuan con resto de material y
acoo de obra.



(14)

16034

14-03/22 Clima: Lluvias 11:25 / 14:10

Personal Obra: 1 inspector, 01 oficial, 1 ayudante
1 operador, 1 boal

Personal Interventoria: 1 inspector, 1 inspector SST-MA

Actividades: Se realiza demolición de cajas
de inspección existentes y excavación manual
en avance parcial.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar medidas de control
con el fin de evitar la contaminación con material
de excavación al material de mejoramiento instalado.

Residente Obra
V.

15-03/22 Clima: despejado

Personal Obra: 1 inspector, 01 oficial, 1 ayudante

Personal Interventoria: 1 inspector, 1 inspector SST-MA

Actividades: Se continúa demolición y excavación
para construcción de cajas de
inspección de alcantarillado

OBSERVACIONES: Se solicita el retiro del
material de mejoramiento contaminado

durante los procesos de excavación.

Verderick Oban

16-03-022

Clima: despejado

Personal Contratista: 1 topógrafo, 01 oficial, 01 ayudante, 01 operador, 1 baal

Personal interentencia: 01 inspector, 01 inspector EST-HA

Actividades: Se continúa excavación y demolición de cajas de inspección y se inicia construcción de cajas para acometidas de alcantarillado, se continúa compactación de material granular en orden el tramo de avance parcial

Verderick Oban

17-03-022

Clima: despejado

Personal obra: 1 topógrafo, 01 oficial, 01 ayudante, 01 operador, 01 baal

Personal interentencia: 01 inspector, 01 inspector EST-HA

(16)

16035

Actividades: se continúan construcción de cajas de inspección para cuanetidos de alcantarillado en avance parcial

Andrés Restrepo
Rodrigo F. G. G.

18-03-022

Clima: despejado

personal de obra: 01 oficial, 02 ayudantes, 01 topógrafo, 01 baal

personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: se continúa construcción de cajas para cuanetidos alcantarillado. se inicia excavación para muros predios 70-28^o y 70-32^o. Se realiza toma de densidades por parte del contratista anden predio 70-10^o ± 1 91%, se solicita corregir y subsanar actividad. y realizar nuevamente la verificación por densidad.

Andrés Restrepo
Rodrigo F. G. G.

342

10-03-022 clima: despejado

personal obra: 01 oficial, 01 ayudante, 01 topógrafo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continúa construcción de cajas para acometidos de alcantarillado.

Andrés Acosta
Gerente Obra

12-03-022 clima: despejado

personal obra: 01 oficial, 01 cadenero, 01 ayudante

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continúa excavación para muros predios 40-28^c y 70-32^b, se inicia parte y figurado de acero para muros avance parcial

Andrés Acosta
Gerente Obra

23-03-022 clima: despejado

Personal obra: 1 topógrafo, 01 ayudante, 01 oficial, 1 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA, 01 residente SST-MA, 01 residente social, 01 residente técnico

Actividades: Se finaliza amarrado e instalación de acero y se funde concreto de 3000 psi para tramos muros prelios 70-28^E y 70-32^E.

OBSERVACIONES: Se realiza toma de densidad en anden derecho predio 70-10^E la cual no cumple por lo cual se solicita al contratista corregir y subsanar teniendo en cuenta que el porcentaje de compactación evidenciado corresponde a 71 94 60. Se evidencia no cumplimiento con el traspaso del acero de refuerzo encontrando tramos de 50 y 20cm, a su vez no se garantiza recubrimiento del acero instalado. Se solicita al contratista informar la ejecución de dichas actividades con antelación ya que la actividad no habria sido liberada por esta interventoria por lo cual se presentan las anteriores observaciones.

Roberto Ob
Roda Roda

24-03-2022 TIEMPO LIBRE

PERSONAL: INSPECTOR - 2 AYUDANTES 1 OFICIAL - 1 ALBA
RESIDENTE TEC - AMBIENTAL - SST

Se continúa con relleno en zona de cimientos laterales; continuación de muros T-9; se realiza carpintería y cerro en una y zona de cimiento con el fin de realizar forma de desdoblamiento el cual se evidenciará en día anterior al día, se realiza aso general de obra

Rodrigo Ochoa

25-03-2022

TIEMPO LIBRE

PERSONAL: 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 1 INSPECTOR 1 ALBA
RESIDENTE - TEC - SST - AMBIENTAL

Se continúan actividades de construcción en zona de cimientos laterales y replanteo de zona para bordillo y cerro, se realiza forma de desdoblamiento, se realiza aso general y mejoramiento de acceso y cercas

20

16037

26-03-2022 Personal 1 oficial 2 ayudantes. 7 Box
INSPECTOR.

Se inicia con actividades de instalación
perdido de confinamiento y fazeado
para la instalación de la cisterna A-10
en zona oriental del segmento, se
confirma con comando de ordenes laterales.


Rodolfo Ochoa
Prodr. Acop.

Personal - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 operador -
1 Box - 1 Box - 1 Box - 1 Box

28-03-2022 Se continúan trabajos de instalación de
perdido de confinamiento y compensación
en zona de ordenes laterales, se
trabaja en conformidad de curva de
inspección y comando de ~~27~~²⁸ ~~Box~~^{Box}.
Se realiza repa de muros de
expansión.

29-03-2011 TIEMPO NUBLADO

PERSONAL 1 - OFICIAL - 2 AYUDANTES - 1 BOHIO

1 OPERARIO - RESIDENTE TCC - 535 - AMBIENTAL

Se cubren trabajos de instalación de
Bordillo de confinamiento y curtek
perforación.

Se realiza cese general de obra y
atención de comentarios, se adelanta
atención de lugar de inspección

Pando Ob

30-03-2011 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 BOHIO - 1 OPERARIO

1 INSPECTOR - RES - TCC - AMBIENTAL 535

Se continúan con labores de instalación
de Bordillo costado lateral de la
obra y ende de igual forma se adelanta
instalación de curtek en zona orientada
Se realiza inspección en zona de obra.

Pando Ob

31-03-2022 7/16:40 SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 7 AYUDANTES

1 OPERARIO - 1 RB - 7 TECNICOS SST - AMBIENTAL

1 BOMBA

Se continúan trabajos de instalación
de bordillo de pavimentación en laterales
del segmento e instalación de casaca
pre-fabricada costado orientado SE

Trabajo con excavación manual para instalación
sumidero en zona sur del CIV.

Reserva Ob.

01-04-2022

TIEMPO SECO: PERSONAL 2 AYUDANTES 7 OFICIALES

1 BOMBA - RB - 7 TC. SST - AMBIENTAL

Se continúa con instalación de bordillo
de pavimentación, instalación de casaca
pre-fabricada y excavación para sumidero
en costado sur, se realiza relevo
de material de excavación y sobrante.

BITACORA DE OBRA
CIV 5003670

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.



☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

22

31-03-2022 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES.

1 OPERARIO - 1 P.L. - 7 CC.MI. 555 - 1 MAQUINARIA

1 BOMBA.

Se continuó trabajo de instalación
de bodega de almacenamiento en interior
del segmento e instalación de casaca
prefabricada custado orientado SE.

Trabajo con excavación manual para instalación
sumidero en zona sur del CIV.

Orden y
Trabajo

01-04-2022

TIEMPO SECO: PERSONAL 2 AYUDANTES 1 OFICIAL

1 BOMBA - P.L. - 7 CC. 555 - 1 MAQUINARIA

Se continuó con instalación de bodega
de almacenamiento, instalación de casaca
prefabricada y excavación para sumidero
en costado sur. Se realizó retro
de material de excavación y sobrante.

Se adelanta caso general de obra y
arreglo de cerchas con pilas.

Proyecto Obra
Hidro-Acto 2

02-09-2022. TIEMPO LUBRADO

PERSONAL: 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 7 OBREROS

1 POAL - RES TGC - SST - AMBIENTAL

Se adelanta trabajo de mantenimiento estructural
en muro norte, se adelanta trabajos de instalación
de conducto prefabricado en costado oriental.
se realiza retiro de material sobrante de obra.

04-09-2022. TIEMPO SECO

PERSONAL: 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 7 OBREROS

POAL - TGC - SST - AMBIENTAL

Se trabaja en extendido y cerchas de
material sub-ase para en vista de
igual forma se trabaja en relleno.

29

y continuacion en zona de control.
Se cubren con costuras de
bordo y loceta perimetral.

06-04

Parabank Chir
Nada. Prest.

05-04-2020 SERAPO MUELADO CON CUERPO. BROS.

PERSONAL OFICIAL - 2 OYUNANTE Y OYUNARIO
1 BOLL.

Se contina con extendido de material
TIPO PPA en zona de orden, se adelanta
conformacion de caja de inspeccion en parte.

parte del segmento, se trabaja en
compactacion de material granular en
zona de calzada.

07-0

se realiza escbo general de obra y
mejoramiento de acceso a por pector.

TIEMPO VARIADO
 06-04-2022 PERSONAL 10 FOLIO 2 AYUDANTES 2
 OPERARIO - 1 BOMBA.

Se continuó con el tendido de mampara
 tipo per en zona de andenes, conformación
 y culminación de muro de inspección, se adelantó la
 instalación de compactador en zona de entrase
 y cerrado de la misma, se adelantó la construcción
 de adecuación de red de domiciliarios.

[Signature]
 J. J. J.

07-04-2022 TIEMPO 560

PERSONAL 2 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 2 TOPOGRAFOS 1 BOMBA
 1 OPERARIO.

Se continuó con instalación de canchales prefabricados
 en estado oriental, de igual forma se adelantó los
 trabajos de conformación de muro de inspección y
 muro en bloque estructural en cruce.

[Signature]
 J. J. J.

26

08-04-2022

Tiempo seco

Personal 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1

BOM - IUPERADIO - RES TEC - SSS - MAINTEN.

Se realiza excavación para confirmación de sumidero en el costado sur del segmento.

11-04-2022

Se aceleran trabajos de emboscado de conductos prefabricados, perchiles y muro. en paralelo, se continúan con construcción de cuneta de inspección.

Reserva Obra

Nota Final

09-04-2022

09-04-2022 - TIEMPO SECO.

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 1 BOM

1 OPERARIO.

Se realiza compactación y cerrados de

12-04

calzado, se continúan con confirmación de cunetas del costado occidental, se.

aceleran trabajos de excavación para sumidero en el costado sur del segmento.

se reanuda caso general de obra y
arreglo de cerramientos.

[Signature]
F. Castro
F. Castro

11-04-2022. PERSONA 2 OFICIAL AYUDANTES 2 OPERARIO
1 BOAZ. 1 TOPOGRAFIA.

Tiempo seco.

Se continua con trabajo de construcción
zona para instalación sumidero estubo sur,
se trabaja en cercado de material en zona de
calzada y zona de andenes; se reanuda retro
de material de excavación. "Bunker"

[Signature]
F. Castro
F. Castro

12-04-2022 TIEMPO SECO

PERSONA 2 OFICIAL 2 AYUDANTES: 1 BOAZ.
1 OPERARIO.

Se continua trabajo de compactación
de material en zona de andenes y

anteriormente de cuyo en Bonaire
del segmento, se tienen en conex.
labor en sumidero costado sur

Se de espera por la programación del
concreto ~~MAR-1~~ ya que se está
definiendo el tipo de estampado a
instalar según propuesta presentada por
el consorcio y Tipología escogida por
la comunidad se tiene en presentación
de la modelación

Fin del Acto
Respecto Ocho

B-04-2022 Tiempo seco

Personal 10 PICAL y MUDANTE 1 BONE

Se continúa con trabajos de
concreción c/c para sumidero
en zona sur y conexiones de
material en zona de conexión

Se trabajó en modificaciones y tipo de
materiales a implementar en la cubierta de
que se tiene en el presupuesto para las utilidades
de concreto en los cimientos y no utilizar
prefabricado según solicitud de la comunidad.

Se realizó retiro de material producto de
excesos.

Federico Obra
J. Acosta

14-15-16-17 ABRIL. SEMANA SANTA.

18-04-2022.

TIEMPO NUBLADO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1 OPERARIO.

Se continúa con construcción de suministro según
aviso del 07-04-2022 por parte del supervisor de la
EAPA, se adelanta trabajo de cierre de
inspección en estado occidental, se realiza
con armadura de acero en bloque estructural.

Federico Obra

19-04-2022 TIEMPO LLUVIOSO EN HORAS DE LA
MAÑANA.

PERSONAL OPERARIO Y OBRERO Y AYUDANTE
Y BOAL - RES - TEC - SSI MAINTEN.

Se realiza cerco de material de sustitución
en ordenes y cubetas, por tener de
lluvia se retiran actividades.

Se informa sobre cerco de escombrera



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 19 de
abril de 2022.

 Informamos se suspende totalmente el servicio en
nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Fis. Lito Ota Andrés Ariza

20-04-2022 TIEMPO LLUVIOSO

PERSONAL OPERARIO Y BOAL Y AYUDANTE
Y OBRERO

Se realiza pedido de uso y orden
en el segmento.



Reporte de cierre por
CEMEX "Escuadrón"

Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 20 de abril de 2022.

▲ ▲ ▲ Informamos se suspende temporalmente el servicio en nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se continúa cerco de seguridad y ordenes para
programar instalación de MP-91 en el zone.

[Handwritten signature]
En las Andes

21-04-2022. TIEMPO LLUVIOSO

PERSONAL 1 OFICIAL 1 AYUDANTE 1 BUAL-
DES TEC- SST- AMBIENTAL.

Se realizó la instalación del sombrero
prefabricado en el custodio sur-oriental
del sector. Se realizó cerco de la
calzada y retro de material sobrante.

160AA

Se reporta intrusión de cucarderos.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 21 de abril de 2022.

 Informamos se suspende el servicio de atención por escombrera fiscal horario de atención hasta las 2:15 p.m

Invitamos a nuestros clientes dirigirse a escombrera Tunjuelo

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

23-01

22-01-2022 HUGO LLUNOSO

Personas 7 oficial 7 OFICINARIO 7 SUP

Se continua con cerco de cultivos y

créditos, se realiza uso general de

obra y refro de material sobrante.

Se reporta cierre de escombrera por

lluvia.

551



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 22 de abril de 2022.

Se suspende temporalmente el servicio de atención en escombreras Tunjuelo y fiscalía.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

[Handwritten signature]
Andrés Rostro

23-04-2022. PERSONAL Y OBREROS Y AYUDANTE
Y BOAL. Y OPERARIO - RES TEC- SST-MAQUINARIA

Se realizó ferra de cascadas en zona
del colzede de igual ferra se
ejecuta la instalación del cargue del
pozo ubicado en la zona norte del
segmento, se debe a una conexión y
conexión de suministro prefabricado.

Andrés Rostro
[Handwritten signature]

25-04-2022 TIEMPO NUBLADO - LUNES EN HUEHUAC LA VALL
PERSONA: EL OPERARIO EL BOQUE - LA VALL
RES. TEL - 557 - AMB-ENTAL.
Se confiere con el personal de suadero
y el personal intercalado, se realiza cerco de
cultivos y andenes; se realiza cosecha y
orden del segmento, labores pendientes
por HUEHUAC en la zona.



Importante
Estimado cliente

Debido a las fuertes lluvias presentadas el día domingo 24 de abril, EL
LUNES 25 DE ABRIL

NO SE PRESTARÁ el servicio de escombrera en
tunjuelo y fiscalá

Durante el día estaremos informando de poder retomar operación en horas de la tarde.
Agradecemos su comprensión.
Hacer extensivo este mensaje a quien sea necesario.

*Reporte CEMEX
Indes Neosky*

26-09-2022 Tiempo seco en Hornos de la mañan, se
primarios Hornos de la noche.

2:30 PM - 9:25 PM.

Se realiza cerco de calzada y andenes con
compactación de la zona, se realiza programación
de cord. de de MA-91 según cupo del proveedor
Cemex.

Rogelio E. López
Andrés Páez

27-09-2022 personal 1 OFICIAL 1 BOAL 1 OPERARIO

Se realiza retiro de material sobrante de
manchales calzada, se realiza compactación de
calzada con el fin de programar instalación de
MA-91 en asfalto turno por parte del proveedor
Cemex, se realiza cerco y andenes general.

Rogelio E. López
Andrés Páez

28-04/072 Clima: Despejado

Personal: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra

Fu
y
f

~~Problemas~~
Antes de la

02-05/072

29-04/072 Clima: Despejado Lluvia 08:35 / 10:30

Personal: 01 Inspector topografo

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra

~~Via~~ Antes de la

13-05/

30-04/072 Clima: Despejado

Personal: 01 operador, 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: Se realiza instalacion de
acero kotono y kotozo y dobelos y se

60-307
junte concreto tipo MR-41 en via 10+000/032
y se realiza estampado para 13 modulos

Va [Signature]

Andrés Ruiz

[Signature]

02-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector, 01 oficial, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTRMA

57
Actividades: Se realizan cortes para juntas
en losas de MR-41 en via.

Va [Signature]

Andrés Ruiz

[Signature]

13-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTRMA

Actividades: No registra.

Va [Signature]

Andrés Ruiz

[Signature]

BITACORA DE OBRA
CIV 5003670

16047

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.



☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

60557
junte concreto tipo MR-41 en via 10+000/032
y se realiza estampado para 13 modulos

Va [Signature]

Andrés R. L.

[Signature]

02-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector, 01 oficial, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSIMA

57
Actividades: Se realizan cortes para juntas
en losas de MR-41 en via.

Va [Signature]

Andrés R. L.

[Signature]

13-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSIMA

Actividades: No registra.

Va [Signature]

Andrés R. L.

[Signature]

04-05/022 clima: despejado

Personal: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector

Actividad: No registra.

Regidate Don
Andrés Pusch



05-05/022 clima: Lluvia fuerte 09:30 / 11:00

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 residente, tecnico, 01
residente SST, 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra

Regidate Don
Andrés Pusch



06-05/022 clima: Lluvias 08:00 / 09:30 y 14:00 / 17:00

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra

V. Rendón Pusch



07-05-22

Clima: Lluvia permanente todo el día

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: No registra

U. No registra

U. No registra



08-05-22

Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: No registra

U. No registra

U. No registra



10-05-22

Clima: Lluvia fuerte 13:00 / 17:00

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: No registra

U. No registra

U. No registra



11-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 Actividades: No registra

do. Andrés P. R. 

12-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 Actividades: No registra

do. Andrés P. R. 

13-05/022 Clima: Lluvia en la mañana, tarde despejado
 Personal Contratista: 03 oficiales, 04 ayudantes
 01 inspector, 01 boal, 01 operador
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 Actividades: Se realiza instalación de acero
 y se funde andén costado derecho en
 concreto estampado tipo MR-41.
 OBSERVACIONES: Se solicita al contratista

cuantizar la correcta implementación del PMT
en conformidad a lo aprobado por la SOTM
V. Andrés Pineda



14-05-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se realizan cortes para inducir
juntas en losos de HB-41

V. Andrés Pineda



16-05-022 Clima: Lluvia leve 07:00 / 08:30

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realiza nivelación de anden
costado izquierdo en material granular
compactado, se realiza instalación de
cayillas para acometidas de alcantarillado
se finalizan rellenos compactados para

muros predios 70-28^o y 70-32^o.

18-05/02

V. Andrés P. S. L.

17-05-022 Clima: Depejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 residente técnico

Personal Interventoria: 01 residente técnico, 01 residente SST, 01 inspector SST-MA, 01 inspector

ACTIVIDADES: No registra

OBSERVACIONES: Esta interventoria solicita al contratista corregir el acabado del estampado del concreto MR-41 en andenes y a su vez, se garanticen excelentes acabados entre la transición del andén y los predios y también se realicen los acabados necesarios que son adyacentes a los predios, garantizando un excelente acabado estético.

19-05/02

V. Andrés P. S. L.

20-05

18-05/022

Clima: Lluvias fuertes 08:00/15:00

Personal Contratista: 03 oficiales, 01 ayudante, 01
boal, 01 inspector, 01 operador

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se realiza instalaciones de acero
en rampas y se funde concreto estampado
tipo MR-41 en orden costado izquierdo

V. Andrés P. S. L.

19-05/022

Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 ayudante, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector SST-MA, 01 inspector

ACTIVIDADES: Se realiza instalación de tapa
para cayas de inspección avance parcial.

V. Andrés P. S. L.

20-05/22

Clima: Despejado


Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria 01 inspector, 01 inspector SST


ACTIVIDADES: No registra

V. Andres Ip de 

25-05/01

21-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 ACTIVIDADES: No registra
 V. Andres 

26-05

23-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA
 ACTIVIDADES: No registra
 V. Andres 

27

24-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 ACTIVIDADES: No registra.

25-05/022 clima: Lluvia moderada 07:30 / 11:30

Personal Contratista: 01 bot, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: jornada de aseo general

V. Andrés Puello



26-05/022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 oficial

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realizan paños y remates

contra pedras y acabados para cajas de
inspeccion de alcantarillado avance parcial

V. Andrés Puello



27-05/022 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra.

V. Andrés Puello



28-05/022 clima: despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA
 Actividades: No registra

V. Andrés Paredes



02-06-0

31-05/022. clima: despejado
 Personal contratista:

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: no registra actividades

V. Andrés Paredes



03-01

31-06-022, clima: Despejado

Personal contratista.

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés Paredes



Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.




○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○

28-05/022 clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA
 Actividades: No registra
 V. Andrés P. S. H. 

02-05-0

31-05/022. clima: Despejado
 Personal contratista: / /

03-01

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividad: no registra actividades
 V. Andrés P. S. H. 

-06-022. clima: Despejado
 Personal contratista: / /

04

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividad: No registra actividades
 V. Andrés P. S. H. 

02-06-022 Clima Despejado
Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividad: No registra actividades

U. Andrés Bello



03-06-022 clima. Lluvias intermitentes todo el día
Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividad: No registra actividades

U. Andrés Bello



04-06-022 clima Despejado
Personal contratista:

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividad: No registra actividades.

U. Andrés Bello



06-06-022 clima Lluvia fuerte 15:20 / 17:00

Personal contratista: /

09-06-1

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HS

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Duval



07-06-022 clima Lluvias 12:30 / 13:00

10-0

personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Duval



08-06-022 clima Despejado

11

Personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspecta SST-HS

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Duval



09-06-022. clima: Lluvia fuerte 12:30 / 13:00

Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-NA

Actividad: no registra actividades

U. / N. / M. / ...





10-06-022. clima: Despejado

Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: No registra actividades

U. / N. / M. / ...



11-06-022 clima: Despejado

Personal contratista:




Pe

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: no registra actividad

U. / N. / M. / ...



13-06-077	<p>Clima: Lluvias intermitentes</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo</p> <p>PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA</p> <p>ACTIVIDADES: No registra actividades</p> <p>U. Andrei Frucht </p>	16-06-077	C
14-06-077	<p>Clima: Despejado</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo</p> <p>PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA</p> <p>ACTIVIDADES: No registra actividades</p> <p>U. Andrei Frucht </p>	17-06-077	
15-06-077	<p>Clima: Despejado</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo</p> <p>PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA</p> <p>ACTIVIDADES: No registra actividades</p> <p>U. Andrei Frucht </p>	18-06	


16-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores



17-06-022 Clima: Lluvias de 10:15 / 11:30

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores



18-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores



Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.



28-05/022 clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: No registra

V. Andrés P. S. L.

02-05-0

31-05/022. clima: despejado

Personal contratista:

03-01

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés P. S. L.

01-06-022. clima: despejado

Personal contratista.

04

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés P. S. L.

02-06-022 clima Despejado
Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividad: No registra actividades

U. Andrés Bello



03-06-022 clima. Lluvias intermitentes todo el día
Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividad: No registra actividades

U. Andrés Bello



04-06-022 clima Despejado
Personal contratista:

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividad: No registra actividades.

U. Andrés Bello



06-06-022. clima Lluvia fuerte 15:30 / 17:00

Personal contratista: /

09-06-1

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HS

Actividad: No registra actividades

V. Andrés Rueda



07-06-022. clima Lluvias 12:30 / 13:00

10-0

Personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés Rueda



08-06-022. clima Despejado

11

Personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspecta SST-HS

Actividad: No registra actividades

V. Andrés Rueda



09-06-022. clima - Lluvia fuerte 12:30 / 13:00

Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra actividades

U. / m. / m. / m.





10-06-022. clima: Despejado

Personal contratista

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: No registra actividades

U. / m. / m. / m.



11-06-022 clima: Despejado

Personal contratista:

Pe

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividad

U. / m. / m. / m.



13-06-022 Clima: Lluvias intermitentes
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSITHA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. A. Ant. J. Ant. b



14-06-022 Clima: Despejado
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSITHA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Ant. J. Ant. b



15-06-022 Clima: Despejado
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSITHA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Ant. J. Ant. b



16-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografico

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores




17-06-022 Clima: Lluvias de 10:15 / 11:30

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografico

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores




18-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografico

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Flores



21-06-022 Clima despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector asist.

ACTIVIDADES: No registra actividades

V. Inf. y Asist.



02-08-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico


Actividades: No registra.

Vbo

Cant. de terreno

Reserva de obra

Inf. y Asist.



08-08-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: No registra

Vobo

Cant. de terreno

Reserva de obra

Inf. y Asist.



09-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes
personal contratista: 01 inspector topografico
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Vobo
Contratista
Residente de obra



10-08-022 clima: Lloviznas leves intermedias
personal contratista: 01 inspector topografico
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Vobo
Contratista
Residente de obra



1-08-022 clima: Despejado
personal contratista: 01 inspector topografico
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Vobo
Contratista
Residente de obra



12-08-022 clima: Despejado
 Personal contratista: 01 inspector topografo, 01 ayudante
 Personal Interventoria: 01 inspector tecnico
 Actividades: se instalan varillas de 5/8" (regillas)
 para ventana de sumidero.

Udo
 Contratacion
 Residente de obra

13-08-022 clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector topografo
 Personal Interventoria: 01 inspector interventoria.
 Actividades: No registra

28-02/22 Clima seco en las horas de la mañana. Lluvia de 2:45 - 3:30 p.m.

Se realizó el trabajo de muestreo tipo IA a nivel de veredades de demarcación de cadenas.


J. J. J. J. J.

01-03-022 CLIMA: Lloviznas 07:00 - 09:00

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales
01 operador, 01 vibro compactador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA, 01 residente social, 01 residente técnico

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se inicia demolición de anillos costado derecho en tramo de avance parcial

Se solicita al contratista realizar el acceso a viviendas ya que en su momento no estaban, se realizó la toma de síntomas COVID y se verifica el uso de los EPP.

(6)

16062

Se evidenció el cerramiento completo del frente y la completa implementación del PMT. Se realizó el acopio de RCD.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

02-03-22

CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 operador, 01 vibrocompactador

Se continua demolición de andenes costado derecho en avance parcial y se realiza extendido y compactación de material granular costado derecho.

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA, 01 residente técnico, 01 residente social.

Se solicita al contratista realizar el acceso a viviendas ya que en su momento no estaban, se realiza toma de síntomas covid y se verifica el uso de los EPP.

Se evidencia mantenimiento al cerramiento.
Se realiza acopia de material y cargue de RCD.

Andrés Acuña

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

03-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
01 operador, 01 vibracompaactor

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 residente técnico,
01 residente social, 01 inspector SST-MA, 01 inspector
técnico.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa
demolición de andenes costado derecho
en avance parcial y se continúa extendido
y compactación de material granular costado
derecho avance parcial.

No se evidencia el acceso a viviendas
debido a demolición de andenes, se realizó
toma de síntomas covid y verificación de EPP

Andrés Acuña

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

M-03-22

CLIMA:

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 Inspector SST-MA,
01 inspector técnico, 01 residente social.

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
01 operario, 01 vibrocompactador.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continúa demolición
de andenes costado derecho e izquierdo en
avance parcial y se continúa extendido y
compactación de material granular costado
derecho avance parcial.

Se realizó cerramiento con cinta debido
a demolición de andenes en el frente
de obra, se registraron síntomas covid y
se verificó EPP y se realizó acceso a
viviendas.

Andri Pardo
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

05-03-22

TIEMPO NUBLADO

PERSONAL 2 Ayudantes 1 OFICIAL, 1 OPERARIO
1 BOAL. - INSPECTOR SST - AMBIENTAL. TIEMPO 5:30

Se realizan actividades de demolición de
 andenes en el costado occidental del segmento,
 se adelanta asco general de obra y retiro de
 material de excavación, se ejecutan actividades
 de conexión y reparaciones de red potable.

Andrés Acosta
 Responsable Obra.

07-03-22 CLIMA: Lluvia moderada 7:00 am a 11:50 am

PERSONAL CONTRATISTA: 02 ayudantes, 02 oficiales,
 01 operador, 01 vibrocompactador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 Inspector SST-MA,
 01 inspector técnico

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se finaliza demolición
 de andenes costado derecho e izquierdo en
 avance parcial y se continúa extendido
 y compactación de material granular costado
 derecho avance parcial.

(10)

El día hoy el sitio de disposición final Nut Fico, que se encuentra cerrado por Hto.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas

Informamos las operaciones de fiscal y Tiquicha se encuentran suspendidas el día de hoy 2 de marzo, en la que se realiza mantenimiento de puentes, estaremos informando de reanudar en el transcurso del día y no presentará mayores afectaciones por el clima

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realiza mto. Cerramiento, orden y aseo en el frente de obra

Se realiza Implementación de Protocolo de Bioseguridad y de las actividades del SG-SST.

Respecto Obra
Luis J. J. J.

Develc

Prof SST. Conto

8-3-22

Se notifica que el sitio de disposición final de RCD

se encuentra sin servicio por condiciones climáticas; Se notifi-

ca señalizada punto de riesgo; Componento organizado y

señalizado, Punto ecológico; Uso adecuado de EPP y toma

de síntomas COVID 19.

Marcel Torres - Res - Ambiental



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condicio

Informamos las opera
de 2022, en lo que se

Agradecemos su com

Hacer extensivo a qu

Clima seco parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 boal.
1 Operario.

Actividades: Excavacion manual andenes.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista realizar
el retiro del material de mejoramiento contumi-
nado durante el desarrollo de actividades de
excavacion sobre andenes. Se solicita implementar
de forma adecuada los accesos a viviendas.

 Rubén Rosales

12

1606

09-03/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal de obra: Inspector, 1 boal, 1 Operario.

Actividades: Transporte y disposición final de escombros.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar la adecuación de accesos y pasos peatonales seguros para los residentes de la zona en intervención.

 Andres Pueli

10-03/22 Clima seco, parcialmente soleado en las horas de la mañana. Lluvias fuertes después de las 2:40 p.m. generando empozamientos de agua.

Actividades: No se realizó ninguna.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar mantenimiento a cerramientos perimetrales y realizar el cambio de la polisombra que se encuentra en mal estado.


 Andres Pueli

542

11-03/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 1 boal, 1 Operario

Actividades: Suministro y acopio de base granular para andenes.


Andres Arce

12-03/22 Clima seco, parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 1 Ofrciel, 1 Ayudante, 1 boal.
1 Operario.

Actividades: Excavacion manual andenes y suministro de base granular reciclada andenes. - Rellenos,

Se continuan con octro de material y
acso de obra

 Andres Arce

(M)

14-03/22 Clima: Lluvias 11:25 / 14:10
 Personal Obra: 1 inspector, 01 oficial, 1 ayudante
 1 operador, 1 boal
 Personal Interventoria: 1 inspector, 1 inspector SST-MA
 Actividades: Se realiza demolicion de cajas
 de inspeccion existentes y excavacion manual en avance parcial.
 OBSERVACIONES: Se solicita realizar medidas de control
 con el fin de evitar la contaminacion con material
 de excavacion al material de mejoramiento instalado

durante

J. P. P.

16-03-022

Clima

Person

dante

Perso

Actu

de

de

ce

Andrés Pineda

15-03/22 Clima: despejado
 Personal Obra: 1 inspector, 01 oficial, 1 ayudante
 Personal Interventoria: 1 inspector, 1 inspector SST-MA
 Actividades: Se continua demolicion y excava
 cion para construccion de cajas de
 inspeccion de alcantarillado
 OBSERVACIONES: Se solicita el retiro del
 material de mejoramiento contaminado

17-03-07

durante los procesos de excavación.

Federick Goss
1. Ajustes

16-03-022 clima: despejado

Personal Centralista: 1 topógrafo, 01 oficial, 01 ayudante, 01 operador, 1 boal

Personal Interventista: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continúa excavación y medición de cajas de inspección y se inicia construcción de cajas para rearmetidos de abanquillado, se continúa compactación de material granular en orden el tramo de avance parcial

Andrés Arce
Federick Goss

17-03-022 clima: despejado

Personal Obra: 1 topógrafo, 01 oficial, 01 ayudante, 01 operador, 01 boal

Personal Interventista: 01 inspector 01 inspector SST-MA

(16)

Actividades: se continua construccion de
cayos de inspeccion para alcantarillas de alcantarillado en avance parcial.

17-03-022

clima:

personal

personal

actividad

para

Andrés Peris

Pereira

18-03-022

Clima: despejado

personal de obra: 01 oficial, 02 ayudantes, 01
topógrafo, 01 local

22-03-022

C

Personal interdentaria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Re

Pr

Actividades: se continua construccion de cayos
para alcantarillas alcantarillado, se inicia excava-
cion para muros predios 7D-28^e y 7D-32^e

se realiza toma de densidades por parte del
contratista anden predio 7D-10^e ± 1 91%, se
solicita corregir y subsanar actividad, y rea-
lizar nuevamente la verificacion por densidad.

23-03

Andrés Peris

Pereira

11-03-022 clima: despejado

personal obra: 01 oficial, 01 ayudante, 01 topografo

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua construcción de cayas para acometidos de alcantarillado.

Adas Acari
Resident Ob

22-03-022 clima: despejado

personal obra: 01 oficial, 01 cachero, 01 ayudante

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividades: Se continua excavación para muros predios 40-28^E y 70-32^D, se inicia parte y figurados de acera para muros avance parcial

Resident Ob

23-03-022 clima: despejado

Personal obra: 1 topografo, 01 ayudante, 01 oficial, 1 boal

(18)

Personal Interventoria: el inspector, el inspector SST-HA, el residente SST-HA, el residente social, el residente técnico. 20-03

Actividades: Se finaliza amarré e instalación de acero y se funde concreto de 3000 psi para zapatas muros predios 70-28^E y 70-32^E.

OBSERVACIONES: Se realiza toma de densidad en anden derecho predio 70-10^E la cual no cumple por lo cual se solicita al contratista corregir y subsan. teniendo en cuenta que el porcentaje de compactación evidenciado corresponde a 94.60. Se evidencia incumplimiento con el traspaso del acero de refuerzo encontrando traspasos de ser 25 y 20cm, a su vez no se garantiza recubrimiento del acero instalado. Se solicita al contratista informar la ejecución de dichas actividades con antelación ya que la actividad no habria sido liberada por esta interventoria por lo cual, se presentan las anteriores observaciones.

Por Orden de Obra
Rodrigo Acuña

24-03-2022 TIEMPO IXTAPALO

PERSONAL INSPECTOR - 2 AYUDANTES 1 OFICIAL - 1 REAL
 RESIDENTE TEC - AMBIENTAL - SST

Se continúa con trabajo en zona de cadáveres
 internos, construcción de muros T-4; se realiza
 compactación y encaje en una zona de cadáveres
 una el fin de realizar forma de consideración el
 cual se evidenciará en el día exterior no
 dieron; se realiza aseo general de obra

Radmila Ochoa

25-03-2022

Radmila Ochoa

TIEMPO IXTAPALO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 1 INSPECTOR 2 OBREROS
 RESIDENTE - TEC - SST - AMBIENTAL

Se continúan actividades de compactación en
 zona de cadáveres internos y refuerzo de
 zona para bordes y cerrados, se realiza
 forma de consideración, se realiza aseo general
 y mejoramiento de acceso y cercamientos

2

26-03-2022

Personal 1 OFICIAL 2 AYUDANTES, 7 HORAS
INSPECTOR.

24.03.22

Se inicia con actividades de instalación
perdido de confinamiento y tajeado
para la instalación de la cumbre a-ru
en zona oriental del segmento, se
continúa con empuje de eslabones laterales.


Pedro Acosta

30-1

Personal - 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES - 1 ORGANIZADO -
1 HORAS - 2 HORAS - 7 HORAS - 1 HORAS.

28-03-2022

Se adelantan trabajos de instalación de
perdido de confinamiento y compactación
en zona de eslabones laterales, se
trabaja en consecuencia de apoyo de
inspección y empuje de ^{nuevo} ~~27 de marzo~~
Se realiza retro de material de
expansión.


09-03-2021 TIEMPO NUBLADO.

PERSONAL 1 - OFICIAL - 2 AYUDANTES - 1 ROTA

1 OPERARIO - RESORTE TCC-585-AMBIENTAL

Se continúan labores de instalación de
perchillo de confinamiento y cubetas
fotométricas.

Se realizó video general de obra y
adelantos de cerramientos; se continúa
adelantando de ley de especies.


Por:  Luis Rueda

20-03-2021 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 ROTA - 1 OPERARIO

1 INSPECTOR - RES - TCC-AMBIENTAL 585.

Se continúa con labores de instalación
de perchillo custodios laterales de la
obra y cada de igual forma se continúa
instalación de cubetas en zona oriental.
Se realiza compactación en zona de esbozo.

Por:  Luis Rueda

22

31-03-2022 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES.

1 OFICINARIO - 1 B.O. 7 TECNICO - SST - MAINTENIMIENTO
1 B.O.A.L.

Se continúan trabajos de instalación
de bardilla de alambramiento en interior
del sector e instalación de casaca
prefabricada costado orientado SR.

Trabaja con excavación manual para instalación
sumidero en zona sur del CIV.

02

01-04-2022

Lados de Of.
J. Carlos Rodríguez

TIEMPO SECO: PERSONAL 2 AYUDANTES 7 OFICIAL

1 B.O.A.L. - B.O. - TEC. SST - MAINTENIMIENTO.

09

Se continúa con instalación de bardilla
de confinamiento, instalación de casaca
prefabricada y excavación para sumidero
en costado sur, se realiza retro
de material de excavación y sobrante.

547

se adelanta caso general de obra y
recibo de documentación en gobierno.

Proyecto Obra
Hidro-Reserva

02-09-2022. TIEMPO VIVADO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1 OPERARIO

1 POMA - RES TGC - SST - AMBIENTAL

Se adelantan trabajos de mantenimiento estructural
en muro norte, se adelantan trabajos de instalaciones
de conducto prefabricado en costado oriental.
se realiza retiro de material sobrante de obra.

07-09-2022. TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 1 OPERARIO

PERSONAL - TGC - SST - AMBIENTAL

Se trabaja en extendido y cerco de
material sub-base para en vista de
igual forma se trabaja en retiro

29

y continuacion en zona de calzon
se calman con costuras de
bordado y loceta preestirada.

06-04-0

Reserva Obr
Nada. Presa.

05-04-000 SERAPO NUBADO CON LUMIN. BRAS.

PERSONAL LOCAL - 2 OYUNANTE Y OCHERO
1 BOLL.

Se contina con extendido de material
tipo PLA en zona de cordones, se adelanta
conformacion de cas de inspeccion en pre.

Surto del segmento, se trabaja en
compuatacion de material granular en
zona de calzados.

07-0

se realiza asco general de obra y
mejoramiento de acceso a los p-echos.

TIEMPO VUELADO
06-04-2022 PERSONAL 10 FILITE 2 AYUDANTES 1
OPERARIO - 1 BOMBA.

Se continuó con el tendido de mampara
tipo PER en zona de andenes, conformación
y colocación de guija de inspección, se colocaron
trabajes de compactación en zona de calzada,
y cercado de la misma, se colocaron actividades
de adecuación de redes domiciliarias.

[Firma]
Fuentes C. B.

07-04-2022 TIEMPO 5610

PERSONAL 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 1 TOPOGRAFO 1 BOMBA
1 OPERARIO.

Se continuó con instalación de cunetas prefabricadas
en cunetas orientales, de igual forma se colocaron
trabajes de conformación de cunetas de inspección y
muros en bloque estructural en cunetas.

[Firma]
Fuentes C. B.

26

08-07-2022

Tiempo seco

Personal 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1

BOMBA - OPERARIO - PES TEC - SST AMBIENTAL

Se realiza excavación para confirmación de sumidero en el costado sur del segmento

11-07-2022

Se adelanta trabajo de emboscado de conductos prefabricados, perchiles y muros. en cuanto, se continúe con construcción de ceras de inspección.

Resumen Obra

09-08-2022

Nota Final

09-07-2022 - TIEMPO SECO.

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES - 1 BOMBA
1 OPERARIO.

Se realiza compactación y cercado de

12-07

calzado, se continúe con confirmación de ceras del costado occidental, se

adelanta trabajo de excavación para sumidero en el costado sur del segmento

se reanuda esco general de obra y
arreglo de cerramientos.

[Signature]
Rafael Chir
Indra Nishi

11-04-2022. PERSONAL 2 OFICIAL AYUDANTES 2 OPERARIO
1 BOAZ. 1 TOPOGRAFO.

Tiempo Seco.

Se continua con trabajo de cerramientos
zona para instalacion sumidero costado sur,
se trabaja en cercado de material en zona de
calzada y zona de cunetas; se reanuda retiro
de material de excavacion. "Sumidero"

[Signature]
Rafael Chir

12-04-2022 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES. 1 BOAZ.

1 OPERARIO.

Se adelanta trabajo de conexiones
de material en zona de cunetas y

29

confirmación de cajer en base norte
del segmento, se hacen en conex.
labor en sumidero costado sur.

Se da espere para la programación del
concreto ~~M241~~ y se este
definiendo el tipo de estampado en
instalar según propuesta presentada por
el consorcio y Tipología escogida por
la comunidad, se trabaje en presentación
de la modulación.

Fin del Acto
Respecto Otr

B-07-2022 Tiempo seco

Personal 10 PICAL y AYUDANTE 2 BOM

Se continúa con trabajos de
construcción cajer para sumidero
en zona sur y construcción de
módulo en zona de cadáver.

Se realiza en modulación y tipo de
a tiempo a implementar en la ciudad de
queel tema es el presupuesto para las utilidades
de concreto en los andenes y no cubren
presupuesto según solicitud de la comunidad

Se realiza retiro de muros producto de
exclusión.

Perdante Obra.
J. Acosta

14-15-16-17 ABRIL - SEMANA SANTA

18-04-2022

TIEMPO AVALADO

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1 OPERARIO

Se continúa con construcción de sendero según
aval del 07-04-2022 por parte del supervisor de la
EAPP, se adelantan trabajos de cierre de
inspección en cortado occidental, se realiza
con armadura de acero en bloques estructurales.

Perdante Obra

19-04-2022 TIEMPO LLUVIOSO EN HORAS DE LA
MAÑANA.

PERSONAL OPERARIO Y OBRERO Y AYUDANTE
1 BOAL - RES - TEC - 557 MAINTEN.

Se realiza cerco de material de sub-suc PA
en andenes y cultivos, por tener de
lluvia se retrasan actividades.

Se informa sobre cierre de escombrera



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 19 de
abril de 2022.

   Informamos se suspende totalmente el servicio en
nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Res. Lda. Ob. Andrés Ariza

20-04-2022 TIEMPO LLUVIOSO

PERSONAL OPERARIO Y BOAL Y AYUDANTE
Y OBRERO

Se realiza trabajo de uso y orden
en el segmento.



Reporte de cierre por
CEMEX "ESCOMBRERAS"

Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 20 de abril de 2022.


 Informamos se suspende temporalmente el servicio en nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se continúa el uso de elizade y ordenar por
proponer instalación de MP-91 en elizade.


En las Andes

21-04-2022. TIEMPO LLUVIOSO

PERSONAL OFICIAL Y AYUDANTE Y BUQUE-
LES TEC-SST-AMBIENTAL.

Se realiza la instalación del sombrero
prefabricado en el custodio sur-oriental
del segmento. Se realiza cerco de la
elizabeth y retro de material sobrante.

Se reporta interrupción de comunicaciones.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 21 de abril de 2022.

   Informamos se suspende el servicio de atención por escombrera fiscal horario de atención hasta las 2:15 p.m

Invitamos a nuestros clientes dirigirse a escombrera Tunjuelo

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

23-01

22-01-2022 HENRY LLUNOSO

PERSONA 7 OBRERA 7 OBRERO 7 OBRERA

Se continúa con cerco de ciudad y

créditos, se realiza uso general de

obra y retro de material sobrante.

Se reporta cierre de escombrera por

lluvia.



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 22 de abril de 2022.

Se suspende temporalmente el servicio de atención en escombreras Tunjuelo y fiscalía.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

[Handwritten signature]
Andrés Muñoz

23-04-2022. PERSONAL Y OFICIALES Y AYUDANTE
Y BOAL. Y OPERARIO - RES TEC-SSA-MANENIA

Se realizó ferra de observación en zona
del cilindro de igual ferra se
ejecuta la instalación del cuerpo del
pozo ubicado en la zona norte del
segmento, se debe a una conexión y
conexión de suministro prefabricado.

Andrés Muñoz
[Handwritten signature]

16076

26-04-2022

ES-04-2022 TIEMPO NUBLADO - LLUVIA EN HORA DE LA NOCHE
PERSONA: EL OPERARIO EL BOAZ - LA GUAYANA
REC. TEL - 551 - ANA-CATAL.

SE confiere con coberturas de suadero
y llantas laterales, se realiza corteo de
cultivos y andenes; se realiza coseo y
orden del segmento, labores pendientes
por lluvia en la zona.



Importante

Estimado cliente

Debido a las fuertes lluvias presentadas el día domingo 24 de abril, EL
LUNES 25 DE ABRIL

NO SE PRESTARÁ el servicio de escombrera en
tunjuelo y fiscalá

Durante el día estaremos informando de poder retomar operación en horas de la tarde.

Agradecemos su comprensión.

Hacer extensivo este mensaje a quien sea necesario.

Roberto C. Díaz
Andrés Acosta

27

563

26-07-2022 Tiempo seco en Hornos de la mina, se
preparan Nuevo en Hornos de la mina.

2:30 pm - 9:25 pm.

Se realiza cerco de calzada y lindero con
compactación de la zona, se realiza preparación
de cordón de M.A. según cupo del proveedor
Cemex.

Por: *[Signature]*
Andrés Buitrago

27-07-2022. Personal 1 OFICIAL 1 BOAL 1 OPERARIO

Se realiza retiro de material sobrante de
manchales calzados, se realiza compactación de
calzada con el fin de preparar instalación de
M.A. en asfalto por parte del proveedor
Cemex, se realiza cerco y lindero general.

Por: *[Signature]*
Andrés Buitrago

28-04/077 clima: Despejado
Personal: 01 inspector topografo
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: No registra

Antes de la

02-05/077

29-04/077 clima: Despejado Lluvia 08:35 / 10:30
Personal: 01 Inspector topografo
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: No registra

Antes de la

13-05/

30-04/077 clima: Despejado
Personal: 01 operador, 03 oficiales, 05 ayudantes
01 boal, 01 inspector, 01 cadenero
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: se realiza instalacion de
acero kotawo y kotozo y dobelos y se

60307
junte concreto tipo MR-41 en via 10+000/032
y se realiza estampado para 13 módulos

Va Lindak Ofc

J. Andrés Rueda

02-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector, 01 oficial, 01 cadenero

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTRMA

57
Actividades: Se realizan cortes para juntas
en losas de MR-41 en via.

Va Lindak Ofc

J. Andrés Rueda

13-05/02 clima: despejado

Personal: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTRMA

Actividades: No registra.

Va Lindak Ofc

J. Andrés Rueda

04-05/022 clima: despejado

Personal: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra.

Residente Don
Andrés Pusch



07-05-22

C
R
F

05-05/022 clima: Lluvia fuerte 09:30 / 11:00

Personal Contratista: 01 inspector

09-05-02

Personal Interventoria: 01 residente tecnico, 01 residente SST, 01 inspector, 01 inspector SST-ru

ACTIVIDADES: No registra

Residente Don
Andrés Pusch



10-05-

06-05/022 Clima: Lluvias 08:00 / 09:30 y 14:00 / 17:00

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: No registra

V. Arendt Pusch



07-05-22 clima: Lluvia permanente todo el día
Personal Contratista: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
ACTIVIDADES: No registra

Registra Uo.

Uo. Andrés Bello



08-05-22 clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
ACTIVIDADES: No registra

Uo. Andrés Bello



10-05-22 clima: Lluvia fuerte 13:00 / 17:00
Personal Contratista: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
ACTIVIDADES: No registra

Uo. Andrés Bello



11-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 ACTIVIDADES: No registra

U. Andrés Bello

12-05/022 Clima: Despejado
 Personal contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 ACTIVIDADES: No registra

U. Andrés Bello

15-05/022 Clima: lluvia en la mañana, tarde despejado
 Personal contratista: 03 oficiales, 04 ayudantes
 01 inspector, 01 boal, 01 operador
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector
 ACTIVIDADES: Se realiza instalación de acero
 y se funde andén costado derecho en
 concreto estampado tipo MR-41
 OBSERVACIONES: Se solicita al contratista

cuantizar la correcta implementación del PMT
en conformidad a lo aprobado por la SOT
V. Andrés Pineda



14-05-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: Se realizan cortes para inducir
juntas en losos de HR-41

V. Andrés Pineda



16-05-022 Clima: Lluvia leve 07:00 / 08:30

Personal Contratista: 02 oficiales, 02 ayudantes
01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realiza nivelación de anden
costado izquierdo en material granular
compactado, se realiza instalación de
cajillas para acometidas de alcantarillado
se finalizan rellenos compactados para

muros predios 70-28^o y 70-32^o.

18-05/022

V. Andres *[Signature]*

[Signature]

17-05-022 Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 residente tecnico

Personal Interventoria: 01 residente tecnico, 01 residente SST, 01 inspector SST-MA, 01 inspector

ACTIVIDADES: No registra

OBSERVACIONES: Esta interventoria solicita al contratista corregir el acabado del estampado del concreto MR-41 en andenes y a su vez, se garanticen excelentes acabados entre las transiciones del anden y los predios y tambien se realicen los acabados necesarios que son adyacentes a los predios, garantizando un excelente acabado estetico.

19-05/0

V. Andres *[Signature]*

[Signature]

20-05

18-05/22 Clima: Lluvias fuertes 08:00/15:00
Personal Contratista: 03 oficiales, 01 ayudante, 01
boal, 01 inspector, 01 operador
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
ACTIVIDADES: Se realiza instalación de acero
en rampas y se funde concreto estampado
tipo MR-41 en anden costado izquierda

V. Andrés P. S. L.

19-05/22 Clima: Despejado
Personal Contratista: 01 ayudante, 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector SST-MA, 01 inspector
ACTIVIDADES: Se realiza instalación de tapa
para cajas de inspección avance parcial.

V. Andrés P. S. L.

20-05/22 Clima: Despejado
Personal Contratista: 01 inspector
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
ACTIVIDADES: No registra

V. Andres [Signature]

25-05/01

21-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: No registra
 V. Andres [Signature]

26-05

23-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-16
 Actividades: No registra
 V. Andres [Signature]

27

24-05/022 Clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
 Actividades: No registra.

25-05/072 clima: Lluvia moderada 07:30 / 11:30

Personal Contratista: 01 bañal, 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

ACTIVIDADES: jornada de aseo general.

V. Andrés P. L. S.



26-05/072 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector, 01 oficial

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

ACTIVIDADES: Se realizan paños y remates

contra predios y acabados para cajas de
inspección de alcantarillado avance parcial

V. Andrés P. L. S.



27-05/072 clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: No registra.

V. Andrés P. L. S.



28-05/022 clima: Despejado
 Personal Contratista: 01 inspector
 Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA
 Actividades: No registra

V. Andrés P. S. L.

31-05/022. clima: Despejado
 Personal contratista:

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés P. S. L.

21-06-022. clima: Despejado

Personal contratista.

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

V. Andrés P. S. L.

02-06-022 Clima Despejado
Personal contratista: / /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Páez



03-06-022 clima. Lluvias intermitentes todo el día
Personal contratista: / /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Páez



09-06-022 clima Despejado
Personal contratista: / /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra actividades.

Vs. Andrés Páez



06-06-022 clima Lluvia fuerte 15:20 / 17:00

Personal contratista: /

09-06-1

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HS

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Luch



07-06-022 clima Lluvias 12:30 / 13:00

10-0

personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Luch



08-06-022 clima Despejado

11

Personal contratista: /

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HS

Actividad: No registra actividades

Vs. Andrés Luch



09-06-022. clima: Lluvia fuerte 12:30 / 13:00
Personal contratista.

personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-MA

Actividad: No registra actividades.

U. / ins. / ins.





10-06-022. clima: Despejado
Personal contratista.

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

Actividad: No registra actividades

U. / ins. / ins.



11-06-022. clima: Despejado
Personal contratista:

Pe

Personal interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividad: No registra actividad

U. / ins. / ins.



13-06-022 Clima: Lluvias intermitentes
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSMA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. A. L. J. F. L. C. B.

14-06-022 Clima: Despejado
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSMA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. A. L. J. F. L. C. B.

15-06-022 Clima: Despejado
 PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo
 PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSMA
 ACTIVIDADES: No registra actividades

U. A. L. J. F. L. C. B.

16-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Roa st




17-06-022 Clima: Lluvias de 10:15 / 11:30

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Roa st



18-06-022 Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector SSTMA

ACTIVIDADES: No registra actividades

U. Andres Roa st



21-06-022 Clima despejado

PERSONAL CONTRATISTA: 01 inspector topografo

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector, 01 inspector

ACTIVIDADES: No registra actividades

V. Rodríguez



06-08-022 Clima: despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: No registra.

Vbo

Carrizosa

Resistente de obra

Rodríguez



08-08-022 Clima: Despejado

Personal contratista: 01 inspector topografo

Personal interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: No registra

Vobo

Carrizosa

Resistente de obra

Rodríguez



09-08-022 clima: Lloviznas leves intermitentes
personal contratista: 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Voto
Contratista
Residente de obra



10-08-022 clima: Lloviznas leves intermedias
personal contratista: 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Voto
Contratista
Residente de obra



1-08-022 clima: Despejado
personal contratista: 01 inspector topografo
personal interventoria: 01 inspector tecnico
Actividades: No registra

Voto
Contratista
Residente de obra



12-08-022

Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo, 01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector tecnico

Actividades: Se instalan varillas de 5/8" (regillos) para ventana de sumidero.

Udo
Contratista
Residente de obra

13-08-022

Clima: Despejado

Personal Contratista: 01 inspector topografo

Personal Interventoria: 01 inspector interventoria

Actividades: No registra

Bitácora
El Bosque
CIV 5003713

Libro de Anotaciones.
80 Hojas Rayadas.



01-01/22 Se da inicio con la inspeccion con Bactor de la red sanitaria y pluvial. CIV: 5003713

Residente de Obra Contrata

Residente de Obra Inter

03-01/22 Se adelanto la inspeccion con camara CCTV de las redes sanitaria y pluvial.

Residente de Obra Contrata

Residente de Obra Inter

26-01/22 Se da inicio a la instalacion de la madera rolliza para el cerramiento por uno de los costados.
Personal: 2 boal.


Tiempo: seco y soleado en las horas de la mañana
aguacero despues de las 4:30 p.m.

Residente de Obra Contrata

Residente de Obra Inter


27-01/22 Se continua con el cerramiento. Se adelanto la nivelacion del area con la comision de topografia.
Personal: 2 boal; Topografo y auxiliares de topografia.

Tiempo: Seco y soleado


Residente de Obra


Residente de Obra Interior


28-01/22 Se adelanta inspeccion de la red aguas lluvias con Bactor.


Residente de Obra


Residente de Obra Interior


01-02/22 se realizan trabajos de cerramiento para iniciar con los trabajos de excavacion, clima soleado



Residente de Obra


Residente de Obra Interior

02-02/22 El Contratista inicia trabajos de excavacion mecanica y Comienzo topografico

Tiempo: Soleado, Cuenta con una Retro excavadora y Volquete, Conto con Ayudante (1), Boral (1)

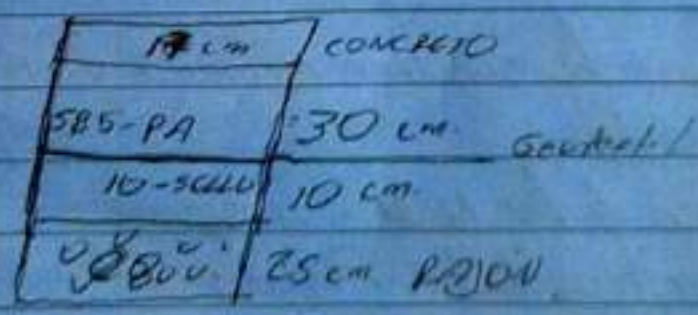

Residente de Obra Contratista


Residente de Obra Interior

03/02/22 clima: soleado Trabajadores: inspector (1), Topógrafo (1) Carretero (1)
 Boral (1) Ayudante (2), SST (1), MA (1)

El contratista continúa con trabajos de excavación y retiro de material de excavación.

En visita al cuxato con la Interventoría, se evidencio que en la cota a -0.67 cm como se determinó el CBE, se observó que aún se encuentra con relleno producto de deslizamientos, por lo anterior, se solicita estabilizar toda la zona con R-25 y sello de 10cm con material sub-base el cual permite garantizar el conformamiento uniforme del segmento.



Una vez revisada la observación y solicitud del contratista se autoriza a que realice una sobre excavación de 15cm para dar estabilidad al segmento vial.

[Firma]
 CCUP

[Firma]

04-02-2022

Se realiza visita por parte del
ING. CESAR. UNÍEZ Representante de
empresa de Alcantarilla de Bepate el
cual informo:

La red debe quedar en espacio público y de
igual forma las descargas deben quedar
directas desde el colector hasta el
medidor; se debe de instalar una válvula
en el costado ^{SUR} ~~NORTE~~ del CIV.

ALVARO NÚÑEZ
42
EAB

Andrés Cor

Se continúa con la excavación mecánica y retiro del
material excavado.

quienro después de las 12:30 - 2:00 p.m.


maquinaria: retroexcavadora y volquete.

Personal: Inspector, topógrafo, cadenero, 2 Ayudantes + 1 bot


Andrés Cor


05-02/22 Se continua con la excavacion mecanica y retiro del material excavado. arreglo acometidas domiciliarias de agua potable.
 Tiempo seco. maquinaria: retroexcavadora y volqueta
 Personal: Inspector, topografo, cadenero, 2 Ayudantes
 1 boal.


 Fernando Osorio


 Juan Carlos

07-02/22 Clima seco parcialmente soleado. Personal: Inspector, topografo, cadenero, Ayudantes 2, Boal.
 Se continua con la excavacion mecanica y retiro del material excavado.


 Fernando Osorio


 Juan Carlos

08-02/22 Se termino la excavacion mecanica caga de la via. Retiro de material excavado. arreglo acometidas domiciliarias de agua potable. Se adelanto perfilado del terreno manualmente aguacero fuerte despues de las 10:00 a.m. y lluvias permanente durante la mañana y hasta las 2:00 p.m. Se suspenden actividades durante el periodo de lluvia. Personal: Inspector, Topografo;

cadenero; 2 Ayudantes; 1 local.

Maquinaria: Retroexcavadora; Minicargador y Volquete.



Res. de Ob.


Int. de Ob.

09-02/22 Se continua con la perfilado manual de la
vía. Arreglo acometidas domiciliarias agua
potable. Suministro y colocación de material
reciclado - extendido.

Clima seco parcialmente nublado. Personal: 1 Oficial;
2 Ayudantes, 3 Topógrafo e Inspector (1)
Maquinaria: 1 Minicargador. (1)


Res. de Ob.


Int. de Ob.

10-02/22 Lluvia fuerte entre 2:45 p.m. - 3:05 p.m.

Personal: Inspector, 1 Oficial; 2 Ayudantes; 3 Topógrafos
Maquinaria: Minicargador. Suministro y colocación de
piedra rajon.


Res. de Ob.


Int. de Ob.

11-02/22 Aguacero fuertes después de las 2:00 p.m. y lluvias permanentes durante toda la tarde. Se suspenden actividades.
Personal: 3 Ayudantes; Inspector.
Se continuo con la acomodación de la piedra rajon en la caja de la vía.

[Signature]
Presidente C.O.R.

[Signature]
Inspector

12-02/22 Clima seco y parcialmente soleado. Personal: Inspector 2 Ayudantes. Retiro de empozamientos de agua y se continua con la acomodación de la piedra rajon en la caja de la vía.

[Signature]
Presidente C.O.R.

[Signature]
Inspector

14-02/22 Lluvia fuerte después de las 3:00 p.m. Personal: Inspector 2 Ayudantes. El fin de semana lluvia generando empozamientos de agua - retiro de empozamientos. Suministro, colocación de piedra rajon. Maquinaria: Minicargador.

[Signature]
Presidente C.O.R.

[Signature]
Inspector

15-02/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, Topografo, cadenero, 2 Ayudantes
Se continua con la acomodación de la piedra rajon.
Arreglo acometida domiciliaria de aguas negras.
Suministro y colocacion de base reciclada para
sello de rajon.

[Signature]

[Signature]

16-02/22 Clima seco parcialmente soleado.

Personal: Inspector, Topografo, cadenero, 2 Ayudantes
Extendida y compactación de sello piedra rajon
caja vía. Maquinaria: Minicargador; Compactador y
canguro.

[Signature]

[Signature]

17-02/22 Clima seco y soleado.

Personal: Inspector, Topografo; cadenero, 2 Ayudantes
Suministro, colocacion de base granular reciclado caja vía
Maquinaria: Minicargador.

[Signature]

[Signature]

18-02/22

Clima seco en la mañana. Llover en las horas de la tarde

Personal: Topógrafo; Inspector; 2 Ayudantes.

Maquinaria: Minicargador y Vibrocompactador

Extendido, compactado y cerco de base granular reciclada
caja vía.

Pereira Cbr

D

19-02/22

Clima seco y soleado

Personal: Topógrafo, Inspector, 2 Ayudantes

Maquinaria: Minicargador y Vibrocompactador.

Cerco y compactación de base granular reciclada caja vía.

Pereira Cbr

D

22-02/22

Clima seco y soleado

Personal: Inspector, 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 baal.

Demolicion manual andenes en concreto, arreglo de
acometidas demoliciones agua potable.

Pereira Cbr

D

23-02/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 bodl, Operario

Se continua con la demolición manual de los andenes

Retiro material de excavación para disposición final.

Maquinaria: Minicargador y volqueta.

- Mantenimiento a caminos y implementación de senderos peatonales y
accesos a viviendas; Verificación de uso adecuado de EPP; Reparo
de guantes y topadoras; Toma de sistemas COVID

Manuel Torres - Res. Ambiental - Marcela Cárdeno

Verde de Oro

24-02/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 bodl.

Maquinaria: Minicargador y volqueta.

Demolición manual andenes en concreto. Retiro RCO
para disposición final.

- Diseño y mantenimiento a senderos y accesos de viviendas; ordenar
y limpiar en frente de obra; Verificación de uso de EPP y toma
de sistemas COVID. Manuel Torres Residente Ambiental - Marcela Cárdeno

Verde de Oro

25-07-22

Se realizó mantenimiento a senderos peatonales; implementación de accesorios para viviendas; Retiro de RCD; Orden aseo y limpieza general.

Namuel Torres - Pcs. Ambiental, Verificación y uso adecuado de EPP, toma de muestras COVID. Marcela Cataño


Tiempo seco parcialmente soleado en la mañana, aguacero fuerte después de 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. generando saturación del terreno y empozamientos de agua.

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, Operario y local. Maquinaria: Minicargador - volqueta.

Demolicion andenes en concreto. Retiro RCD para disposición final.

Res. de la Odr





26-02/22 Clima seco, parcialmente soleado
Personal: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 boal.
Excavacion manual y demolicion manual de ardores
en concreto.


Inspector Ocho




28 02/2022 Clima LLUVIAS PARCIALES.

Personal: Inspector 1 boal 1 - 3 Ayudantes.

1 OFICIAL - 1 OBRERO - 1 Prescribe Ocho.

1 SST. 1 AMBULATORIO

* Se continua con excavacion manual en
zona de ardores y conformacion de los
mismos.


Inspector Ocho



01-03-2022 CLIMA: LLUVIAS 07:00 - 09:00

PERSONAL CONTRATISTA: 01 ayudante, 01 boal
01 minicargador

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector técnico, 01 inspector SST-MA, 01 residente social, 01 residente

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se continúa perfilado y conformación de andenes en avance parcial.

Se solicita al contratista la correcta implementación del sendero peatonal. Se evidenció punto ecológico y acceso a viviendas.

Se verificó el uso de EPP y se realizó la toma de síntomas cívico.


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

02-03-2022: CUIMA: NUBLADO

Personal 2 ayudantes 1 OFICIAL - 01 local.

1 operativo, 1 INSPECTOR - RESIDENTE SST. TECNICO

Se continúa con excavación manual en

zona de andén, se adelanta excavación por instalación de bordillo: B-80.


Residente de obra

03-03-2022 TIEMPO SECO.

Personal 3 ayudantes, 10 oficiales, 10 operarios, 2 inspectores, 1 operario.


Se realizó toma de densidades en zona de sendero "onda" costado oriente, y zona occidental: K0+007 DERECHA. 98.8

K0+030 DER. 94.3 K0+014/24 96.8

LAS ANTERIORES DENSIDADES CIV 5003713 MEJORA DE ANDES.

Se realizó mantenimiento a algunos accesos a viviendas, se verificó el estado de la palisombra que no se encuentra en uso.

Se realizó toma de síntomas covid y verificación EPP.


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.


04-03-22 CLIMA:

PERSONAL CONTRATISTA: 01 ayudante, 01 BOAL, 01 operario, 01 minicargador.

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspecta tecnico,
01 inspector SST-MA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continuo excavación
e instalación de bordillo tipo A-80. Costado
derecho en tramo de avance parcial.

Se realizó acopio de material el cual
fue cubierto por polisombra y se realizó
mantenimiento a la polisombra.



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA.

25-03-2022 TIEMPO UTILIZADO

PERSONAL LOCAL Y AYUDANTE EQUIPO DE
TOPOGRAFIA "ICADENERO Y TOPOGRAFIA"

Se realizan actividades de instalación
de bordillo para conformación de cunetas
y relleno de los mismos, se adelanta
levanto de niveles y líneas de construcción
"Andenes y Bordes de Vías", se realiza coseo general
de obra y acopio de materiales.

se realizó movimiento de cercomientos y
accions a predios.

Andrés Puskoff
Puskoff Obra

07-03-22 CLIMA: Lluvia moderada 7:00 am a 11:50 am

PERSONAL CONTRATISTA: 01 ayudante, 01 BOA2, 01
operador, 01 minicargador.

PERSONAL INTERVENTORIA: 01 inspector SST-MA,
01 inspector técnico.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se continuo suministro
e instalación de material granular compactado
en andenes e instalación de geotextil en
tramo de avance parcial.

El día de hoy. El sitio de disposición final.

Reporte cierre del mismo por mantenimiento de Patio.

Ajuntó se da Notificación de Camex.

16695



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas

Informamos las operaciones de faja y fardo se encuentran suspendidas el día de hoy 7 de marzo, en la que se realiza mantenimiento de patios, estaremos informando de reanudar en el transcurso del día y no presentarse mayores alteraciones por el clima

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se realiza mto de Cerramiento, Limpieza y
Implementación PHT. Adecuación Componentes.
Se implementan Protocolos de Bioseguridad.

[Handwritten signature]
JES OMA

[Handwritten signature]
Prof SST.

8-3-22

Se notifica que el sitio de disposición final de RCD se encuentra sin servicio debido a condiciones climáticas.



Importante

Estimado Cliente

Debido a las condiciones clim

602

Se realizan mantenimientos a los accesos y viviendas, toma de muestras COVID y verificación de uso de EPP adecuados.

Manuel Torra - Ger. Ambiental

Clima: Seco parcialmente soleado

Personal de obra: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 boal.

Actividades: Excavación manual, demolición cajas de inspección aguas negras.

Orden de Obra

29-03/22 Clima (seco parcialmente soleado)

Personal de obra: Inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 boal.

Actividades: Excavación manual para zarpas; cajas de inspección. Demolición mampostería cajas de inspección aguas negras.

OBSERVACIONES: Se solicita verificar y corregir el bordillo A-80 costado derecho K+035/022 por posible afectación durante procesos de excavación en anclajes ya que el mismo se encuentra desplazado.

Andrés Rojas
Presidente Obr

10-03/22 Clima seco parcialmente soleado en las horas de la mañana, Lluvias fuertes después de las 2:40 p.m.

Personal de obra: Inspector, 2 Oficiales; 2 Ayudantes, 1 boal.

Actividades: Excavacion manual zarpa. Corte y piquado de hierro para zarpa.

OBSERVACIONES: Se solicita realizar implementacion y adecuacion de los accesos temporales a viviendas.

Andrés Rojas
Presidente Obr

11-03/22 Clima seco parcialmente soleado

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 boal.

Actividades: Excavacion manual zarpa. Fundida solado en concreto pisor cajas de inspeccion aguas negras. Amarre de hierro para zarpas.

OBSERVACIONES: Se solicita al contratista

Proteger las tuberías de servicios de alcantarillado expuestas a posibles hundimientos con material de excavación.

~~Personal Obra~~
~~Andrés~~

12-03/22 Clima: seco, parcialmente soleado.

Personal: Inspector, 2 Oficiales, 1 boal.

Actividades: Instalación de bordillo prefabricado

~~Andrés~~

14-04/22 Clima: despejado

Personal Obra: 01 Inspector, 02 oficiales, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST-HA 15-03

Actividades: Se finaliza instalación de acero y se funden zarpas muros predios

7c-28^e y 87f 23 sur concreto 3000 Psi

OBSERVACIONES: Se reitera al contratista garantizar la separación y recubrimientos del acero instalado a su vez, retirar el agua emporada

lo anterior debe realizarse con anterioridad a la instalación del concreto. Se ordena al contratista realizar el respectivo control y seguimiento a las actividades ejecutadas en conformidad a los diseños de cada frente de obra donde cualquier modificación debe ser debidamente sustentada documental y técnicamente y debe ser revisada con antelación por esta interventoría, lo anterior, ya que se evidencian modificaciones a los muros propuestos dentro del diseño, lo anterior sin aprobación previa.

Orderya obr

Alfonso

15/03/22 clima: lluvia 11:25 a 12:10

Personal obra: 01 topógrafo, 01 inspector, 01 cadenero, 02 oficiales, 01 boal

Personal Interventoría: 01 inspector, 01 inspector SSR

Actividades: Se inicia instalación de bloques para mampostería en muros de predios 76-28^E y 87f-23gr en avance parcial.

se continua instalacion de bordillo A-80
en tramo de avance parcial.

*Andrés B. P. /
V. A. / 17-03-22*

16-03/22 Clima: despejado

personal de obra: 01 topografo, 02 oficiales
01 ayudante, 01 bral

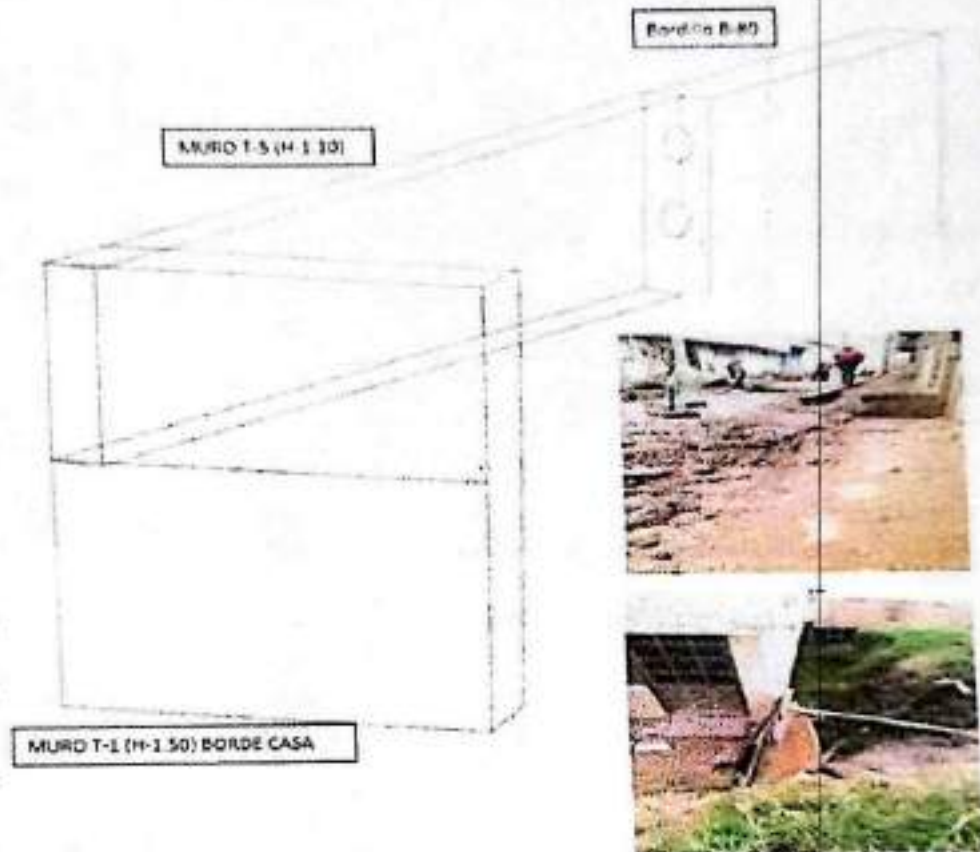
Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST

Actividades: se continua instalacion de bloques
para mamposteria de muros predios 7c-28^E y

876-23sur, se inicia excavacion para muros
T1 y T5 en predio 7c-05^E en avance parcial

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que la
vivienda identificada con nomenclatura 7c-05^E
se encuentra a un nivel inferior con respecto
al predio contiguo, se requiere realizar
un muro para confinar la estructura de
la via y la estructura del anden, por 17-03/
lo que la CVP (Arg. Ivan Ayala)
autoriza ejecutar en este tramo un

muro T5 alineado con el bordillo por la cara de la vía.



Paralelo a Obra
/ Veri. Staff

17-03/074 Clima: despejado

personal de obra: 01 topografo, 02 oficiales
01 ayudante, 01 boal

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: Se continua instalacion de
bloques para mamposteria muros predios
7c-28^e y 89f-23sur, Se continua construccion
de cajas de inspeccion para alcantarillado de
alcantarillado, se continua excavacion para
muros T1 y T5 para predio 7c-65^e en
tramo de avance parcial

T1

Pa

C

19-03/022

C

Pe

Andrés Rodríguez
Jorge L. Díaz

18-03/022 Clima: despejado

Personal de Obra: 01 topografo, 02 oficiales
01 ayudante

Personal Interventoria: 01 inspector, 01 inspector SST 22-03/022

Actividades: Se continua construccion
de cajas de inspeccion de alcantarillado
Se continua relleno compactado en
material compactado en anden costado
izquierdo en tramo de avance parcial
Se finaliza excavacion para muros

Ti y TS en predio 7c-05^e.

Andrés Pérez /
Presidente Obra

19-03/022 clima: despejado
personal de obra: 01 topógrafo, 02 oficiales
01 ayudante
personal intervectorial: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
Actividades: Se continúa instalación de
bordillo tipo A-80 en avance parcial.

Andrés Pérez /
Presidente Obra

22-03/022 clima: despejado
personal de obra: 01 topógrafo, 02 oficiales
01 ayudante, 01 boal
personal intervectorial: 01 inspector, 01 inspector SST
Actividades: se funde solado de limpieza
y se inicia figurado e instalación de
acero para muros Ty y TS predio 7c-05^e

Se continúan instalaciones de barda de
en tramo de avance parcial

Fin de obra
23-03-022

23-03-022 clima: despejado

Personal de obra: 01 topógrafo, 02 oficiales
01 ayudante, 01 boal

Personal interviniente: 01 inspector, 01 inspector SST-MA
01 residente social, 01 residente técnico, 01
residente SST-MA

Actividades: Se funde concreto de 3000
psi para zapatas muros T1-T5 piedra 7c-05

OBSERVACIONES: El contratista no garantiza
recubrimiento del acero instalado. Se solicita
informar la ejecución de estas actividades
con antelación ya que la actividad no
había sido liberada por esta interviniente.

Se evidencia modificación a la alineación
del muro T5 la cual debería haberse
realizado en continuación con la cara

del bordillo que queda contra la via, para lo cual el contratista manifiesta que dicha modificacion la realizo para no obstaculizar una valvula de acueducto encontrada en la zona modificando de esta forma lo aprobado por la CUP el dia 16-03-022.

✓ ING. TECNICO OBRAS

6-03-022 CLIMA ~~SECO~~ - MAQUINA

PERSONAL DE OBRAS = 2 OFICIALES - 2 AYUDANTES - 01 BOTIL

INSPECTOR TGC - 26100000 - 387 - AMBULANT.

Se continua con armado de muro tipo T-4 en costado oriental y armado de muro T-2 en costado sur-oriental, se continua con instalacion de Bordillo de confinamiento y relleno en material PFA - en andares.

Se advierte que el muro T-4 no fue posible realizarlo como se propuso en razon a que se evidencio el peso de una Valvula de control de agua potable el cual se debio dejar, es de advertir que se ordenara la caja segun

Bordado y loma de villa

1/10 100 100 100

25-03-2022

TIEMPO MEDIO

PERSONAL 2 AYUDANTES 2 OFICIALES 1 ADEL

INSPECTOR - RESIDENTE

Se adelanta actividades construcción muro
tipo T-4 en bloque crujo estructural y
muro tipo T-2 en costado sur-oriental
Se continua con instalaciones de bordado y loma
en zona sur y construcción de cajas de
inspección.

1/10 100 100 100

1/10 100 100 100

26-03-2022

5-716 MPD SECO

PERSONAL 2 AYUDANTES 2 OFICIALES 1 ADEL

INSPECTOR - FGC - SST - L. G. - AMARILLO

Se adelanta actividad de muro T-3 en costado
sur-oriental con el fin de continuar con
conformación de cader. de esta zona
Se continua con trabajo de instalaciones de

de confinamiento, compactación de material
grueta en estado endurecido

Responde Tec. Obra
Nº 101: 1001


28-01-2021: TIEMPO SECO

Personal de Obra 1 OFICIAL 1 AYUDANTE 1 BURE
SE CONTINUA CON TRABAJOS INSTALACIÓN DE MALLA
Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SARIKAL EN LINA
DE ANDENET, SE REALIZA ASO SEVERAL DE OMA


Responde Obra
Nº 101: 1001

29-01-2021 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE 1 BURE
AYUDANTE TEC - SST. AMBIENTAL.

Se recibe pedido de confinamiento con el
anillo de confinamiento con malla, se confina con
cerveza de sub tipo PA en vin y
compactación de material grueta en endurecido

Trabajos en STOP por escape de vapor de
acueducto

30-03-2022. Se realizó recorrido de obra
en conjunto con SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN,
CONSTRUYENDO con los PROFESIONALES
HIDRÁULICAS con el fin de verificar y
REUNIR la condición de las aguas calientes
al PORD EXISTENTE; SIN EMBARCO Y TIENDO
LAS 10:45 PM. SE DIO SUPLEN DEL SUPERVISOR
DEL ACUEDUCTO 'ESPA' QUE EN ESTA MAN
NO LLASO, POR LO QUE SE CANCELÓ

Trabajo en la zona sur del segmento 01-02-2022
tanto en vía como en orden hasta
no tener resuelto el tema de recolección
de agua caliente por parte de supervisor.

HUGO LARROTA:

TIEMPO SECO: PERSONAL 3 AYUDANTES 2 OFICIALES

1 BOYA INSPECTOR - REG - TEC - SST - AMB.

[Handwritten signature]

31-03-2022 TIEMPO SECO

PERSONAL 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL - 1 BOYA

1 OPERARIO - REG - TEC - SST - AMBIENTAL

Se continúan trabajos en construcción de corderos y conformación de cayo de inspección, en espera visita por parte de supervisor de la ENAB para definir la conexión de los cayos nuevos y continuar con los labores de cercado en la zona sur del segmento.

José D. Ochoa
Rafael Acosta

21-08-2022. TIEMPO SECO

PERSONAL OFICIAL 2 AYUDANTES, BUAL -
INSPECTOR - RET - TEE - SST - AMBIENTAL.

- Se trabaja en la instalación de perdido de confinamiento en zona sur del segmento y conformación de muro en bloque estructural, se realiza cercado de viga y Alcega General de Obra, pendiente visita de supervisor de la ENAB. (definir sum. de obra)
Jesús Ochoa
Rafael Acosta

02-07-2022 TIEMPO URBANO.

Personal - 1 ayudante - 1 voluntario - 1 boti
Indicador - TEC - 535 - RUMENIR

Se continua con trabajo de instalación
de bardilla en la parte sur del
segmento, se realiza refuerzo de material de
exclusión de conductos 'subterráneos'. Se prepara
visita por parte de supervisor de la
entidad ENAA para el día 07-07-2022
9:30 am con el fin de definir la acción
del suministro.

[Firma]

07-07-2022 TIEMPO SECO

Personal 1 ayudante - 1 oficial, 1 boti
1 ofonero..

se realiza entosqueleto de bardilla de
continuo miento en casafundo sur del
segmento, en espera respuesta por parte
de la CUP. sobre la solicitud del recibo
de trabajo en conductos, por escrito autorizado
con el fin de continuar con el trabajo de

ordenes.

Parte de
F. G. O. O. O.

05-01-2022 Tiempo Aprobado - con lluvias de agua

personal 1 - Ayudante - 10 FICHA. 1 BURE.

Se realiza verificación de nivel con la
parte de topografía, se culmina instalación de
bordillo de conformamiento en zona sur del
segmento, se recibe material sub-base ped en
el fin de carpeta con los rellenos de los

ordenes.

F. G. O. O.

06-01-2022 Tiempo Aprobado

personal 1 OFICIAL 1 BURE - 1 AYUDANTE SECRETARIO.

Se sigue en cumplimiento de los ultimos
de inspección, se realiza trabajo de conformamiento
y relleno de ordenes.

Se realiza verificación de bordado de ordenes
por acceso a la cual se asigna por con
el fin de verificar altura para
conformar las gradas correspondientes

no de estar que se le informe al
dueño del predio que es imposible
dejar el acceso de pasto y en riesgo
ya que sería peligroso para su mismo
ingreso.

Respecto a
Nelson Restrepo

07-08-2012 TIEMPO SECO

Presencia local 2 minutos y 30 seg
Res - TBC - SST - AMBIENTAL.

09-08-20

Se continúa con instalación de Bueño
B-80 en el costado sur del segmento,
confirmación de tipo de inspección en el
costado norte, se adelanta trabajo de
relleno de terreno "candenero" en el
costado "sur-oriental".

8-09-00 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES 2 BODE

RESERVA: SSR - AMBIENTAL.

Se continúan trabajos de relleno y conexión de cables en el costado sur-oriental del segmento, se trabaja en instalaciones de perfilado en el costado sur del segmento, se trabaja en construcción de muros T-9.

se realiza aseo general de obra y acopio de materiales.

A. Cortés
F. J. J. Tec

31-09-00 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES 1 BODAL

1 OPERARIO. RES - SSR - REC AMBIENTAL.

Se continúan con labores de relleno y conexión de cables en la parte

sur del segmento. embasado de

perfilado de camuflaje en zona sur.

Se realiza caso del pozo existente
y placement del mismo.

Respecto Obra
Acoste Cof

11-04-2022. Tiempo seco = Personal 1 oficial y 1 boy
1 ayudante - 1 topógrafo.

Se continúa con labores de construcción
de zona sur C muro T-A - instalación
Bordado B-90 para cierre de sementro-
rellero y completación del zona de ordenes.
Se realiza asob yera y retro de
material sobre la de denotación y excavación.

Acoste C
Respecto Obra

12-04-2022. Tiempo seco.

Personal 2 boy 1 oficial 1 ayudante

Rancho de Tec. 551 - 10/10/2021

Se continúan con labores de compactación
de material grueso en zona de muestreo
y arreglo de los caminos.

Residente *[Signature]*
A. G.

13-04-2022 TIEMPO SECO

PERSONAL 1 BOAL - 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL -

Se realizó trabajo de compactación y
arreglo de caminos, se cubren con instales
de pedrillo en la zona sur y emboscado
del mismo; se adelanta trabajo de conformación
de accesos y adecuación de los caminos con el
fin de permitir el acceso adecuado a las
unidades; se realiza arreglo de cerramientos
y se genera de obra de igual forma
acopio de materiales.


Rancho *[Signature]*
A. G.

14-15-16-17-ABRIL-2022 SEMANA SANTA

18-04-2022 TIEMPO NUBADO.

PERSONAL 1 OFICIAL 2 AYUDANTE Y OCBARRO
IBARRA.

Se realiza excavación para uso de
cierre de celda en castillo sur del
segmento, se realiza instalación de
sumidero preinstalado según especificación
y usita por parte del supervisor de la
E.N.A.B. se adelanta trabajo de cerco en
cerca la parte y retiro de sub-base en
castillo norte del andén


Andrés Moshe.

20-04

19-04-2022 TIEMPO LLUVIOSO EN HORAS DE LA MAÑANA

PERSONAL 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE 1 OCBARRO
Y IBARRA.

Se continúa con instalación de celda
preinstalado y uso de cierre, se repite
cierre de escombreros.

16106



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 20 de abril de 2022.


 Informamos se suspende temporalmente el servicio en nuestras escombreras de fiscalía y Tunjuelo.

Estaremos informando en el transcurso de la mañana de reanudar operaciones al cese de las fuertes lluvias presentadas.

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

Se adelantará trabajo de cerceo y corrección de red de aguas lluvias de algunas colonias.


F. J. L. Nuez L.

20-04-2022, TIEMPO LLUVIOSO.

PERSONA 2 OFICIAL 1 AYUDANTE Y OFICINARIO
2 GUARD

Se adelantará trabajo de cerceo en calles y calzadas con el fin de programar densidad e inspección de aguas y en especial Tipo de asfalto a instalar según propuesta de valor social por la

613

comunicada el respecto cierre de actividad

22-04-2022



Importante

Estimado cliente

Debido a las condiciones climáticas presentadas el día de hoy 21 de abril de 2022.

Informamos se suspende el servicio de atención por escombrera fiscal horario de atención hasta las 2:15 p.m

Invitamos a nuestros clientes dirigirse a escombrera Tunjuelo

Agradecemos su comprensión

Hacer extensivo a quien sea necesario.

[Handwritten signature]
Andrés Arce

21-04-2022 TIEMPO CUBIERTO

Resumen y oficial 2 minutos 10 segundos

se definen actividades de construcción

por parte de lluvia, en menor de la hora

se cubren con carpas y cubrimiento

de agua para desechos.

[Handwritten signature]
Andrés Arce
