

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

**ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS
POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS**



Periodo comprendido entre el 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
- 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
 - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
 - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
 - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
 - 2.3.1 Obligaciones
 - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
 - 2.4.1 Obligaciones
 - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
 - 2.5.1 Obligaciones
- 3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
- 4. ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificadorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificadorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	\$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	\$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		\$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 12 de noviembre del 2024

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

- b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjunta al presente informe.

- c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

- d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

- e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad	Financiera:	Banco BBVA
Tipo de Cuenta:		Ahorros
Número de Cuenta:		309-054583
Nombre de la cuenta:		FIDUPREVISORA S.A FNGRD - COLOMBIA VITAL

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

- a. Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	150

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	140
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Conse cutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	Nariño	PASTO	Pasto	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	Córdoba	CORDOBA	Tuchín	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÚNIMA 'ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMUCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguizamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALEN A	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALEN A	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALEN A	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALEN A	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALEN A	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALEN A	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALEN A	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
  @findeter
  findeter
  @findetercol
  linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBSERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramita la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTISIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	91	Atlántico	ATLANTICO	Palmar de Varela	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	ATLANTICO	Luruaco	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE sería intervenida por el FFIE
4	71	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época”.
	139	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	33	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	140
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	136

- b. En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

- c. Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARIA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
  @findeter
  findeter
  @findetercol
  linkedin.com/company/findeter

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
6		Curumani	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA'ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORIA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORIA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
		Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
	Santander	Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORIA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORIA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOS	87	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORIA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORIA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamó	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Total general					52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

- d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

- a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

- b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$271.455.247	Etapas 2
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023	Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	\$3.447.332.359	Etapas 2
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico - Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	\$295.715.000	Terminado el 15 de noviembre del 2024
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	\$4.044.124.630	Terminado el 15 de noviembre del 2024
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblviejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	\$351.774.412	Entregado el 30 de abril del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	\$4.744.960.153	Entregado el 30 de abril del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós	20/09/2023	JASA LTDA	\$3.566.467.466	Entregado 22 de marzo del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023	Magdalena - San Sebastián de Buenavista	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	\$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumani	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	\$4.102.044.984	Terminado el 14 de diciembre del 2024
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023	Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	\$300.856.990	Terminado el 14 de diciembre del 2024

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	\$2.102.352.000	Entregado 17 de mayo del 2024
6	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	\$155.543.411	Entregado 17 de mayo del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	\$4.706.470.280	Entregado 21 de agosto del 2024
8	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	\$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consortio Guajira 7	4.158.777.879	Etapas 2
7	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Etapas 2
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapas 2
9	INTERVENTORIA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapas 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribio Valle Del Cauca - Guadalupe De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	\$6.014.978.800	Etapas 2
10	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	\$327.496.568	Etapas 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	\$ 4.728.021.810	Etapas 2
11	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	\$312.927.160,00	Etapas 2
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	\$ 4.918.276.400	Etapas 2
12	INTERVENTORIA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	\$ 351.774.412	Etapas 2

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024, satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

- c. Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol  @findeter  findeter  @findetercol  linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
8 de noviembre del 2024	Comité Técnico No. 73	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Se apruebe la inclusión de tres (3) ítems no previstos complementarios y sus análisis de precios unitarios a la lista de precios fijos del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-053-2023., conforme a la revisión y aprobación por parte de la interventoría para dar culminación funcional de los proyectos priorizados dentro del Grupo 5 del programa de Aulas Móviles del Ministerio de Educación Nacional NOTA: Se informa que el contrato de obra termina el 8 de noviembre de 2024, por lo anterior se agradece las gestiones pertinentes para poder contar con los votos del comité técnico solicitado. 3. Propositiones y varios
18 de noviembre del 2024	Comité Técnico No. 74	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: SUSPENSIÓN No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7". 3. Solicitud: SUSPENSIÓN No.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-MENAM-I-059-2023 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7; PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER" 4. Propositiones y varios
22 de noviembre del 2024	Comité Técnico No. 75	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Se apruebe la inclusión de ocho (8) ítems no previstos complementarios y sus análisis de precios unitarios a la lista de precios fijos del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-080-2023., conforme a la revisión y aprobación por parte de la interventoría para dar culminación funcional de los proyectos priorizados dentro del Grupo 10 del programa de Aulas Móviles del Ministerio de Educación Nacional 3. Propositiones y varios
29 de noviembre del 2024	Comité Técnico No. 76	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 3. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$165.685.393,30) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMEN5-I-064-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9", ACLARANDO QUE, EL VALOR DE \$ 91.213.418,06 SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL VALOR DE \$74.471.975,24 SERÁN CON CARGO AL PATRIMONIO

			AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023. 4. Propositiones y varios
29 de noviembre del 2024	Comité Técnico No. 77	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Suspensión por el término de diez (10) días al contrato de obra No. PAF-ATMEN5-S-041-2024 cuyo objeto es EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS". 3. Propositiones y varios

Comités Fiduciarios

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
18 de noviembre del 2024	Comité Fiduciario No. 47	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: SUSPENSIÓN No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7". 3. Solicitud: SUSPENSIÓN No.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-MENAM-I-059-2023 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7; PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER" 4. Propositiones y varios

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

- Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo Viejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Se remitió a la Fiduciaria Popular para revisión final 01/12/2024 en espera de remisión para firmas
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	En espera de aprobación de pólizas por parte de la Fiducia.
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Se suscriben y se fechan las actas de liquidación para el contrato de obra el 20 de noviembre
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Se suscriben y se fechan las actas de liquidación para el contrato de obra el 27 de noviembre.
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba - Tuchín Córdoba - Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba - Ayapel Córdoba - Montelibano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	\$4.706.470.280	Se encuentra en proceso de recopilación y soportes de liquidación en la semana del 25 al 30 de noviembre de 2024
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	\$297.097.668	Se encuentra en proceso de recopilación y soportes de liquidación en la semana del 25 al 30 de noviembre de 2024

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	63.650.000.000
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	59.485.981.308

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. Presentación de seguimiento 12 de noviembre del 2024



HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER GB



JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Apoyo de la Gerencia de Infraestructura



**Seguimiento CI No.
CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023**

AULAS MOVILES

Contrato No. 4917031-2023




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio:
Fecha Fin Actual:

2/06/2023
01/07/2025

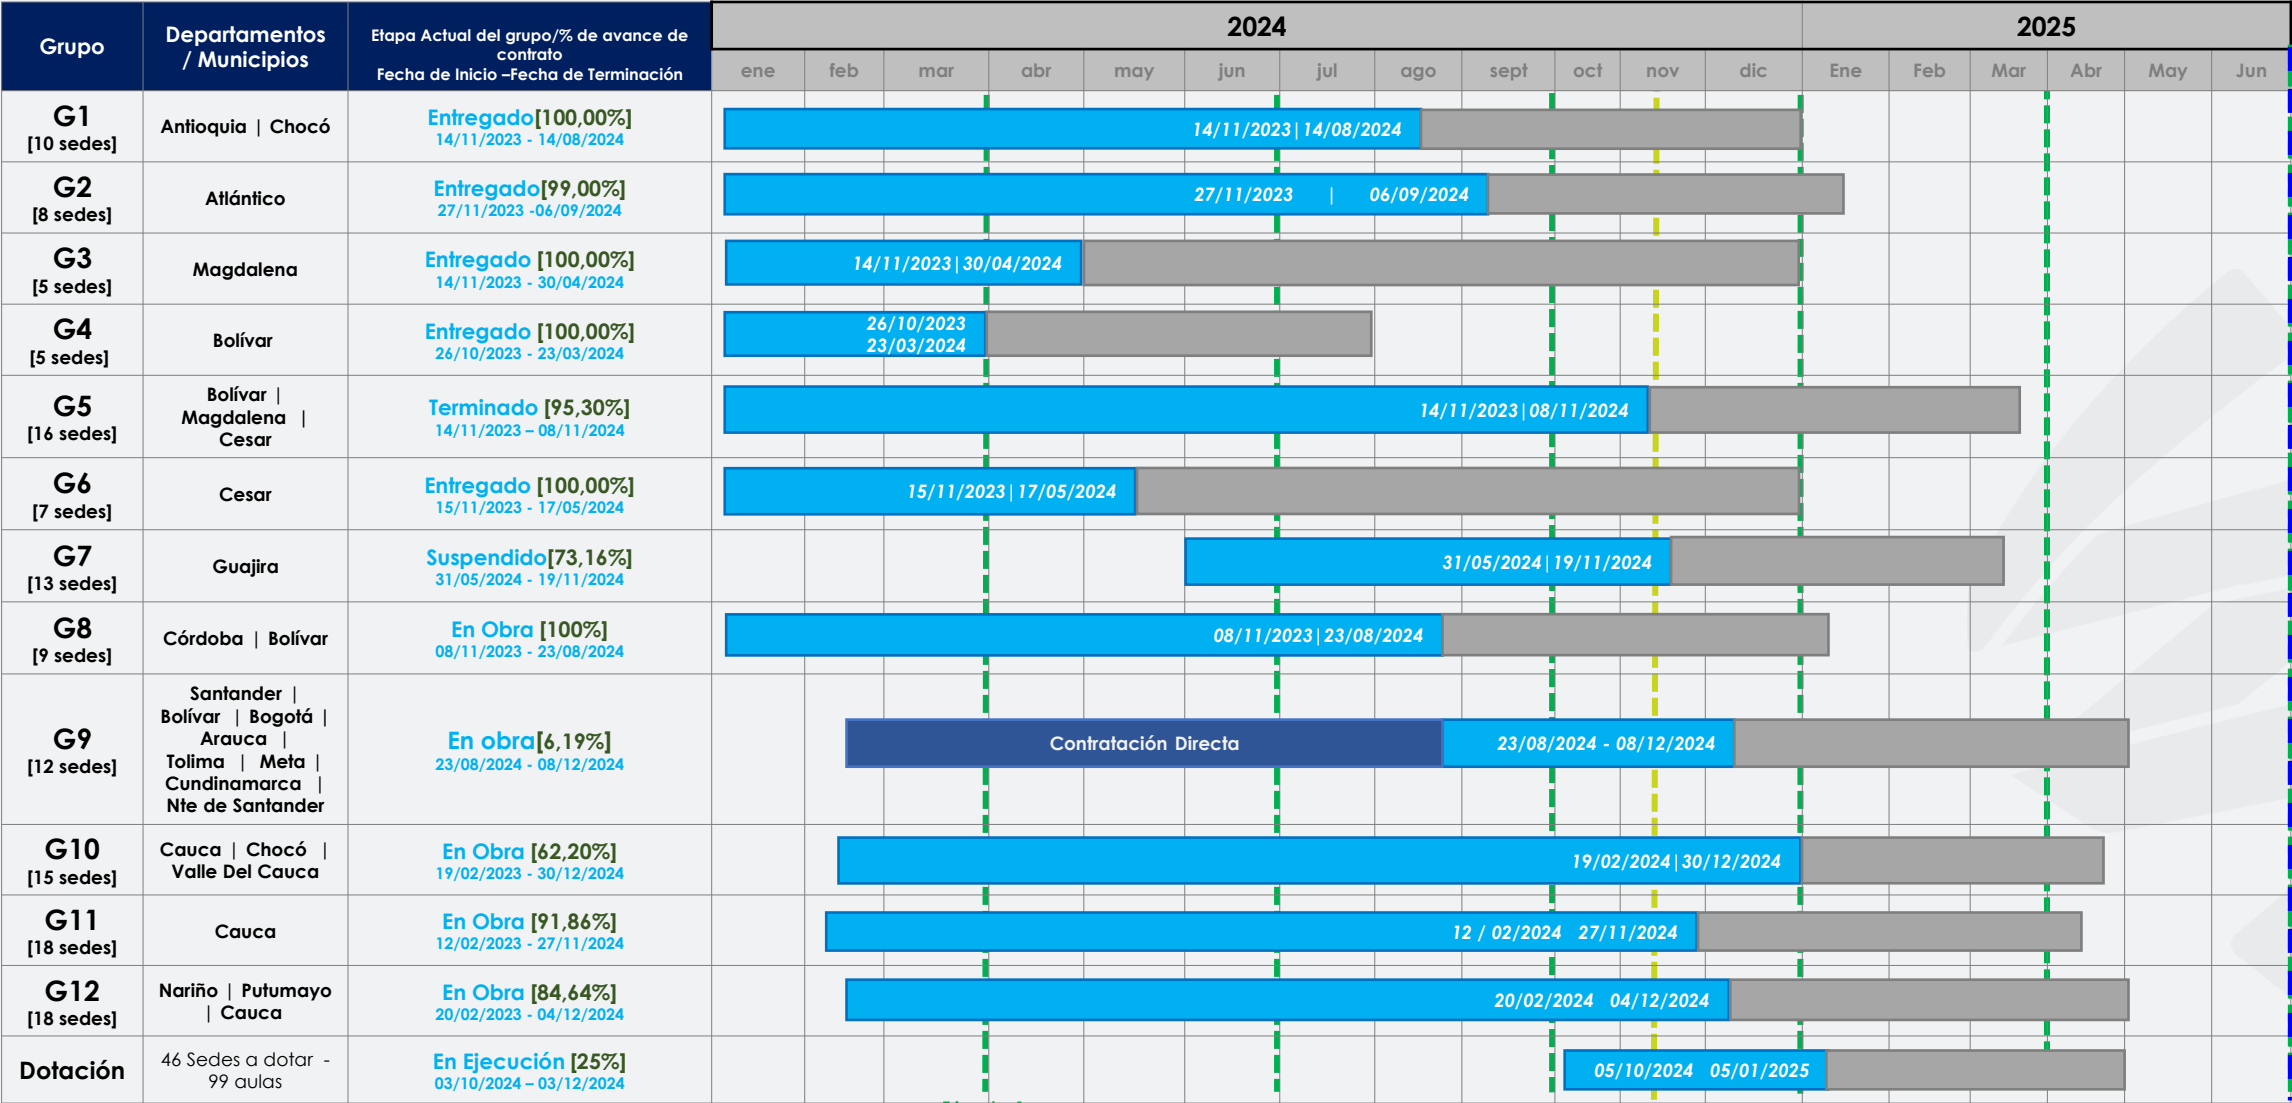

12/11/2024

1 julio de 2025 - Fecha Fin Interadministrativa

Estado de entrega y ejecución de Sedes

 **136** sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 julio 25 –
Fin Interadministrativo

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
79 sedes 58,09%	18 sedes 13,24%	23 sedes 16,91%	16 sedes 11,76%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 7 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 9 Grupo 6 - 7 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 5 Grupo 11 - 10 Grupo 12 - 12	Grupo 2 - 1 Grupo 7 - 4 Grupo 10 - 5 Grupo 11 - 7 Grupo 12 - 1	Grupo 9 - 12 Grupo 10 - 5 Grupo 11 - 1 Grupo 12 - 5	Grupo 5 - 7 Grupo 7 - 9

Estado de entrega y ejecución de Sedes



136

sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$

63.650

Millones de pesos



Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 –
Fin Interadministrativo

VALOR
EJECUTADO

\$ 40.103 mll

VALOR POR
EJECUTAR

\$ 23.547 mll

VALOR
COMPROMETIDO

\$ 59.130 mll

SALDO

\$ 355 mll

Estado Entrega de Dotación

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada
17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:
Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:
DOTAESCOL SAS
Valor \$ \$ 584.310.000,00

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024
2 meses de ejecución

- ➡ 16 DEPARTAMENTOS
- ➡ 38 MUNICIPIOS
- ➡ 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

N°	Departamento	Municipio	IE	SEDE	Puesto trabajo Prescolar	Puesto trabajo Primaria	Puesto trabajo Secund.	Puesto de trabajo Docente	Tablero	Tablero Movil	Mueble	Tandem
1	Cesar	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	0	0	30	1	0	1	1	1
2	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	0	0	120	4	0	4	4	4
3	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	0	0	90	3	0	3	3	3
4	Córdoba	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	0	30	0	1	1	0	1	1
5	Córdoba	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	0	0	30	1	0	1	1	1
6	Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	0	0	30	1	0	1	1	1
7	Córdoba	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	0	60	0	2	2	0	2	2
8	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	0	30	0	1	1	0	1	1

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Septiembre 30 de 2024



Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha de Giro	SALDO POR GIRAR
ene-23				\$ -
feb-23	\$ -	\$ -		\$ -
mar-23	\$ -	\$ -		\$ -
abr-23	\$ -	\$ -		\$ -
may-23	\$ -	\$ -		\$ -
jun-23	\$ -	\$ -		\$ -
jul-23	\$ -	\$ -		\$ -
ago-23	\$ 82.351.406,35	\$ -		\$ 82.351.406,35
sep-23	\$ 108.927.246,74	\$ -		\$ 191.278.653,09
oct-23	\$ 131.902.760,66	\$ -		\$ 323.181.413,75
nov-23	\$ 144.907.033,92	\$ -		\$ 468.088.447,67
dic-23	\$ 143.221.271,36	\$ 468.088.448,00	13/12/2023	\$ 143.221.271,03
ene-24	\$ 133.626.379,48	\$ 143.221.271,36	10/01/2024	\$ 133.626.379,15
feb-24	\$ 120.547.529,88	\$ 133.626.379,15	12/02/2024	\$ 120.547.529,88
mar-24	\$ 117.745.976,50	\$ 120.547.529,88	12/03/2024	\$ 117.745.976,50
abr-24	\$ 100.331.907,69	\$ 117.745.976,50	10/04/2024	\$ 100.331.907,69
may-24	\$ 89.374.457,56	\$ 100.331.907,69	11/05/2024	\$ 89.374.457,56
jun-24	\$ 76.820.331,89	\$ 89.374.457,56	13/06/2024	\$ 76.820.331,89
jul-24	\$ 68.012.790,67	\$ 76.820.331,89	15/07/2024	\$ 68.012.790,67
ago-24	\$ 21.741.419,32	\$ 68.012.790,67	14/08/2024	\$ 21.741.419,32
sep-24	\$ 20.861.120,00	\$ 21.741.419,32	10/09/2024	\$ 20.861.120,00
TOTALES	\$ 1.360.371.632,02	\$ 1.339.510.512,02		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha de Giro	SALDO POR GIRAR
ene-23		\$ -		\$ -
feb-23	\$ -	\$ -		\$ -
mar-23	\$ -	\$ -		\$ -
abr-23	\$ -	\$ -		\$ -
may-23	\$ -	\$ -		\$ -
jun-23	\$ -	\$ -		\$ -
jul-23	\$ -	\$ -		\$ -
ago-23	\$ 443.947.650,01	\$ -		\$ 443.947.650,01
sep-23	\$ 548.880.836,71	\$ -		\$ 992.828.486,72
oct-23	\$ 436.008.307,20	\$ -		\$ 1.428.836.793,92
nov-23	\$ 718.224.229,49	\$ -		\$ 2.147.061.023,41
dic-23	\$ 788.090.860,63	\$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	\$ 788.090.860,04
ene-24	\$ 427.858.051,59	\$ 788.090.860,63	10/01/2024	\$ 427.858.051,00
feb-24	\$ 474.970.095,24	\$ 427.858.051,00	12/02/2024	\$ 474.970.095,24
mar-24	\$ 478.495.863,61	\$ 474.970.095,24	12/03/2024	\$ 478.495.863,61
abr-24	\$ 259.736.382,70	\$ 478.495.863,61	10/04/2024	\$ 259.736.382,70
may-24	\$ 353.632.163,66	\$ 259.736.382,70	11/05/2024	\$ 353.632.163,66
jun-24	\$ 266.323.590,41	\$ 353.632.163,66	13/06/2024	\$ 266.323.590,41
jul-24	\$ 294.233.627,01	\$ 266.323.590,41	15/07/2024	\$ 294.233.627,01
ago-24	\$ 313.006.436,96	\$ 294.233.627,01	14/08/2024	\$ 313.006.436,96
sep-24	\$ 192.185.501,19	\$ 313.006.436,96	10/09/2024	\$ 192.185.501,19
TOTALES	\$ 5.995.593.596,41	\$ 5.803.408.095,22		
SALDO POR GIRAR	\$ 213.046.621,19			

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2024/09/12 | Hora: 10:15 | IP: 190.144.253.210



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	28964	PIUED1MTGO	2024/09/10	\$334,747,856.28	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/10	13:50:07	14:04:28	KATHERIN PEREZ URUEÑA	2024/09/11	17:10:01	\$334,747,856.28	\$334,747,856.28

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado
90.00		2	0		0	JORGE LINARES CLIENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Checuso	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804950450	2024/09/10	\$21,741,419.32	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000630053991	PAGOS		Procesado
500804950450	2024/09/10	\$313,006,436.96	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000630053991	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- Banco: BBVA
- Tipo: Ahorros
- No. Cuenta: 309-054583
- Nombre de la Cuenta: FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES

INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION


Noviembre 12 de 2024



Educación



GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

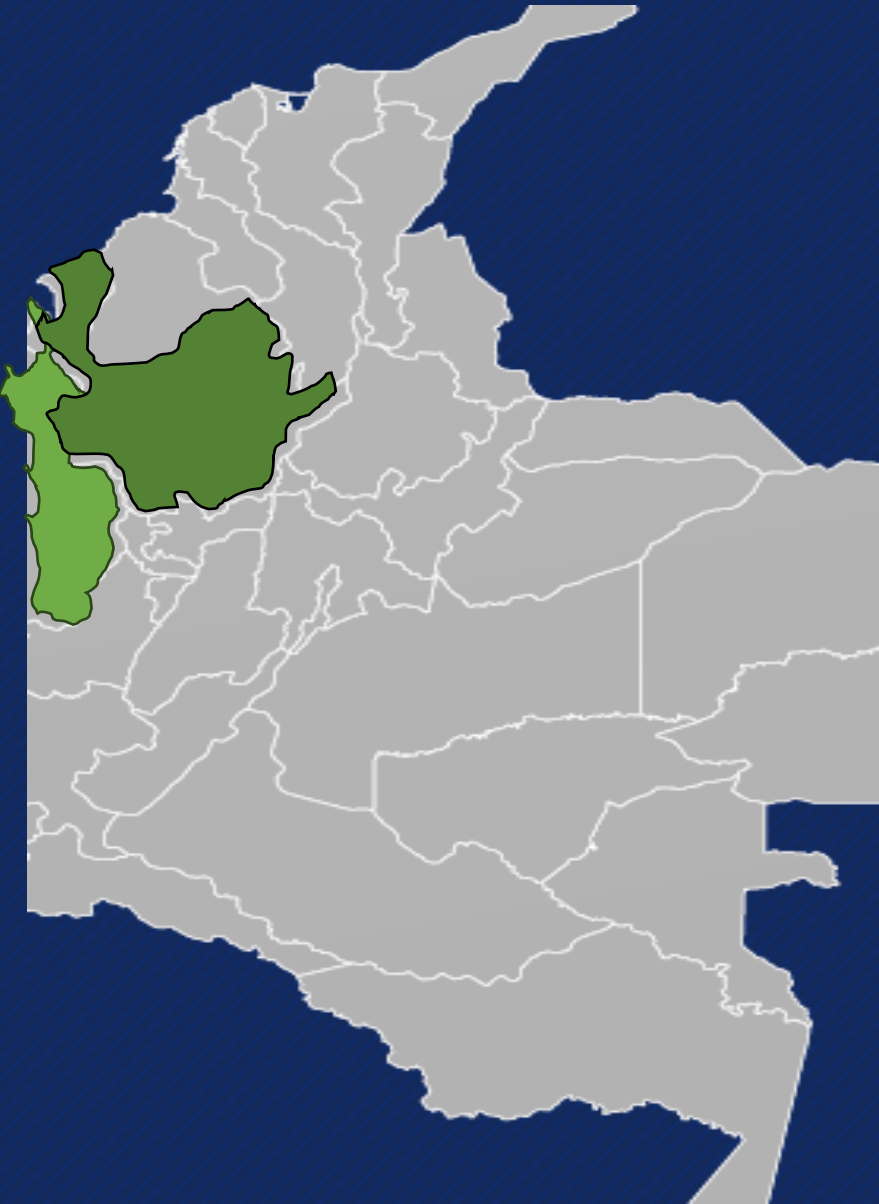

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA

ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
	6	3 MEJ	27/2/2024
	14	5 MEJ	21/3/2024
	9	5 MEJ	30/5/2024
	23	8 MEJ	30/5/2024
	4		14/3/2024
	3	2 MEJ	30/5/2024
	4	5 MEJ	20/5/2024
2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
	2	4 MEJ	30/5/2024
	6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:



Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.




BALANCE GENERAL POR CONTRATO DERIVADO

INTERVENTORÍA					
COMPONENTE	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	PENDIENTE POR PAGAR	SALDO SOBRANTE
1	\$ 130.133.279,78	\$ 130.133.279,78	\$ 130.133.279,78	\$ -	\$ -
2	\$ 195.086.032,54	\$ 189.858.781,63	\$ 170.349.123,63	\$ 19.509.658,00	\$ 5.227.250,91
TOTAL	\$ 325.219.312,32	\$ 319.992.061,41	\$ 300.482.403,41	\$ 19.509.658,00	\$ 5.227.250,91
NOTA: De cada uno de los pagos, se efectuó una retención en garantía del diez por ciento (10%) la cual se devolverá al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del contrato. El valor de la rete garantía acumulado asciende a la suma de \$ 30.048.240,34					
OBRA					
COMPONENTE	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	PENDIENTE POR PAGAR	SALDO SOBRANTE
1	\$ 276.444.315,00	\$ 276.444.315,00	\$ 276.444.315,00	\$ -	\$ -
2	\$ 3.372.041.007,00	\$ 3.149.121.765,22	\$ 3.145.944.631,16	\$ 3.177.134,06	\$ 222.919.241,78
TOTAL	\$ 3.648.485.322,00	\$ 3.425.566.080,22	\$ 3.422.388.946,16	\$ 3.177.134,06	\$ 222.919.241,78
NOTA: De cada uno de los pagos, se efectuó una retención en garantía del diez por ciento (10%) la cual se devolverá al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del contrato. El valor de la rete garantía acumulado asciende a la suma de \$ 342.238.894,61.					

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.



SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA
Atlántico	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL
Atlántico		IE TECNICAAGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE PRINCIPAL
Atlántico		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	SEDE MESOLANDIA

ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
1		2	16/09/2024
3		1	13/09/2024
	15		16/08/2024
	8		18/07/2024
	5	8	11/07/2024
	16	8	16/07/2024
	22		15/11/2024
	8		4/09/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:



DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO


COMPONENTE 2: Contrato terminado el 5 de septiembre, con corte al 03 de noviembre de 2024, porcentaje programado 100% vs ejecutado 99%, en proceso de entregas y recibo a satisfacción, se resaltan las siguientes particularidades:

1. **IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad.** Actividades ejecutadas, la IE. presenta observaciones por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo con visitas del 27 y 28 de agosto, se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realiza visita técnica y se evalúan las observaciones y se emitirá concepto técnico con fecha de atención si son pertinentes, se proyecta entrega para el 15 de noviembre.
2. IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
3. IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
4. IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
5. IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
6. IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección, en actividades de terminaciones de batería sanitaria. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción
7. IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realizó visita por parte de la entidad territorial el 12 de septiembre en validación de atención de pendientes, se reportan faltantes.
8. IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.

Nota: Las fechas de terminación relacionadas corresponden a las fechas en las cuales se habilito el uso de los espacios dadas las necesidades institucionales, sin perjuicio de los detalles pendientes de atención entre otros documentos pendientes de entrega y aprobación de interventoría, paralelamente se adelanta el cierre documental del componente 1 y 2 para la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción .

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID MEN 018
SOLEDAD, ATLANTICO

MUNICIPIO	SOLEDAD	
POBLACIÓN BENEFICIADA	295	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	16	Cambio de estructura de madera a metallica, cambio de laminas de asbesto a laminas UPVC, cambio de sistema eléctrico y mantenimiento de rejas metálicas en 3 bloques, en donde se intervienen 16 aulas, suministro e instalación de red contraincendios y gabinete, cambio de canales y bajantes
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	7	Mejoramiento de 6 baterías sanitarias, construcción de batería para personas con movilidad reducida, cambio de sanitarios, cambio de puertas, pañete, estuco, enchape, construcción de lavamanos corridos
FECHA DE ENTREGA		16 DE JULIO DEL 2024

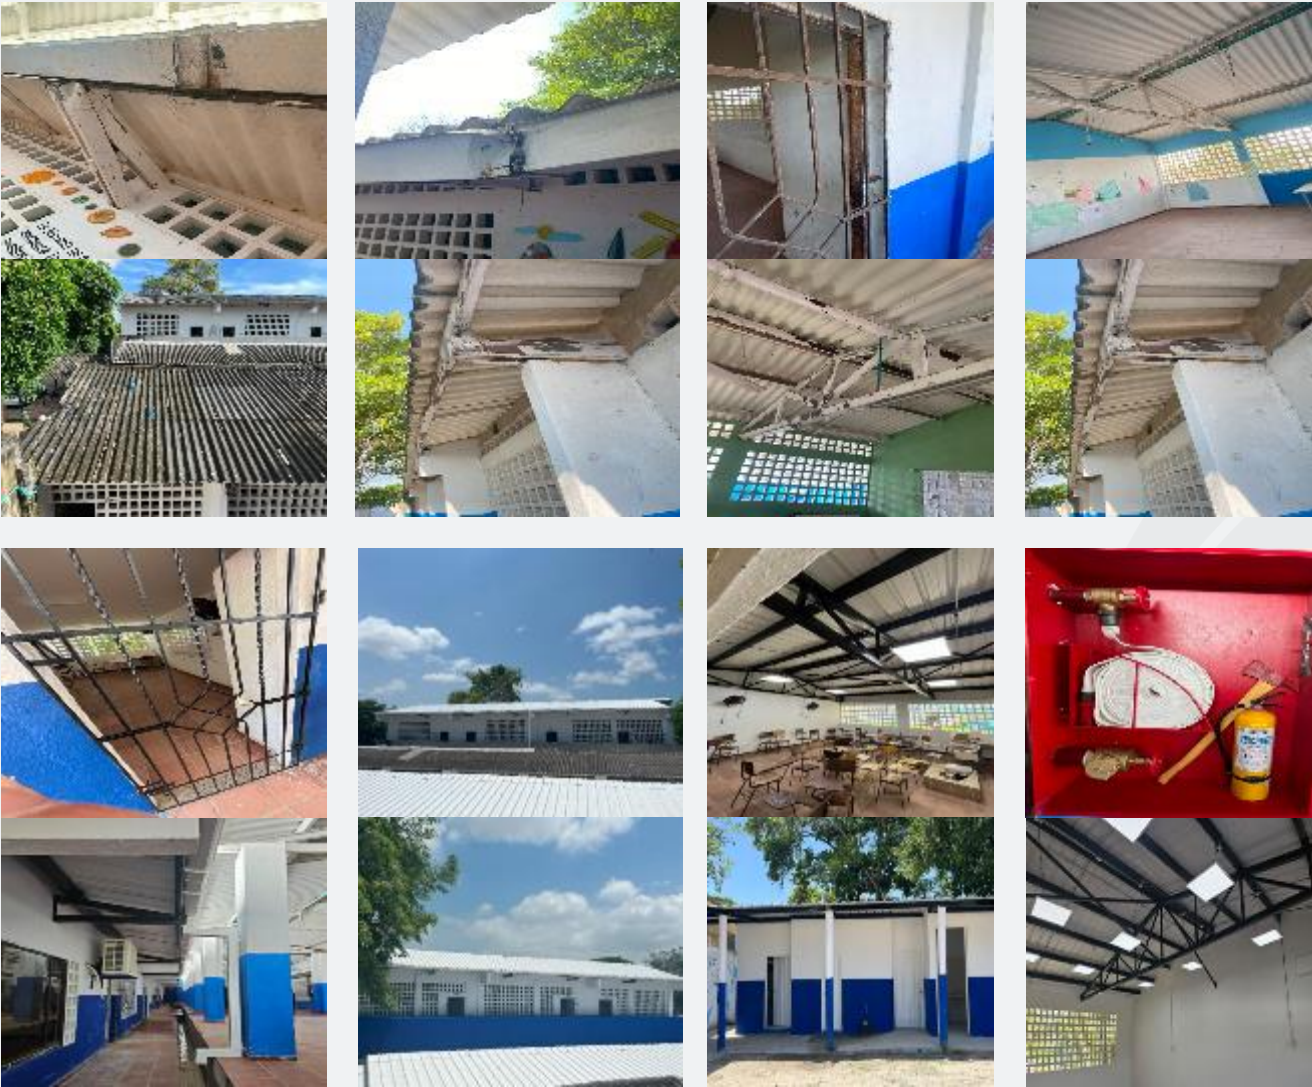

ANTES

DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA - ID MEN 192
SOLEDAD, ATLANTICO

MUNICIPIO	CABICA, SOLEDAD	
POBLACIÓN BENEFICIADA	92	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	0	
Aulas nuevas	3	Construcción de aulas nuevas palafíticas, desde cimentación, estructura metálica, láminas de metaldeck, tablón rojo, paredes en drywall, pintura, rampa de acceso, escalera de acceso, sistema eléctrico, canales y bajantes. Construido en 1 bloque de 3 aulas.
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024	



ANTES

DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144
SOLEDAD, ATLANTICO

MUNICIPIO	SOLEDAD	
POBLACIÓN BENEFICIADA	3160	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	22	Cambio cubierta, cambio estructura metalica, cambio de laminas de asbesto cemento a laminas UPVC, cambio en la impermeabilización cubierta en losa de concreto, cambio red eléctrica, estuco y pintura. Construcción de muro perimetral.Distribuidos en 4 bloques, para un total de 22 aulas
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		...

ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS



INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197
MALAMBO, ATLANTICO

MUNICIPIO	MALAMBO	
POBLACIÓN BENEFICIADA	537	
ALCANCE		
Mejoramamiento Aulas	7	Cambio de cubierta, de laminas de asbesto cemento a laminas UPVC, mantenimiento de estructura metálica, adición de correas metálicas, cambio de sistema eléctrico, estuco, pañete, pintura, distribuidos en 2 bloques, con 14 espacios, de los cuales 7 eran aulas, 1 sala de docentes, 1 sala de psicoorientación, 1 coordinación 2 baños para estudiantes y 2 baños para docentes.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		4 DE SEPTIEMBRE DE 2024



ANTES

DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092
REPELON, ATLANTICO

MUNICIPIO	PITA, JURISDICCIÓN DE REPELON	
POBLACIÓN BENEFICIADA	21	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	0	
Aulas nuevas	1	Demolición y construcción desde cimientos de aula nueva, estructura metalica, cubierta en láminas UPVC, rampa de acceso, baranda metalica, sistema electrico, muros en drywall, canales y bajantes aguas lluvia, 1 aula
Baterías sanitarias	2	Construcción de 2 baterías sanitarias para la institución, suministro e instalación de sanitarios, lavamanos, tanques de almacenamiento, motobomba y pozo séptico.
FECHA DE ENTREGA		1 DE OCTUBRE DE 2024



ANTES

DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083
REPELON, ATLANTICO

MUNICIPIO	LAS TABLAS, JURISDICCIÓN DE REPELON	
POBLACIÓN BENEFICIADA	46	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	8	Cambio de estructura metálica, cambio de laminas de asbesto a laminas UPVC, cambio de sistema eléctrico, mejoramiento de muros, canales y bajantes de aguas lluvia, cambio de cielo raso*. 8 aulas, 1 sala de informática.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento de baterías de baños, cambio de puertas, suministro de orinales, suministro de sanitarios
FECHA DE ENTREGA	25 DE JULIO DEL 2024	



ANTES



DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084 REPELON, ATLANTICO

MUNICIPIO	VILLA ROSA, JURISDICCIÓN DE REPELON	
POBLACIÓN BENEFICIADA	136	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	6	Mejoramiento de cubierta, adición y mantenimiento de estructura metálica, cambio de láminas de asbesto cemento a láminas UPVC, instalación de canales, bajantes, mejoramiento de muros, cambio de sistema eléctrico. 2 bloques de 3 aulas para un total de 6 aulas intervenidas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	7	Adecuación de baterías de baño, cimentación, estructura y suministro para tanque elevado.
FECHA DE ENTREGA		16 DE JULIO DE 2024




ANTES



DESPUÉS

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064
GALAPA, ATLANTICO

MUNICIPIO	GALAPA	
POBLACIÓN BENEFICIADA	1473	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	16	Cambio de cubierta, cambio de estructura metalica, cambio a lámina UPVC, mejoramiento de muros, instalación de canales y bajantes, cambio de red electrica, y cambio de cielo raso.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		2 DE SEPTIEMBRE 2024

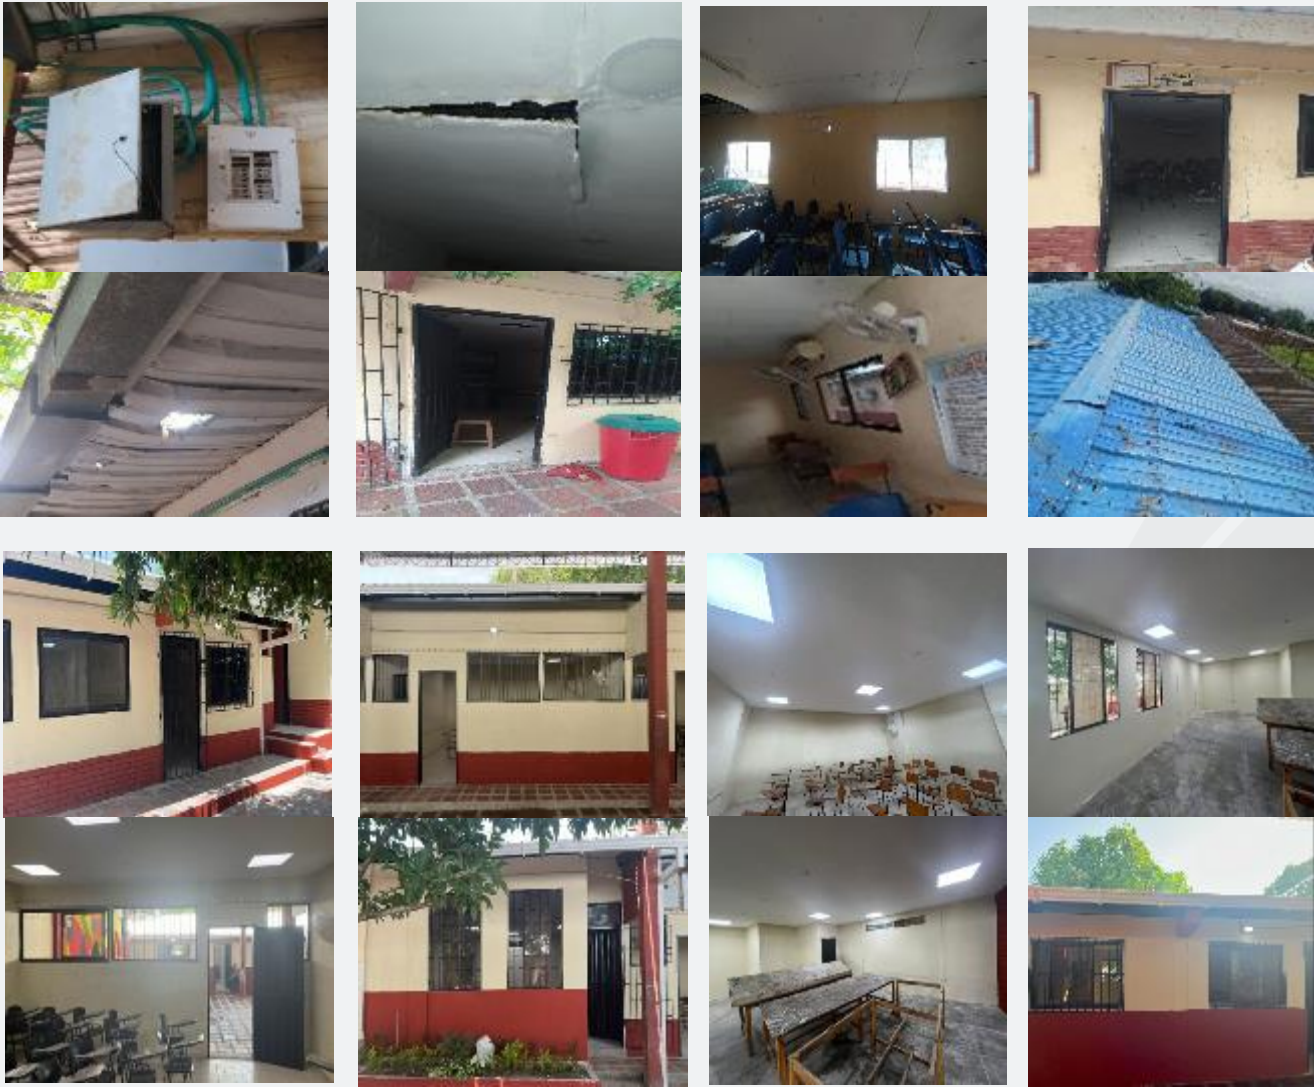


ANTES

DESPUÉS


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3




Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

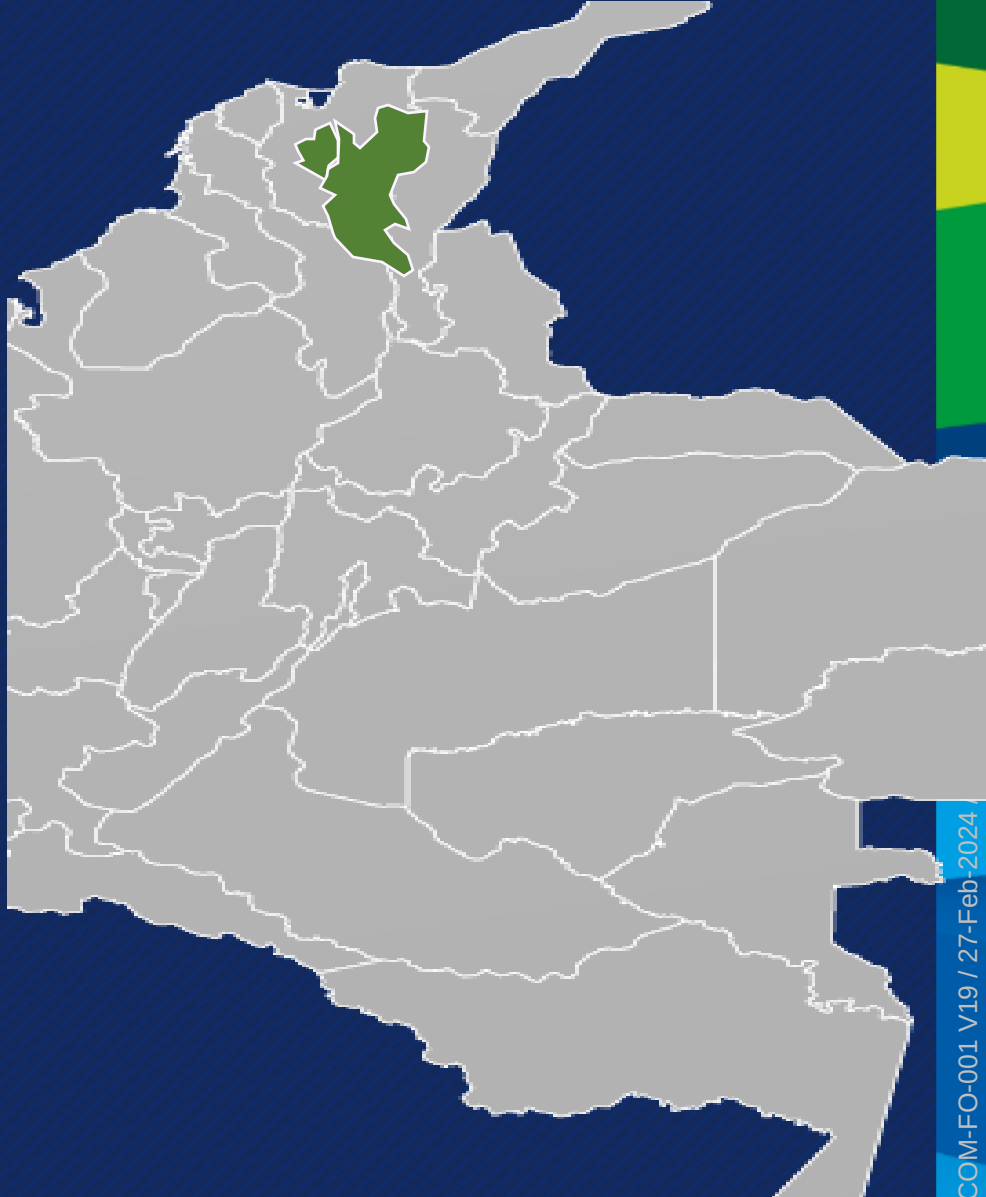

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

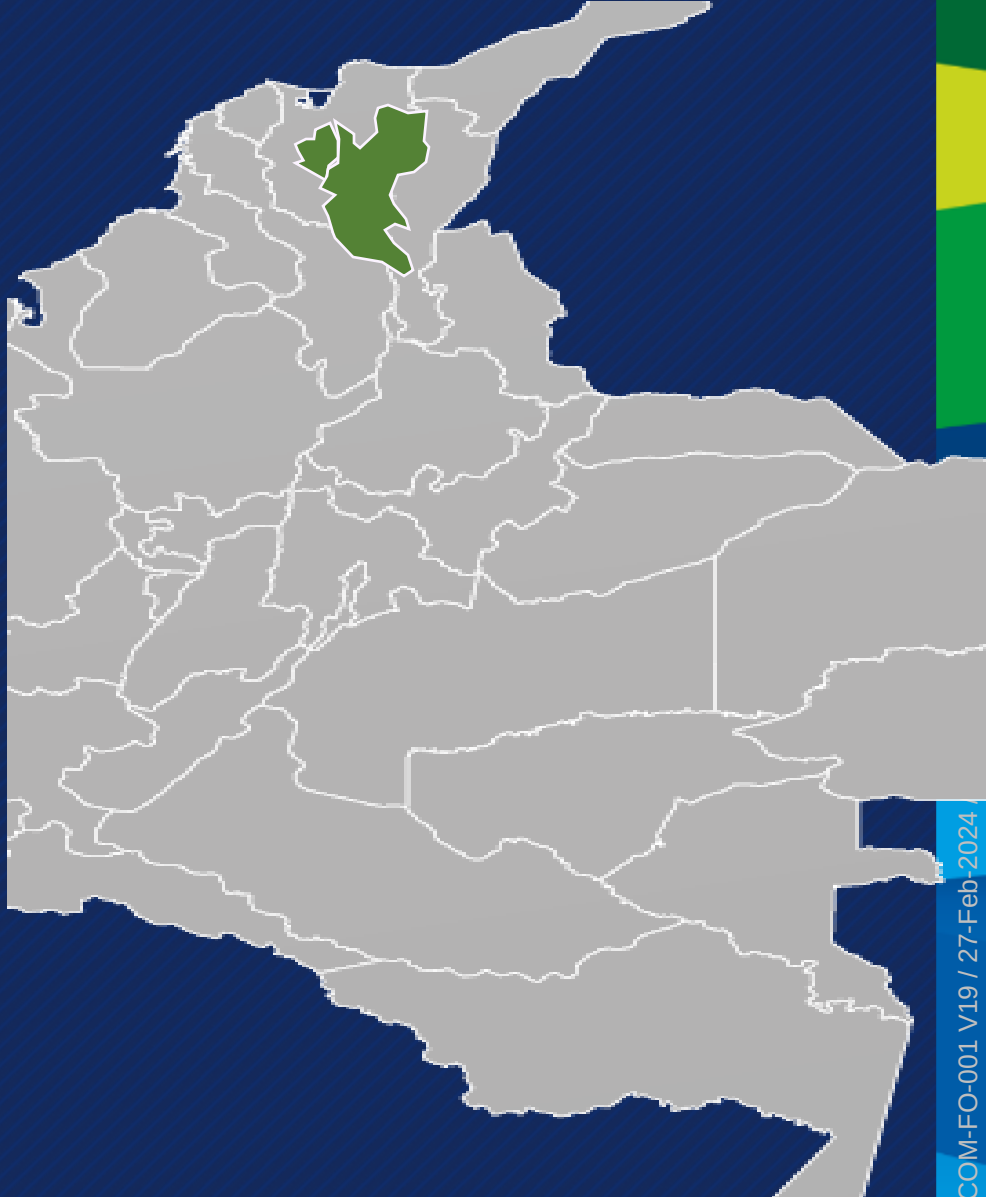

GRUPO 5, Departamentos de Cesar, Magdalena y Bolivar.

PORCENTAJES DE AVANCE:

98.66%
Porcentaje
Programad
o

85.20%
Porcentaje
de avance

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENT O	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADA S	BATERIAS SANITARIA S	FECHA DE ENTREGA
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL		10		13/11/2024
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	3		07/11/2024
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS		7		13/11/2024
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO		6		22/11/2024
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS		2		22/11/2024
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	1	6	1 Bs, 11 aparatos	13/11/2024
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES		11		Entregada
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA		2		Entregada
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	0		Entregada
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	1	0	1 Bs, 4 aparatos	14/11/2024
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL		3		Entregada
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS		2		Entregada
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION		2		Entregada
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	0	3 Bs, 3 aparatos	14/11/2024
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA		2		Entregada
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA		3		Entregada

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Contrato terminado el 8 de noviembre, con corte al 03 de noviembre de 2024, porcentaje programado 99,53% vs ejecutado 95,30%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA : Se adelanta la construcción de las vigas aéreas se espera desencofrar para montar las correas.
2. IE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL: Se culmino la instalación de la estructura metálica y se comienza la instalación de las tejas upvc.
3. IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM: Se instalaron la totalidad de las cerchas que se le hicieron mantenimiento, y se instalaron las tejas UPVC de las mismas, se comienza la instalación de los PHR – C en los salones nuevos, se tienen problemas para ingresar material por el estado de la vía.
4. IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL : Se adelanta el entibado para culminar la viga de cimentación, las columnas ya están izadas con su acero, se tienen problemas para ingresar material por el estado de la vía.
5. IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL : Se trabajan acabados del tipo arquitectónico, pintura y limpieza para entregar la sede.
6. IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS : Se empiezan los trabajos de pintura y acabados.
7. IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA : Se instalaron los muros y cubierta de aula nueva, y se pintó y se terminaron de colocar las cubiertas.
8. IE CRISTIAN MORENO PALLARES – SEDE PRINCIPAL: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 28 de junio de 2024
9. IE CRISTIAN MORENO PALLARES – SEDE GUAIMARAL: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 30 de julio de 2024
10. IE CRISTIAN MORENO PALLARES – SEDE LOS SERRENOS: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 21 de junio de 2024
11. IE EL PUEBLITO – SEDE PUERTO LA ESTANCIA: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 30 de julio de 2024
12. IE EL PUEBLITO – SEDE TORRECILLA: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 30 de julio de 2024
13. IE LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI - SEDE PLAN BONITO: Se culminan actividades aula nueva en sistema prefabricado ,sede entregada el 2 de septiembre de 2024
14. IED ANTONIO NARIÑO – SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS ORTIZ: Se adelantan actividades de mejoramientos en aulas, cocina, construcción de aula nueva en sistema prefabricado y batería sanitaria.
15. IED OSCAR PISCIOTTI NUMA – SEDE INMACULADA CONCEPCION: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 14 de junio de 2024.
16. IED RURAL SILVIA COTES DE BISWELL – SEDE LA ISLITA: Se culminan actividades de mejoramientos, sede entregada el 5 de junio de 2024

Nota: Las fechas de terminación relacionadas corresponden a las fechas en las cuales se habilito el uso de los espacios dadas las necesidades institucionales, sin perjuicio de los detalles pendientes de atención entre otros documentos pendientes de entrega y aprobación de interventoría, paralelamente se adelanta el cierre documental del componente 1 y 2 para la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL

ID No. 30

Antes

MUNICIPIO		Curumaní
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 497.923.275,69
POBLACIÓN BENEFICIADA		362
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	11	• Montaje de estructura metálica y cubierta. • Instalacion de cielo raso en drywall. • Mejoramiento a la parte eléctrica • Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 28 DE JUNIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS

ID No. 101

Antes

MUNICIPIO		Curumaní
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 105.661.911,21
POBLACIÓN BENEFICIADA		25
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	3	- Montaje de estructura metálica y cubierta. - Instalacion de cielo raso en drywall. - Mejoramiento a la parte eléctrica - Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 21 DE JUNIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL

ID No. 98

Antes

MUNICIPIO		Curumaní
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 155.169.361,85
POBLACIÓN BENEFICIADA		21
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	3	- Montaje de estructura metálica y cubierta. - Mejoramiento a la parte eléctrica - Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 30 DE JULIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA

ID No. 97

MUNICIPIO		Curumani - Cesar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 153.339.407,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		30
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	0	
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 130 M2 tipo multigrado.
Baterías sanitarias Nueva	1	aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica general, accesorios hidrosanitarios y enchapes.
FECHA DE ENTREGA		14 de noviembre de 2024

Antes



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA

ID No. 147

Antes

MUNICIPIO		Chimichagua
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 73.156.095,58
POBLACIÓN BENEFICIADA		25
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	2	- Montaje de estructura metálica y cubierta. - Mejoramiento a la parte eléctrica - Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 30 DE JULIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA

ID No. 148

Antes

MUNICIPIO		Chimichagua
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 89.032.758,38
POBLACIÓN BENEFICIADA		25
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	3	- Montaje de estructura metálica y cubierta. - Mejoramiento a la parte eléctrica - Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 30 DE JULIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL

ID No. 146

MUNICIPIO		Chimichagua - Cesar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 117.872.002,82
POBLACIÓN BENEFICIADA		25
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	0	
Aulas nuevas	1	Construcción en sistema de pórtico, instalación de red eléctrica nueva, cubierta y estructura metálica nueva.
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		14 de noviembre de 2024

Antes



Después



GRUPO 5, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA

ID No. 32

Antes

MUNICIPIO		Banco magdalena
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 85.957.145,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		20
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	2	• Montaje de estructura metálica y cubierta. • Mejoramiento a la parte eléctrica • Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 5 DE JUNIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION

ID No. 133

Antes

MUNICIPIO		Banco magdalena
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 124.705.216,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		20
ALCANCE		
Aulas Mejoradas	2	• Montaje de estructura metálica y cubierta. • Mejoramiento a la parte eléctrica • Pintura completa al colegio tanto interna como externa.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO EL 14 DE JUNIO DE 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS

ID No. 24

Antes

MUNICIPIO		Banco - Magdalena
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 862.258.635,32
POBLACIÓN BENEFICIADA		177
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	6	Cambio de cubiertas, mampostería, carpintería metálica, y cambio de la red eléctrica.
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 69 M2 tipo multigrado prefabricado.
Baterías sanitarias	1	Construcción de aparatos sanitarios y enchapes, instalación de grifería y puesta en funcionamiento de los aparatos sanitarios, instalación de la red eléctrica y cubierta.
FECHA DE ENTREGA		13 de noviembre de 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolivar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA

ID No. 13

MUNICIPIO		Balsamo - Magdalena
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 419.262.469,74
POBLACIÓN BENEFICIADA		150
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Instalación de estructura metálica para cubierta y tejas UPVC, pintura,
Aulas nuevas	3	Construcción en sistema de pórtico, instalación de red eléctrica nueva, cubierta y estructura metálica nueva.
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		12 de noviembre de 2024

Antes



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolivar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL

ID No. 14

Antes

MUNICIPIO		Bálsamo - Magdalena
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 151.100.342,11
POBLACIÓN BENEFICIADA		50
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	2	Instalación de estructura metálica para cubierta y tejas UPVC, pintura, placa de contrapiso.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		12 de noviembre de 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL

ID No. 06

Antes

MUNICIPIO		Barranco de loba - Bolivar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 622.246.544,86
POBLACIÓN BENEFICIADA		225
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	10	Instalación de estructura metálica para cubierta y tejas UPVC, pintura, placa de contrapiso y redes eléctricas
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		07 de noviembre de 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO

ID No. 10

Antes

MUNICIPIO		Barranco de loba - Bolivar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 340.620.505,20
POBLACIÓN BENEFICIADA		160
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	10	Instalación de estructura metálica para cubierta y tejas UPVC, pintura, placa de contrapiso y redes eléctricas
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		07 de noviembre de 2024



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA

ID No. 09

MUNICIPIO		Barranco de loba - Bolivar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 518.303.395,80
POBLACIÓN BENEFICIADA		160
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Instalación de estructura metálica para cubierta y tejas UPVC, pintura, placa de contrapiso y redes eléctricas
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 69 M2 tipo multigrado prefabricado.
Baterías sanitarias	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA		07 de noviembre de 2024

Antes



Después



GRUPO 5, Departamentos de Cesar – Magdalena - Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO

ID No. 43

MUNICIPIO		San Martin de loba - Bolívar
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 281.969.568,84
POBLACIÓN BENEFICIADA		25
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	0	
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 69 M2 tipo multigrado prefabricado.
Baterías sanitarias	0	
FECHA DE ENTREGA		ENTREGADO 2 DE SEPTIEMBRE

Antes



Después



Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023



Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN



Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN



VALOR EJECUCION		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
		C1	C1	C2	C2			
O: \$4.158.777.879 I: \$295.239.000		31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	18/11/2024	Progr	91,84%	-18,68%
AVANCE POR COMPONENTE		Programado	100,00%	Programado	95,90%	Ejecut	73,16%	
		Ejecutado	100,00%	Ejecutado	74,75%			
DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA		SEDE		AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2		KASICHE		1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6		YAMAIN KASPOLIMANA		1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA		ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA		2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA		ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA		1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL		CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL		1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2		LA CAMPANA		0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2		WAYUUMAANA		0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2		LA ESTRELLA		1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6		YAMAIN PRINCIPAL		1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN		COOPERATIVO		0	7	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN		JOSÉ ANTONIO GALÁN		0	0	6
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7		APUNIMAANA1		0	8	0
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7		WAKUAPAMANA		0	9	6
TOTALES						8	36	24

Avance General: En la semana del 21 al 27 de oct de 2024. Actualmente **SUSPENDIDO** desde el 28oct2024 hasta 16nov2024

Avance general Componente I: 100%

Avance general por Sede Componente II: - 21,16%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 60,54%

ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 49.82%

ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 82.59%

ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 70.16%

ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 66.14%

ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%

ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%

ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 80.53%

ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 85.36%

ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%

ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 72.22%

ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%

ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 65,03%

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)



I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECCIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES



REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECTACIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES



Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO



Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL



Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.



Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O: \$4.810.476.306,00 I: \$313.800.000	23-Ago-24	08-oct-24	09-oct-24	08-dic-24	Programado	17,03%	-10,84%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100,00%	Programado	12,00%	Ejecutado	6,19%	
	Ejecutado	100,00%	Ejecutado	0,50%	En inicio de obras		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT OS SANITAR IOS	ID MEN
Santander	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	4	9	Si aplica	7
	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	NA	1	Si aplica	17
	Barrancabermeja	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada			141
Bolívar	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	NA	2	Si aplica	20
	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	1	1	Si aplica	123
			I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	NA	12	5	124
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada			33
		COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada			136
Arauca	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA	LA PAVA	NA	2	1	56
	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	NA	7	3	138
Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	1	1	2	67
			EL BRASIL	1	1	2	100
Meta	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	5	2	8	96
Cundinamarca	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	1	1	2	104
Norte de Santander	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	NA	1	Si aplica	132

Avance General: Se finalizaron actividades del componente I, se realizaron socializaciones e inicio de ejecución de obras.

- Se aprobó el de retiro de las 3 sedes educativas mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
- Se solicitará mediante comunicado a la interventoría el inicio de proceso de apremio al contratista de obra.
- Se realizará solicitud de prórroga para el contrato de obra por actividades adicionales en las sedes de Tolima y Villavicencio y por los atrasos presentados en las demás sedes y prórroga y adición para el contrato de interventoría.

Avance por sede:

ID No. 56: Se realizó socialización y se iniciaron obras el 05/11/2024.

ID No. 132: Se realizó socialización el 29/10/2024 y se tiene programado iniciar obras el 12/11/2024.

ID No. 138: Se realizó socialización el 01/11/2024 y se iniciaron obras el 08/11/2024.

ID No. 7: Socialización realizada el 07/11/2027 y se tiene programado iniciar obras el 14/11/2024

ID No. 17: Socialización realizada el 07/11/2027 y se tiene programado iniciar obras el 14/11/2024

ID No. 20: Socialización realizada el 06/11/2027 y se tiene programado iniciar obras el 15/11/2024

ID No. 123: Socialización realizada el 06/11/2027 y se tiene programado iniciar obras el 15/11/2024

ID No. 124: Socialización realizada el 06/11/2027 y se tiene programado iniciar obras el 15/11/2024

ID No. 104: Sede con alcances definidos. En programación de socialización e inicio de obras.

ID No. 67 y 100: Se realizaron socializaciones el 06/11/2024 y se programa inicio de obras el 13/11/2024.

ID No. 96: Con alternativa de las aulas aprobada. En programación de socialización e inicio de obras.

Se verifica la necesidad de solicitud de prórroga para el contrato de obra, se encuentra en estructuración de solicitudes para verificación y citación de comité técnico.

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 56 - CENTRO EDUCATIVO LA PAVA Arauca, Saravena



ID No. 138 - CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE Arauca, Arauca



Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL


ID No. 100 - EL BRASIL
Tolima, Santa Isabel



ID No. 67 - LA HUMAREDA
Tolima, Santa Isabel

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEV AS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	ID188. IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	15/11/2024
CAUCA	SUAREZ	ID189. IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	30/12/2024
CAUCA	SUAREZ	ID190. IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	30/12/2024
CAUCA	TORIBIO	ID12. IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID16. IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	30/12/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID164. IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	30/12/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	30/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	30/11/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	15/11/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	30/11/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/11/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	17/9/2024

Estado	Proyectos
Entregados	5
Terminados	5
Ejecución	5

PORCENTAJES DE AVANCE:



DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: fecha de terminación contrato 30 de diciembre, con corte al 03 de noviembre de 2024, porcentaje programado 62,20 % vs ejecutado 62,20%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE PRINCIPAL: Las actividades ejecutadas son; instalación de teja upvc 2,5mm en cinco bloques, mantenimiento de paredes, resanes, y pintura en paredes internas Y fachadas del bloque N°4 y biblioteca escolar del bloque N°3, instalación de canales en 4 bloques, instalación de redes eléctricas, en 5 bloques, e instalación de teja en 5 bloques. Se encuentra pendiente la instalación de bajantes y corrección de canales y el cambio de lámparas en la sala de profesores.
2. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE MARIA INMCULADA: Las actividades ejecutadas son: Mejoramiento de 7 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado, pañete, estuco y pintura de paredes internas y fachada, instalación de redes eléctricas en aulas y pasillos, enchape de aulas y pasillos en tablón de gres, e instalación de carpintería metálica puertas y ventanas, cambio de cubierta por teja upvc 2,5mm para la batería de niñas, se realizó la demolición de la batería de niños y se inicia la fundición de cimientos para la nueva batería localizada en el mismo lugar. En aulas nuevas se realizó la demolición de la cimentación antigua, la fundición de zapatas aisladas, la fundición del muro de contención sobre zapata corrida, fundición de vigas de cimentación y placa de contrapiso. Esta pendiente culminar las obras de cimentación de aulas nuevas para continuar con el armado de pórticos en estructura metálica y levantamiento de muros, la continuación de obras hidrosanitarias para la batería nueva de niños y realizar el muro de refuerzo en el aula 3 del bloque N°2, así como la instalación de tubería y respectiva conexión para el manejo de aguas lluvias y aplicación de pintura en batería de niñas.
3. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTADER: Desmonte de teja en bloque N°2 e instalación de teja termoacústica upvc 2,5mm en bloque N°2 y parcialmente en el bloque N°1
4. IE. LA PLAYA: Obras de mejoramiento terminadas y entregadas a satisfacción al rector y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de Julio, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 14 de agosto del 2024.
5. I.E DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de mayo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 28 de mayo del 2024, y suscripción.
6. I.E DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL: Obra nueva en ejecución, las actividades ejecutadas son: Localización y replanteo de los dos módulos sobre terreno natural y los dos módulos en palafitos y la batería sanitaria, fundición de zapatas aisladas, vigas y pedestales de los dos módulos, fundición de placa de contrapiso batería sanitaria y modulo 1 y 2 , obra de contención para el módulo 2 sobre terreno natural, instalación de placas macizas en concreto en aulas del módulo 1. Esta pendiente. Terminar instalación de envoltorio de los módulos de la parte alta del terreno y las instalaciones hidrosanitarias para la batería sanitaria, instalación de estructura metálica y muros en placas de concreto.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JHON F. KENNEDY las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 15 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, mantenimiento carpinteria metalica, enchape de pisos ent ablon de gres, mejoramiento de 11 baterias sanitarias, cambio de sanitarios lavamanos, mantenimiento de puertas, estuco y pintura, mejoramiento de sistema electrico en EMT en toda la institución, canales, bajantes, mesones en lavamanos, instalacion de orinales.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JULIAN MENDOZA Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 30 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de septiembre del 2024, y suscripción.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 11 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, repello estuco y pintura en la mayor parte del sistema de vigas de porticos

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: fecha de terminación contrato 30 de diciembre, con corte al 03 de noviembre de 2024, porcentaje programado 62,20 % vs ejecutado 62,20%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

10. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 8 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 8 de agosto del 2024, y suscripción
11. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 3 aulas existentes, 1 bateria existente, 1 aula nueva y 1 bateria sanitaria nueva que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, cambio de sanitarios lavamanos, estuco y pintura, mejoramiento de sistema electrico en EMT en toda la institución, canales, bajantes, mesones en lavamanos, instalacion de orinales, limpieza y descapote, excavaciones, cimentación, fundición, estructura metalica de aula nueva y bateria, estructura de cubierta, instalaciones sanitarias de bateria nueva, sistema electrico nuevo.
12. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 29 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de septiembre del 2024, y suscripción.
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) Esta sede aún no inicia su intervención. Actualmente se adelantan actividades de demolición por parte de la comunidad, el contratista ya tiene materiales y personal en la zona para iniciar actividades inicio que se proyecta para la semana del 28 al 31 de octubre.
14. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector pendientes del recibo a satisfacción y suscripción de acta , las obras se terminaron el 29 de julio, se realiza instalación de la placa informativa del MEN
15. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector pendientes del recibo a satisfacción y suscripción de acta , las obras se terminaron el 23 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 777.494.255,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		755
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1527,62 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 12 aulas más aulas múltiples. Mantenimiento de paredes en bloque 4 y biblioteca. Instalación de redes eléctricas y mejoramiento de las mismas.
Baterías sanitarias	.	Mejoramiento de redes eléctricas
FECHA DE ENTREGA		15 de noviembre de 2024



Después



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE MARIA INMACULADA ID MEN. 189. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Suarez
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 1.784.498.874,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		365
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento de 7 aulas repartidas en dos bloques, instalación de teja upvc 2,5mm, mantenimiento de paredes general, instalación de enchape, mantenimiento y cambio de carpintería metálica puertas y ventanas, instalación de redes eléctricas aulas y pasillos.
Aulas nuevas	6	Construcción de 6 aulas en dos niveles, en estructura metálica y muros en mampostería, instalación de redes eléctricas.
Baterías sanitarias	1	Construcción de batería para niños conformada por 7 tazas sanitarias, un orinal, 2 lavamanos corridos y un lavamanos de pedestal. Incluye mejoramiento de batería de niñas, cambio de cubierta y mantenimiento de paredes, unidades sanitarias y grifería. Red sanitaria hasta la cámara de inspección.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Ahora

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 466.062.196,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		356
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1077,08 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 5 bloques compuestos por 13 aulas.
Baterías sanitarias		Mejoramiento cambio de cubierta
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Toribio
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 315.736.591,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		369
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 908 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cuatro bloques compuestos por 8 aulas mas espacios comunes. Y construcción de red para evacuación de aguas lluvias conformada por 10 cajas de inspección y 89,07m de tubería Novafort 200mm
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de Agosto de 2024



Después



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO. ID MEN:16. MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 110.054.169,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		26
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 310,20 m2 de teja Upvc 2,5 mm en dos bloques compuestos por 3 aulas más un salón de sistemas. Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques
Baterías sanitarias	N.A.	Mejoramiento de 3 unidades sanitarias, cambio de tazas e instalación de piso cerámico.
FECHA DE ENTREGA		28 de mayo de 2024



Después



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID MEN. 16. MUNICIPIO DE SANTADER DE QUILICHAO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 1.154.707.185,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		445
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	8	Construcción de 8 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado), repartidas en 4 módulos, 2 de ellos contruidos sobre terreno natural y otros 2 en sistema palafítico. Para un área útil de 418,4 m2 sin contar pasillos.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos para niñas y 2 tazas sanitarias, 2 orinales y 4 lavamanos para niños. Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024




Después



MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 510.041.591,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		239
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	15	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de estructura metálica para cubiertas e instalación de 970,60 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 15 aulas, Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	11	Mejoramiento de 11 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		18 de octubre de 2024



Antes

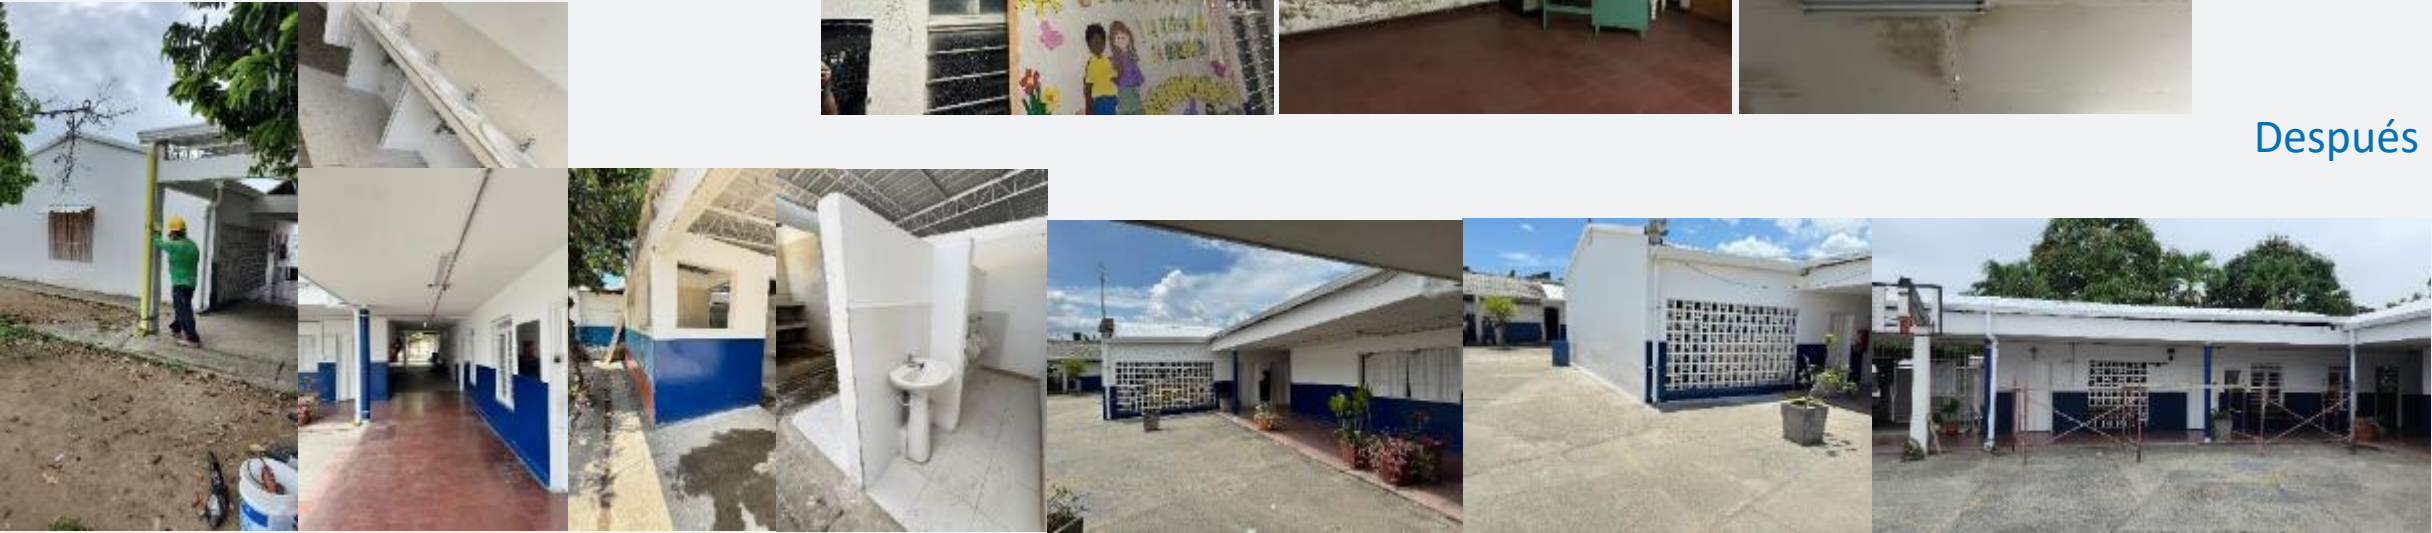

Después

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 194.491.940,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		181
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 484,71 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 7 aulas, Mantenimiento de puertas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico en 3 aulas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	9	Mejoramiento de 9 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024



Antes



Después

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL ID MEN.128. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 348.092.586,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		360
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1130 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 11 aulas, repello, estuco y pintura en estructura de vigas en concreto.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	N.A	
FECHA DE ENTREGA		15 de Noviembre de 2024



Después

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA ID MEN.130. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 63.767.518,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		3
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de cubierta 129,78 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 1 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		08 de agosto de 2024



Después



MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 230.551.218,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubiertas e instalación de cubierta 163,81 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 2 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico.
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado)
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos, construcción en sistema prefabricado, y mejoramiento de 2 baterías sanitarias, con sus respectivos cambios de tazas y lavamanos, estuco y pintura
FECHA DE ENTREGA		30 de noviembre de 2024



Antes

Después



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN ID MEN.158. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Antes

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 156.924.919,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	5	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubierta e instalación de cubierta 179,12m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 4 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico, estuco pintura, andenes, enchape de pisos, instalación sanitaria, cambio de puertas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento de 5 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

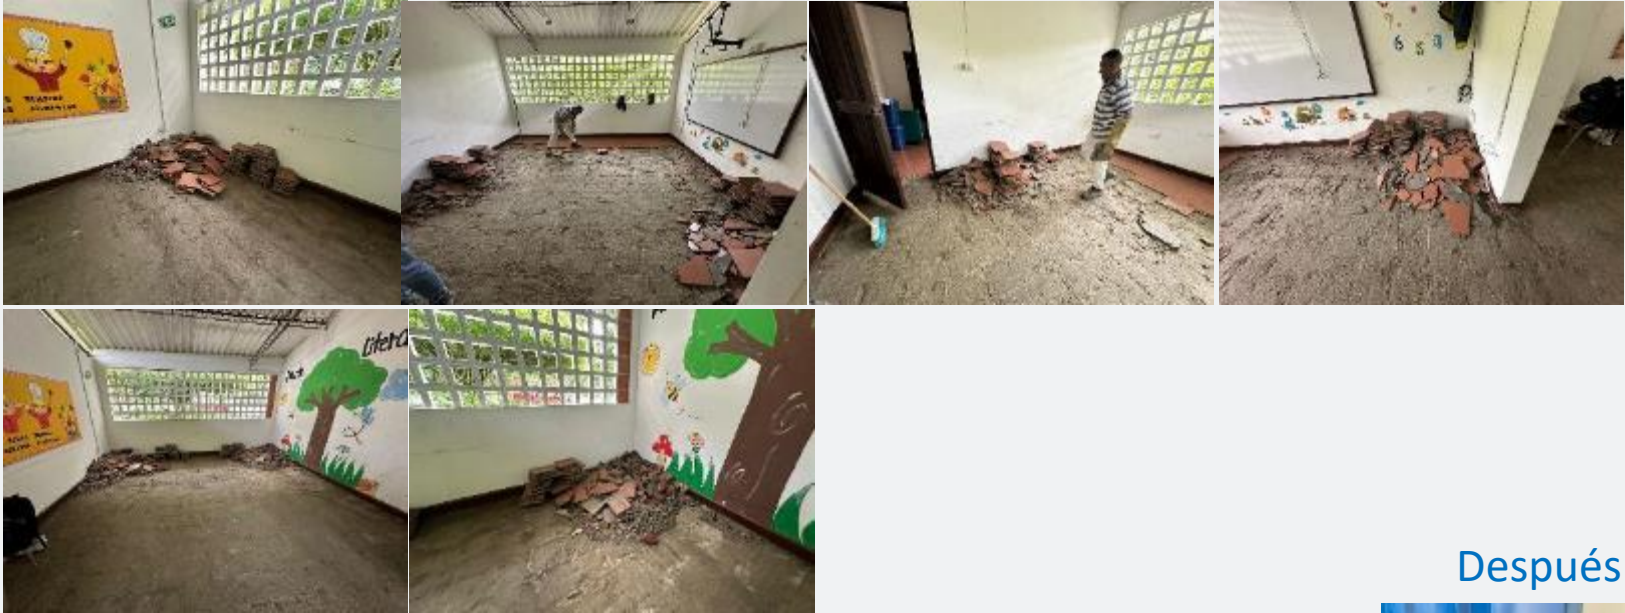

Después



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) ID MEN. 105. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 218.872.398,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aula de 87,55 m2 en sistema liviano (prefabricado),. Para un área útil de 74.71 m2.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024

Antes



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR ID MEN. 106. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 63.613.268,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	1	• Mantenimiento estructura madera para cubierta, instalación de 136,21 m2 de teja Upvc 2,5 mm en aula y baños. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores. Instalación de 2 aparatos sanitarios . Instalación de luminarias. Instalación de canales y bajantes
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	N.A	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias,
FECHA DE ENTREGA		30 de noviembre de 2024

Antes



Después



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS ID MEN.107. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO,

DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Antes

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 222.646.644,00
POBLACIÓN BENEFICIADA		52
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura madera para cubierta y entrepiso, instalación de 63 m2 de teja Upvc 2,5 mm en circulación fachada principal. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores.. Instalación de luminarias tomas e interruptores. Instalación de cielorraso falso., mantenimiento entrepiso en madera.
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	1	Mantenimiento de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos 2 para niñas y 2 para niños. Enchape de pisos y paredes. Instalación de puertas
FECHA DE ENTREGA		30 de noviembre de 2024



Después



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O: \$4.728.021.810 I: \$ 358.032.903	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/11/2024	Progr	93,49%	-1,63%
AVANCE POR COMPONETE	Programado	100%	Programado	93,09%	Ejecut	91,86%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	91,37%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 M
El Tambo	I.E. Huisitó	Huisitó (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	13	6 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	6	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	17	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	3	2 M
		El Altillio	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yervas	NA	2	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

COMPONENTE 2

Estado	Proyectos
Entregados	12
Terminados	5
Ejecución	1
Sin iniciar	0

- 12 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 5 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede.
- 1 proyecto, correspondiente a la intervención de la sede Huisitó del Tambo, se encuentra en ejecución.

Se presenta atraso en la ejecución de la sede Huisitó del Tambo. Se solicitó a contratista e interventoría implementar contingencias para reducirlo hasta nivelar la programación. Contratista informó sobre contingencia basada en aumento de personal. Informó sobre algunos aspectos de orden público que han impedido el ingreso normal de nuevo personal para la obra.

Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría.

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega

C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

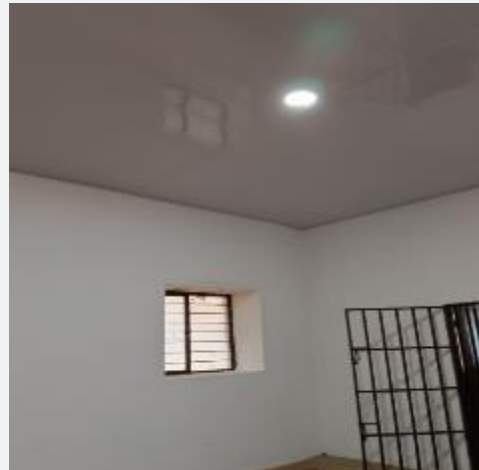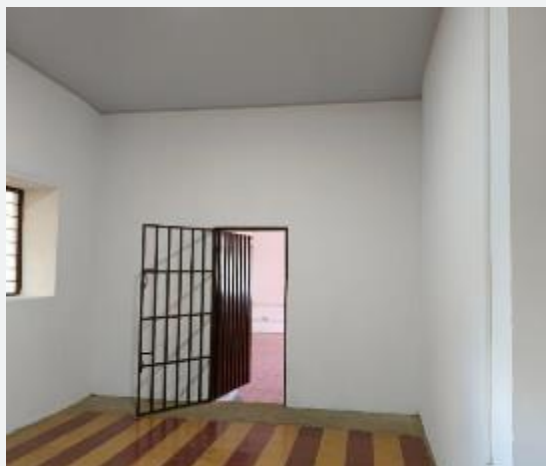

I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar

I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas

I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas

I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Olaya – Sede principal
Balboa

I.E. Santa Teresita – Sede principal
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo
Bolívar



I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán



C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal
Rosas



I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay
La Vega




I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

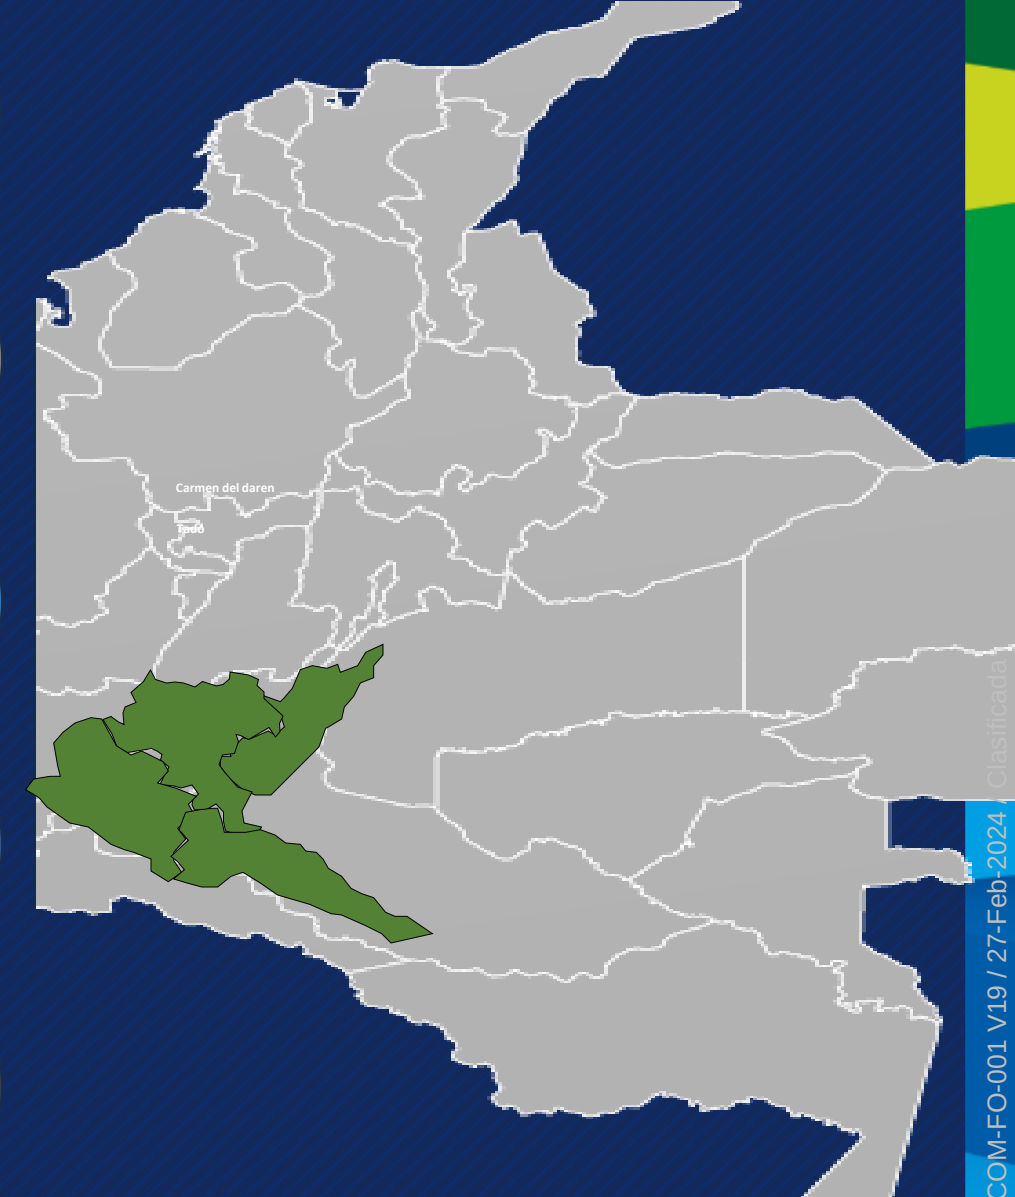

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



VALOR EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O:\$4.918.276.400 I: \$418.988.095	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/12/2024	Programado	81,98%	2,65%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100,00%	Programado	80,86%	Ejecutado	84,64%	
	Ejecutado	100,00%	Ejecutado	83,68%	% Financiero G12: 78,36% Obra: 78,22% Interventoría: 80,06%		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT OS SANITARI OS
Cauca	Piamonte	ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID125. Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	0	28	1
Cauca	Piamonte	ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	1
Huila	Acevedo	ID26. Institución Educativa Bateas	Bateas	0	5	5
Nariño	Pasto	ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	5	0
Nariño	El Rosario	ID8. Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	5	0	7
Nariño	Barbacoas	ID87. Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	2
Nariño	Barbacoas	ID110. Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombón	0	2	1
Nariño	Ipiales	ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	1
Nariño	Mallama (Piedrancha)	ID149. Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	1
Putumayo	Puerto Asís	ID41.I. E. Rur Cauca	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID57. I. E. Rur Cauca	Esc Rur Mix El Progreso	1	0	1
Putumayo	Pto Leguizamo	ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	0	1	1
Putumayo	Orito	ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wurrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID172. IE. Rur Cauca - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	12

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

Estado	Proyectos
Entregados	12
Terminados	1
Ejecución	5
Sin iniciar	0

- **Sede ID36. Tallambi,** se realizó subsanación de desplome (falta de plomo) de aula 5, se armaron aula 1 y 2 estructura metálica, en aula 3 y 4 se funde placa, en baterías se realizó instalación de tubería, compactación y fundición de placa.
- **Sede ID41. Teteye,** se encuentra en ejecución de actividades instalación de bajantes, eléctricas, enchapes e instalación de aparatos sanitarios, pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.
- **Sede ID57. Progreso,** se encuentra en ejecución de estucos y pinturas, pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.
- **Sede ID127. Orito,** se encuentra terminación en instalación de estructura metálica de cubierta, demoras en el empalme por la forma de transporte en mula debía llegar desarmada para armarse en sitio, falta instalar cubierta, , pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.
- **Sede ID172. Sede Principal Puerto Asís,** se realizó cambio de estructura de cubierta e instalación de cubierta en internado aprovechando la semana de receso escolar, se continua con actividades de estructura de tanque y mejoramiento de baterías sanitarias.

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Pasto - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 262.132.882
POBLACIÓN BENEFICIADA		986
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	- Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		15 de agosto de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

MUNICIPIO		El Rosario - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 66.208.426
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		24 de junio de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Acevedo - Huila
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 278.705.701
POBLACIÓN BENEFICIADA		193
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. - Mejoramiento de restaurante escolar
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 82.111.341
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		5 de julio de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 112.235.014
POBLACIÓN BENEFICIADA		173
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		22 de julio de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 57.066.573
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		19 de junio de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 214.447.888
POBLACIÓN BENEFICIADA		33
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	4	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		16 de agosto de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 97.200.260
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 135.500.591
POBLACIÓN BENEFICIADA		39
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 193.112.465
POBLACIÓN BENEFICIADA		24
ALCANCE		
Mejoramientos Aula múltiple	1	- Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. - construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	Ejecutada dentro del aula
FECHA DE ENTREGA		6 de septiembre de 2024

Antes



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO		Cumbal - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 818.394.559
POBLACIÓN BENEFICIADA		171
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	5	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	7	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO			Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN			\$ 184.632.555
POBLACIÓN BENEFICIADA			5
ALCANCE			
Mejoramientos Aula	N.A.		
Aulas nuevas	1	Instalación eléctrica fotovoltaica	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A		
Baterías sanitarias nuevas	1		
FECHA DE ENTREGA			3 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 197.031.005
POBLACIÓN BENEFICIADA		6
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	Instalación eléctrica fotovoltaica
Aulas nuevas	1	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 1.339.389.729
POBLACIÓN BENEFICIADA		850
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	28	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. Circulación + cerramiento + cubierta de conexión de área de preescolar
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha	3	Mejoramiento en preescolar
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO		Orito - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 206.821.177
POBLACIÓN BENEFICIADA		13
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A	Instalación eléctrica fotovoltaica
Aulas nuevas	1	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024



Después



Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– EN EJECUCIÓN

Antes

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		\$ 224.052.916
POBLACIÓN BENEFICIADA		161
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas)	6	
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias	12	• Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad.
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024



Después





Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol  @findetercol
t @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

