

FORMATO				
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020
Página: 1 de # 10				
* La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 13/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-756-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-831 del 09 de diciembre de 2024, Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-729-2024 con asunto "Solicitud de orden y aseo en obra en atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales fijadas en la Resolución No 1074 de 2023." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 13/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-757-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta a su comunicado 2024-ATSC-CENV-846 del 12 de diciembre de 2024 con asunto "Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-675-2024, con asunto: "Solicitud de cumplimiento ficha PMA-MAS-7 manejo de residuos líquidos industriales, residuos líquidos domésticos y de escorrentía / presentación de certificados de recolección, transporte y disposición final de agua residuales domésticas."." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 14/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-758-2024, donde esta Interventoría se permite enviar las observaciones al comunicado 2024-ATSC-CENV-852 cuyo asunto es: "Remisión del Acta de Obra No.5". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 14/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-759-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 16/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-760-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta oficio 2024-ATSC-CENV-843 con asunto "Remisión de acta de entorno" * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 16/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-761-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta a las comunicaciones: 2024-ATSC-CENV-828, cuyo objeto es: "presentación de laboratorios y diseño mezcla asfáltica proveedor COLBITUMEN calle rodaje alfa bitumen 82-22". 2024-ATSC-CENV-841, cuyo objeto es: "Respuesta al comunicado EPSILON TOLU23000882H3-746-2024 con asunto "Bitumen calle de rodaje alfa", 2024-ATSC-CENV-849, cuyo objeto es: "Presentación de laboratorios y diseño mezcla asfáltica proveedor COLBITUMEN calle rodaje alfa bitumen 82-22". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 16/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-762-2024 , donde esta Interventoría se permite realizar la solicitud de Atención a Derrames en Pistas * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 14/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-763-2024 , donde esta Interventoría se permite realizar la solicitud de Personal Mínimo Contractual * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 16/12/2024 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2024, donde esta Interventoría se permite enviar el Acta Parcial Corte No 5 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-764-2024, donde esta Interventoría se permite enviar el personal BMA - Alcance a comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-759-2024 "Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6"." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-765-2024, donde esta Interventoría se permite realizar las observaciones de las Actividades BMA - Alcance a comunicación "Personal BMA - Alcance a comunicación EPSILON TOLU- 23000882H3-759-2024 "Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6"; EPSILON TOLU-23000882H3-759-2024 "Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6"." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-766-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta comunicación 2024-ATSC-CENV-861 con asunto: "Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-758-2024, con asunto "Observaciones al comunicado 2024-ATSC-CENV-852 cuyo asunto es: "Remisión del Acta de Obra No. 5" * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-767-2024, donde esta Interventoría se permite hacer la solicitud de cumplimiento de las fichas de manejo Ambiental PMA-MRA- 2 Manejo de emisiones atmosféricas. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-768-2024, donde esta Interventoría se permite hacer el reporte de comportamiento inseguro controlador de tráfico del PMT ubicado en la ruta 9004. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-769-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta a su comunicado 2024-ATSC-CENV-832 de 9 de diciembre de 2024; con asunto Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-726-2024 con asunto "Solicitud de cumplimiento ficha PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, referente a la entrega del Plan de Vigilancia y Control de Ecosistemas Sensibles". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-770-2024, donde esta Interventoría se permite hacer la solicitud de Permanencia en Campo del Equipo SST * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite al contratista y aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-433-2024, donde esta Interventoría se permite informar el alcance al comunicado No EPSILON TOLU BTA-23000882H3-415-2024 de 13 de diciembre de 2024. Monitores de calidad de aire – actualización. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 16/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-771-2024, donde esta Interventoría se permite enviar la reiteración No 1 del comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-737-2024 del 04 de diciembre de 2024 * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 17/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-772-2024, donde esta Interventoría se permite realizar la solicitud de Información referente a Equipo Mínimo. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-773-2024, donde esta Interventoría se permite realizar dar respuesta a su comunicado No. 2024-ATSC-CENV-838 de 9 de diciembre de 2024; con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-727-2024, con asunto Respuesta a su comunicado 2024-ATSC-CENV-733 de 14 de noviembre de 2024 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-644-2024 con asunto "Solicitud de información de donación de material vegetal sin aprobación previa de interventoría de 30 de octubre 2024". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-774-2024, donde esta Interventoría se permite solicitar el alcance EPSILON TOLU-23000882H3-765-2024 con asunto "Actividades BMA - Alcance a comunicación "Personal BMA - Alcance a comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-759-2024 "Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6"; EPSILON TOLU-23000882H3-759-2024 "Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-855 cuyo asunto es: "Remisión Acta de Obra No. 6"." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-775-2024, donde esta Interventoría se permite hacer traslado PQRS solicitud de madera * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-434-2024, donde esta Interventoría se permite hacer traslado oficio 2024-ATSC-CENV-776 con asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU- 23000882H3-700-2024 con asunto "Respuesta a oficio 2024-ATSC-CENV-745 de fecha 18 de noviembre de 2024, con asunto "Remisión de las cotizaciones para la fabricación de pendón de identificación para la oficina de atención al usuario. Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-6452024, con asunto "Respuesta oficio 2024-ATSC-CENV-621"." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-435-2024, donde esta Interventoría se permite hacer traslado del comunicado No. 2024-ATSC-CENV-844 con asunto "Ejecución de las actividades para sepultar el sitio Arqueológico en el Hallazgo No. 2 para la operación temporal de la pista del Aeropuerto" de fecha 12/12/2024. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-436-2024, donde esta Interventoría se permite hacer remisión Informe semanal de interventoría No. 47 * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 18/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-776-2024, donde esta Interventoría se permite informar los deterioros de superficies pavimentadas con mezcla asfáltica TIPO P-401. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 19/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-777-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-854 del 13 de diciembre de 2024 que tiene como asunto "Remisión de los APU NP TALA". * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 19/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-778-2024, donde esta Interventoría se permite dar respuesta comunicación 2024-ATSC-CENV-840 con asunto "Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-739-2024 con asunto "Repuesta comunicación 2024-ATSC-CENV- 825 con asunto "Presentación Perfil Profesional Contractual - Ingeniero Residente"." * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 19/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-779-2024, donde esta Interventoría se permite hacer la solicitud de limpieza, orden y aseo en la pista y franjas de seguridad previo a la operación aeroportuaria. * La interventoría CONSORCIO EPSILON TOLU el día 19/12/2024 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-437-2024, donde esta Interventoría se permite hacer envío del Acta Parcial Corte No 6 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.				
ACTIVIDADES TECNICAS				
Viernes 13/12/2024 Se continúan con las actividades de topografía en el hito 2, localización de puntos de control para poligonal cerrada, adicional se riega material para vía de acceso al hito 2. Se realiza extracción de núcleos en pista para ensayos de laboratorio desde la cabecera 35 a cabecera 17 Se realiza extendido de material de base granular para nivelación de franjas con pista Se realiza extendida de material en cabecera 35 con subbase en zona de ampliación Se realiza extendida de material de excavación costado izquierdo desde la abs. K1+050 a K1+200 con bulldozer (la actividad inicia a las 11:15) Se realiza riego de emulsión asfáltica para segunda capa de asfalto desde abs K0+265 a K0+210. Estado del clima: Tiempo seco				

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
---	-------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación niveles para instalación de mezcla asfáltica conjuntamente con la comisión de topografía del contratista de K0+165 al K0+240, costado izquierdo; entre ordenadas -22.5 a 8 y de K0+165 a K0+213, costado derecho; entre ordenadas 8 y 29.8.
* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza levantamiento de poligonal cerrada para el hito 2.

Sabado 14/12/2024

Se continúan actividades en el hito 2 con topografía, levantamiento poligonal cerrada
Se realiza chequeo de pines para instalación de última capa de mezcla asfáltica de K0+160 a K0+140 y de K0+213 a K0+265 ordenadas -4.15 a 4.15
Se realiza extendida y transporte de material de excavación para franjas de seguridad costado izquierdo K1+050 a K1+200
Se realiza instalación de mezcla asfáltica primer tramo de transición pista y cabecera 17 en el K0+216 entre ordenada -23 y -8 (Se realiza monitoreo por parte de la interventoría de temperatura en la extendida de la mezcla asfáltica)
Se realiza fresado de 4 cm del tamo K0+700 a K0+650 carril 1, costado derecho y costado izquierdo carril 2 K0+700 a K0+755 (10 cm)
Se realiza extendida de material de excavación desde K1+00 y K0+920 costado derecho (bulldozer)
Se realiza extendido de franja con base granular desde K0+880 hacia menores K0+660 costado izquierdo
No se realiza instalación de plástico costado derecho desde abs K0+920 a menores. Adicional se realiza extendida de material con motoniveladoras desde abs. K0+796 a K0+750
Nota: El plástico desde la K0+920 hacia menores dada la altura de los llenos no se hace necesario y la motoniveladora se encuentra en la actividad de perfilado de lo extendido por el bulldozer.

Estado del clima: Tiempo seco

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza levantamiento de poligonal cerrada para el hito 2.

Domingo 15/12/2024

Se realiza sopleteo en el tramo K0+665 a K0+700 carril 1 costado derecho, se inicia riego de liga en el tramo K0+665 a K0+700 carril 1 costado derecho.
Se realiza extendida de material de excavación en margen izquierdo de K0+665 a mayores hasta K0+800
Se realiza instalación de mezcla asfáltica cabecera 17 del K0+213 a K0+180 carril -3 costado izquierdo, costado derecho desde K0+213 al K0+180 carriles 4.5 y 6
Se realiza nivelación de franja costado derecho con base granular desde la K0+230 hacia mayores
Se realiza riego de liga en el tramo K0+165 al K0+180 margen derecha carril 1 capa 2
Se realiza instalación de asfalto carril 1 costado derecho capa 2 (K0+265 al K0+255) y capa 3 del (K0+255 al K0+240) en este tramo no se llega al espesor
Se instalaron en total 233.9 m3 en la jornada

Estado del clima: Tiempo seco

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de pines para instalación de última capa de mezcla asfáltica de K0+160 a K0+190 y de K0+213 a K0+265; entre ordenadas -4.15 a 4.15.

Lunes 16/12/2024

Sobre el material instalado de mezcla asfáltica el domingo 15 de diciembre se dejan las siguientes observaciones:
1. Tramo K0+213 al K0+205 carril -3 costado izquierdo capa 2 se observa erosión superficial (peladura)
2. Deficiencia en la compactación en el tramo K0+200 al K0+180 carril -5 costado izquierdo capa 2
3. Tramo K0+223 entre carril 3 y 4 depresión y fallas en la compactación
4. En el tramo K0+230 al K0+290, se instala capa 3 carril 1 costado derecho sin imprimación
Se realiza extendida de material de excavación franjas costado derecho hacia menores desde K0+920, se realiza renivelación del relleno K0+920 al K1+030 margen derecha total de viajes 41
Se realiza extendida de material de base granular para franjas desde K0+550 costado izquierdo
Se realiza instalación de mezcla asfáltica en la transición K0+240 al K0+230 (3 capas) y K0+213 al K0+230 (4 capas)
Se realiza chequeo de pines en la calle de rodaje A

Estado del clima: Tiempo seco

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de pines para instalación de última capa de mezcla asfáltica en calle rodaje Alfa de K0+025 a K0+078, costado izquierdo; entre ordenadas 0 a -10.5.
* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza levantamiento de poligonal cerrada para el hito 2.

Martes 17/12/2024

Se inicia con la limpieza de la cabecera 35 hacia menores, se realiza la instalación de asfalto en calle de rodaje A K0+023 a K0+078 carril 1 y 2, margen izquierdo y carril -1 margen derecho.
Se realiza el empalme entre pavimento rígido y flexible calle de rodaje A con plataforma.
Se realiza lleno y extendido de material margen derecha desde abs K0+720 a K0+550, se finaliza todo el margen derecho desde abs. K0+240 a la K1+350. El día de hoy se extienden 49 viajes.
Se realiza recorrido para realizar inspecciones visuales a las superficies pavimentadas con mezcla asfáltica tipo P-401 y se identifican las siguientes diferencias constructivas, las cuales no garantizan una superficie libre de irregularidades que pueden afectar la seguridad de las operaciones o causar daños o aumentar la fatiga estructural de las aeronaves:
Derrame de combustible (severidad medio):
-Plataforma de viraje ubicada en la cabecera provisional 35 K1+300 al K1+350 margen derecha
Bacheos o parches (severidad baja):
-RWY K0+558 a K0+560 carril 1 margen derecho
-RWY K0+650 a K0+657 carril 1 margen derecho
-RWY K0+675 a K0+700 carril 1 margen derecho
-RWY K0+50 a K0+780 carril 1 margen derecho
Erosión superficial (peladura) (severidad baja):
-Plataforma de viraje ubicada en la cabecera provisional 35 K1+300 al K1+350 margen derecha
-RWY K0+412 a K0+470 carril -2 margen izquierdo
-RWY K0+560 a K0+592 carril -2 margen izquierdo
-RWY K0+800 a K0+860 CARRIL -2 margen izquierdo
-RWY K0+950 a K1+050 carril -2 margen izquierdo
Se instalan en total 261 m3 de mezcla asfáltica el día de hoy en calle de rodaje A. Realizando la primera capa desde K0+023 a K0+078 carriles 1, 2, -1, -2 y segunda capa desde K0+023 a K0+078 carriles 1, -1, -2. Queda pendiente carril 2 en lados K0+040 a K0+037 carril 1 costado derecho capa 2
Se tuvo una temperatura de colocación de 101° y fue instalada a las 18:34

Estado del clima: Tiempo seco

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de niveles de pines para instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica en la calle de rodaje Alfa de K0+022.5 a K0+078, entre ordenadas -10.5 y 10.5 y las curvas al ingreso a la plataforma.

Miercoles 18/12/2024

Se continúa con la limpieza desde cabecera 35 provisional a menores
Se realiza extendida de base granular franja de seguridad costado derecho abs K0+600 a mayores hasta el K0+800
Se realiza extendida de material de excavación desde abs K1+000 a K1+800 costado izquierdo
Se inicia con la marcación de puntos con topografía para señalización horizontal, se inicia con actividad de pintura sobre las 15:30 umbral cabecera 35 provisional
Se realiza chequeo de pines para continuar actividad de asfalto en cabecera 17

Estado del clima: Tiempo seco

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de pines para instalación segunda capa de mezcla asfáltica en calle de rodaje Alfa de K0+025 a K0+078, costado derecho; entré ordenadas 5.25 y 10.5.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de pines para instalación capa de mezcla asfáltica de K0+165 a K0+265, costado izquierdo; entre ordenadas 0 y -8.3.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de localización de señalización horizontal en pista de K1+030 al K1+300.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Página: 1 de # 10

Se continua con la limpieza desde cabecera 35 provisional hacia menores

Se da inicio con la demarcación para señalización horizontal con apoyo de topografía, se da inicio a actividades de pintura en umbral de pista cabecera 35 provisional

Se realiza verificación de pines cabecera 17 con topografía

Se realiza extensión de material de excavación en franjas costado derecho abs K0+210 a K0+240 y costado izquierdo abs K1+000 A K0+800

Se realiza nivelación zona RESA cabecera 17 con motoniveladora y compactador

Se realiza instalación de mezcla asfáltica en carril 2 calle de rodaje A. Se realiza instalación de mezcla asfáltica en pista en cabecera 17 con 3 carriles 4. 3. 2. 1. -2 tramo K0+195 a K0+225

Topografia:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de pines para la instalación de capa de mezcla asfáltica de K0+165 a K0+240, costado izquierdo, entre ordenadas -8.3 al -22.5.

EVD	PROYECTO / ACTIVIDAD / INICIAL	SEMANA		VALOR PROGRAMADO			VALOR EJECUTADO			ADELANTO (+)						
		Nº	DE	DE	HASTA	SEMANA L	%	ACUMULADO	%		SEMANA L	%	ACUMULADO	%		
E.T.A. DE OMBIA	12	8/04/2024	14/04/2024			0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	0,00%
	13	15/04/2024	21/04/2024			0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	0,00%
	14	22/04/2024	28/05/2024	\$	294.216.249	0,26%		294.216.249	0,26%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	-0,26%
	15	29/04/2024	5/05/2024	\$	294.216.249	0,26%		588.432.497	0,51%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	-0,51%
	16	6/05/2024	12/05/2024	\$	294.216.249	0,26%		882.648.746	0,77%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	-0,77%
	17	13/05/2024	19/05/2024	\$	294.216.249	0,26%		1.176.864.995	1,02%	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%	-1,02%
	18	20/05/2024	26/05/2024	\$	709.272.861	0,62%		1.886.137.875	1,64%	\$	415.056.632,34	0,36%	\$	415.056.632	0,36%	-1,26%
	19	27/05/2024	2/06/2024	\$	294.216.249	0,26%		2.180.354.124	1,89%	\$	-	0,00%	\$	415.056.632	0,36%	-1,53%
	20	3/06/2024	9/06/2024	\$	252.193.356	0,22%		2.432.539.480	2,11%	\$	1.040.033,82	0,00%	\$	416.066.668	0,36%	-1,75%
	21	9/06/2024	15/06/2024	\$	294.216.249	0,26%		2.726.755.729	2,36%	\$	3.035.200,00	0,00%	\$	419.131.948	0,36%	-2,00%
	22	16/06/2024	22/06/2024	\$	226.861.094	0,20%		2.953.628.823	2,56%	\$	-	0,00%	\$	419.131.948	0,36%	-2,20%
	23	23/06/2024	29/06/2024	\$	86.543.208	0,05%		3.012.180.031	2,61%	\$	-	0,00%	\$	419.131.948	0,36%	-2,25%
	24	30/06/2024	6/07/2024	\$	86.543.208	0,05%		3.070.723.238	2,66%	\$	-	0,00%	\$	419.131.948	0,36%	-2,30%
	25	7/07/2024	13/07/2024	\$	86.543.208	0,05%		3.129.266.446	2,71%	\$	21.506.153,00	0,02%	\$	440.638.099	0,38%	-2,33%
	26	14/07/2024	20/07/2024	\$	86.543.208	0,05%		3.187.809.654	2,76%	\$	403.775,00	0,00%	\$	441.041.874	0,38%	-2,36%
	27	21/07/2024	27/07/2024	\$	186.151.326	0,14%		3.353.960.979	2,91%	\$	23.686.042,00	0,02%	\$	464.727.916	0,40%	-2,51%
	28	28/07/2024	3/08/2024	\$	186.151.326	0,14%		3.520.112.305	3,05%	\$	196.061.525,00	0,17%	\$	660.789.441	0,57%	-2,46%
	29	4/08/2024	11/08/2024	\$	166.151.326	0,14%		3.686.263.630	3,20%	\$	270.151.174,00	0,23%	\$	930.940.615	0,81%	-2,36%
	30	12/08/2024	18/08/2024	\$	131.965.209	0,11%		3.816.228.839	3,34%	\$	427.338.526,84	0,36%	\$	1.368.079.142	1,21%	-2,15%
	31	19/08/2024	25/08/2024	\$	200.337.442	0,17%		4.016.568.281	3,48%	\$	140.035.963,00	0,12%	\$	1.508.114.225	1,31%	-2,16%
	32	26/08/2024	1/09/2024	\$	167.485.422	0,15%		4.186.051.703	3,63%	\$	232.968.970,00	0,20%	\$	1.741.083.195	1,51%	-2,12%
	33	2/09/2024	9/09/2024	\$	172.977.343	0,15%		4.359.029.046	3,78%	\$	402.678.826,00	0,35%	\$	2.143.962.021	1,74%	-2,04%
	34	9/09/2024	15/09/2024	\$	1.194.487.016	0,54%		5.553.516.082	4,82%	\$	222.917.162,00	0,19%	\$	2.366.879.193	2,05%	-2,76%
	35	16/09/2024	22/09/2024	\$	629.194.070	0,10%		6.182.710.132	5,01%	\$	644.621.757,00	0,52%	\$	3.011.500.940	2,44%	-2,57%
	36	2														

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

Semanas	VALOR PROGRAMADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)
0	\$-	\$-
1	\$-	\$-
2	\$-	\$-
3	\$-	\$-
4	\$-	\$-
5	\$-	\$-
6	\$-	\$-
7	\$-	\$-
8	\$-	\$-
9	\$-	\$-
10	\$-	\$-
11	\$-	\$-
12	\$-	\$-
13	\$-	\$-
14	\$-	\$-
15	\$-	\$-
16	\$-	\$-
17	\$-	\$-
18	\$-	\$-
19	\$-	\$-
20	\$-	\$-
21	\$-	\$-
22	\$-	\$-
23	\$-	\$-
24	\$-	\$-
25	\$-	\$-
26	\$-	\$-
27	\$-	\$-
28	\$-	\$-
29	\$-	\$-
30	\$-	\$-
31	\$-	\$-
32	\$-	\$-
33	\$-	\$-
34	\$1.908	\$-
35	\$-	\$-
36	\$-	\$-
37	\$-	\$-
38	\$-	\$-
39	\$-	\$-
40	\$-	\$-
41	\$-	\$-
42	\$-	\$-
43	\$-	\$-
44	\$-	\$-
45	\$-	\$-
46	\$-	\$-
47	\$-	\$-
48	\$-	\$-
49	\$-	\$-
50	\$-	\$-
51	\$-	\$-

Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades:

FORMATO				
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
Viernes 13/12/2024: * Mesa de trabajo revisión de carpetas Obligación formato 8 a especificaciones técnicas * Acompañamiento proceso de Donación de madera comercial 2 donaciones que suman 2.2m3 * Recorrido en campo Verificación de medidas de manejo ambiental aplicadas; * 1. Control y acompañamiento de reutilización de material de excavación en los laterales de la pista * 2. Verificación de instalación de los punto de Muestreo de Calidad de Aire * 3. Verificación de actividad de Rocería en el Hito2, para adecuación de área de intervención * Acompañamiento capacitación manejo de especies vegetales y faunísticas en amenaza o en veda * EPSILON TOLU-23000882H3-754-2024 Solicitud de adecuación de almacenamiento para residuos convencionales * EPSILON TOLU-23000882H3-755-2024 Reiteración No 1 del comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-671-2024 de 12 de noviembre 2024 con asunto / solicitud de información ambiental / funcionamiento e instalación de triturador móvil. * EPSILON TOLU-23000882H3-756-2024 Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-831 del 09 de diciembre de 2024, Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-729-2024 con asunto "Solicitud de orden y aseo en obra en atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales fijadas en la Resolución No 1074 de 2023." * EPSILON TOLU-23000882H3-757-2024 "solicitud de cumplimiento ficha PMA-MAS-7 manejo de residuos líquidos industriales, residuos líquidos domésticos y de escorrentía / presentación de certificados de recolección, transporte y disposición final de agua residuales domésticas." Sábado 14/12/2024: * Realización y envío del acta CET-CAT-169 correspondiente a Revisión de carpetas obligación formato 8ª especificaciones técnicas. * Acompañamiento capacitación Cuidado y protección de fauna y flora silvestre Domingo 15/12/2024 Día festivo no laborado por el area ambiental. Lunes 16/12/2024 * Recorrido en campo verificación de medidas ambientales implementadas * 1. Revisión de Estaciones de monitoreo de calidad de Aire * 2. Revisión de FOD para pista próxima a entrar en operación * 3. Revisión de canales Perimetrales * Acompañamiento capacitación Manejo de Fauna, nidos y procesos de Ahuyentamiento. Martes 17/12/2024 * Recorrido en Campo Comité ambiental #20 seguimiento de medidas ambientales implementadas entre la firma contratista y la interventoría * Mesa de trabajo contratista e interventoría, para la conciliación y revisión del proceso de intervención forestal * EPSILON TOLU BTA-23000882H3-415-2024 Traslado del comunicado No 2024-ATSC-CENV-836 de 10 de diciembre de 2024 con asunto 2024- ATSC-CENV-836. Alcance al comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-602-2024 del 21 de octubre * EPSILON TOLU-23000882H3-767-2024 Solicitud de cumplimiento de las fichas de manejo Ambiental PMA-MRA- 2 Manejo de emisiones atmosféricas * EPSILON TOLU-23000882H3-769-2024 Respuesta a su comunicado 2024-ATSC-CENV-832 de 9 de diciembre de 2024; con asunto Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-726-2024 con asunto "Solicitud de cumplimiento ficha PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, referente a la entrega del Plan de Vigilancia y Control de Ecosistemas Sensibles". * EPSILON TOLU-23000882H3-771-2024 Reiteración No 1 del comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-737-2024 del 04 de diciembre de 2024 Miércoles 18/12/2024 * Reunión virtual con el Consorcio Ica para revisión de los formatos presentadas por la firma contratista * EPSILON TOLU-23000882H3-773-2024 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-644-2024 con asunto "Solicitud de información de donación de material vegetal sin aprobación previa de interventoría de 30 de octubre 2024". * EPSILON TOLU BTA-23000882H3-433-2024 Alcance al comunicado No EPSILON TOLU BTA-23000882H3-415-2024 de 13 de diciembre de 2024. Monitoreos de calidad de aire – actualización. Jueves 19/12/2024 * Recorrido conjunto área ambiental y área técnica, con el fin de realizar el seguimiento y control de las medidas de manejo ambiental implementadas a la fecha y las que estén pendientes a desarrollar. * Realización y envío del acta CET-CAT-175 Recorrido conjunto de verificación y seguimiento y adquisición de nuevos compromisos * Realización y envío del acta CET-CAT-176 Recorrido conjunto de verificación y seguimiento al estado de orden y aseo de la pista previo a operación * Mesa de trabajo virtual para revisión de formatos ICA enviados por la firma contratista, participación entidad, el contratista y la interventoría * EPSILON TOLU-23000882H3-777-2024 Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-854 del 13 de diciembre de 2024 que tiene como asunto "Remisión de los APU NP TALA". * Mesa de trabajo virtual para revisión de formatos ICA enviados por la firma contratista, participación entidad, el contratista y la interventoría				
COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: Viernes 13/12/2024: * Inspección en campamento, se realiza verificación de las condiciones locativas en el campamento, distribución y organización garantizando los ambientes seguros, señalización y delimitación en las áreas, puntos de emergencias dotados de camillas, botiquín, extintor y kit antiderrames, unidades sanitarias en condiciones adecuadas para su uso. * Se realiza inspección y seguimiento de equipos y maquinarias en campamento. Se hace revisión de los reportes en preoperacionales y garantizando la operación segura. Sábado 14/11/2024: * Seguimiento a las actividades de instalación de mezcla asfalti * Se realiza inspección en la operación del PMT instalado en el OR 46+084 en la entrada y salida de maquinas y equipos, se realiza observación de la acción.ca y emulsión. Se realiza seguimiento a la implementación de los procedimientos seguros definidos en las actividades mencionadas.Seguimiento a las excavaciones abiertas, se verifica la delimitación y señalización de estas. * Acompañamiento a las charlas de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista. * Se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-763-2024 con asunto: Solicitud de Personal Mínimo Contractua. Domingo 15/12/2024 No se realizaron labores por parte del area. Lunes 16/12/2024 * Seguimiento a las actividades de lavado y limpieza de la pista para el inicio de la demaracación de la señalización y pintura. * Inspección en campo: se realiza seguimiento a la señalización, delimitación de excavaciones, verificación de dotación y estado de los puntod de emergencias incluyendo botiquín, camilla, extintor y kit antiderrames. * Se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-762-2024 con asunto: Solicitud de Atención a Derrames en Pistas Martes 17/12/2024 * Seguimiento en la instalación de mezcla asfáltica e imprimación en la pista, verificación de procedimientos seguros, EPP, preoperacionales de máquinas y equipos, hidratación y acompañamiento del personal SST del contratista. Se tiene el acompañamiento en las actividades de relleno en la franja de seguridad. Miércoles 18/12/2024 * Acompañamiento a las charlas de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista. * Se realiza seguimiento al personal del contratista al momento de hacer ingreso a la pista, se hace verificación de personal por medio de planillas y listados de personal. * Seguimiento en la continuación con las actividades de lavado y limpieza de la pista, se realiza verificación de uso de elementos de protección personal EPP de los trabajadores en las diferentes actividades, se solicita la hidratación permanente. * Se emiten los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-768-2024 con asunto: Reporte de comportamiento inseguro controlador de tráfico del PMT ubicado en la ruta 9004 y EPSILON TOLU-23000882H3-770-2024 con asunto: Solicitud de Permanencia en Campo del Equipo SST. Jueves 19/12/2024 * Se realiza inspección en el carro utilero en las actividades de pintura, verificación de la cuadrilla de personal. Se acompaña en la actividad. * Se realiza acompañamiento en el recorrido en campo en compañía de la supervisión del proyecto. Se realiza seguimiento a las actividades de instalación de mezcla asfáltica, emulsionado, relleno de franjas de seguridad y pintura de la pista.				
COMPONENTE ARQUEOLOGIA:				
Durante la semana No. 48 se desarrolló el seguimiento a actividades de prospeccion arqueologica.				

FORMATO				
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028		Versión: 01
			Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
COMPONENTE SOCIAL:				
Durante la semana No. 48 se desarrollaron las siguientes actividades: Viernes 13/12/2024: * Acompañamiento a la firma contratista durante la capacitación sobre MANEJO DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS EN AMENAZA O EN VEDA dirigida al personal vinculado a la obra Sábado 14/12/2024: *Acompañamiento a la firma contratista durante la capacitación sobre CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HÁBITATS dirigida al personal vinculado a la obra Domingo 15/12/2024 * No se realizó ninguna actividad por parte del contratista al ser día dominical. Lunes 16/12/2024 *Revisión de informes semanales de la firma contratista. Martes 17/12/2024 *Se realiza Comité social N°16 el cual tuvo la participación de la firma contratista y la interventoría. Se realizó seguimiento a las actividades correspondientes a las fichas socioeconómicas del Plan de Manejo Ambiental . *Acompañamiento a la firma contratista en la revisión de buzones de sugerencias ubicados en las instalaciones de la alcaldía, concejo y personería municipal, además del buzón ubicado en la tienda El Camping Miércoles 18/12/2024 *Participación en reunión virtual con profesionales socioambientales de ICAs, con el fin de retroalimentar las fichas del informe ICA. Jueves 19/12/2024 *Seguimiento y verificación del estado actual de la madera donada a la oficina de Gestión de riesgo del municipio Santiago de Tolú.				
COMPONENTE ESPECIALISTAS				
1. Especialista Electrico				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: 1.El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5) 2.Se le envió solicitud al contratista para que entregue una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información. 3.En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados. 4.Se firma la versión final de planos eléctricos. 5.No hubo actividad de obra del componente eléctrico				
2. Especialista En Gerencia De Proyectos				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: 1.Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 48 de trabajos. 2.Se mantiene seguimiento a la matriz de riesgo contractual, específicamente a los riesgos No 28 y 29, respecto al riesgo No 30 correspondiente a hallazgos arqueológicos el cual se materializo en el hito 1 se le da el tratamiento definido en la matriz de riesgos. 3.Se revisa y aporta al comunicado sobre la inversión de los recursos del anticipo en lo correspondiente a la ubicación de las 20 volquetas de la orden de operación No 14 que aun no hacen presencia en la obra 4.Se realiza revisión y concepto de los indicadores de gestión de gerencia para el acta de obra con corte al 19/12/2024				
3. Especialista Pavimentos				
Durante la semana N.º 48 se desarrollaron las siguientes actividades: Viernes, 13/12/2024: * Se llevó a cabo la elaboración del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-751-2024 del 13 de diciembre de 2024, cuyo asunto es: "DEFINICIÓN DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA LOS EMPALMES DE LA CALLE DE RODAJE CON PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE". En esta comunicación, la Interventoría, respecto a los detalles de las juntas y las transiciones, solicita al contratista atender dentro de los términos contractuales, las observaciones indicadas mediante la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-377-2024 del 7 de noviembre de 2024 para proceder con la respectiva revisión.. Del Sábado, 14/12/24 al Lunes, 15/12/2024: * Se llevó a cabo la elaboración del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-761-2024 del 16 de diciembre de 2024, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2024-ATSC-CENV-828 DEL 6 DE DICIEMBRE 2024, PRESENTACIÓN DE LABORATORIOS Y DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA PROVEEDOR COLBITUMEN CALLE RODAJE ALFA BITUMEN 82-22". En esta comunicación, la Interventoría realiza la revisión del diseño de la mezcla asfáltica, versus las especificaciones técnicas para la mezcla asfáltica tipo P-401, de acuerdo con la Circular de Asesoramiento AC 150/5370-10H del 21 de diciembre de 2018 de la FAA e informa al contratista de obra que conforme a lo indicado en la mencionada comunicación NO SE ACEPTA EL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA presentado mediante las comunicaciones 2024-ATSC-CENV-828 y 2024-ATSC-CENV-849. Del Martes, 17/12/2024 al Miércoles, 18/12/2024: * Se llevó a cabo la elaboración del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-776-2024 del 18 de diciembre de 2024, cuyo asunto es: "DETERIOROS SUPERFICIES PAVIMENTADAS CON MEZCLA ASFÁLTICA TIPO P-401". En esta comunicación, la Interventoría, se permite manifestar que en inspecciones visuales a las superficies pavimentadas con mezcla asfáltica tipo P-401 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre) se identificaron deficiencias constructivas, las cuales no garantizan una superficie libre de irregularidades que puede afectar la seguridad de las operaciones y/o causar daños y/o aumentar la fatiga estructural de las aeronaves. Teniendo en cuenta lo anterior, los tramos enunciados en la mencionada comunicación quedarán en observación por parte de la Interventoría y se realizará el respectivo seguimiento a la evolución de los deterioros presentados. Jueves, 19/12/2024: * Se realizó acompañamiento, desde la especialidad de pavimentos, a la vista técnica de campo realizada por la Entidad Contratante a la Pista, Calle de Rodaje Alpha y Plataforma de Viraje ubicada en la Cabecera 17 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre).				
4. Especialista Diseño Geometrico				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: * Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto. * Apoyo a la dirección de la interventoría en temas contractuales y de seguimiento de obra. * Apoyo técnico respecto a análisis de Precios No previstos y ejecución de obra. * Firma digital y físico de planos de diseño de geometría * Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.				
5. Especialista Costos y Presupuestos				
Durante la semana No 48 se realizó el seguimiento y control al acta parcial de obra N°5 y al acta parcial N°2 de interventoría.				
6. Especialista en Geotecnia				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: Seguimiento fotográfico de campo a la fecha sobre las actividades de extendido y colocación carpeta asfáltica y remoción parcial descapote perimetral en el sector ampliación de pista aérea.				
7. Especialista Hidraulico				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: Las actividades desarrolladas en la semana del 13 al 19 de diciembre, corresponden a la revisión y firma electronica de los planos de los diseños hidraulicos del aeropuerto de Tolu.				
8. Especialista aeroportuario				
Durante la semana No 48 se desarrollaron las siguientes actividades: Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante) CT 21 Informe mensual Agosto				

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Página: 1 de # 10

Se formulan observaciones al producto de señalización V6

Durante la semana No 48 se realizaron las siguientes actividades:

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

* A la semana No 48 se reporta un avance físico así:

MEDICION DE INDICADORES:

En este sentido se requiere que el contratista proponga e implemente un plan de contingencia en el cual se defina un plazo pertinente para la nivelación del atraso que se presenta en el proyecto.

El día 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El día 18 de diciembre se emite concepto por parte de Interventoria en repsuesta a la programacion presentada.

NOTAM:

AD CLSD

FORMATO	
---------	--



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
---------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------	-------------------

Página: 1 de # 10

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA	
-------------------------------	--

Personal de Interventoría	34
Personal del Contratista	98
Total Personal en Obra	132

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 01/MARZO/2020


Página: 1 de # 10

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERFIL	PROFESIONAL	ESTADO	RESPUESTA DEL COMUNICADO
Director de Interventoría	Wilson Giovanni Urrea Urrea	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Residente de interventoría	Claudia Lorena Losada Plazas	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en Vías y Pavimentos	Mario Alberto Hernández Valencia	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Ambiental	Isis Patricia Herrera Pérez	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Residente Ambiental	Danny Paola Losada Plazas	Aprobado	2024262020006831 (14/03/2024)
Especialista Diseño Geométrico	Edgar Rene Urrea Urrea	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en Gerencia de Proyectos	Luis Fernando Vargas Rodríguez	Aprobado	2024262020006831 (14/03/2024)
Especialista Hidráulico	Roberto Anderson Jaimes Silva	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Electromecánico o Eléctrico	Iván Jaramillo Jaramillo	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en Geotecnia	José Armando Ruiz Angarita	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Aeroportuario o Aeropistas	Javier Augusto Moscoso	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Ingeniero Apoyo	Erika Johanna Caro Rojas	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Ingeniero Apoyo	Andrés Mauricio Urrea Rivera	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Inspector SST	Yarelis campo Villero	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Cadenero 2 (1)	María del Carmen Quintero Pastrana	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Cadenero 1 (1)	José Aurelio Díaz Velásquez	Aprobado	202432185245113 (02/04/2024)
Cadenero 2	Juan Camilo Ospina Chávez	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Conductor	Alfredo Ramón Fernández Aleans	Aprobado	2024262020006830.
Auxiliar servicios generales de interventoría	Leonela Margarita Velásquez Cuadrado	No requiere aprobación	2024262020006830.
Profesional social	Amarylis Isabel Bojato Reales	Aprobado	2024262020006830.
Cadenero 2 (2)	Victor Salgado Morillo	Aprobado	2024262020006830.
Residente Ambiental	Hernán Guillermo Lamadrid Ariza	Aprobado	20242620200019900.
Inspector SST	Jairo Luis Naváez Hernández	Aprobado	20242620200019900.
Arqueólogo	Candelaria Vanessa Carriazo Lamadrid	Aprobado	20242620200019900.
Ingeniero Forestal	Iván Javier Valencia Tovar	Aprobado	20242620200019900.
Profesional social	Luisa Fernanda Barragan Vilora	Aprobado	20242620200024102.
Topógrafo 1	Diego Javier Vanegas Rivera	Aprobado	20242620200026332.
Topógrafo 2	Marco Antonio Córdoba Muñoz	Aprobado	20242620200024578.
Abogado	Paola Andrea Serna Zapata	Aprobado	20242620200024558.
Ingeniero residente	Willian Pérez Santana	Aprobado	20242620200048440.
Ingeniero de apoyo 3	Paula Viviana Afanador Ortiz	En revisión	EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024
Ingeniero de apoyo 4	Licena Patricia Paternina Muñoz	En revisión	EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024
Coordinador de interventoría	Angela Teresa García Quintana	Aprobado	20242620200051040.

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA POR CARGO

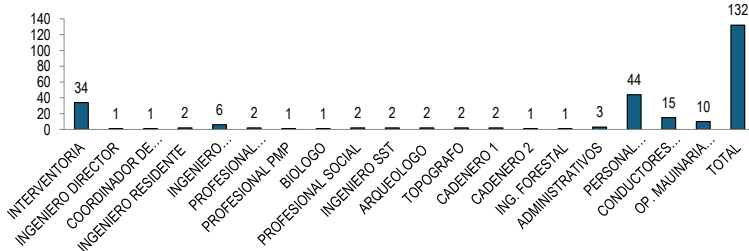

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA

