



RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IV).
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24
INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	6
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FRENTE DE OBRA 7 DE ABRIL

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
1/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra s3 y 4s: Cajeo de via Abscisa k0+055 al K0+070</p> <p>Frente calle 50E entre Cra s3 y 4s: Reparación en muro esquina intersección con Cra 3A # 35D-40</p> <p>Nota: Se presentò lluvias fuertes 12:30 p.m a 3:30 p.m</p>	 <p>1 oct 2024 4:04:10 p. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>
2/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra s3 y 4s: Cajeo de via Abscisa k0+070 al K0+075</p> <p>Frente calle 50E entre Cra s3 y 4s: Toma de detalles presentados por la interventoria</p> <p>NOTA: Se presento lluvias fuertes 9:40 a.m a 12:40 p.m</p>	 <p>2 oct 2024 9:58:43 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>  <p>2 oct 2024 9:58:50 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>
3/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra s3 y 4s: Arreglo daño tubería Asbectico cemento 6" acueducto intersección con la cra 3s</p> <p>Frente calle 50E entre Cra s3 y 4s: Toma de detalles presentados por la interventoria</p> <p>NOTA: Se presento lluvias fuertes 1:20 p.m a 3:40 p.m</p>	 <p>3 oct 2024 1:54:22 m</p>  <p>3 oct 2024 9:18:13 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>  <p>3 oct 2024 1:24:39 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
5/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Figuración de Acero 1/2" base Manhol Intercepción con cra 3s, instalación de rieles Abscisa K0+08 al K0+040	
7/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformación base Suelo Cemento K0+08 al K0+040 Frente calle 50B entre Cra 4 y 5s: Instalación tubería Alcantarillado 8" (6 m) en la intersección Cra 4s Nota: Se presentó lluvias fuertes hora 12:30 p.m a 2:20 p.m	
8/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformación base Suelo Cemento K0+010 al K0+038 Frente calle 50B entre Cra 2 y 3s: Empalme tubería Alcantarillado 8" Manhol #13 al Manhol #14	
9/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Fundida losa Concreto MR39 (17.5 m3) Abscisa K0+010 al K0+038) Frente calle 50E entre Cra 3 y 4s: Reparación y Adecuación de andenes Aptos Cra 4 # 50D-40	

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
10/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Retiro de rieles y limpieza.	 <p>10/10/2024 7:40:20 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>
11/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformación base Suelo Cemento, demolición andén existente.	 <p>11 oct 2024 4:12:23 p. m.</p>
12/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Concreto MR-39 para completar placa de pavimento, lluvias a las 5:00 PM	 <p>12/10/2024 11:44:22 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>
15/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformación de andes e instalación de tuberías de 8" en los pozos frente de oficina entre cra 2a y 3 sur por la calle 50b.	 <p>15/10/2024 11:00:39 p. m. 55c 37 Carrera 2a sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
16/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion de andes, lluvias de 12:00 PM a 2:30 PM.	 <p>16/10/2024 12:08:52 p. m. 1 Carrera 3a Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
17/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion de andes, lluvias desde 2:00 PM a 3:45 PM.	 <p>17 oct 2024 9:05:40 a. m. 49b-46 Carrera 1d Las Americas Barranquilla Atlántico</p>
18/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Continua cajeo en calle 50b , excavacion para 2 registros en calle 50b entre cr 2a y 3 sur en el costado derecho.	 <p>18 oct 2024 10:58:38 a. m. 8964 Carrera 3a Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
19/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Aplicación de suelo cemento y conformacion, construccion de registros domiciliarios 2 UND en calle 50b entre cra 2a y 3 sur.	 <p>19 oct 2024 8:47:11 a. m. 55C-37 Carrera 2a Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>

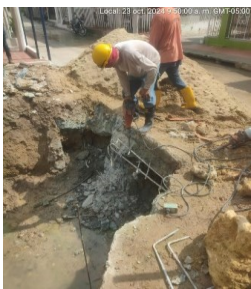
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
21/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion de suelo cemento, conformacion de andes y arreglo de contadores, excavacion para registros 3 UND en calle 50b entre cra 2a y 3 sur.</p>	 <p>21 oct 2024 2:18:38 p.m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
22/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Adecuacion de andenes y fundida de estos en ambos lados, se presentaro lluvias a la hora de la fundida 11:45 AM.</p>	 <p>22 oct 2024 11:04:32 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p>
23/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Suelo cemento en calle 50b entre cra 3 y 4 sur, construccion de registros (2 UND)entre cra 2a y 3 sur carril IZQ.</p>	 <p>23/10/2024 2:36:23 p.m. #37-D-51 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
24/10/2024	<p>Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion banca de compactacion y alistado de niveles para fundir en calle 50b entre cra 3 y 4 sur, cajeo en calle 50b entre cra 4 y 4a sur del borde del arroyo hacia cra 4sur aparece nivel freatico alto, excavacion para registros calle 50b entre cra 2a y 3 sur.</p>	 <p>24 oct 2024 8:59:51 a. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>


DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
25/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Replanteo en la calle 50b entre cra 3 y 4 sur base suelo cemento, cajeo en calle 50b entre cra 4 y 4a.	 <p>25/10/2024 12:20:26 p. m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
26/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion suelo cemento en calle 50b entre cra 3 y 4 sur, conformacion y enrocado para filtro contiguo al arroyo, fundicion de losas de concreto en calle 50b entre cra 3 y 4 sur.	 <p>26/10/2024 12:22:28 p. m. 8970 51 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
28/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Absisado de niveles en calle 50b entre cra 3 y 4 sur, cajeo en calle 50b entre cra 4 y 5 sur.	 <p>26 oct 2024 10:16:08 p. m. 4596 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
29/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Replanteo y conformacion de andenes alistado de niveles para alinear bordillos en calle 50b entre cra 3 y 4, instalacion de tubería de 8" en calle 50b entre cra 2a y 2sur.	 <p>29/10/2024 2:26:45 p. m. 506-41 Carrera 1 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
30/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Fundida de bordillos en calle 50b entre cra 3 y 4sur, andenes en la esquina de calle 50e con cra 3a y tramo de bordillos en los 6 apartamentos en la esquina de la calle 50e con cra 4sur.	 <p>30 oct 2024 1:55:47 p.m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlantico</p>
31/10/2024	Frente calle 50B entre Cra 3 y 4s: Conformacion de andenes en calle 50b entre cra 3 y 4 sur, cajeo en calle 50b entre cra 4 y 4a sur.	 <p>31 oct 2024 4:39 p. m. GMT-05:00 Latitude: 4° 32' 52.57" N Longitude: 74° 58' 41.670" W</p>
FRENTE DE OBRA PARQUE EL MILAGRO		
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
8/10/2024	Parque El Milagro: Se realiza levantamiento topografico, se inicia excavación mecánica y retiro de escombros area donde se construira el Box Coulvert.	 <p>8 oct 2024 5:57:28 p. m. 38-07 Carrera 1th Cieneros Barranquilla Sociedad Atlantico</p>
9/10/2024	Parque El Milagro: Se continúa excavación mecánica y retiro de escombros.	 <p>9 oct 2024 11:04:00 p.m. 38-07 Carrera 1th Cieneros Barranquilla Sociedad Atlantico</p>

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	
10/10/2024	Parque El Milagro: Se continúa excavación mecánica y retiro de escombros.		
11/10/2024	Parque El Milagro: Se continúa bombeo de agua, colocación piedra e inicia armado de acero de refuerzo		
15/10/2024	Construcción Box Culvert: Bombeo mecánico de agua, demolición de muro existente.		
16/10/2024	Construcción Box Culvert: Colocación pedraplen, fabricación panelas de apoyo, solado.		

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	
17/10/2024	Construcción Box Culvert: Se termina solado, topografía nivela, coloca putnos y realiza trazados.		
18/10/2024	Construcción Box Culvert: Se inicia instalación de acero de refuerzo de fondo y muros.		
19/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continúa con el armado del acero de refuerzo.		
21/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continúa con la demolición de los muros existentes.		

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
22/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continúa con la demolición de los muros existentes.	 
23/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continua con la demolición de los muros existentes. En reunión con los entes de control e interventoría más la comunidad se llevo a un cambio en la seccion del canal dejando como resultado un ancho libre de 1.7 mts.	 
24/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continua con la demolición de los muros existentes. Se realiza desarme de acero figurado para ampliación de sección de acuerdo a lo estipulado.	 
25/10/2024	Construcción Box Culvert: Se realiza armado y figuración de acero de refuerzo.	 

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
26/10/2024	Construcción Box Culvert: Se realiza armado y figuración de acero de refuerzo.	  
28/10/2024	Construcción Box Culvert: Se realiza armado y figuración de acero de refuerzo. Se realiza limpieza de fondo y encofre de losa de fondo previo a revisión de interventoría.	   
29/10/2024	Construcción Box Culvert: Se realiza fundida de losa de fondo con previa revisión de la interventoría.	  
30/10/2024	Construcción Box Culvert: Se inicia encofrado de muros	 

DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
31/10/2024	Construcción Box Culvert: Se continúa con el encofrado de muros.	
