
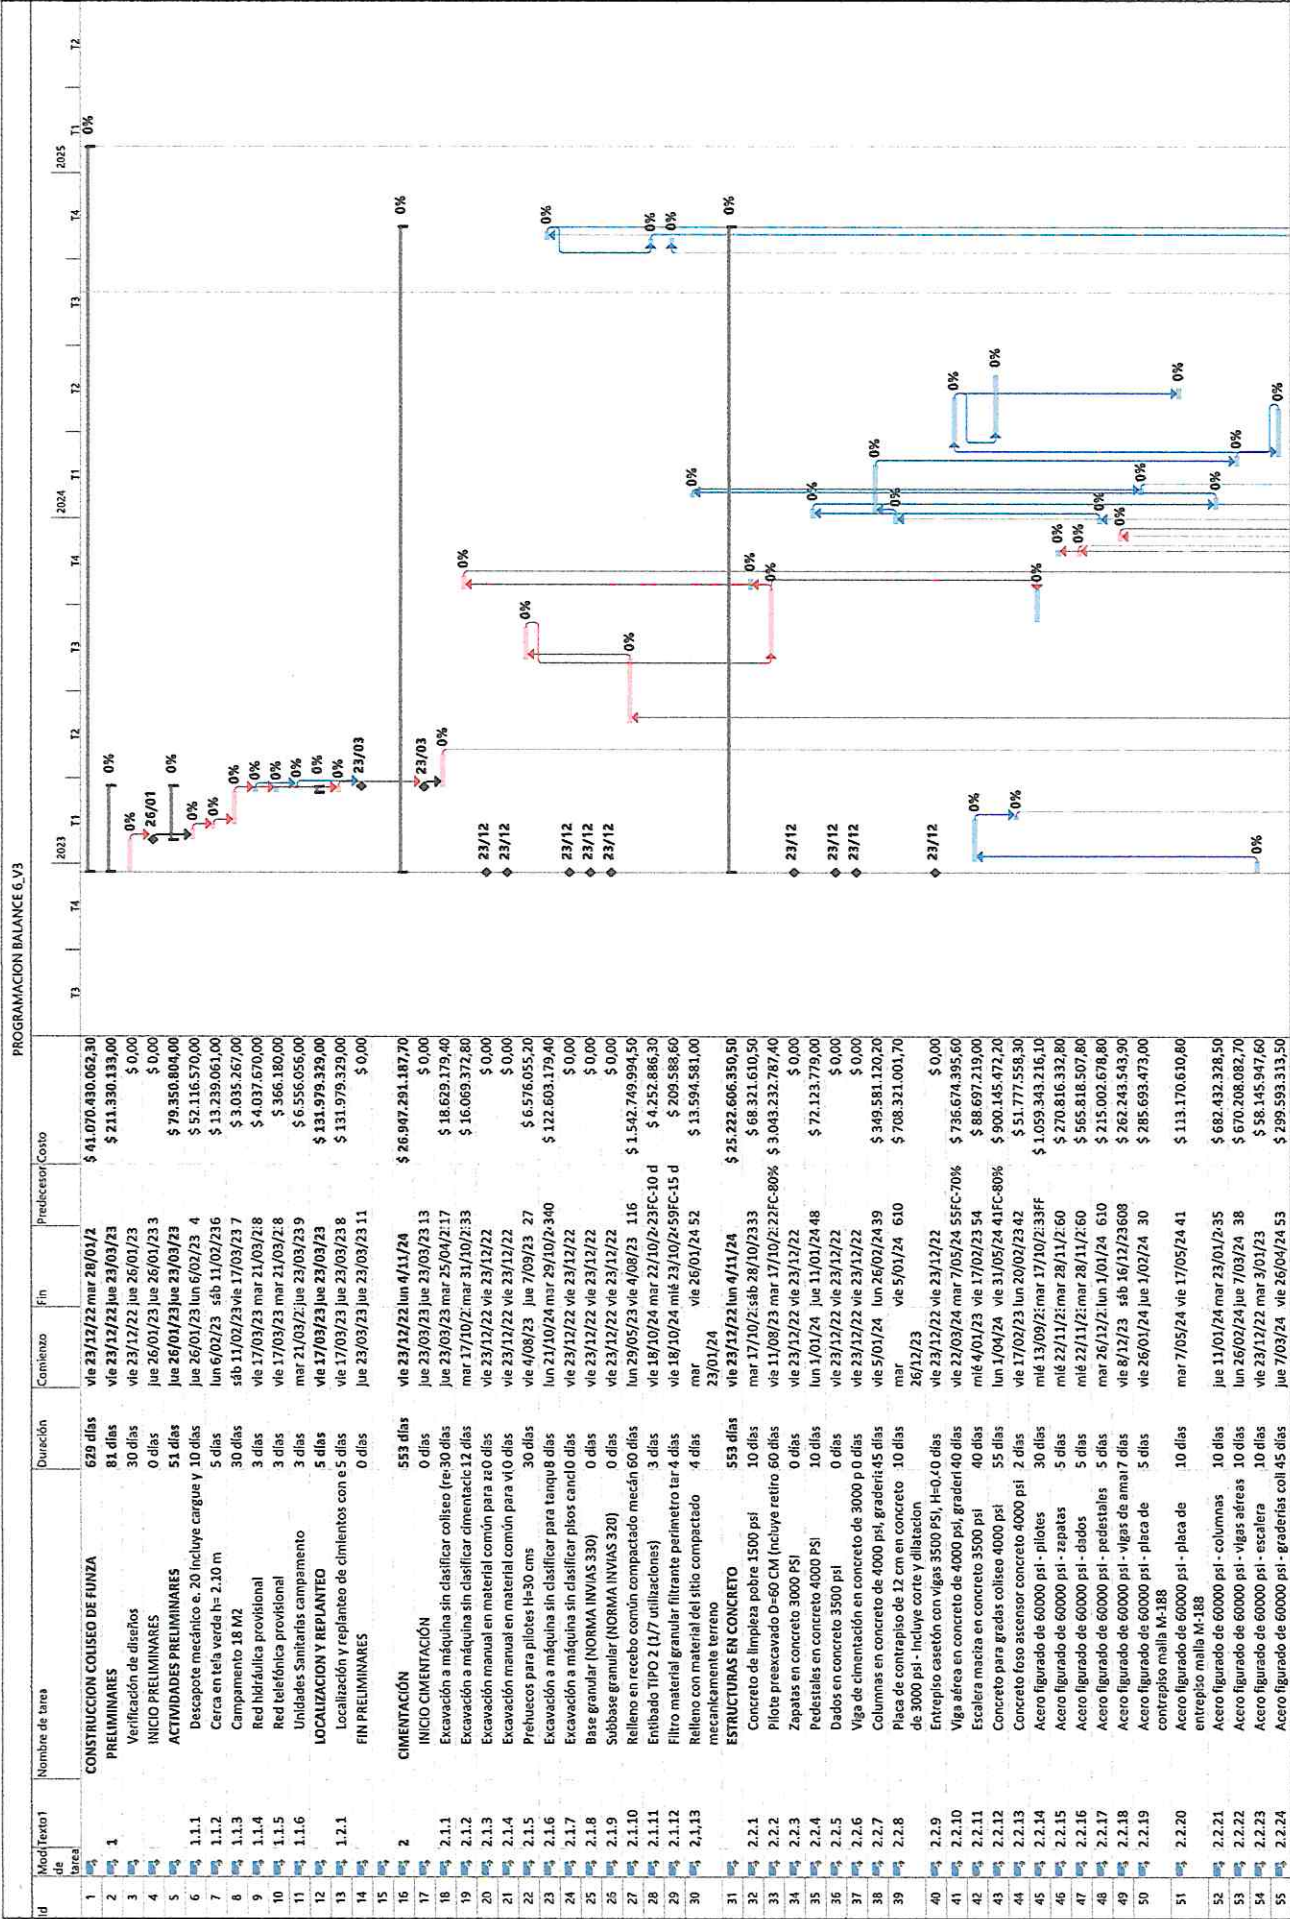


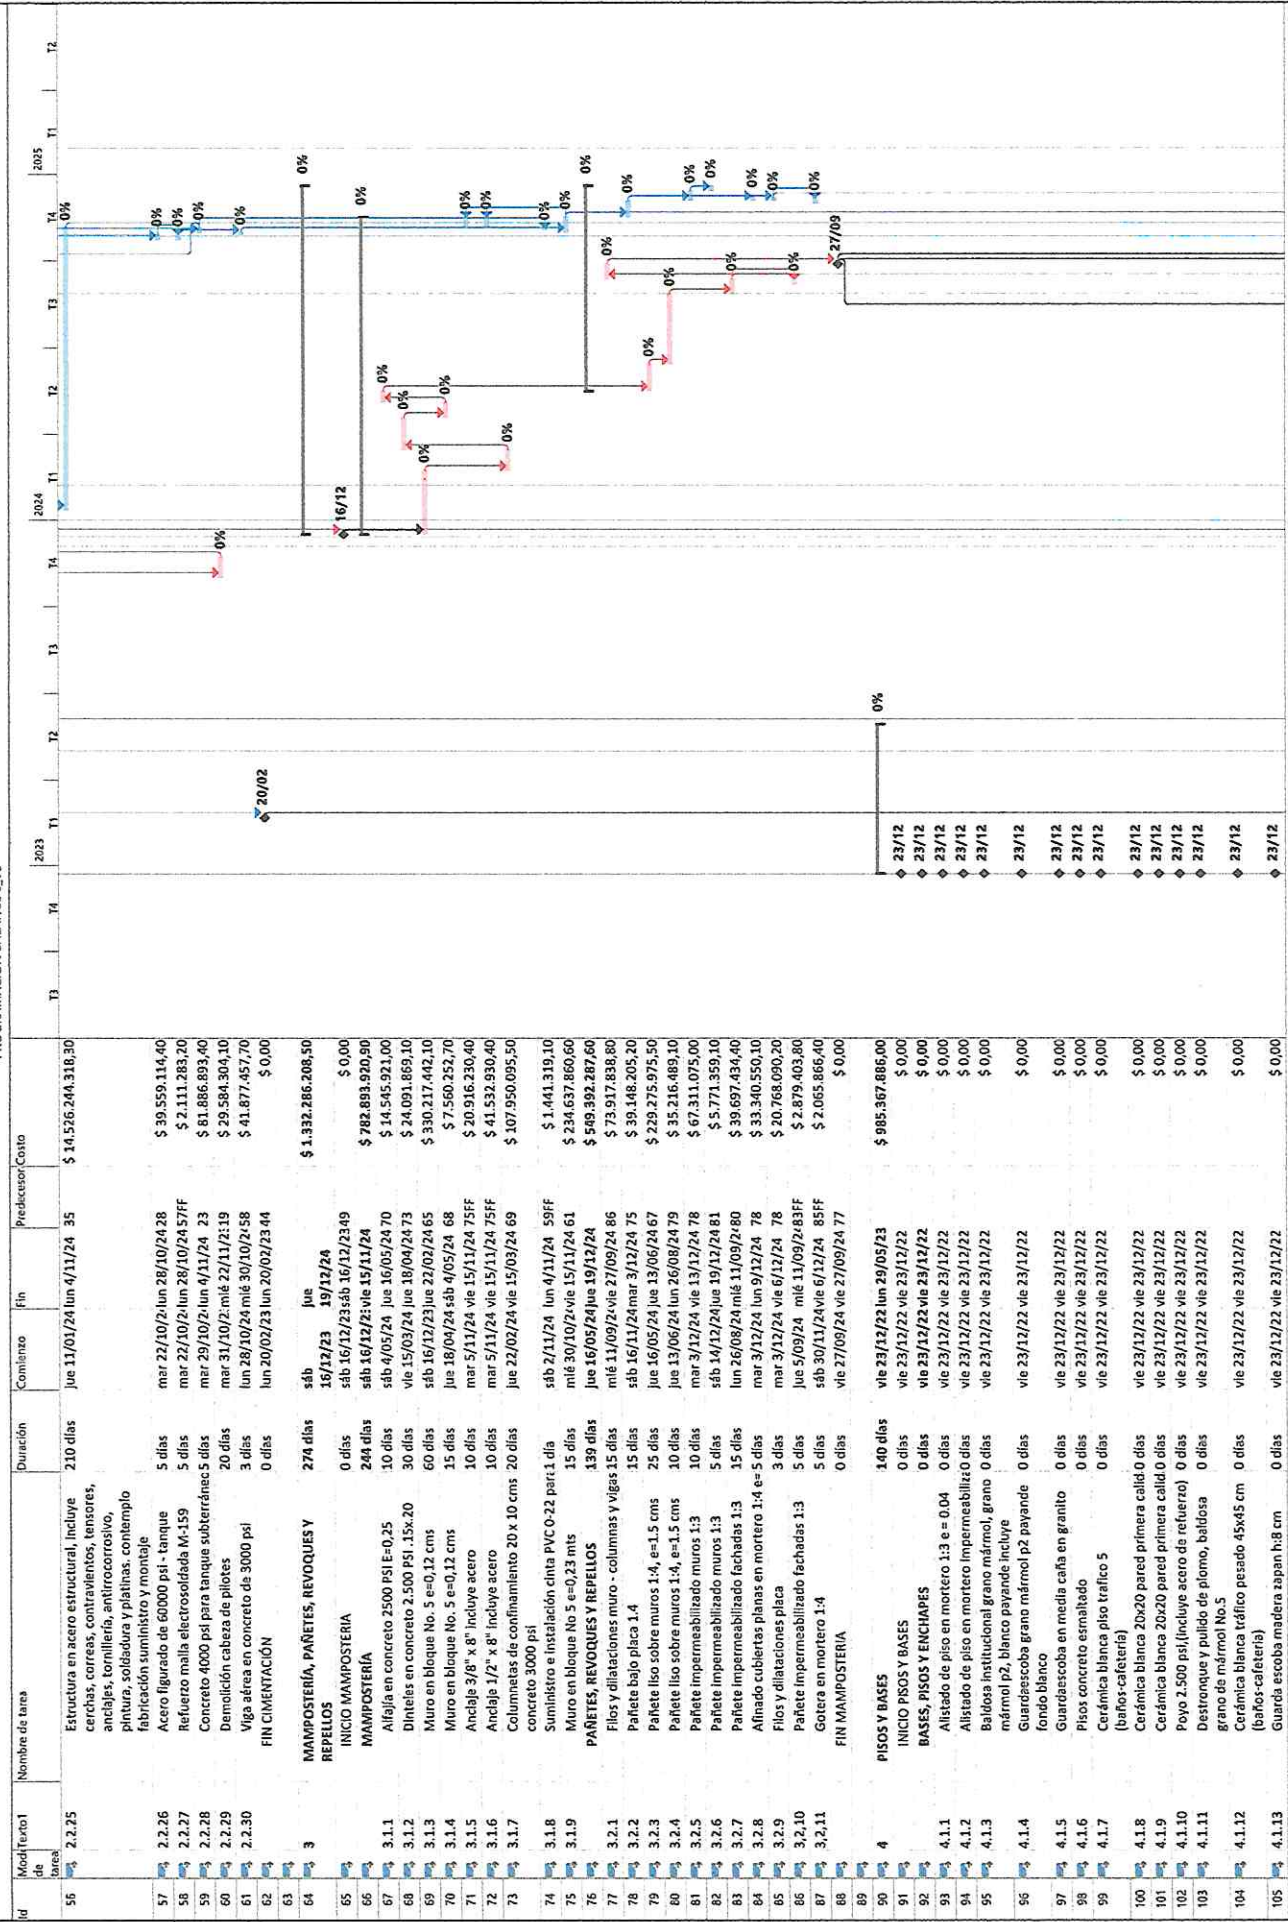

Tareas críticas		División		solo fin		Hito de línea base		Resumen manual		Tarea inactiva	
División crítica		Progreso de tarea		solo duración		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Línea base		Progreso del resumen		Tareas externas		Resumen inactivo	
Tarea		solo el comienzo		División de la línea base		Resumen		Hito externo		Fecha límite	

d	Mod/Texto1 de tarea	Número de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predector	Costo
106	4.1.14	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida), color crema	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
107	4.1.15	Piso laminado 12 mm tráfico pesado con Jumbolo	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
108	4.1.16	Sardinel fundido in-situ H=0.20 m, E=0.2 m, O días	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
109	4.1.17	Guardaesoba en granadillo 1x0.10 m con concreto de 3000 PSI	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
110	4.1.18	Cenefa cerámica 20.5*30.5 cm	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
111	4.1.19	Dilatación en bronce	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
112	4.1.20	Boca puerta en bronce	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
113	4.1.21	ESTRUCTURA ESCENARIO DEPORTIVO	140 días	Vie 23/12/22	lun 29/05/23		\$ 985.367.886,00
114	4.2.1	Subbase granular (norma invias 320)	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
115	4.2.2	Relleno base granular (norma invias 330)	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
116	4.2.3	Relleno tipo 6 "rajon-piedra"	30 días	mié 26/04/23	lun 29/05/23		\$ 985.367.886,00
117	4.2.4	Suministro e instalación geotextil NT 2000 (O días)	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
118	4.2.5	Concreto para pavimento rígido mr-41, incl 0 días	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
119	4.2.6	Recubrimiento cancha preflexort polideport 0 días	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
120	4.2.7	FIN PISOS Y BASES	0 días	lun 29/05/23	lun 29/05/23		\$ 0,00
121	4.2.8	ESTRUCTURA METÁLICA	121 días	mié 11/09/24	vie 24/01/25		\$ 400.825.135,00
122	4.2.9	INICIO PINTURA	0 días	Vie 27/09/24	Vie 27/09/24		\$ 0,00
123	4.2.10	PINTURA	121 días	mié 11/09/24	vie 24/01/25		\$ 400.825.135,00
124	4.2.11	Impermeabilización fachada en sílica transpa 10 días	10 días	mar 15/10/24	vie 25/10/24		\$ 15.194.985,00
125	4.2.12	Pintura epoxica alta resistencia con catalita 10 días	10 días	lun 16/12/24	jue 26/12/24		\$ 28.220.291,00
126	4.2.13	Pintura fachada tipo koraza	16 días	jue 26/09/24	mar 15/10/24		\$ 27.315.116,00
127	4.2.14	Pintura vinilo bajo placa	20 días	vie 6/12/24	sáb 28/12/24		\$ 43.183.348,00
128	4.2.15	Líneas de demarcación canchas	6 días	sáb 21/09/24	vie 27/09/24		\$ 904.207,00
129	4.2.16	Pintura acrílica texturizada para pisos	10 días	mar 17/09/24	vie 27/09/24		\$ 67.310.615,00
130	4.2.17	Estuco y vinilo 3 manos	50 días	Vie 27/09/24	vie 22/11/24		\$ 109.405.079,00
131	4.2.18	Estuco y vinilo 3 manos	30 días	Vie 22/11/24	jue 26/12/24		\$ 28.927.778,00
132	4.2.19	Esmalte sobre lamina lisa	3 días	mar 21/01/25	vie 24/01/25		\$ 6.526.874,00
133	4.2.20	Esmalte sobre lamina lisa	5 días	lun 20/01/25	vie 24/01/25		\$ 413.009,00
134	4.2.21	Pintura epoxica alta resistencia con catalita 5 días	5 días	vie 20/12/24	jue 26/12/24		\$ 633.918,00
135	4.2.22	Pintura epoxica alta resistencia con catalita 20 días	20 días	mié 4/12/24	jue 26/12/24		\$ 13.641.424,00
136	4.2.23	Pintura fachada tipo koraza	30 días	Vie 27/09/24	jue 31/10/24		\$ 12.476.231,00
137	4.2.24	Vinilo sobre pañete 2 manos	20 días	mié 11/09/24	jue 3/10/24		\$ 44.950.676,00
138	4.2.25	Vinilo sobre pañete 2 manos (lineal)	10 días	jue 3/10/24	mar 15/10/24		\$ 1.721.584,00
139	4.2.26	FIN PINTURA	0 días	jue 26/12/24	jue 26/12/24		\$ 0,00
140	4.2.27	CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS	628 días	Vie 23/12/22	lun 27/01/25		\$ 4.656.056.574,00
141	4.2.28	INICIO CUBIERTAS Y CIELOS RASOS	0 días	lun 4/11/24	lun 4/11/24		\$ 0,00
142	4.2.29	CUBIERTAS Y CIELOS RASOS	628 días	Vie 23/12/22	mar 21/01/25		\$ 2.486.089.227,00
143	4.2.30	Tapa tipo sándwich 525-cal 26 poliuretano	65 días	mar 1/10/24	vie 13/12/24		\$ 1.728.091.369,00
144	4.2.31	Inyectado 30mm	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
145	4.2.32	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall rh de 1/2". Incluye perfilera de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y una mano de Cortasol tipo celoscreen 110-m1, paso 200, 0 días	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
146	4.2.33	Suministro e instalación de dilatación en "z" para cielorraso (incluye elementos de fijación y masilla de nivelación)	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
147	4.2.34	Mediacapa de mortero impermeabilizado	0 días	Vie 23/12/22	Vie 23/12/22		\$ 0,00
148	4.2.35	muros 1.4 cubierta	35 días	Vie 13/12/24	mar 21/01/25		\$ 757.997.858,00
149	4.2.36	Policarbonato alveolar, incluye estructura	678 días	Vie 23/12/22	lun 27/01/25		\$ 2.169.967.347,00
150	4.2.37	FACHADAS	678 días	Vie 23/12/22	lun 27/01/25		\$ 2.169.967.347,00
151	4.2.38						

[illegible]

Id	Modi de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedor Costo	202320242025											
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
219	7.1.56	Ventana rejilla de ventilación TIPO 3 Shut de basuras (V-06) - 3.00 m x 0.50 m.- SEGUN DETALLE	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
220	7.1.57	Ventana abatible con marco en aluminio TIPO 4 taller de carpintería metálica (V-08) -1.20 m x 1.00 m.- SEGUN DETALLE	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
221		FIN CARPINTERIA METALICA	0 días	mar 21/01/23	mar 21/01/23	\$ 0.00												
222		VENTILACION MECANICA	626 días	vie 23/12/22	vie 24/01/25	\$ 605.890.447,00												
223	8	INICIO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0 días	vie 27/09/24	vie 27/09/24	\$ 0.00												
224		RED CONTRA INCENDIOS	602 días	vie 23/12/22	sáb 28/12/24	\$ 17.645.801,00												
225	8.1.1	Tubería 2" acero negro ranurada SCH40 (ln) 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
226	8.1.2	Tubería 2 1/2" acero negro ranurada SCH40 (ln) 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
227	8.1.3	Tubería 4" acero negro ranurada SCH40 (ln) 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
228	8.1.4	Tubería 6" acero negro ranurada SCH40 (ln) 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
229	8.1.5	Punto hidráulico rociador automático	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
230	8.1.6	Rodador automático 1/2" k=5.6 pendiente 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
231	8.1.7	Pintura para tubería red de incendios con d 16 días	16 días	mar 5/11/24	vie 22/11/24	\$ 3.162.592,00												
232	8.1.8	Pintura para tubería red de incendios con d 16 días	16 días	mar 5/11/24	vie 22/11/24	\$ 5.479.081,00												
233	8.1.9	Gabinete tipo III	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
234	8.1.10	Sirena electrónica, de color rojo, con señal 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
235	8.1.11	Pulsador de alarma convencional de rearm 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
236	8.1.12	Medidor de flujo 6"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
237	8.1.13	Registro de 6"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
238	8.1.14	Cheque anti golpe de ariete - hierro dúctil 4" 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
239	8.1.15	Tee 4"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
240	8.1.16	Tee 6"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
241	8.1.17	Reducción 6-4"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
242	8.1.18	Reducción 6-2 1/2"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
243	8.1.19	Reducción 2 1/2"-1"	10 días	mar 5/11/24	vie 15/11/24	\$ 1.351.529,00												
244	8.1.20	Derivación strap 2-1/2"	8 días	sáb 16/11/24	lun 25/11/24	\$ 4.617.184,00												
245	8.1.21	Derivación strap 2 1/2-1/2"	4 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	\$ 663.021,00												
246	8.1.22	Desinfección	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	\$ 1.345.617,00												
247	8.1.23	Extintor de polvo químico ABC, capacidad 12 días	12 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	\$ 1.016.777,00												
248	8.1.24	Suministro de un equipo contra incendio de 0 días	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
249	8.2.1	RED SUMINISTRO	564 días	vie 23/12/22	vie 15/11/24	\$ 92.989.979,00												
250	8.2.2	Excavación manual en material común h=0, 6 días	6 días	vie 27/09/24	vie 4/10/24	\$ 10.243.455,00												
251	8.2.3	Relleno con material del sitio compactado r 5 días	5 días	lun 28/10/24	vie 1/11/24	\$ 2.936.934,00												
252	8.2.4	Relleno en rebozo común compactado mec 5 días	5 días	mar 22/10/24	lun 28/10/24	\$ 6.434.588,00												
253	8.2.5	Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (incluye 10 días	10 días	vie 27/09/24	mié 9/10/24	\$ 3.232.535,00												
254	8.2.6	Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (incluye acc 6 días	6 días	mié 9/10/24	mié 16/10/24	\$ 1.583.345,00												
255	8.2.7	Red suministro PVC 1" RDE 21 (incluye acc 10 días	10 días	mié 16/10/24	lun 28/10/24	\$ 3.285.563,00												
256	8.2.8	Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (incluye 10 días	10 días	lun 28/10/24	jue 7/11/24	\$ 3.749.447,00												
257	8.2.9	Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (incluye 13 días	13 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	\$ 808.098,00												
258	8.2.10	Red suministro PVC 2" RDE 21 (incluye acc 6 días	6 días	vie 4/10/24	vie 11/10/24	\$ 5.833.352,00												
259	8.2.11	Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (incluye 13 días	13 días	vie 11/10/24	mar 15/10/24	\$ 2.522.992,00												
260	8.2.12	Red suministro PVC 3" RDE 21 (incluye acc 3 días	3 días	mar 15/10/24	vie 18/10/24	\$ 1.143.090,00												
261	8.2.13	Red suministro PVC 4" RDE 21 (incluye acc 3 días	3 días	vie 18/10/24	mar 22/10/24	\$ 2.041.276,00												
262	8.2.14	Registro 4"	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	\$ 0.00												
263	8.2.15	Punto hidráulico pvc- 1/2" paral 15 días	15 días	mié 16/10/24	vie 1/11/24	\$ 6.327.027,00												
264	8.2.16	Punto agua caliente cpvc 5 días	5 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24	\$ 2.079.834,00												
265	8.2.17	Ducha electrónica 110v-127v 5 días	5 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24	\$ 3.922.963,00												
266	8.2.18	Desinfección 3 días	3 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24	\$ 2.691.234,00												
267	8.2.19	Llave de corte especial 4" 3 días	3 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 3.569.095,00												
268	8.2.20	Válvula cheque 4" 3 días	3 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	\$ 2.184.168,00												
269	8.2.21	Tee 1" 3 días	3 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 318.635,00												
270	8.2.22	Tee 1 1/4" 5 días	5 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24	\$ 659.911,00												
271	8.2.23	Tee 1 1/2" 5 días	5 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 805.241,00												
272	8.2.24	Tee 2" 5 días	5 días	sáb 5/10/24	vie 11/10/24	\$ 550.664,00												
273	8.2.25	Tee 2 1/2" 5 días	5 días	mié 9/10/24	mar 15/10/24	\$ 673.894,00												

d	Modi	Text01	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predector	Costo
331	8.3.24		Reducción 4" - 2"	3 días	vie 27/12/24	mar 31/12/24	313FF	\$ 1.761.005,00
332	8.3.25		Reducción 4" - 3"	3 días	vie 27/12/24	mar 31/12/24	331FF	\$ 563.355,00
333	8.3.26		Reducción 3" - 2"	3 días	lun 25/11/24	mié 27/11/24	312FF	\$ 1.273.111,00
334	8.3.27		Válvula anti roedores 4"	3 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	324	\$ 7.467.586,00
335	8.3.28		Marco tapa caja de inspección	3 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	314	\$ 4.685.554,00
336	8.3.29		Caja de inspección tapón de limpieza	10 días	lun 11/11/24	jue 21/11/24	335	\$ 5.955.733,00
337	8.3.30		Caja de inspección de 70 x 70	3 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	314	\$ 8.808.242,00
338	8.3.31		Suministro instalación canaletas sección 0: 3 días	3 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	335FF	\$ 393.492,00
339			RED AGUAS LLUVIAS	626 días	vie 23/12/22	vía 24/01/25		\$ 203.539.692,00
340	8.4.1		Excavación manual en material común h=0, 20 días	20 días	vie 27/09/24	lun 21/10/24	224	\$ 25.875.980,00
341	8.4.2		Relleno con material del sitio compactado r 12 días	12 días	sáb 9/11/24	vie 22/11/24	345	\$ 8.375.367,00
342	8.4.3		Relleno en rebozo común compactado mac 10 días	10 días	vie 22/11/24	mié 4/12/24	341	\$ 11.293.247,00
343	8.4.4		Bajante pvc aguas lluvias d=6"	5 días	lun 20/01/25	vie 24/01/25	154FC-5 d	\$ 14.227.490,00
344	8.4.5		Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye union 12 días	12 días	lun 21/10/24	sáb 27/11/24	340	\$ 59.269.824,00
345	8.4.6		Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye union 6 días	6 días	sáb 27/11/24	sáb 9/11/24	344	\$ 18.385.362,00
346	8.4.7		Caja de inspección 70 x 70	6 días	lun 2/09/24	sáb 7/09/24	355	\$ 7.771.979,00
347	8.4.8		Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, e 8 días	8 días	sáb 7/09/24	mar 17/09/24	346	\$ 5.971.181,00
348	8.4.9		Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (con 8 días	8 días	mar 17/09/24	mié 25/09/24	347	\$ 7.801.544,00
349	8.4.10		Cubierta pozo d=1.7m, e=0.20m concreto 34 días	34 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	348	\$ 7.210.765,00
350	8.4.11		Rejilla granada 6"	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	154FC-5 d	\$ 5.111.930,00
351	8.4.12		Canal en lámina galvanizada cal 18, ds=1200 días	2 días	vie 23/12/22	vía 23/12/22		\$ 0,00
352	8.4.13		Marco tapa caja de inspección	2 días	sáb 7/09/24	mar 10/09/24	346	\$ 4.409.933,00
353	8.4.14		Wash primer sobre aluminio	6 días	sáb 9/11/24	vía 15/11/24	345	\$ 13.497.012,00
354	8.4.15		Bajante aguas lluvias PVC 4"	2 días	mié 28/08/24	jue 29/08/24	357	\$ 2.988.573,00
355	8.4.16		Tubería PVC alcantarillado 4"	2 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24	354	\$ 10.269.451,00
356	8.4.17		Caja de inspección 60 x 60	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	352	\$ 801.486,00
357	8.4.18		Canal en lámina galvanizada cal 22, ds=90 2 días	2 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24	88FC-30 d	\$ 1.148.818,00
358	8.4.19		Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula	2 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24	354	\$ 529.815,00
359	8.4.20		Yee 6"	2 días	jue 31/10/24	sáb 7/11/24	344FF	\$ 707.512,00
360	8.4.21		Reducción 6-4"	2 días	jue 31/10/24	sáb 7/11/24	359FF	\$ 341.569,00
361	8.4.22		Wash primer sobre aluminio	2 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	353	\$ 2.150.854,00
362			FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0 días	vie 29/11/24	vía 29/11/24	299/330/3	\$ 0,00
363			EQUIPOS ESPECIALES	629 días	vie 23/12/22	mar 28/01/25		\$ 2.578.296.340,00
364	9		INICIO EQUIPOS ESPECIALES	0 días	jue 29/08/24	jue 29/08/24	354	\$ 0,00
365			RED ELECTRICA PROVISIONAL	13 días	jue 29/08/24	vía 13/09/24		\$ 89.831.187,00
366			Estructura de derivación en poste existente 2 días	2 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24	365	\$ 2.599.007,00
367	9.1.1		Transformador de 112,5 KVA para provisor 1 día	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24	375	\$ 12.637.083,00
368	9.1.2		Estructura de protecciones para transform 1 día	1 día	mar 3/09/24	mié 4/09/24	368	\$ 3.945.080,00
369	9.1.3		Puesta a tierra para transformador en posti 1 día	1 día	mié 4/09/24	jue 5/09/24	369	\$ 1.310.139,00
370	9.1.4		Malla de puesta a tierra para transformado 1 día	1 día	jue 5/09/24	vie 6/09/24	370	\$ 1.316.095,00
371	9.1.5		Suministro, plomada e Inceza de poste de c 1 día	1 día	vie 6/09/24	sáb 7/09/24	371	\$ 3.095.932,00
372	9.1.6		Armario con grupo de medida para baja ten 1 día	1 día	sáb 7/09/24	lun 9/09/24	372	\$ 10.197.093,00
373	9.1.7		Suministro y montaje de red para alumbrad1 día	1 día	lun 9/09/24	mar 10/09/24	373	\$ 534.183,00
374	9.1.8		Estructura de paso en poste	1 día	mar 10/09/24	mié 11/09/24	374	\$ 1.564.258,00
375	9.1.9		Tableros móviles certificados, con extension 1 día	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24	375	\$ 29.901.538,00
376	9.1.10		Tablero general de distribución, para red pr 1 día	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24	375	\$ 2.088.294,00
377	9.1.11		Empalmes pre moldeados para exterior, jue 1 día	1 día	mar 3/09/24	jue 5/09/24	378	\$ 2.417.116,00
378	9.1.12		Red Eléctrica provisional L:50m	3 días	mar 3/09/24	jue 5/09/24	378	\$ 7.858.869,00
379	9.1.13		Suministro e instalación de reflectores Prov 1 día	1 día	mar 3/09/24	mié 4/09/24	377	\$ 2.289.768,00
380	9.1.14		Suministro y montaje de red para alumbrad3 días	3 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24	375	\$ 890.305,00
381	9.1.15		Suministro e instalación de tablero trifásico 1 día	1 día	mié 11/09/24	jue 12/09/24	376	\$ 1.653.406,00
382	9.1.16		Suministro e instalación de tablero monofá: 1 día	1 día	mié 11/09/24	jue 12/09/24	376	\$ 887.866,00
383	9.1.17		UPS de 3 KVA	1 día	mar 3/09/24	mié 4/09/24	377	\$ 4.097.868,00
384	9.1.18		Alimentador en 3/8 + 1/8EN AVG de Cu lib 1 día	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24	378	\$ 547.287,00
385	9.1.19		TABLEROS , ACOMETIDAS PRINCIPALES Y CANALIZACIONES	628 días	vie 23/12/22	27/01/25		\$ 862.977.057,00
386			Suministro e instalación de tablero trifásico 3 días	3 días	mar 5/11/24	vía 8/11/24	464	\$ 5.298.322,00
387	9.2.1		Suministro e instalación de tablero trifásico 3 días	3 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	387	\$ 2.817.846,00
388	9.2.2		Suministro e instalación de tablero trifásico 3 días	3 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	387	\$ 2.817.846,00

Tareas críticas	División		solo fin	Hitos de línea base	Resumen manual	Tarea lucra
División crítica		Progreso de tarea	solo duración	Hitos	Resumen del proyecto	Hitos inactivo
Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea		solo el comienzo		Resumen	Hitos externos	Fecha límite

Página 8

d	Mod/Texto1 de ter	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicador	Costo
309	9.2.3	Suministro e instalación de tablero bifásico 3 días	3 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	388	\$ 7.476.751,00
310	9.2.4	Suministro e instalación de tablero trifásico 3 días	3 días	vie 15/11/24	mar 19/11/24	389	\$ 1.267.063,00
311	9.2.5	Suministro e instalación de tablero monofásico 3 días	3 días	mar 19/11/24	vie 21/11/24	390	\$ 1.432.057,00
312	9.2.6	Suministro e instalación de tablero de control 3 días	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	391	\$ 2.147.909,00
313	9.2.7	Suministro e instalación de tablero para par 3 días	3 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	392	\$ 1.398.489,00
314	9.2.8	Tablero General COULISOE. Incluye totalizad 3 días	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	393	\$ 11.307.962,00
315	9.2.9	Tablero General EQUIPOS. Incluye totalizad 3 días	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	393	\$ 5.547.794,00
316	9.2.10	UPS trifásica de 30 KVA	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	393	\$ 44.295.486,00
317	9.2.11	UPS Bifásica de 6 KVA	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	393	\$ 10.198.994,00
318	9.2.12	UPS Monofásica de 2 KVA	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	393	\$ 10.935.202,00
319	9.2.13	Alimentador en 2H2+1H2N(libre de halógeno)+1H8T desnudo, para pantalla gigante, no incluye tubería.	14 días	mar 5/11/24	mié 20/11/24	464	\$ 44.827.002,00
320	9.2.14	Alimentador en 3H6+1H6N(libre de halógeno)+1H10T desnudo	8 días	mar 12/11/24	mié 20/11/24	399FF	\$ 12.345.051,00
321	9.2.15	Alimentador en 2H6+1H4N(libre de halógeno)+1H10T desnudo	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	400	\$ 495.846,00
322	9.2.16	Alimentador en 2H6+1H6N(libre de halógeno)+1H10T desnudo	3 días	lun 25/11/24	mié 27/11/24	401	\$ 32.923.112,00
323	9.2.17	Alimentador en 3H4+1H4N(libre de halógeno)+1H10T desnudo	5 días	mié 27/11/24	mar 3/12/24	402	\$ 8.486.655,00
324	9.2.18	Alimentador en 3H2+1H2N(libre de halógeno)+1H8T desnudo	14 días	mar 3/12/24	mié 18/12/24	403	\$ 54.557.519,00
325	9.2.19	Alimentador en 3H1/0+1H1/0N(libre de halógeno)+1H6T desnudo	4 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24	404	\$ 19.941.861,00
326	9.2.20	Alimentador en 3H1/0+1H2/0N(libre de halógeno)+1H6T desnudo	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24	405	\$ 2.101.652,00
327	9.2.21	Tubería PVC de 1 1/2"	6 días	mar 5/11/24	mar 12/11/24	464	\$ 15.507.440,00
328	9.2.22	Tubería PVC de 2"	3 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	407	\$ 1.942.559,00
329	9.2.23	Tubería PVC de 1"	10 días	lun 4/11/24	vie 15/11/24	408FF	\$ 7.163.233,00
330	9.2.24	Tubería EMT de 1 1/2"	5 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24	409	\$ 4.656.365,00
331	9.2.25	Suministro e instalación de medidor bifásico 3 días	3 días	jue 21/12/24	jue 5/12/24	398	\$ 2.506.293,00
332	9.2.26	Transferencia automática con breakers mol 3 días	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	410	\$ 13.085.693,00
333	9.2.27	Selector tetrapolar de 75 A para tablero de 3 días	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	410	\$ 32.891,00
334	9.2.28	Red de media tensión subterránea 3H2 AWG0 días	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	410	\$ 0,00
335	9.2.29	Acometida en 5H300+1H300N+1x2T Des)	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	410	\$ 37.409.000,00
336	9.2.30	Acometida en 4H300+1H300N+1x4/0T Des) 10 días	10 días	lun 25/11/24	jue 5/12/24	415	\$ 43.987.089,00
337	9.2.31	Alimentador general en 3x1/0+3x1/0N+1x4T desnudo.	3 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24	410	\$ 10.282.935,00
338	9.2.32	Alimentador general en 3x2+1x2N+1x8T de 0 días	5 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22		\$ 0,00
339	9.2.33	Alimentador general en 1x1/0+1x1/0N+1x6T desnudo.	3 días	lun 25/11/24	vie 29/11/24	417	\$ 22.242.754,00
340	9.2.34	Alimentador general en 2x6+1x6N+1x10T desnudo.	3 días	vie 29/11/24	mar 3/12/24	419	\$ 623.480,00
341	9.2.35	Alimentador general en 3x6+1x6N+1x10T desnudo.	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	420	\$ 3.987.560,00
342	9.2.36	Alimentador general en 2(3x4/0+1x4/0N+1x0) días	15 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22		\$ 0,00
343	9.2.37	Alimentador general en 2(3x3/0+1x3/0N+1x6T Des)	30 días	mar 3/12/24	jue 19/12/24	421CC	\$ 59.881.708,00
344	9.2.38	Alimentador general en 3(3x3/0+1x3/0N+1x6T Des)	20 días	jue 19/12/24	mié 22/01/25	423	\$

Id		Modif/texto de Bases	Nombre de tarea	Duración	Contenizco	fin	Predector/Costo	2023												2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								T4	T3	T2	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1

