

Nombre de tarea

PAQUETES DE BOSILLO CTO 003 DE 2023

154.38 dmar 20/06/23 \$ 1,512,814,709.66

1 L 10-001 BOYACA REAL 153.88 dmar 20/06/23 jue 21/12/23 \$ 288,926,450.02

2 Acta de inicio 0 dias mar 20/06/23 mar 20/06/23 5 0.00

3 PRELIMINARES 97.88 dmar 20/06/23 vie 13/10/23 \$ 895,484.80

4 Compactación fondo de excavación con equipos livio 20 dias mar 20/06/23 vie 13/10/23 \$ 513,985.50

5 Descape Manual y Retiro (-e=10-15cm) 6 dias mar 20/06/23 mar 27/06/23 \$ 381,498.30

7 DEMOLICIONES 13 dias mar 27/06/23 mar 11/07/23 \$ 2,037,342.30

8 Demolición anden conc e=0.10 incl. cargue y ret ** 4 dias mar 27/06/23 vie 30/06/23 \$ 112,308.00

9 Demolición bordillo con compresor + cargue y retiro 5 dias vie 30/06/23 jue 07/07/23 \$ 1,866,120.00

10 Demolición placa de contrapiso incl.cargue+retiro 4 dias jue 07/07/23 mar 11/07/23 \$ 58,914.30

11 DESMONTES Y RETIROS, DESTAPES 7 dias vie 22/09/23 sab 30/09/23 \$ 7,666,445.25

12 Demol pav asfáltico (carg+retiro) 7 dias vie 22/09/23 sab 30/09/23 \$ 7,666,445.25

13 DESMONTES Y REINSTALACIONES 5 dias vie 25/08/23 vie 25/08/23 \$ 548,212.60

14 Desmonte Corte y reinstal. adoqueo Arcilla 20X10X6CM + arena + B-600(10cm) 5 dias sab 19/08/23 vie 25/08/23 \$ 548,212.60

15 EXCAVACIONES Y RELLENOS 11 dias mar 11/07/23 mar 25/07/23 \$ 2,295,978.48

16 Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiege<50 11 dias mar 11/07/23 mar 25/07/23 \$ 2,295,978.48

17 NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO 3 dias sab 5/08/23 jue 10/08/23 \$ 14,177,085.00

18 Nivelación+Configuración terreno Material Local Selec 3 dias sab 5/08/23 jue 10/08/23 \$ 14,177,085.00

19 RELLENOS 4 dias jue 10/08/23 mar 15/08/23 \$ 1,525,650.60

20 Relleno compactado Base granular tipo IDRD ** 4 dias jue 10/08/23 mar 15/08/23 \$ 1,525,650.60

21 ESTRUCTURA 4 dias mar 15/08/23 vie 18/08/23 \$ 503,909.03

22 Placa contrapiso h=0.10 C210 kg/cm2 (6mm@15) 4 dias mar 15/08/23 vie 18/08/23 \$ 280,755.00

23 viga de amarre concreto3.00 4 dias mar 15/08/23 vie 18/08/23 \$ 223,154.03

24 psiCimentación+Alreador 2 dias sab 19/08/23 mié 23/08/23 \$ 1,617,722.00

25 Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m 2 dias sab 19/08/23 mié 23/08/23 \$ 421,082.00

26 Corte dilataciones en concreto Con Pulidora ** 2 dias sab 19/08/23 mié 23/08/23 \$ 1,106,640.00

27 PINTURA 148.88 dmar 26/06/23 jue 12/12/23 \$ 612,121,398.48

28 Limpieza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr 5 dias mar 25/07/23 jun 31/07/23 \$ 4,022,652.40

29 Pintura cerramiento malla eslabonada ** 7 dias jue 11/08/23 mar 21/11/23 \$ 24,636,253.00

30 Demarcación pintura trafico microbolígrafo a=0.1 ** 9 dias jue 9/11/23 mar 21/11/23 \$ 3,598,410.00

31 Pintura Baranda M-80 (2 MANOS) 1 dia? mar 26/06/23 mar 27/06/23 \$ 1,510,312.28

32 Pintura estructura microbolígrafo (con Compresor) ** 5 dias mié 22/11/23 jun 27/11/23 \$ 182,427.00

33 Emptradación sencilla céspedn pasto kikuyu + Tier11 dias jue 16/11/23 mié 29/11/23 \$ 267,240.00

34 Recubrimiento sintético Acrílico campos 20 dias mar 28/11/23 jue 21/12/23 \$ 27,004,005.00 deportivos

35 MOBILIARIO URBANO 84.88 dclun 31/07/23 jue 9/11/23 \$ 104,537,862.50

36 CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4-3-B medio+Geotextil22 dias vie 13/10/23 jue 9/11/23 \$ 63,676,192.50

37 Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** 12 dias jun 31/07/23 mar 15/08/23 \$ 40,861,770.00

38 MODULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACION 7 dias vie 1/09/23 vie 8/09/23 \$ 1,823,696.00

39 Módulo Complemento para Baranda 7 dias vie 1/09/23 vie 8/09/23 \$ 1,827,696.00

40 M-80(0.80x0.85m)**

NO PREVISTOS 105.88 dmar 11/07/23 jue 16/11/23 \$ 90,071,661.78

41 EXCAVACION MECANICA 11 dias sab 30/09/23 vie 13/10/23 \$ 7,685,332.28

42 Cargue+Transp+DispFinal(CDRS

43 Cauñete T-C prefabricada (A-120) (canal)** 10 dias sab 21/10/23 mié 1/11/23 \$ 11,591,580.00

44 Desmonte CerramientoMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue 6 dias mar 12/07/23 mar 18/07/23 \$ 5,814,409.20

45 ALABRIDE DE PUAS 1 INCH (Sum+inst) 7 dias jun 12/09/23 jun 18/09/23 \$ 6,132,230.46

46 Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20+e=0.15m)sin ref 5 dias jue 31/08/23 jun 10/08/23 \$ 10,058,812.80

47 Desmonte y retiro cerramiento alambre puas ** 5 dias mar 18/07/23 mar 25/07/23 \$ 1,238,433.14

48 Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M ** 6 dias mar 11/07/23 mar 18/07/23 \$ 4,078,737.63

49 Destape y limpieza cajas 70x70x70 ** 3 dias vie 1/09/23 mar 5/08/23 \$ 176,928.68

50 MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sum+inst) 6 dias mié 9/08/23 mar 15/08/23 \$ 14,058,362.42

51 MALLA ESABONADA CAL 10-Aguja+Platina+Soldadura malla punto a punto (Sum+inst) 7 dias mar 15/08/23 jue 24/08/23 \$ 15,529,115.00

52 TIERRA NEGRA + TRANSPORTE 5 dias jue 9/11/23 jue 16/11/23 5 0.00

53 Desmonte y reinstalación estruc de microbolígrafo ** 2 dias vie 13/10/23 mar 17/10/23 \$ 409,155.66

54 Cubierta Policarbonato Alveolar Cal. 8mm-Connet+Perfil 4 dias mar 19/09/23 vie 22/09/23 \$ 5,940,018.20

55 PUERTA DE ACCESO PEATONAL EN TUB 1 1/4", MALLA ESAB CAL 10 H2 5 dias mar 5/09/23 lun 11/09/23 \$ 1,442,716.26

56 PUERTA 4MTS, H2 MTS, DOS HOJAS CON PIVOTE, TUBO GALV 2", MARCO 1 1/2" MALLA ESAB CAL 10 H2", ANGULO 1 PLATINA 1/8" 5 dias mar 5/09/23 lun 11/09/23 \$ 2,793,345.03

57 Poda zonas verdes cancha (Cargue y Retiro) 10 dias vie 13/10/23 jue 26/10/23 \$ 3,124,487.04

2. 10-204 URB FERIAS 133 dias lun 26/06/23 vie 1/12/23 \$ 388,782,410.12

58 PRELIMINARES 42 dias mar 27/06/23 mié 16/08/23 \$ 2,675,845.90

59 Compactación fondo de excavación con equipos livio 20 dias mar 10/08/23 mié 16/08/23 \$ 704,367.90

60 Descape Manual y Retiro (-e=10-15cm) 6 dias mar 27/06/23 jue 3/07/23 \$ 1,970,878.00

61 DEMOLICIONES 7 dias mar 4/07/23 mar 11/07/23 \$ 1,854,344.86

62 Demolición anden conc e=0.10 incl. cargue y ret ** 7 dias mar 4/07/23 mar 11/07/23 \$ 1,795,430.56

63 Demolición placa de contrapiso incl.cargue+retiro 6 dias mar 4/07/23 lun 10/07/23 \$ 58,914.30

64 DESMONTES Y RETIROS, DESTAPES 07 dias mar 11/07/23 lun 18/08/23 \$ 1,306,688.10

65 Desmonte Baraca Exist.(demol. de bases y retiro)** 3 dias mar 11/07/23 vie 14/07/23 \$ 739,800.00


66 Desmonte y retiro adoqueo ** 11 dias mar 11/07/23 mar 25/07/23 \$ 1,698,377.28


67 Demol pav asfáltico (carg+retiro) 6 dias mié 16/08/23 jue 24/08/23 \$ 3,905,122.62

68 Desmonte y retiro de Baraca** 3 dias mar 25/07/23 vie 28/07/23 \$ 181,225.00

69 Desmonte Corte y reinstal. adoqueo Arcilla 20X10X6CM + arena + B-600(10cm) 5 dias mié 13/08/23 lun 18/08/23 \$ 782,163.20

Número de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
86	Geotextil T-3400 Suministro e instalación CDRC	2 días	jun 28/09/23	jun 30/09/23	\$ 6,382,391.60
97	CANCHAS	15 días	vie 8/09/23	lun 25/09/23	\$ 51,141,065.14
98	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio-Geotextil	15 días	vie 8/09/23	lun 25/09/23	\$ 46,336,122.00
99	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	10 días	mié 13/09/23	sáb 23/09/23	\$ 4,804,943.14
100	MOBILIARIO URBANO	61 días	mié 13/09/23	vie 24/11/23	\$ 64,675,692.00
101	Banca prefab M-3, 1x1espald sumín e instala 2.V.M **	6 días	jun 9/11/23	jun 16/11/23	\$ 6,204,112.00
102	Baranda cerramiento M-83 (sum + inst)	8 días	mié 13/09/23	vie 21/09/23	\$ 12,395,473.20
103	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	7 días	vie 17/11/23	vie 24/11/23	\$ 1,579,266.00
104	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	9 días	mar 26/09/23	jun 5/10/23	\$ 42,496,240.80
105	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 24/11/23	mar 28/12/23	\$ 489,006.00
106	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especcf-IDRD) Sum+Insta	3 días	vie 24/11/23	mar 28/11/23	\$ 489,006.00
107	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN	12 días	jun 21/09/23	jun 5/10/23	\$ 23,980,155.00
108	Modulo pierna prensa horizontal (sum + inst) guiro	3 días	jun 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 2,550,967.00
109	MODULO 3A (SUM + INST)	3 días	jun 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 6,399,341.00
110	Modulo Caballo Bicicleta Estática (Sumin+Insta)	3 días	jun 25/09/23	jun 28/09/23	\$ 1,975,186.00
111	Modulo caminador aereo (sumin+instal)	3 días	jun 25/09/23	jun 28/09/23	\$ 2,295,928.00
112	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Instal) Brazo3	3 días	jun 28/09/23	lun 27/10/23	\$ 3,184,436.00
113	Modulo Espalda Brazos Altos (Sum+Inst)	3 días	jun 28/09/23	lun 27/10/23	\$ 2,417,231.00
114	MODULO ELIPTICA (sumin+instal)	3 días	jun 27/10/23	jun 5/10/23	\$ 2,996,791.00
115	Modulo M-5 Columpio (sum + inst)	3 días	lun 27/10/23	jun 5/10/23	\$ 2,169,276.00
116	NO PREVISTOS	111.88 dmié 19/07/23	vie 1/12/23	\$ 62,488,718.09	
117	Desmonte juegos infantiles **	2 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	\$ 193,228.80
118	Demolición Sardinel (Inc.Minicargador+carb+retiro)	4 días	lun 24/07/23	jun 27/07/23	\$ 3,550,744.36
119	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DisipFinal)	4 días	jun 24/08/23	jun 27/08/23	\$ 12,118,787.23
120	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal) **	13 días	vie 8/09/23	vie 22/09/23	\$ 5,023,018.00
121	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue	6 días	jun 5/10/23	jun 12/10/23	\$ 969,068.20
122	Cinta AjusteConc. 3000psi±0.20±0.15m/jsin ref	3 días	mar 26/09/23	jun 28/09/23	\$ 1,307,645.66
123	DEMOLICION MURD5 1.5 + Traseigo	4 días	jun 1/08/23	mar 7/08/23	\$ 645,224.37
124	Tubo Galvan Ø 2 1/2" (2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum+Inst	3 días	jun 12/10/23	mié 25/10/23	\$ 1,724,918.23
125	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	8 días	mar 1/08/23	vie 11/08/23	\$ 3,706,125.12
126	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL 18-HG+V (DEC3	3 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23	\$ 1,706,871.46
127	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	3 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23	\$ 964,089.76
128	Relevo en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 14/08/23	vie 25/08/23	\$ 11,028,570.56
129	MALLA ESABONADA CAL 10-Angulo+Platina+Soldadura malla punto a	10 días	jun 12/10/23	mié 25/10/23	\$ 3,105,823.00
130	TERRA NEGRA + TRANSPORTE	5 días	sáb 7/10/23	vie 13/10/23	\$ 0.00
131	Desmonte y reinstalacion entree de microdofa**	4 días	vie 11/08/23	mié 16/08/23	\$ 409,155.66
132	DEMOLICION CIMENTO CONCRETO Refe	8 días	mar 1/08/23	vie 11/08/23	\$ 7,654,432.59
133	PUERTA 4MTS, H=2 MTS, DOS HOJAS CON PIVOTE, TUBO GALV 2", MARCO 1 1/2" MALLA ESAB CAL 10 42" ANGULO PLATINA 1/2"	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 8,380,035.09
134	3. 10-306 URB. DESARROLLO LA RIVERA	138.25 dmar 20/06/23	vie 1/12/23	\$ 250,769,063.77	
135	PRELIMINARES	53.25 dmi mar 20/06/23	mié 23/08/23	\$ 2,646,060.60	
136	Compacticación fondo de excavación con equipos h=4 días	4 días	vie 17/08/23	mié 23/08/23	\$ 421,272.60
137	Descapeo Manual y Retiro (e=10-15cm)	6 días	mar 20/06/23	mar 27/06/23	\$ 2,244,748.00
138	DEMOLICIONES	6 días	mar 20/06/23	mar 27/06/23	\$ 1,914,714.75
139	Demolición placa de contrapiso incl.cargue+retiro	6 días	mar 20/06/23	mar 27/06/23	\$ 1,914,714.75
140	DESMONTES Y RETIROS, DESTAPES	22.13 dmi mar 27/06/23	lun 24/07/23	\$ 4,523,194.51	
141	Desmonte baranda M-80 vin+g con retiro.	3 días	mar 27/06/23	jun 29/06/23	\$ 862,734.00
142	Desmonte equipos biosustentables (demol+retiro)	3 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	\$ 599,080.00
143	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	7 días	jun 13/07/23	lun 24/07/23	\$ 3,061,380.51
144	DESMONTES Y REINSTALACIONES	34.25 dmi lun 26/06/23	vie 4/08/23	\$ 4,150,868.48	
145	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	10 días	vie 14/07/23	mié 26/07/23	\$ 2,020,902.00
146	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-5 o 5A-STP	8 días	mié 26/07/23	vie 4/08/23	\$ 668,299.00
147	Desmonte Corte y reinstal. adoquin Arcilla 20X10X6CM + arena + B-600(10cm)	9 días	lun 26/06/23	mié 5/07/23	\$ 1,461,687.48
148	EXCAVACIONES Y RELLENOS	7 días	vie 4/08/23	lun 14/08/23	\$ 12,590,748.00
149	Excavación manual-retiro suelo blando+Trasiego<50.7 días	50.7 días	vie 4/08/23	lun 14/08/23	\$ 12,590,748.00
150	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO	3 días	lun 14/08/23	mié 17/08/23	\$ 10,237,083.80
151	Nivelación+Configuración terreno Mater. Local Selec	3 días	lun 14/08/23	mié 17/08/23	\$ 10,237,083.80
152	RELLENOS	6 días	mié 23/08/23	mié 30/08/23	\$ 10,738,706.62
153	Relevo compactado Base granular tipo DRD **	6 días	mié 23/08/23	mié 30/08/23	\$ 10,738,706.62
154	ESTRUCTURA	12 días	mié 30/08/23	mié 13/09/23	\$ 37,546,302.00
155	Placa contrapiso h=0.10 C-210 kg/cm2 (6mm@15) *12 días	12 días	mié 30/08/23	mié 13/09/23	\$ 37,546,302.00
156	PISOS	49 días	mié 13/09/23	vie 10/11/23	\$ 79,396,306.40
157	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	2 días	mié 13/09/23	jun 14/09/23	\$ 502,588.80
158	Piso Caucho receti 5cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	28 días	vie 6/10/23	vie 10/11/23	\$ 22,710,096.00
159	Piso Caucho receti 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	28 días	vie 6/10/23	vie 10/11/23	\$ 17,489,891.60
160	Piso Caucho receti 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	28 días	vie 6/10/23	vie 10/11/23	\$ 38,697,730.00
161	PINTURA	16.75 dmié 20/09/23	lun 9/10/23	\$ 4,067,709.16	
162	Limpieza Estruct.Metalica- pintura esmalte+varicor	3 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00
163	Pintura cerramiento malla eslabonada **	3 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23	\$ 1,340,642.55
164	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	5 días	mié 27/09/23	mar 3/10/23	\$ 983,557.61
165	Pintura Modulo M-5 Columpio **	5 días	mar 3/10/23	lun 9/10/23	\$ 883,401.00
166	Pintura Modulo M-3+retir-pinto+anticorrosivo+plint	5 días	mié 27/09/23	mar 3/10/23	\$ 880,108.00
167	EMPRADICACIÓN Y ABORDECACIÓN	6 días	sáb 25/11/23	vie 1/12/23	\$ 1,014,977.52
168	Empradición sencilla cespedon pasto kikuyo + Tier6	6 días	sáb 25/11/23	vie 1/12/23	\$ 1,014,977.52
169	CONFINAMIENTOS	18 días	mié 23/08/23	mié 13/09/23	\$ 20,759,025.24
170	Bordillo prefabricada-800(35x40x2.80m)JV-conc10 días	10 días	vie 1/09/23	mié 13/09/23	\$ 17,128,207.40
171	Geotextil T-3400 Suministro e instalación CDRC	6 días	mié 30/08/23	mié 30/08/23	\$ 5,630,817.84
172	CANCHAS	4 días	vie 22/09/23	mié 27/09/23	\$ 4,792,982.04
173	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	4 días	vie 22/09/23	mié 27/09/23	\$ 4,792,982.04
174	MOBILIARIO	53 días	vie 15/09/23	sáb 18/11/23	\$ 21,694,636.43
175	Banca prefab M-3, 1x1espald sumín e instala 2.V.M **	3 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23	\$ 5,102,054.00
176	Baranda cerramiento M-83 (sum + inst)	7 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	\$ 15,272,099.43
177	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	3 días	jun 5/10/23	lun 9/10/23	\$ 533,532.00
178	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	3 días	mié 15/11/23	sáb 18/11/23	\$ 2,105,688.00
179	Sum + Instalate+Asiento Fibra Iona Columpio-STPM	1 día	vie 5/10/23	vie 6/10/23	\$ 304,347.00
180	Suministro + inst. Acople Columpio -STPM**	1 día	jun 5/10/23	vie 6/10/23	\$ 376,914.00
181	SEÑALIZACIÓN	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	\$ 489,006.00
182	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especcf-IDRD) Sum+Insta	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	\$ 489,006.00
183	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN	2 días	mar 3/10/23	jun 5/10/23	\$ 3,158,214.00
184	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	2 días	mar 3/10/23	jun 5/10/23	\$ 1,495,354.00
185	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	2 días	mar 3/10/23	jun 5/10/23	\$ 1,662,860.00
186	NO PREVISTOS	120 días	mar 4/07/23	vie 24/11/23	\$ 31,044,538.22
187	Demolición Sardinel (Inc.Minicargador+carb+retiro)	5 días	mar 4/07/23	lun 10/07/23	\$ 2,450,575.23
188	Cinta AjusteConc. 3000psi±0.20±0.15m/jsin ref	5 días	mié 13/09/23	mar 19/09/23	\$ 282,904.11
189	DEMOLICION MURD5 1.5 + Traseigo	5 días	mar 4/07/23	lun 10/07/23	\$ 119,827.38
190	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traseigo+Retiro)	4 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	\$ 679,524.15
191	Remate de Muro	2 días	mié 15/08/23	mié 16/08/23	\$ 310,461.45
192	Lad.Prens.Macizo(Pandereta±0.37m)	4 días	jun 13/07/23	mar 18/07/23	\$ 4,771,940.00
193	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ABREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSUSTENTABLES	5 días	mié 20/09/23	mar 26/09/23	\$ 0.00
194	Tubo Galvan Ø 2 1/2" (2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	5 días	vie 11/08/23	lun 14/08/23	\$ 0.00
195	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL 18-HG+V (DEC2	3 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 1,706,871.46
196	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 482,044.88

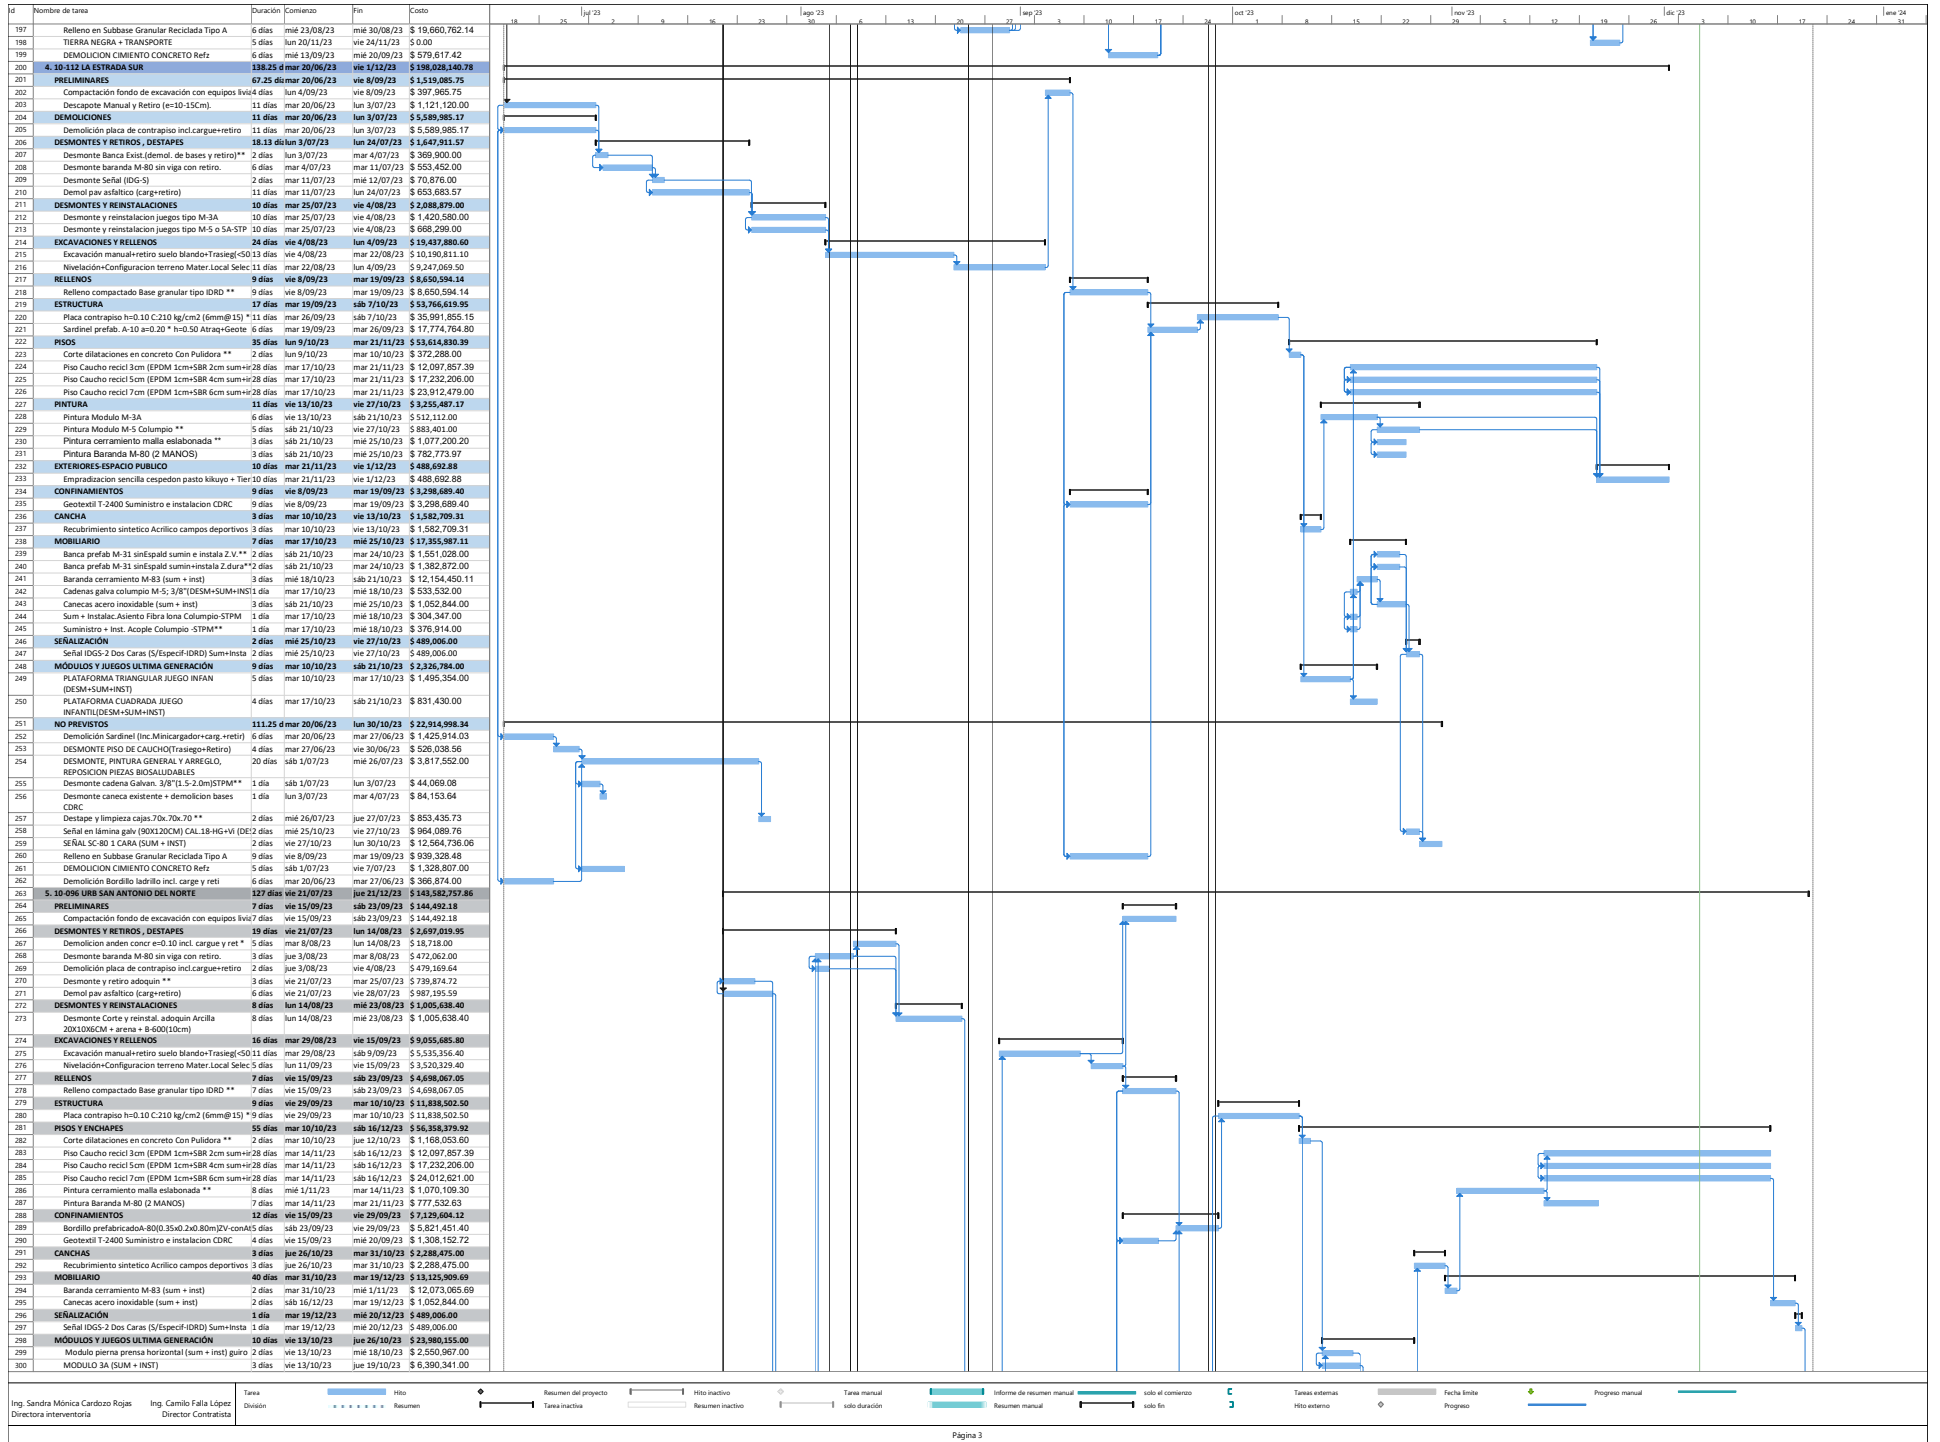

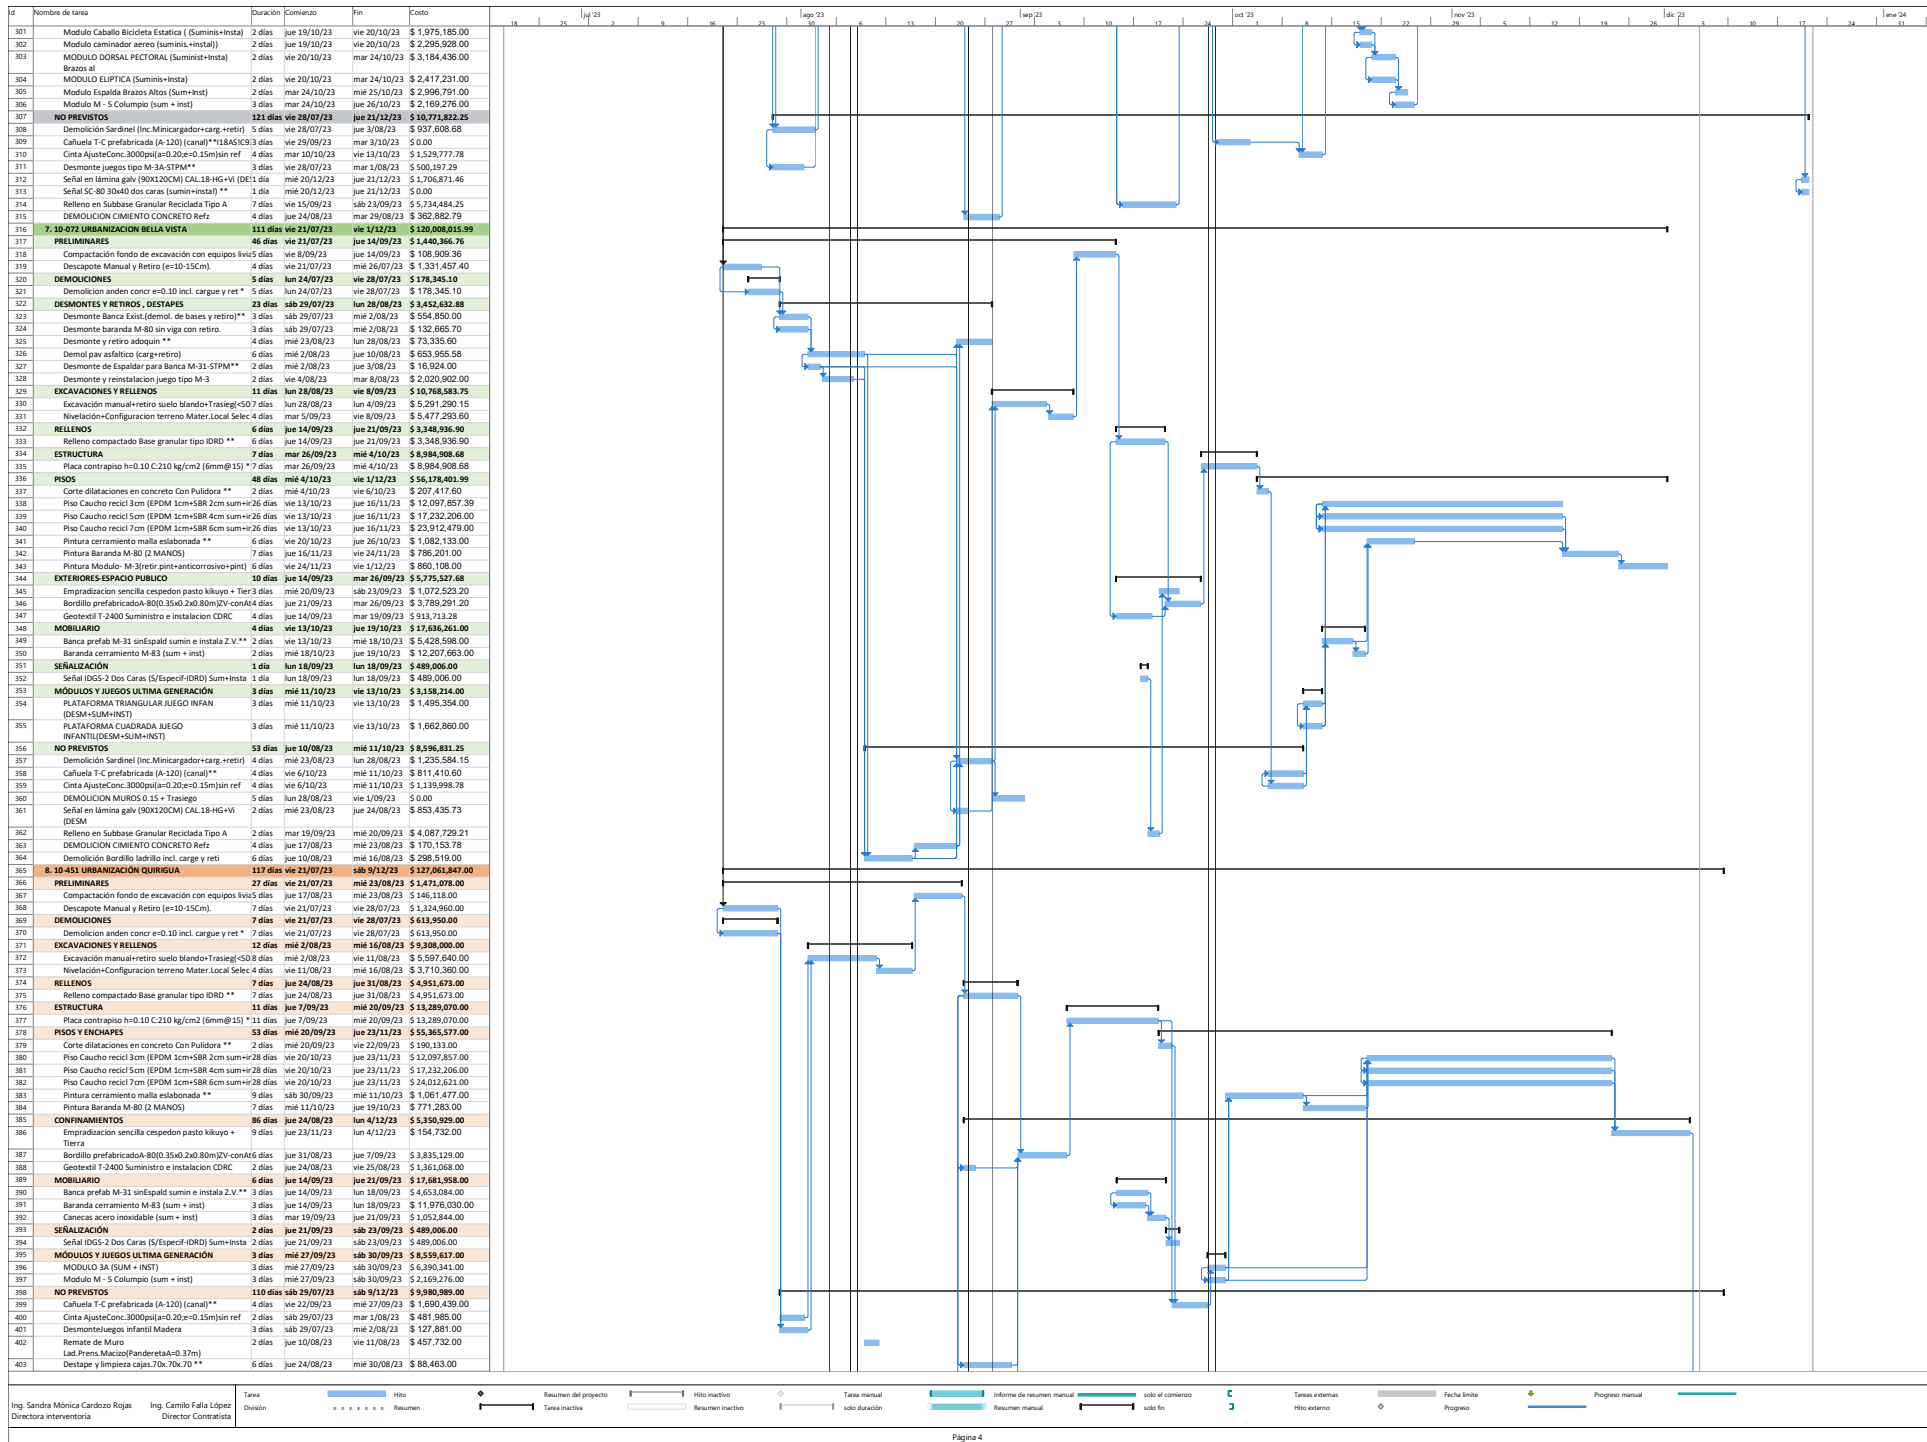

Número de tarea	Descripción	Duración	Comienzo	Fin	Costo
404	Señal en lámina galvan (90X120CM) CAL-18-HG+VI (DESM)	2 días	jue 6/12/23	mié 6/12/23	\$ 853,436.00
405	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	2 días	mié 6/12/23	sáb 9/12/23	\$ 482,045.00
406	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	6 días	jue 24/08/23	mié 30/08/23	\$ 5,799,008.00
407	10-10-174 CIUDADILLA COLCUBISSUDO	106.88 d	mié 9/08/23	vie 15/12/23	\$ 198,092,262.74
408	PRELIMINARES	36.88 dí	mié 9/08/23	jue 21/09/23	\$ 3,097,686.07
409	Compactación fondo de excavación con equipos livie6 días	jue 14/09/23	jue 21/09/23	\$ 318,845.80	
410	Descapote Manual y Retiro (e=10-15cm).	5 días	mié 9/08/23	mar 15/08/23	\$ 2,778,840.27
411	DESMONTE Y RETIROS, DESTAPES	10 días	jue 10/08/23	mié 23/08/23	\$ 3,854,704.82
412	Demolicion anden cont e=10 incl. cargue y reti *	4 días	jue 10/08/23	mar 15/08/23	\$ 1,894,074.42
413	Desmonte y retiro adquin **	6 días	mié 16/08/23	mié 23/08/23	\$ 1,960,630.40
414	EXCAVACIONES Y RELLENOS	16 días	lun 28/08/23	jue 14/09/23	\$ 19,975,159.97
415	Excavación manual-retiro suelo blandotrasing<O-9 días	jun 28/08/23	mié 6/09/23	\$ 12,210,733.74	
416	NivelacionConfiguracion terreno Mater Local Sele	7 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23	\$ 7,764,428.23
417	RELLENOS	9 días	jue 21/09/23	lun 2/10/23	\$ 10,363,043.98
418	Relleno compactado Base granular tipo IORD **	9 días	jue 21/09/23	lun 2/10/23	\$ 10,363,043.98
419	ESTRUCTURA	18 días	mar 2/10/23	mar 24/10/23	\$ 25,546,767.14
420	Placa contrapiso h=10 C-210 kg/cm2 (ferrn@15) * ** 9 días	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 25,125,685.14	
421	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hgrom=0.74m (Inc.Exca	3 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23	\$ 421,082.00
422	PISOS Y ENCACHES	37 días	mar 24/10/23	jue 7/12/23	\$ 47,014,091.74
423	Corte distalizaciones en concreto Con Pulidora **	3 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$ 512,532.80
424	Piso Caucho rectil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst	28 días	jue 2/11/23	jue 7/12/23	\$ 18,522,922.05
425	Piso Caucho rectil 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst	28 días	jue 2/11/23	jue 7/12/23	\$ 11,166,469.49
426	Piso Caucho rectil 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst	28 días	jue 2/11/23	jue 7/12/23	\$ 14,562,077.40
427	Pintura cerramiento metal eslabonada **	4 días	jue 2/11/23	mié 6/11/23	\$ 915,651.00
428	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	4 días	jue 6/11/23	mar 14/11/23	\$ 665,247.00
429	Empizadacion serrilla cespicio pasto kikuyo + Tierra	7 días	vie 17/11/23	sáb 25/11/23	\$ 659,192.00
430	CONFINAMIENTOS	18 días	jue 21/09/23	mié 11/10/23	\$ 15,634,138.76
431	Bordillo prefabricado-A-80(0.35x0.2x0.80m)(ZV-conAt6	5 días	jue 5/10/23	mié 11/10/23	\$ 12,555,888.38
432	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	3 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 3,078,272.38
433	CANCHA	6 días	jue 26/10/23	jue 2/11/23	\$ 5,187,210.00
434	Cubrimiento sintético Acrylic campos deportivos	6 días	jue 26/10/23	jue 2/11/23	\$ 5,187,210.00
435	MOBILIARIO	5 días	jue 2/11/23	jue 9/11/23	\$ 17,007,588.00
436	Banca Madera M-50 sumin-instala sobre ZD existe*	2 días	jue 2/11/23	sáb 4/11/23	\$ 5,655,184.00
437	Baranda cerramiento M-83 (sum + inst)	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 10,320,561.00
438	Caneas acero inoxidable (sum + inst)	2 días	mar 7/11/23	jue 9/11/23	\$ 1,052,844.00
439	SEÑALIZACION	2 días	jue 2/12/23	lun 12/12/23	\$ 489,006.00
440	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	2 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	\$ 489,006.00
441	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN	9 días	jue 2/11/23	mié 15/11/23	\$ 23,980,155.00
442	Modulo piedra prensa horizontal (sum + inst) guiro	2 días	jue 2/11/23	sáb 4/11/23	\$ 2,550,967.00
443	MODULO 3A (SUM + INST)	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 6,390,341.00
444	Modulo Caballo Bicicleta Estático (Sumini+insta)	2 días	mar 7/11/23	jue 9/11/23	\$ 1,975,185.00
445	Modulo caminador aereo (sumini+insta)	2 días	mar 7/11/23	jue 9/11/23	\$ 2,295,928.00
446	MODULO DORSAL PECTORAL (Sumini+insta)	2 días	jue 9/11/23	sáb 11/11/23	\$ 3,184,436.00
447	MODULO ELIPTICA (Sumini+Insta)	2 días	jue 9/11/23	sáb 11/11/23	\$ 2,417,231.00
448	Modulo Espalda Brazos Altos (Sum+inst)	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 2,996,791.00
449	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 2,169,276.00
450	NO PREVISTOS	95 días	mié 23/08/23	vie 15/12/23	\$ 15,912,810.26
451	Desmontejuegos Infantil Madera	3 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	\$ 127,861.46
452	Desmonte juegos tipo M-5 o SA-STPM**	2 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	\$ 258,349.87
453	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	25 días	lun 28/08/23	lun 25/09/23	\$ 66,103.62
454	Destape y limpieza cajas.70x70x70 **	3 días	mar 12/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00
455	Señal en lámina galvan (90X120CM) CAL-18-HG+VI (DESM)	3 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 1,706,871.46
456	Señal SC-80 30x40 dos caras (sumini+insta) **	3 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 482,044.88
457	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	9 días	jue 21/09/23	lun 2/10/23	\$ 12,649,183.56
458	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	6 días	jue 9/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00
459	Demolicion Bordillo ladrillo incl. cargue y reti	5 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23	\$ 622,375.41
460	10-10-178 URBANIZACION TABORA	109 días	sáb 5/08/23	vie 15/12/23	\$ 58,504,129.93
461	PRELIMINARES	40 días	sáb 5/08/23	vie 22/09/23	\$ 1,411,322.50
462	Compactación fondo de excavación con equipos livie9 días	mié 13/09/23	vie 22/09/23	\$ 105,472.50	
463	Descapote Manual y Retiro (e=10-15cm).	8 días	sáb 5/08/23	mié 16/08/23	\$ 1,305,850.00
464	DEMOLICIONES	12 días	sáb 5/08/23	mar 22/08/23	\$ 3,852,995.22
465	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	12 días	sáb 5/08/23	mar 22/08/23	\$ 3,852,995.22
466	EXCAVACIONES Y RELLENOS	11 días	mar 22/08/23	lun 4/09/23	\$ 4,193,499.60
467	Excavación manual-retiro suelo blandotrasing<O-11 días	mar 22/08/23	lun 4/09/23	\$ 4,193,499.60	
468	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 2,482,490.00
469	NivelacionConfiguracion terreno Mater Local Sele	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 2,682,490.00
470	RELLENOS	9 días	vie 22/09/23	mar 3/10/23	\$ 3,408,457.34
471	Relleno compactado Base granular tipo IORD **	9 días	vie 22/09/23	mar 3/10/23	\$ 3,408,457.34
472	ESTRUCTURA	20 días	mar 3/10/23	vie 27/10/23	\$ 6,037,026.30
473	Placa contrapiso h=10 C-210 kg/cm2 (ferrn@15) * ** 11 días	vie 13/10/23	vie 27/10/23	\$ 7,615,947.30	
474	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hgrom=0.74m (Inc.Exca	5 días	mar 3/10/23	lun 9/10/23	\$ 421,082.00
475	PISOS	10 días	vie 27/10/23	jue 9/11/23	\$ 381,508.40
476	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	10 días	vie 27/10/23	jue 9/11/23	\$ 381,508.40
477	PINTURA	53.88 dí	vie 15/09/23	mar 21/11/23	\$ 1,523,339.10
478	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	9 días	jue 9/11/23	mar 21/11/23	\$ 663,231.10
479	Pintura Modulo M-5 Columpio **	8 días	vie 15/09/23	lun 25/09/23	\$ 0.00
480	Pintura Modulo- M-3(petr.pint+anticorrosivo+pint)	8 días	mar 26/09/23	mié 4/10/23	\$ 860,108.00
481	CONFINAMIENTOS	18 días	vie 22/09/23	vie 13/10/23	\$ 8,789,306.00
482	Bordillo prefabricado-A-80(0.35x0.2x0.80m)(ZV-conAt9	3 días	mar 3/10/23	vie 13/10/23	\$ 7,792,494.00
483	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	4 días	vie 22/09/23	mié 27/09/23	\$ 996,812.00
484	MOBILIARIO	13 días	mar 22/11/23	mar 7/12/23	\$ 4,866,276.00
485	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	4 días	mar 21/11/23	vie 24/11/23	\$ 3,102,056.00
486	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST2 días	mar 21/11/23	mié 22/11/23	\$ 711,376.00	
487	Caneas acero inoxidable (sum + inst)	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	\$ 1,052,844.00
488	Sum + Instal+Asiento Fibr Iona Columpio-STPM	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	\$ 0.00
489	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**	5 días	vie 29/11/23	mar 5/12/23	\$ 0.00
490	SEÑALIZACION	3 días	mar 5/12/23	lun 11/12/23	\$ 489,006.00
491	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	3 días	mar 5/12/23	lun 11/12/23	\$ 489,006.00
492	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN	21 días	vie 13/10/23	jue 9/11/23	\$ 7,339,621.00
493	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	4 días	vie 13/10/23	jue 19/10/23	\$ 2,169,276.00
494	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	5 días	vie 13/10/23	vie 20/10/23	\$ 2,032,131.00
495	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	8 días	vie 20/10/23	lun 30/10/23	\$ 1,495,354.00
496	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	8 días	lun 30/10/23	jue 9/11/23	\$ 1,662,860.00
497	NO PREVISTOS	97 días	mar 22/08/23	vie 15/12/23	\$ 11,509,279.47
498	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	12 días	mar 22/08/23	mar 5/09/23	\$ 4,771,940.00
499	Tubo Galvan Ø 2	8 días	mar 5/09/23	mié 13/09/23	\$ 129,693.10
500	Desmonte juegos tipo M-5 o SA-STPM**	3 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	\$ 258,349.87
501	Señal en lámina galvan (90X120CM) CAL-18-HG+VI (DESM)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	\$ 1,706,871.46
502	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	8 días	vie 22/09/23	lun 2/10/23	\$ 482,044.88

