



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN**

INFORME PARCIAL N° 02

PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.6702875 DE 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA.

PROCESO DE SELECCIÓN No. : LP-DR-01-2024.

OBJETO : “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EL MANTENIMIENTO AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL DE SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

VALOR : 1.638.600.635 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO).

PLAZO : TRES (3) MESES Y CUATRO (4) DIAS.

FECHA DE INICIO : 27 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN : 31 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT: 901.863.382-1
CONFORMADO POR: ARMELCO SAS 50% -
INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
50%

CONSULTOR INTERVENTORÍA : INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC S.A.S

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Firma contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.6702875 DE 2024 proceso de selección LP-DR-01204 el 29 de agosto 2024.

Firma contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6741340 proceso de selección MC-DR-08-2024 el 06 de septiembre 2024.

Firma del acta de inicio 27 de septiembre 2024.

1.1. GARANTÍAS

- **Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal 33-44-101253259.**
Fecha de expedición: 03/09/2024
Vigencia desde: 31/08/2024
Vigencia hasta: 31/12/2024
Valor asegurado: \$1.147.020.444,50
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento 33-40-101081241.**
Fecha de expedición: 03/09/2024
Vigencia desde: 31/08/2024
Vigencia hasta: 31/12/2024
Valor asegurado: \$260.000.000,00

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Obra en ejecución 3%.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

El avance financiero para el periodo es de **\$49.158.019,00**, lo que representa un **3%** de ejecución de las actividades realizadas durante el mes de octubre.

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

El avance en gasto presupuestal ha sido de **\$49.158.019,00**, para el mes de octubre.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

N/A

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

N/A

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

Se hace seguimiento durante la ejecución del proyecto con la vigencia del certificado de vinculación de personas en condición de discapacidad que hace referencia a la inclusión laboral de personas con discapacidad a la planta de personal de uno de los consorciados.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

No se reportan accidentes laborales.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 2.

Semana del 13 de octubre al 19 de octubre 2024.

- Pica y raspe de texturizado 95,89M2 en fachadas internas de piso 1.
- Desmonte de manto edil en azotea 200,01M2.
- Aplicación de Sika emulsión asfáltica para sellado de poros 360,41M2.
- Escarificación de muro exterior ubicado en parqueadero 19,94M2.
- Instalación de manto edil en azotea 340,00M2.
- Aplicación de graniplast en muros internos piso 4 247,25M2
- Visita técnica, recorrido en obra para identificación de actividades eléctricas.
- Desmonte de aparatos sanitarios (3 sanitarios, 2 lavamanos, 2 orinales) en piso 1.
- Demolición de enchape en baños 12,66M2 piso 1.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Suspensión de actividad instalación de manto asfáltico por motivos de fuertes lluvias.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

En este periodo, las actividades ejecutadas se realizaron según lo establecido en el acuerdo N.PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.

Se realizan charlas al personal en obra acerca de la necesidad de la conservación del Medio Ambiente y de su Seguridad y Salud en el Trabajo, para que las personas adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida y así mismo; identificar los peligros, el origen de las enfermedades, evaluar y valorar los riesgos para evitar accidentes de trabajo.

La limpieza en la obra es un trabajo cuyo objetivo es acabar con la suciedad que se acumula durante la jornada laboral, de esta manera, se realizan actividades de orden y aseo diariamente al finalizar la jornada de trabajo, con el fin de mantener los puestos de trabajos ordenados y limpios y contribuir con ello a un trabajo más eficiente y más seguro.

El uso eficiente del agua es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, es muy importante mantener una hidratación adecuada y constante a lo largo de toda la jornada laboral, durante este periodo, se suministró agua potable a todo el personal que labora en obra, con el fin de completar aquellos líquidos perdidos especialmente cuando se realiza algún ejercicio o actividad y de esta forma evitar severas complicaciones de salud.

Para el desarrollo de las actividades diarias, se utiliza el agua de las instalaciones de la Rama Judicial permitiendo un uso eficiente y racional de este recurso.

El uso de la energía se realiza por medio de los equipos que son conectados mientras se utilizan, al terminar la jornada fueron desconectados y almacenados, esta actividad se hace de manera eficiente para aprovechar de forma correcta el servicio.

Las charlas diarias SST son realizadas en el parqueadero del Palacio de Justicia del municipio de Riohacha – La Guajira para el aprovechamiento de la luz natural y de esta forma evitar el consumo de la energía eléctrica

Los residuos sólidos residuos son almacenados y acopiados temporalmente en sitios autorizados por el supervisor de la Interventoría para luego realizar su respectiva disposición final con la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Charlas SST y ambiental.



Orden y Aseo en Obra.



Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



Gestión Integral de Residuos.



Actividades de seguridad y salud en el trabajo.

Se realizan las respectivas charlas de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se detalla los temas tratados respecto a la seguridad y salud en el trabajo.

Plan de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo: La inducción en SST, es una de las actividades de mayor importancia antes del ingreso de cualquier trabajador nuevo a la obra.

A cada trabajador se le brindan lineamientos básicos para su desempeño en la obra y consta de la difusión y actividades como:

- Afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscal.
- Inducción de seguridad y salud en el trabajo; por parte del área SST.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso (Ingenieros residentes, profesional SST).
- Diariamente se realizan las charlas pre operacionales de seguridad y salud en el trabajo a cada uno de los frentes de trabajo.
- Se realiza pausas activas y descansos prolongados durante la ejecución de las actividades con el fin de evitar lesiones osteomusculares o cansancio muscular.
- De acuerdo con lo estipulado dentro de las normas de seguridad se hace Entrega de dotación y elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores.
- Se realiza verificación del estado de los EPP, y su respectiva reposición si requiere de ser necesario por deterioro.
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo, con el fin de advertir los riesgos y peligros tanto al personal de obra como al personal externo y así garantizar áreas de trabajo seguro.
- Elaboración y divulgación de (ATS) para cada una de las actividades.
- Permiso de equipos eléctricos.
- Verificación del estado de los equipos de protección contra caídas (EPCC), se realiza la entrega al personal a realizar la actividad quienes cuentan con sus respectivos cursos vigentes para trabajo en alturas.
- Inspección de herramienta manual y equipos con el fin de verificar las condiciones actuales en la que se encuentran y así prevenir cualquier incidente o accidente.
- Se hace inspección de camilla y botiquín con el fin de verificar las condiciones de los elementos y en caso de una emergencia pueda ser usado sin inconvenientes.

Capacitaciones y Charlas de Seguridad e Inducción SST.

- Inducción a personal (socialización de políticas del no consumo de alcohol drogas y tabaquismo, política de prevención de acoso laboral. Socialización de los riesgos a los cuales están expuestos.
- Medidas preventivas ante altas temperaturas (Mantenerse en constante Hidratación).
- La importancia de la seguridad en las manos en el lugar de trabajo.
- La importancia de la señalización de prevención de riesgos laborales en actividad de aplicación de base en muro.
- Riesgos de caída en edificación ventana de caída libre al vacío controles preventivos para mitigar el riesgo de caída.
- Qué es la manipulación de cargas riesgos y medidas preventivas.
- Que son las pausas activas beneficios de realizar pausas activas, conocer los riesgos que se previenen al realizar pausas activas.
- El orden y la limpieza para prevenir accidentes laborales.
- Tomar medidas preventivas ante la línea de fuego, conocer los tres tipos de peligros en las

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

líneas.

- Cartelera informativa en SST, centro de atención primaria ante una emergencia, números de atención de ambulancias, número de llamadas ante una emergencia.
- Riesgos por el uso del celular en el lugar de trabajo.
- Socialización ficha de seguridad de producto químico Graniplast master los riesgos al que se está expuesto al utilizar el producto y sus medidas preventivas.
- Beneficio de realizar pausas activas antes de iniciar la jornada laboral.
- Que es el trabajo en equipo conocer los objetivos del trabajo en equipo.
- Riesgos eléctricos en el trabajo medidas preventivas, prohibido utilizar los cuartos eléctricos para guardar herramientas materiales, andamios en los pisos 4,3,2,1.
- La falta de concentración en los trabajos implica riesgo para la seguridad, evitar las distracciones en el lugar de trabajo.



Personal de obra



Socialización de Seguridad y salud en el Trabajo.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Socialización política no alcohol no drogas y tabaquismo	Socialización política de prevención de acoso laboral
--	---



8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

N/A

9. OBSERVACIONES

Los ítems que se mencionan con N/A todavía no se han presentado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los 19, del mes de octubre de 2024.

COMPONENTES	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
COMPONENTE SST	VIHELKA VILLAMIZAR	 Vihelka Geraldine Villamizar 1.131.073.834
COMPONENTE TECNICO	JESSICA SANDOVAL	
COMPONENTE AMBIENTAL	DANIELA PARRA	
DIRECTOR DE OBRA R – Legal CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A & V	FRANCISCO VILLANUEVA	

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Semana 13 de octubre al 19 de octubre 2024

Pica y raspe de texturizado en fachadas internas. Piso 1

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



Pica y raspe de texturizado en fachadas internas. Piso 1

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



Pica y raspe de texturizado en fachadas internas. Piso 1

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Escarificación de muro exterior ubicado en parqueadero.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Desmonte de manto edil en azotea.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Aplicación de Sika emulsión asfáltica en azotea.




CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Charlas de SST.



Desmonte de aparatos sanitarios en piso 1

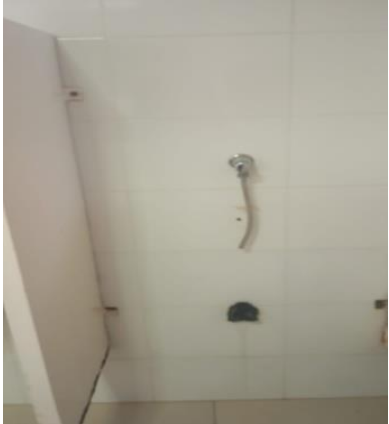

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Visita técnica, identificación de actividades eléctricas.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Aplicación de graniplast- piso 4.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Aplicación de graniplast- piso 4.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Aplicación de graniplast- piso 4.




CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024

Instalación de manto edil en azotea.

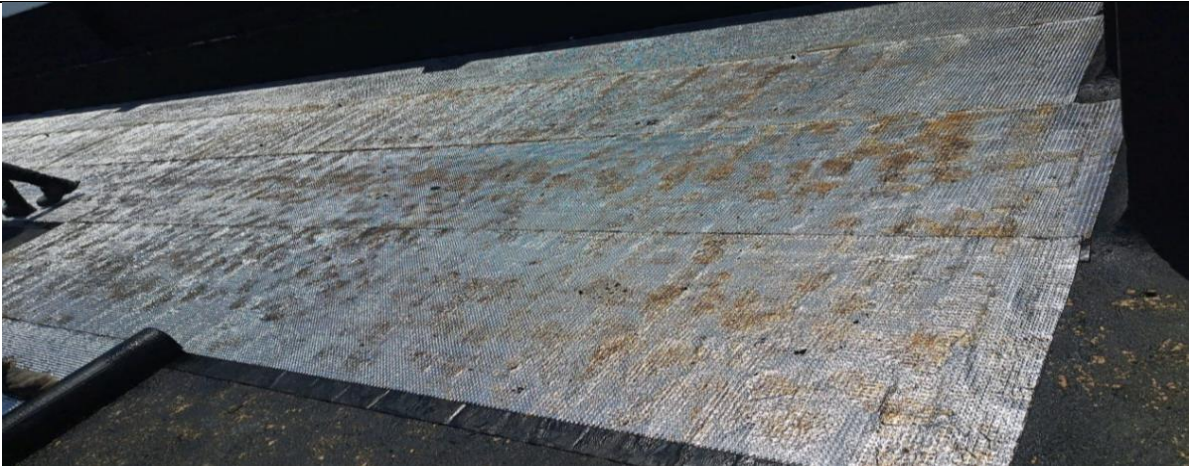

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 03/10/2024	FECHA	FECHA 12/10/2024
