

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

CONTRATO No. 1983 DE 2019: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 - PR 69+0000.



**PERIODO: 01 AL 30 de septiembre de 2023
Ocaña, 01 de octubre de 2023**

CONTRATO No. 2656 DE 2023

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA
TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1 LOTE 10.**



CONTENIDO

Anexo 1	Informe Semanal	4
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	4
Formato	MEPI-MN1-IN-15-FR-8.....	4
Anexo 4	Estado General del Tiempo	4
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	4
Anexo 6	Actas de comité.....	4
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría.....	4
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	4
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.....	4
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	4
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada	4
1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.1	Localización	6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..	7
2.3	Inventario y Estado Inicial de la Vía	7
2.4	Características Técnicas del Proyecto.....	7
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	Información General del Contrato.....	8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	8
3.3	Seguimiento ítems no previstos	10
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	10
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	10
4.1	Informe Semanal	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	10
4.3	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra	10
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	10
4.5	Estado General del Tiempo.....	10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	10
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	11
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	11
4.9	Otros documentos seguimiento mensual:.....	11
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
5.1	Información general del contrato	11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	12
5.3	Informes especialistas y Profesionales.....	12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC.....	13
5.5	Informe Matriz de Riesgos.....	13
5.6	Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría	13
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
6.1	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría.....	13
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	13
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	13
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	13
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	13
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	14



8. ANEXOS

14

8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....	14
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.....	14
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	
	PR 46+0924 ¡Error! Marcador no definido.	
	LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE ¡Error! Marcador no definido.	
	PR 39+0655 ¡Error! Marcador no definido.	
	LIMPIEZA DE SEÑALES ¡Error! Marcador no definido.	
	PR 41+0135 ¡Error! Marcador no definido.	
	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES ¡Error! Marcador no definido.	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales	16
8.4	Copia de la Bitácora del mes Correspondiente.....	16
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	8
	FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8	8
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	9
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	10
	ACTAS DE COMITE	11
	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO	16



LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Informe Semanal Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Anexo 6	Actas de comité
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías ha destinado \$ 375.843.799,00 acumulados para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO 1, GRUPO 1 y \$1.802.061.564,00 para ejecutar OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la vía objeto del alcance: Vía 7008, carretera Ocaña - Alto del Pozo desde el PR 38+0000 al PR 69+0000.

Esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña con el oriente del país y la frontera colombo venezolana, desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 2656 de 2023, por parte del CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 1983 de 2019, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la vía: Ocaña – Alto del Pozo, en el tramo que va desde el PR 00+0000 al PR 69+0000, en el corredor vial ruta 70 tramo 08 que une la frontera Colombo Venezolana, en el puente internacional Simón Bolívar.



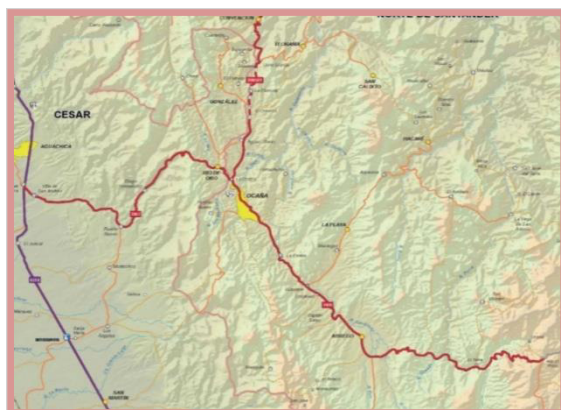
El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento Norte de Santander y Cesar.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

- a) Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
- b) Códigos de las vías.
- c) Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

No.	TERRITORIAL	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO	PR 38+0000	PR 69+0000	31,00	31,00
TOTAL DE KILÓMETROS							31,00

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que benefician u optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.



3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	1983 DE 2019
OBJETO	Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Ocaña. Carretera 7008: Ocaña – Alto del Pozo, PR 38+0000 - PR 69+0000.
CONTRATISTA	Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA
REPRESENTANTE LEGAL	CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA 1:	12 DE AGOSTO DE 2022
PRÓRROGA 2:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 4:	23 DE MARZO DEL 2023
PRÓRROGA 5:	31 DE JULIO DE 2023
PRÓRROGA 6:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.227.284.773,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 1	\$174.813.014,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 2	\$122.809.142,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 3	\$188.748.053,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 4	\$88.406.582,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.802.061.564,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

SEMANA 5 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZARON ACTIVDADES DE: LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000; ROCERÍA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 53+0200 AL PR 56+0000; LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES DEL PR 53+0200 AL PR 56+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 6 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000; ROCERÍA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 56+0000 AL PR 60+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL

SEMANA 7 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000; ROCERÍA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 57+0000 AL PR 61+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL

SEMANA 8 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000; ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 65+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 9 DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 65+0000 AL PR 66+0000; ROCERÍA EN EL PR 65+0000 AL PR 66+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 65+0000 AL PR 66+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 65+0000 AL PR 66+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 65+0000 AL PR 66+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 65+0000 AL PR 66+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL



3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas por la microempresa, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Ocaña.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al contrato mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la microempresa, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 2)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**



4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento Programa de Obra
(No Aplica)
- Acta de Comité de Obra
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Actas de Reunión
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2656 de 2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA
GESTOR DEL PROYECTO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)



5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.
- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.
- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.
- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y Profesionales

(No aplica).



5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Informe Matriz de Riesgos

(No aplica)

5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 6)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 7)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**
- Plan de Cargas o reprogramación al plan de Cargas aprobado



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento al Plan de Cargas
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene realizando todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección Territorial quien venía realizando la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.
- La principal actividad ejecutada por la microempresa de mantenimiento rutinario fue realizar las actividades de mantenimiento periódico de las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- El inspector SISO de la administración vial semanalmente realiza la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El estado de salud de los asociados es bueno. Se confirma que vienen desarrollando actividades en la vía los asociados contratados.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

(Ver anexo 11)

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

**CONTRATO No. 1983 DE 2019: CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO,
PR 38+0000 - PR 69+0000.**

COOPERATIVA EL TARRA – SEPTIEMBRE DE 2023





CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES PR 55+0332	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTCALES PR 58+0850
	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 59+0400	LIMPIEZA DE DEFENSAS PR 62+0200

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales
(No Aplica)

8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente
(Ver anexo 12)

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA 15 10 2023 (Día / Mes / Año)</div> <div>01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</div>
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA PERIODO MES: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATO DE OBRA No.: 1983		
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2656 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
ALCANCE FISICO CONTRATADO		
AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO		
AVANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES		
INVERSIÓN EN OBRA		
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)		
Firma: Ruben Isaza Palacio Representante Legal COINZA ING SAS NIT. 901.164.885 cel: 311 308 3033 Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial		

		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		VERSIÓN		1	
		PÁGINA			
Contrato de Obra No. 1983		Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARR			
Contrato de Interventoría No. 2656-2023		Interventoría: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA			
Objeto Contrato de Obra: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 70NS01: LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION, PR 00+0000 - PR 33+0000.					
INFORME MENSUAL No. 2		MES O PERIODO:		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA		
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3		
1	INTRODUCCIÓN		8		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		9		
2.1	Localización		9		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10		
2.4	Características técnicas del proyecto		11		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		11		
3.1	Información general del contrato		11		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12		
3.3	Seguimiento Items no previstos		13		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		13		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4			
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	36		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	38		
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11			
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42		
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14			
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1			
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2			
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		14		
5.1	Información general del contrato		14		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		15		
5.3	Informes especialistas y profesionales		16		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		16		
5.5	Informe matriz de riesgos.				
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría				
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.				
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		16		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15			
6.6	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2			
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2			
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3			
7	Conclusiones y recomendaciones		17		
8	Anexos		20		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		60		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas				
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64		
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.					
Firma:		Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ			
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Matrícula No.: 54202-099505 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor. Dirección Territorial					



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

ANEXOS



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 1

INFORME SEMANAL FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN-IN-15-FR-3 1 1 DE 2																																																																																															
FECHA						8	09	2023 (Día / Mes / Año)																																																																																													
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																					
PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA			SEMANA No.: 5 del 01/09/2023 al 07/09/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ																																																																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.																																																																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.																																																																																																					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																					
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA				INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S																																																																																																	
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: N.A																																																																																																	
CONTRATO No. 1983 DE 2019				VALOR INICIAL: \$ 1.227.284.773,00		CONTRATO No. 2656-2023																																																																																															
FECHA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2019				VALOR ADICIONES: \$ 574.776.791,00		FECHA DE INICIO: 08/08/2023																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022				VALOR ACUMULADO \$ 1.802.061.564,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																															
						VALOR INICIAL: \$ 375.843.799,00																																																																																															
						VALOR ADICIONES: \$																																																																																															
						VALOR ACUMULADO: \$ 375.843.799,00																																																																																															
						VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																															
						VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																															
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																					
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td rowspan="2">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 67.174.005,00</td><td>\$ 427.227.299,00</td><td>\$ 452.862.620,00</td><td>\$ 377.843.005,00</td><td>\$ 277.154.635,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 67.174.005,00</td><td>\$ 427.227.299,00</td><td>\$ 452.862.620,00</td><td>\$ 377.843.005,00</td><td>\$ 153.387.369,56</td></tr><tr><td></td><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 93.767.235,44</td></tr><tr><td rowspan="2">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 375.843.799,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 375.843.799,00</td></tr></table>									CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 377.843.005,00	\$ 277.154.635,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 377.843.005,00	\$ 153.387.369,56		SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.767.235,44	INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA					\$ 375.843.799,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					\$ -		SALDO DE VIGENCIA					\$ 375.843.799,00																																														
CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																															
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 377.843.005,00	\$ 277.154.635,00																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 377.843.005,00	\$ 153.387.369,56																																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.767.235,44																																																																																															
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA					\$ 375.843.799,00																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					\$ -																																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA					\$ 375.843.799,00																																																																																															
<div><div><p>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p><p>OBRA</p><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 1.771.463.558,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 1.739.598.212,36</td><td>98,20%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 1.734.328.577,32</td><td>97,90%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ 5.269.635,03</td><td>0,30%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 1.769.645.816,95</td><td>98,20%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.764.285.160,95</td><td>97,90%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ 5.360.656,00</td><td>0,30%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 10.314.101,18</td><td>0,58%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 10.314.101,18</td><td>0,58%</td></tr><div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div>X</div><div></div></div><p>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</p><p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 76151 DE 04/08/2023</p><p>PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2023</p><p>VALOR FACTURA: \$ 44.203.290,75</p><p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p><p>Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023, fecha del acta de inicio del proceso contractual</p><table><tr><th colspan="2">ANTICIPOS</th><th>INDICADOR IC</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td>En el mes:</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td>Acumulado:</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td></tr></table></table></div><div><p>INTERVENTORIA</p><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 375.843.799,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 31.320.316,59</td><td>8,33%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 21.924.221,61</td><td>5,83%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 21.924.221,61</td><td>5,83%</td></tr><div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div></div><div>X</div></div><p>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</p><p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 0</p><p>VALOR FACTURA: \$ -</p><p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p><p>Observaciones:</p><table><tr><th colspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table></table></div></div>									VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.771.463.558,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 1.739.598.212,36	98,20%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.734.328.577,32	97,90%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 5.269.635,03	0,30%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.769.645.816,95	98,20%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.764.285.160,95	97,90%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 5.360.656,00	0,30%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 10.314.101,18	0,58%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 10.314.101,18	0,58%	ANTICIPOS		INDICADOR IC	Otorgado \$		En el mes:	Amortizado \$		Acumulado:	Saldo \$			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 375.843.799,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 31.320.316,59	8,33%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 21.924.221,61	5,83%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 21.924.221,61	5,83%	ANTICIPOS		Otorgado \$		Amortizado \$		Saldo \$																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.771.463.558,00																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 1.739.598.212,36	98,20%																																																																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.734.328.577,32	97,90%																																																																																																			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 5.269.635,03	0,30%																																																																																																			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																																			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.769.645.816,95	98,20%																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.764.285.160,95	97,90%																																																																																																			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 5.360.656,00	0,30%																																																																																																			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 10.314.101,18	0,58%																																																																																																			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 10.314.101,18	0,58%																																																																																																			
ANTICIPOS		INDICADOR IC																																																																																																			
Otorgado \$		En el mes:																																																																																																			
Amortizado \$		Acumulado:																																																																																																			
Saldo \$																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 375.843.799,00	100,00%																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 31.320.316,59	8,33%																																																																																																			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 21.924.221,61	5,83%																																																																																																			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 21.924.221,61	5,83%																																																																																																			
ANTICIPOS																																																																																																					
Otorgado \$																																																																																																					
Amortizado \$																																																																																																					
Saldo \$																																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)																																																																																																					
<div><div><p>Meta Física Programada %</p><p>Meta Física Ejecutada %</p></div><div><p>Avance o Atraso Físico %</p></div></div> <div><table><tr><th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td rowspan="6">Estudios y diseños</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="11">* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</td></tr><tr><td colspan="5">TRAMO Y/O SECTOR 1:</td><td colspan="5">TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="5">TRAMO Y/O SECTOR (n):</td><td colspan="5"></td></tr></table></div>									Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											TRAMO Y/O SECTOR 1:					TRAMO Y/O SECTOR 2:					TRAMO Y/O SECTOR (n):									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																											
Estudios y diseños					Prog																																																																																																
					Ejec																																																																																																
					Prog																																																																																																
					Ejec																																																																																																
					Prog																																																																																																
					Ejec																																																																																																
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																					
TRAMO Y/O SECTOR 1:					TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																					

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 7. LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES DEL PR 53+0200 AL PR 56+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div></div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div></div><div><div>Programado</div><div>Ejecutado</div></div></div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div>1 de septiembre de 2023 1:34:40 p. m.</div><div>P. R. 54+200</div><div></div><div>LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR 54+0200</div></div>	<div><div>sep. 04. 2023 08:05a. m.</div><div>55+332</div><div></div><div>LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES PR 55+0332</div></div>	<div><div>7 de septiembre de 2023 8:07:56 a. m.</div><div>P. R. 53+871</div><div></div><div>LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 45+0300</div></div>
<div><div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tama Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.</div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: _____</div><div>No. MAT: _____</div></div></div>		
<div><div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 5 DEL 01/09/2023 AL 07/09/2023

FECHA 07 09 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No. 1983 DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS : Al ir y venir del trabajo , proteccion de los niños en la casa , hay que denominar las preocupaciones , seguridad despues del trabajo, seguridad en el hogar.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: _____</div>	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ</div> <div>No. MAT: 08202 - 31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA	
	REGISTRO DE CHARLAS	
	Versión: 1.0	Fecha: Mayo 08 de 2020 Código: F-032

No	Fecha:	SEPTIEMBRE 01 DE 2023 VIERNES	SEPTIEMBRE 04 DE 2023 LUNES	SEPTIEMBRE 05 DE 2023 MARTES	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 MIÉRCOLES	SEPTIEMBRE 07 DE 2023 JUEVES
	Tema:	AL IR Y VENIR DEL TRABAJO	PROTECCION DE LOS NIÑOS EN LA CASA	HAY QUE DOMINAR LAS PREOCUPACIONES	SEGURIDAD DESPUES DEL TRABAJO	SEGURIDAD EN EL HOGAR
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZONA	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona
9	RICARDO BECERRA	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES
POR COVID 19

Versión: 1.0

Fecha: abril 21 de 2020

Código: F-033

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	6	ML 3.50	ML 2.50	ML 1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Sixto Jacome
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis E. Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
RICARDO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ricardo Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro A. Becerra

Fecha de entrega: Septiembre 01 - 2023

(*)Con la firma del presente certifico bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 56+0000 AL PR 60+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div></div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div></div><div><div>Programado</div></div><div><div>Ejecutado</div></div></div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div>8 de septiembre de 2023 2:59:10 p. m.</div><div>PR 58+850</div><div></div><div>LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 58+0850</div></div>	<div><div>13 de septiembre de 2023 2:02 p. m.</div><div>PR 59+0656</div><div></div><div>LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE PR 59+0656</div></div>	<div><div>13/09/2023 8:18:06 a. m.</div><div>PR 59+0950</div><div></div><div>LIMPIEZA DE SEÑALES HORIZONTALES PR 59+0950</div></div>
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tama Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.</div>		
		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del R0104S. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 6 DEL 08/09/2023 AL 14/09/2023

FECHA 14 09 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No. 1983 DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: La distraccion , la importancia de lavarse bien las manos , proteccion de los pies , la puntualidad en el trabajo, la seguridad es una cuestion personal.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: _____</div>	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES</div> <div>No. MAT: 08202-31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REGISTRO DE CHARLAS

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	SEPTIEMBRE 08 DE 2023 VIERNES	SEPTIEMBRE 11 DE 2023 LUNES	SEPTIEMBRE 12 DE 2023 MARTES	SEPTIEMBRE 13 DE 2023 MIÉRCOLES	SEPTIEMBRE 14 DE 2023 JUEVES
	Tema:	LA DISTRACCION	LA IMPORTANCIA DE LAVARSE BIEN LAS MANOS	PROTECCION DE LOS PIES	LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO	LA SEGURIDAD ES UNA CUESTION PERSONAL
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAM GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZONA	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona
9	RICARDO BECERRA	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES
POR COVID 19

Versión: 1.0

Fecha: abril 21 de 2020

Código: F-033

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	ML 6	ML 3.50	ML 2.50	1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Sixto Jacome
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmido Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis Evelio Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
RICARDO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ricardo Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro A. Becerra

Fecha de entrega: Septiembre 8 - 2023

(*)Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES
POR COVID 19

Versión: 1.0

Fecha: abril 21 de 2020

Código: F-033

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	ML 6	ML 3.50	ML 2.50	1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Sixto Jacome
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis Evelio Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
RICARDO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ricardo Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro A. Becerra

Fecha de entrega: Abril 22 - 2023

(*) Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 57+0000 AL PR 61+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div><div>ProgramadoEjecutado</div></div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><p>LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 59+0400</p></div>	<div><p>LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 60+348</p></div>	<div><p>LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE PR 60+022</p></div>
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tama Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.</p>		
		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 7 DEL 15/09/2023 AL 21/09/2023

FECHA 21 09 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No. 1983 DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

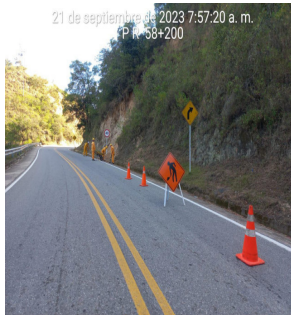
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Apilamiento de materiales, como levantar pesos, especialidad de levantamientos, claves para una buena comunicacion.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA "REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID-19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: _____</div>	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES</div> <div>No. MAT: 08202-31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REGISTRO DE CHARLAS

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	SEPTIEMBRE 15 DE 2023 VIERNES	SEPTIEMBRE 18 DE 2023 LUNES	SEPTIEMBRE 19 DE 2023 MARTES	SEPTIEMBRE 20 DE 2023 MIÉRCOLES	SEPTIEMBRE 21 DE 2023 JUEVES
	Tema:	APILAMIENTO DE MATERIALES	COMO LEVANTAR PESO	ESPECIALIDAD DE LEVANTAMIENTOS	SABIA PERO SE LE OLVIDO	CLAVES PARA UNA COMUNICACION EFECTIVA
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAM GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZONA	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona
9	RICARDO BECERRA	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES
POR COVID 19

Versión: 1.0

Fecha: abril 21 de 2020

Código: F-033

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	ML 6	ML 3.50	ML 2.50	1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Sixto Jacome
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis Evelio Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
RICARDO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ricardo Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro A. Becerra

Fecha de entrega: Septiembre 15-2023

(*) Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN-IN-15-FR-3 1 1 DE 2		
FECHA						3	10	2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)								
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA			SEMANA No.: 8 del 22/09/2023 al 28/09/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA				INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S.				
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: N.A				
CONTRATO No.: 1983 DE 2019				VALOR INICIAL: \$ 1.227.284.773,00		CONTRATO No.: 2656-2023		
FECHA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2019				VALOR ADICIONES: \$ 574.776.791,00		FECHA DE INICIO: 08/08/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022				VALOR ACUMULADO \$ 1.802.061.564,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023		
						VALOR ANTICIPO: \$ -		
						VALOR AMORTIZADO: \$ -		
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 577.643.005,00	\$ 277.154.635,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 67.174.005,00	\$ 427.227.299,00	\$ 452.862.620,00	\$ 577.643.005,00	\$ 153.387.369,56		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.767.235,44		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA					\$ 375.843.799,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA					\$ 375.843.799,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
OBRAINTERVENTORIA								
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.771.463.558,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 1.770.015.132,73 99.92%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.764.745.497,70 99.62%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 5.269.635,03 0.30%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 1.800.588.120,48 99.92%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.795.227.464,48 99.62%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 5.360.656,00 0.30%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 10.314.101,18 0.58%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 10.314.101,18 0.58%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$1669 DE 15/09/2023								
PERIODO FACTURADO: AGOSTO DE 2023								
VALOR FACTURA: \$ 44.203.290,75								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023, fecha del acta de inicio del proceso contractual								
ANTIPIOSINDICADOR VIC								
Otorgado \$ En el mes: Amortizado \$ Acumulado: Saldo \$								
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base								
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad Vigencia Vigencia (n) Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %								
Estudios y diseños								
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n): TRAMO Y/O SECTOR 2:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)								
FUENTES DE MATERIALES								
DISPONIBLE								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL SI NO								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL SI NO								
OBSERVACIONES:								
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
ESTADO: OBSERVACIONES:								
V. GESTIÓN SOCIAL								
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15 12								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11 7								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4 5								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 11 7								
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:								
VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)								
OBSERVACIONES:								
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0								
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0								
AVALÚOS APROBADOS: 0								
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0								
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)								

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE: 1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 65+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div><div>Programado</div></div> <div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 38+0000PR 69+0000</div><div>Ejecutado</div></div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div>22 de septiembre de 2023 1:12:35 p. m.</div><div>PR 62+850</div></div> <div>LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES PR 62+0850</div>	<div><div>26 de septiembre de 2023 1:29:58 p. m.</div><div>PR 62+200</div></div> <div>LIMPIEZA DE DEFENSAS PR 62+0200</div>	<div><div>29/09/2023 12:49:30 p. m.</div><div>PR 65+238</div></div> <div>LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 65+0238</div>
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tama Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.</div>		
		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 8 DEL 22/09/2023 AL 28/09/2023

FECHA 28 09 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No. 1983 DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

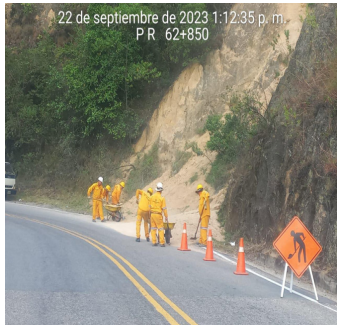
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Seguridad en el transporte del personal , seguriad con las motocicletas , seguridad con la maquinaria riesgos del ruido , riesgo publicos

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: _____</div>	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES</div> <div>No. MAT: 08202-31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REGISTRO DE CHARLAS

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	SEPTIEMBRE 22 DE 2023 VIERNES	SEPTIEMBRE 25 DE 2023 LUNES	SEPTIEMBRE 26 DE 2023 MARTES	SEPTIEMBRE 27 DE 2023 MIÉRCOLES	SEPTIEMBRE 28 DE 2023 JUEVES
	Tema:	SEGURIDAD EN EL TRASPORTE DE PERSONAL	SEGURIDAD CON LAS MOTOCICLETAS	SEGURIDAD CON LA MAQUINARIA	RIESGOS DEL RUIDO	RIESGO PÚBLICO
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO	LUISEVELIO PACHECO
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZONA	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona	Eleison Tarazona
9	RICARDO BECERRA	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra	Ricardo Becerra
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES
POR COVID 19

Versión: 1.0

Fecha: abril 21 de 2020

Código: F-033

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	6	ML 3.50	ML 2.50	ML 1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Sixto Jacome
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis E Pachecho
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio B
RICARDO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ricardo Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro A Becerra

Fecha de entrega: Septiembre 22 - 2023

(*)Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 2

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

FECHA

11

10

2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No:

1983 DE 2019

CONTRATISTA:

Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 - PR 69+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

2656 DE 2023

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

NOMBRE ARL:

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradores de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO	13,363,532	REPRESENTANTE- OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
2	RICARDO BECERRA JACOME	88,050,008	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
3	WILLIAN GOMEZ	13,364,454	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
4	BREINER JULIAN VERGEL PEÑARANDA	1,094,573,224	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	PORVENIR	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
5	MAURICIO BECERRA JACOME	1,094,578,037	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
6	ROSMIRO JACOME BECERRA	88,149,057	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
7	SIXTO JACOME BECERRA	88,277,435	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
8	IVAN ORTIZ GOMEZ	13,364,767	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 46,400.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 185,600.00	\$ 46,400.00					
9	LUIS EVELIO PACHECO ASCANIO	2,845,209	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 40,000.00	PORVENIR	7898178724	\$ 160,000.00	\$ 40,000.00					
10	JORGE OMAR SEPULVEDA JACOME	88,149,104	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 40,000.00	COLPENSIONES	7898178724	\$ 160,000.00	\$ 40,000.00					
11	ALEXANDER JACOME JACOME	5,470,538	OBRERO	\$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coop. T. A. EL TARRA	\$ 1,160,000.00	\$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	7898178724	\$ 40,000.00	PORVENIR	7898178724	\$ 160,000.00	\$ 40,000.00					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:


El contratista adjunta la certificación de fecha

2/10/2023

a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma



NOMBRE: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO

Residente de Obra

C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firmado digitalmente por

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Matrícula No. 54520-09605 NTS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




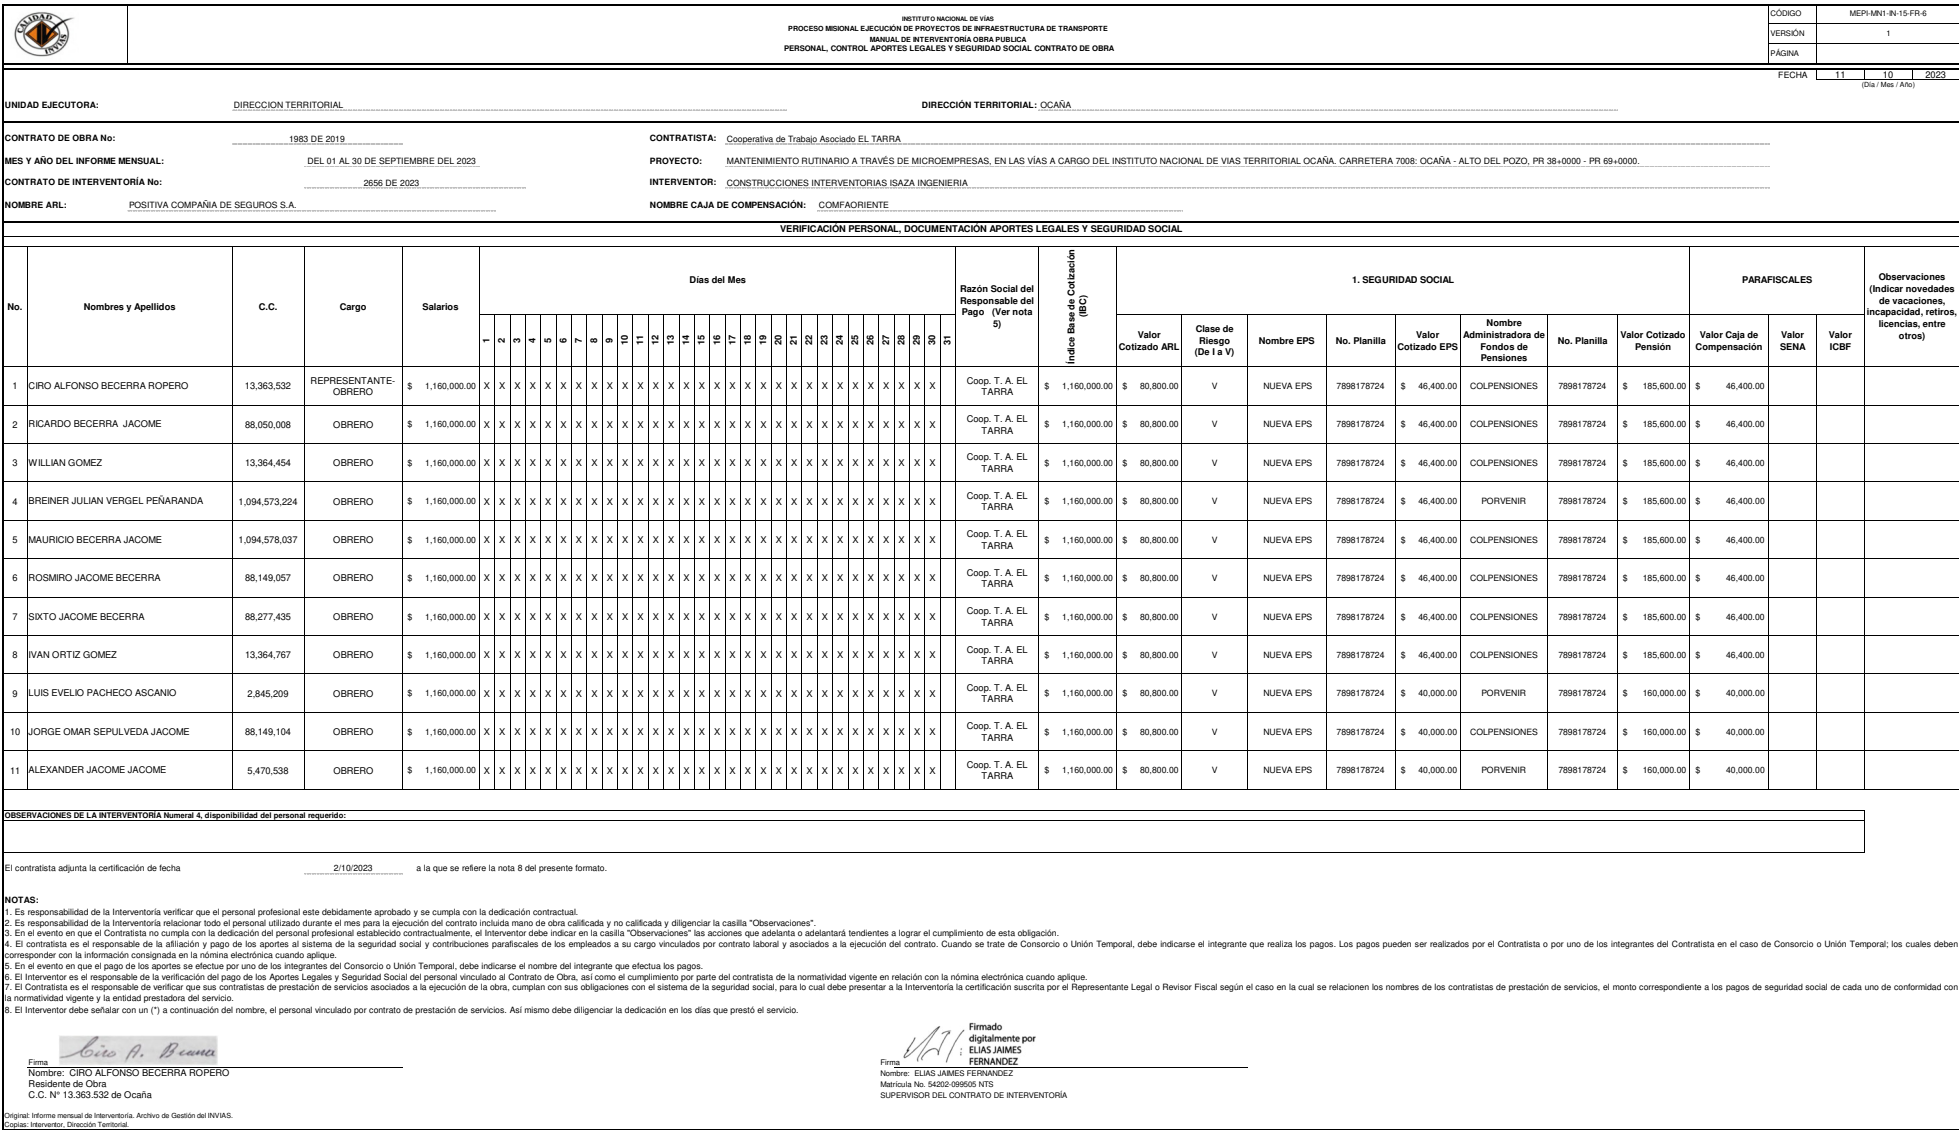
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

		INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA					CÓDIGO MEPMV-IR-15-FR-8								
							VERSION 1								
							PAGINA								
							FECHA 11 10 2023 Día / Mes / Año								
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCION TERRITORIAL:					DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA								
CONTRATO DE OBRA No:		1983 DE 2019					CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA								
MES INFORME MENSUAL:		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL PROYECTO. P.O.D. PR 38-0000 - PR 68-0000								
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:		2656 DE 2023					INTERVENITOR: CONTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Punto de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2019	1080119	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	1983 DE 2019	\$ 67.174.005.00	\$ -						
2020	164320	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	1983 DE 2019	\$ 427.227.299.00	\$ -						
2021	196521	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	1983 DE 2019	\$ 452.862.620.00	\$ -						
2022	242222	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	1983 DE 2019	\$ 280.020.849.00	\$ -						
2022	851922	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	ADICIONAL N° 1 - 1983 DE 2019	\$ 174.813.014.00	\$ -						
2022	1312622	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20	PROPIOS	ADICIONAL N° 2 - 1983 DE 2019	\$ 122.809.142.00	\$ -						
2023	279523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			21	PROPIOS	ADICIONAL N° 3 - 1983 DE 2019	\$ 188.748.053.00	\$ -						
2023	864023	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			21	PROPIOS	ADICIONAL N° 4 - 1983 DE 2019	\$ 88.406.582.00	\$ 49.563.944.89						
								\$ 1,802,061,564.00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1,802,061,564.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar IVA/IS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	16-30 NOV 2019	\$ 16,508,357.00	\$ 285,144.00	\$ 16,793,501.00				1080119 DEL 2019	\$ 50,380,504.00	\$ 1,785,268,063.00	105074 de 04/12/19	X		
2	Obra	DICIEMBRE DE 2019	\$ 33,016,714.00	\$ 570,289.00	\$ 33,587,003.00				1080119 DEL 2019	\$ 16,793,501.00	\$ 1,751,681,060.00	108188 de 11/12/19	X		
3	Obra	01-31 ENE 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 408,410,526.00	\$ 1,714,070,786.00	13183 de 18/02/2020	X		
4	Obra	01-29 FEB 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 372,816,261.00	\$ 1,680,476,511.00	17861 de 03/03/2020	X		
5	Obra	01-31 MAR 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 337,213,976.00	\$ 1,644,874,236.00	25473 de 04/04/2020	X		
6	Obra	01-30 ABR 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 301,611,701.00	\$ 1,609,271,961.00	30877 de 05/05/2020	X		
7	Obra	01-31 MAY 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 266,009,426.00	\$ 1,573,669,686.00	38548 de 05/06/2020	X		
8	Obra	01-30 JUN 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 230,407,151.00	\$ 1,538,067,411.00	45551 de 06/07/2020	X		
9	Obra	01-31 JUL 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 194,804,676.00	\$ 1,502,465,136.00	54206 de 06/08/2020	X		
10	Obra	01-31 AGO 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 159,202,601.00	\$ 1,466,862,861.00	66091 de 16/09/2020	X		
11	Obra	01-30 SEPT 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 123,600,326.00	\$ 1,431,260,586.00	71910 de 06/10/2020	X		
12	Obra	01-31 OCT 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 87,998,051.00	\$ 1,395,658,311.00	81754 de 06/11/2020	X		
13	Obra	01-30 NOV 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 52,395,776.00	\$ 1,360,066,036.00	91943 de 05/12/2020	X		
14	Obra	DICIEMBRE DE 2020	\$ 34,997,768.00	\$ 604,507.00	\$ 35,602,275.00				164320 DEL 2020	\$ 16,793,501.00	\$ 1,324,452,761.00	93158 de 08/12/2020	X		
15	Obra	01-31 ENE 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,776.00	\$ 37,738,548.00				196521 DEL 2021	\$ 431,917,573.00	\$ 1,286,715,213.00	17094 de 02/03/2021	X		
16	Obra	01-28 FEB 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 394,179,021.00	\$ 1,248,976,661.00	18133 de 05/03/2021	X		
17	Obra	01-31 MAR 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 356,440,469.00	\$ 1,211,238,109.00	32699 de 20/04/2021	X		
18	Obra	01-30 ABR 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 318,701,917.00	\$ 1,173,499,557.00	37156 de 03/05/2021	X		
19	Obra	01-31 MAY 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 280,963,360.00	\$ 1,135,761,005.00	46844 de 02/06/2021	X		
20	Obra	01-30 JUN 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 243,224,813.00	\$ 1,098,022,453.00	56401 de 01/07/2021	X		
21	Obra	01-31 JUL 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 205,486,261.00	\$ 1,060,283,901.00	69080 de 05/08/2021	X		
22	Obra	01-31 AGO 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 167,747,709.00	\$ 1,022,545,349.00	79455 de 02/09/2021	X		
23	Obra	01-30 SEPT 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 130,008,157.00	\$ 984,806,797.00	92554 de 05/10/2021	X		
24	Obra	01-31 OCT 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 82,270,600.00	\$ 947,086,248.00	102552 de 04/11/2021	X		
25	Obra	01-30 NOV 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 54,532,053.00	\$ 909,328,693.00	115548 de 02/12/2021	X		
26	Obra	DICIEMBRE DE 2021	\$ 37,097,772.00	\$ 640,780.00	\$ 37,738,552.00				196521 DEL 2021	\$ 16,793,501.00	\$ 871,591,141.00	117728 de 07/12/2021	X		
27	Obra	1-31 ENE 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 256,811,372.00	\$ 256,811,372.00	17485 de 24/02/2022	X		
28	Obra	1-28 FEB 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 216,808,394.00	\$ 245,111,372.00	24511 de 11/03/2022	X		
29	Obra	1-31 MAR 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 176,801,416.00	\$ 176,801,416.00	36540 de 11/04/2022	X		
30	Obra	1-30 ABR 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 136,802,438.00	\$ 136,802,438.00	46595 de 06/05/2022	X		
31	Obra	1-31 MAYO 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 96,799,460.00	\$ 96,799,460.00	57372 de 02/06/2022	X		
32	Obra	1-30 JUN 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 56,796,482.00	\$ 56,796,482.00	70226 de 07/07/2022	X		
33	Obra	1-31 JUL 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				242222 DEL 2022	\$ 16,793,504.00	\$ 16,793,504.00	81897 de 03/08/2022	X		
34	Obra	1-31 AGO 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				851822 DEL 2022	\$ 151,603,540.00	\$ 151,603,540.00	98427 de 08/09/2022	X		
35	Obra	1-30 SEP 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				851822 DEL 2022	\$ 111,600,562.00	\$ 111,600,562.00	108605 de 06/10/2022	X		
36	Obra	1-31 DE OCT 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				851822 DEL 2022	\$ 71,597,584.00	\$ 71,597,584.00	122493 de 10/11/2022	X		
37	Obra	1-30 DE NOV 2022	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				851822 DEL 2022	\$ 31,584,606.00	\$ 31,584,606.00	131833 de 02/12/2022	X		
38	Obra	DICIEMBRE DE 2022	\$ 30,279,387.50	\$ 523,056.00	\$ 30,802,393.50				851822 DEL 2022	\$ 792,312.50	\$ 792,312.50	136022 de 16/12/2022	X		
39	Obra	1-31 DE ENE 2023	\$ 46,386,211.48	\$ 885,451.00	\$ 47,271,662.48				1312622 DEL 2022	\$ 24,397,792.00	\$ 24,397,792.00	11383 de 03/02/2023	X		
40	Obra	1-28 DE FEB 2023	\$ 39,323,750.00	\$ 679,228.00	\$ 40,002,978.00				1312622 DEL 2022	\$ 34,384,814.00	\$ 34,384,814.00	20965 de 02/03/2023	X		
41	Obra	1-31 MAR 2023	\$ 40,273,418.56	\$ 695,632.00	\$ 40,969,050.56				279523 DEL 2023	\$ 182,173,816.44	\$ 182,173,816.44	35183 de 12/04/2023	X		
42	Obra	1-30 ABR 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				279523 DEL 2023	\$ 137,976,525.69	\$ 137,976,525.69	44929 de 05/05/2023	X		
43	Obra	1-31 DE MAY 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				279523 DEL 2023	\$ 93,767,234.94	\$ 93,767,234.94	56236 de 07/06/2023	X		
44	Obra	1-30 JUN 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				279523 DEL 2023	\$ 49,563,944.19	\$ 49,563,944.19	64826 de 05/07/2023	X		
45	Obra	1-31 JUL 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				279523 Y 864023 DEL 2023	\$ 93,767,235.44	\$ 93,767,235.44	76151 de 04/08/2023	X		
46	Obra	1-31 AGO 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				279523 Y 864023 DEL 2023	\$ 49,563,944.89	\$ 49,563,944.89	81669 de 15/09/2023	X		
47 y final	Obra	1-30 SEP 2023	\$ 43,452,743.75	\$ 750,547.00	\$ 44,203,290.75				864023 DEL 2023	\$ 5,360,653.94	\$ 5,360,653.94		X		EN TRAMITE
TOTALES			\$ 1,766,193,951.06	\$ 30,306,979.90	\$ 1,796,760,910.96					\$ 5,360,653.94	\$ 5,360,653.94				
Todos los Acta aprobados por la Interventoría deben relacionarse estos o no facturas.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP/INV-IR-15-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	11	10	2023
			(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA			
CONTRATO DE OBRA No.: 1983 DE 2019			CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA			
MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, CARRETERA 7008, OCAÑA - ALTO DEL PROYECTO: PC20, PPI 38-0000 - PPI 68-0000			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2656 DE 2023			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA			
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO						
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRA	\$	1,766,199,931.06	\$	30,506,979.00	\$	1,796,706,910.06
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN						
AJUSTES						
ESTUDIOS Y DISEÑOS						
GESTIÓN PRESUP. (PREACTA)						
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)						
VALOR TOTAL	\$	1,766,199,931.06	\$	30,506,979.00	\$	1,796,706,910.06
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.						
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.						
Firma				Firmado digitalmente por		
Nombre: CIRIO ALFONSO BECERRA ROPERO				ELIAS JAMES FERNANDEZ		
Residente de Obra				Matrícula No. 54202-099505 NTS		
C.C. N° 13,363,532 de Oaxaca				SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del IMTAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.						

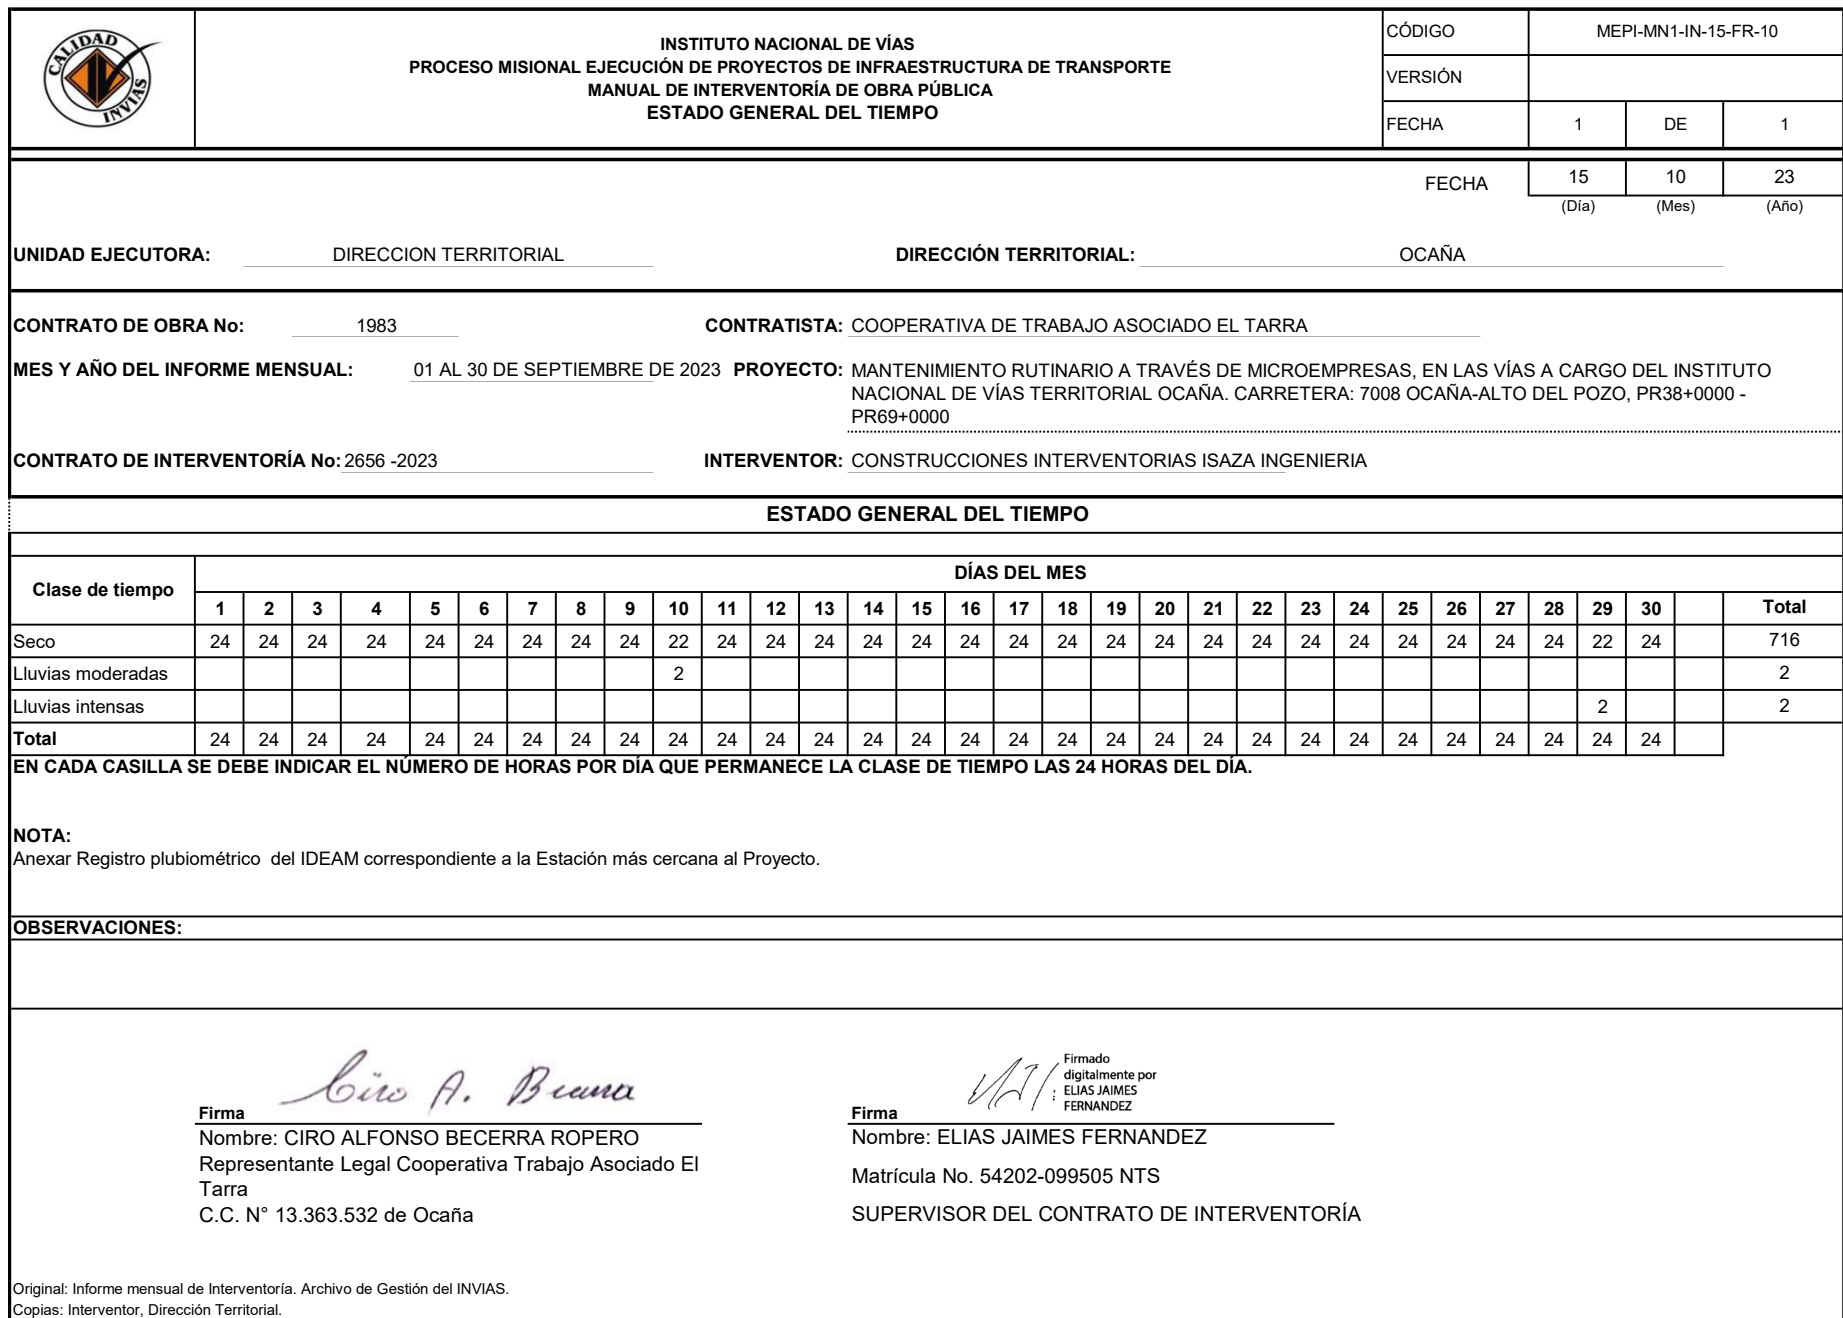




CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10**





CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA				15	10	23
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA
-------------------	-----------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.	1983	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA
----------------------	------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000
--

FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAZO INICIAL:	31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 1,227,284,773.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 1,802,061,564.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 122,728,477.30	6	11	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 245,456,954.60	6	11	2019	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400-47-994000066688
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	08/11/2019

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			6	11	2019	31	7	2022
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 165.263.200,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-47-994000016771 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/11/2019

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 4 PRÓRROGA No.: 6 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			16	11	2019	9	4	2024
Cumplimiento	10%	\$ 180,206,156.40	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 360,412,312.80	16	11	2019	10	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000066688

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/07/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 348,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	8	2023	10	10	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-74-994000016771 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/07/2023

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 6

ACTAS DE COMITE **FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1**



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ

PÁGINA	1	DE	2
--------	---	----	---

FECHA	14	9	20
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE COMITÉ No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO No. 2656 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO: GRUPO AMV 1 LOTE 10.

SUPERVISOR: ELIAS JAIMES FERNANDEZ - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>ELIAS JAIMES FERNANDEZ</u>	<u>Director Territorial</u>	<u>INVIAS</u>
<u>RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ</u>	<u>Ingeniero residente</u>	<u>CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S</u>
<u>ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA</u>	<u>Ingeniera Auxiliar II</u>	<u>CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S</u>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de avance de contrato de la administración vial y seguimiento de las labores del personal de mantenimiento rutinario

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el acta No. 1 de fecha 8 de agosto y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ

1. Avance contrato administración vial.
2. Seguimiento personal de mantenimiento rutinario

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Avance contrato administración vial

El ingeniero residente Rafael Reyes y la ingeniera auxiliar Alejandra Villegas, presentan un informe sobre las actividades desarrolladas por parte de la administración vial: a la fecha la administración vial radicó el 13 de septiembre el acta parcial de costos No. 1 del periodo comprendido del 08 al 31 de agosto de 2023, y con esta se muestra un porcentaje de ejecución del 13.38% del valor total del contrato.

La administración vial informa que se ha cumplido con los compromisos pactados en el acta anterior referente a la radicación requerimientos logística y la instalacion de la valla informativa, lo anterior, se cumplió estrictamente en los plazos establecidos.

2. Contratos mantenimiento rutinario.

*** Contratos de mantenimiento rutinario:**

Los contratos de mantenimiento rutinario se vienen ejecutando sin ningún tipo de inconvenientes, en este mes, específicamente el día 30, se dan por finalizados con contratos de mantenimiento rutinario.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 7

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

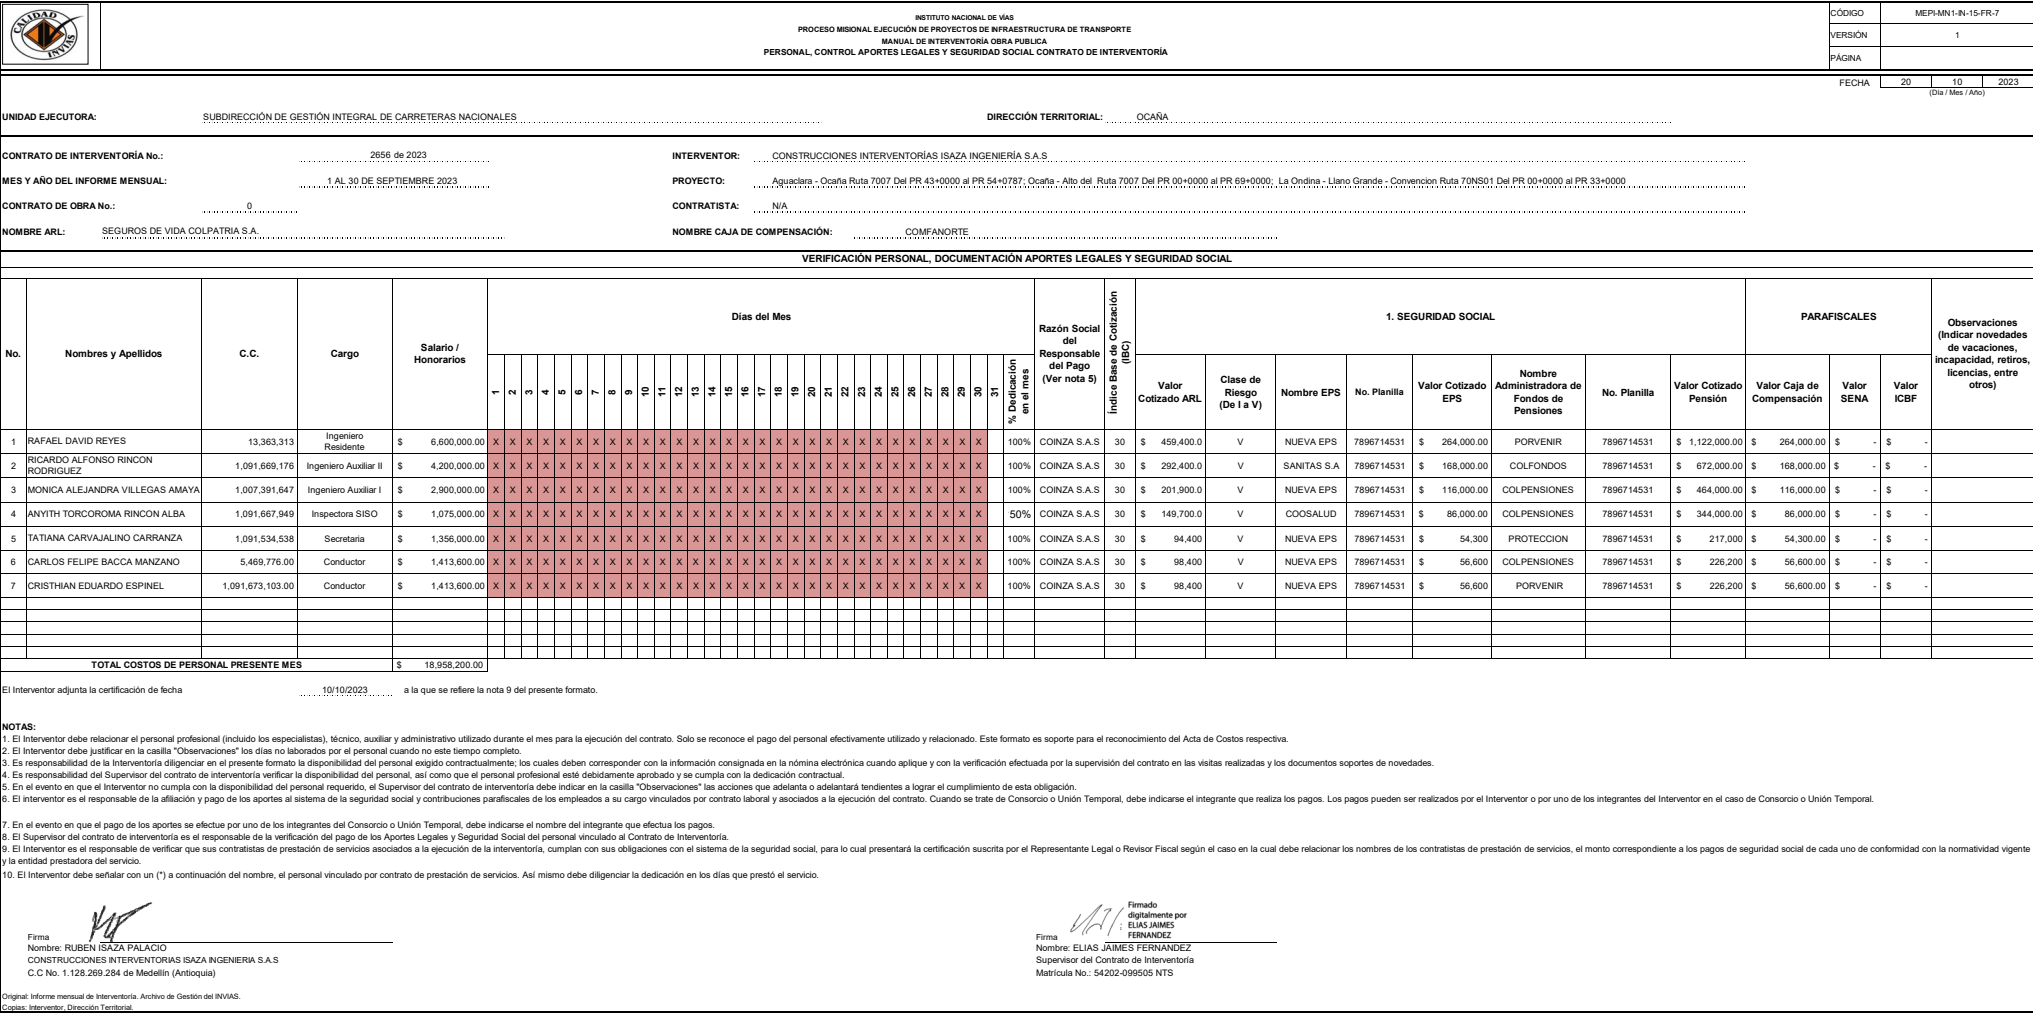
[illegible]



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 8

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7





CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPI/MN-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
							FECHA	20	10	2023		
							(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 2656 de 2023							INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S					
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023							PROYECTO: Aguadara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000					
CONTRATO DE OBRA No: 0							CONTRATISTA: N/A					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02		21	Propios	Contrato principal		\$375,843,799.00	\$ 325,541,434.20			
TOTAL												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 375,843,799.00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								919123 de 2023-08-08		\$ 375,843,799.00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 42,270,894.79	\$ 8,031,470.01	\$ 50,302,364.80				919123 de 2023-08-08	\$ 50,302,364.80	\$ 325,541,434.20	81755 de fecha 18/09/2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 60,653,237.55	\$ 11,524,115.13	\$ 72,177,352.68				919123 de 2023-08-08	\$ 122,479,717.48	\$ 253,364,081.52		EN TRÁMITE
TOTALES		\$ 102,924,132.34	\$ 19,555,585.14	\$ 122,479,717.48					\$ 122,479,717.48	\$ 253,364,081.52		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 80,560,234.00		\$ 15,306,444.46		\$ 95,866,678.46							
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 22,363,898.34		\$ 4,249,140.68		\$ 26,613,039.02							
* VALOR TOTAL	\$ 102,924,132.34		\$ 19,555,585.14		\$ 122,479,717.48							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div> Firma Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)</div><div> Firma Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 54202-099505 NTS</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

		FECHA		
		15	10	23
		(Día)	(Mes)	(Año)

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
--	------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA
-------------------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.

FECHA DE INICIO:	08/08/2023
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	08/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 375,843,799.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 375,843,799.00 (Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
---	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 37,584,379.90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 75,168,759.80
Calidad del servicio	30%	\$ 112,753,139.70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	8	2023	8	06	2024
DD	MM	AA	DD	MM	AA
3	8	2023	8	12	2026
3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	65-44-101223482
Certificado de modificación o anexo No.:	2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	08/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
---	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 11

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL
PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA	1	DE	1
				FECHA	15	10	23
Contrato de obra	1983						
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA						
Conformación:							
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000						
Fecha de Inicio:	16 DE NOVIEMBRE DE 2019						
Valor Inicial:	\$ 1,227,284,773						
Adición 1:	\$174.813.014,00						
Adición 2:	\$122.809.142,00						
Adición 3:	\$188.748.053,00						
Adición 4:	\$88.406.582,00						
Valor Actual:	\$1.802.061.564,00						
Plazo Inicial:	31/07/2022						
Total Prórrogas:	30/09/2023						
Prórroga 1:	DOCE (12) DIAS CALENDARIO						
Prórroga 2:	CUATRO (4) MESES Y ONCE (11) DÍAS CALENDARIO						
Prórroga 1:	OCHO (8) DIAS CALENDARIO						
Prórroga 2:	DOS (2) MESES Y VEINTITRÉS (23) DIAS CALENDARIO						
Prórroga 1:	CUATRO (4) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO						
Prórroga 2:	DOS (2) MESES CALENDARIO						
Plazo Inicial:	31/07/2022						
Plazo Actualizado:	30/09/2023						
Fecha de Iniciación:	16/11/2029						
Fecha de Vencimiento:	sábado, 30 de septiembre de 2023						
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2023							
CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO				
OF-CTO 2656 DE 2023-050	04-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-001165 de fecha 2023-08-30			INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-051	04-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 29-08-2023, ruta 70NS01			INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-052	05-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta Oficio 2023S-VOCA-001165 de fecha 30/08/23 – Directorio de Emergencia			INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-053	05-sep-23	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y TRÁNSITO ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCION Convención – Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION			SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-054	05-sep-23	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO Rio de Oro - C	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA			SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-055	05-sep-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO Abrego N.S	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).			SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-056	05-sep-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA Ciudad	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION			SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-057	05-sep-23	Teniente coronel GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES			SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-058	05-sep-23	Señores INTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ Aguachica - Cesar	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA			SOLICITUD	

OF-CTO 2656 DE 2023-059	05-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 03-09-2023, ruta 7008 PR 37+0090	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-060	05-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.4	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-061	06-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-001647 de fecha 2023-09-02	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-062	06-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Seguimiento derecho de petición, respuesta oficio No. DT-OCA 46440	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-063	06-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta Oficio 2023S-VOCA-001315 de fecha 31/08/2023 Traslado Radicado 2023E-VUVRAZ-004072 de fecha 30-08-2023 Respuesta Metrogas oficio DT-OCA 33547 de fecha 30-08-2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-064-A	09-sep-23	Fabian Carrascal Ph.D. in Petroleum Engineering M. Sc. in Chemistry Chemist and Chemical Engineer	Respuesta petición adecuación alcantarillas vía Circunvalar	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-064-B	08-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Actas de Obra No. 46 de las Microempresas de Trabajo Asociado Caliservicios.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-065	08-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-000423 de fecha 2023-08-24	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-066	09-sep-23	SAMIR CASADIEGO SANJUAN Alcalde Municipal de Ocaña	Traslado petición adecuación alcantarillas vía Circunval	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-067	09-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Actas de Obra No. 46 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Oplamar	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-068	09-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Actas de Obra No. 46 de la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-069	09-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Actas de Obra No. 46 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-070	09-sep-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 08 al 14 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-071	09-sep-23	LUIS FRANCISCO RINCON - COOPERATIVA DE CALISERVICIOS	Programación semana comprendida del 08 al 14 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-072	09-sep-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 08 al 14 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-073	09-sep-23	OTONIEL BAYONA PACHECO - COOPERATIVA OPLAMAR	Programación semana comprendida del 08 al 14 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado Oplamar. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-074	110/09/23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Notificación Invasión Vía Nacional	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-075	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Asunto: Informe accidente ocurrido el día 01-09-2023 en el PR 27+0850, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-076	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 08-09-2023 en el PR 07+0930, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-077	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 07-09-2023 en el PR 50+0700, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-078	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remision Informe Semanal No.5	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-079	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 10-09-2023 en el PR 51+0900, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-080	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 26-08-2023 en el PR 25+0800, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-081	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 10-09-2023 en el PR 46+0860, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-082	12-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 10-09-2023 en el PR 08+0116, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-083	13-sep-23	OTONIEL BAYONA PACHECO - COOPERATIVA OPLAMAR	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-084	13-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 11-09-2023 en el PR 02+0700, ruta 70NS01	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-085	14-sep-23	LUIS FRANCISCO RINCON - COOPERATIVA DE CALISERVICIOS	Programación semana comprendida del 15 al 21 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado Caliservicios. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-086	14-sep-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 15 al 21 de septiembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-087	14-sep-23	OTONIEL BAYONA PACHECO - COOPERATIVA OPLAMAR	Programación semana comprendida del 15 al 21 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado Oplamar. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-088	14-sep-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 15 al 21 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-089	15-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-003198 de fecha 2023-09-09 - Respuesta Visita Alcantarilla	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-090	17-sep-23	JHON EDINSON PRADO PEREZ	Respuesta a Requerimiento Contraloría Última Versión Matriz Puentes	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-091	18-sep-23	GUSTAVO PAVA - Gestion de Riesgo Municipio de Ocaña	Medidas de Prevención	SOLICITUD

OF-CTO 2656 DE 2023-092	18-sep-23	JOSE MAURICIO VELASQUEZ RINCON - Secretario de Planeación Municipi de	Medidas de Prevención	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-093	18-sep-23	SAMIR CASADIEGO SANJUAN - Alcalde Municipal de Ocaña	Medidas de Prevención	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-094	18-sep-23	SAMIR CASADIEGO SANJUAN - Alcalde Municipal de Ocaña	Medidas de Prevención Ruta 70NS01 via la Ondina-Convención	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-095	18-sep-23	JOSE MAURICIO VELASQUEZ RINCON - Secretario de Planeación Municipi de	Medidas de Prevención Ruta 70NS01 via la Ondina-Convención	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-096	18-sep-23	GUSTAVO PAVA - Gestion de Riesgo Municipio de Ocaña	Medidas de Prevención Ruta 70NS01 via la Ondina-Convención	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-097	18-sep-23	LUIS FRANCISCO RINCON - COOPERATIVA DE CALISERVICIOS	Atención sitio Critico	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-098	18-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-004434 de fecha 2023-09-14	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-099	20-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.6	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0100	20-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta diligenciamiento información profesionales y logística administradores	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0101	21-sep-23	LUIS FRANCISCO RINCON - COOPERATIVA DE CALISERVICIOS	Programación semana comprendida del 22 al 28 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado Caliservicios. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0102	21-sep-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 22 al 28 de septiembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0103	21-sep-23	OTONIEL BAYONA PACHECO - COOPERATIVA OPLAMAR	Programación semana comprendida del 22 al 28 de septiembre de 2023 para la	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0104	21-sep-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 22 al 28 de septiembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0105	21-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 18-09-2023 en el PR 02+0150, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0106	22-sep-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Notificación hallazgo de invasión en el PR 64+0350, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0107	22-sep-23	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NORTE DE SANTANDER.	Notificación hallazgo de invasión en el PR 64+0350, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0108	23-sep-23	ALBERT URQUIJO SANCHEZ - Director de Coorponor Ocaña	Notificación hallazgo de invasión en el PR 64+0350, ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0109	23-sep-23	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NORTE DE SANTANDER.	Reiteración notificación hallazgo de invasión en el PR 64+0350, ruta 7008	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0110	23-sep-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Reiteración notificación hallazgo de invasión en el PR 64+0350, ruta 7008	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0111	25-sep-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Afectaciones generadas de Invasión el PR64+0350 Ruta 7008 via Ocaña – Alto del Pozo	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0112	25-sep-23	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NORTE DE SANTANDER.	Afectaciones generadas de Invasión el PR64+0350 Ruta 7008 via Ocaña – Alto del Pozo	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0113	25-sep-23	MARY ROSA PAREDES ASAF - Oficina Juridica Dirección Territorial Ocaña	Información Invasión de Vía	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0114	25-sep-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Contrato de administración vial No.2656 de 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0115	25-sep-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Notificación limpieza de alcantarillas colmatadas en la ruta 7008	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0116	26-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.7	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0117	27-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 24-09-2023 en el PR 51+0590, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0118	27-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta actualización de emergencias y sitios críticos red vial nacional 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0119	27-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 24-09-2023 en el PR 51+0590, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0120	27-sep-23	JOSE HELÍ SANTANA RINCON -Alcalde Municipio de Rio de Oro - Cesar	Notificación posible hallazgo de invasión en el PR 44+0437 Ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0121	28-sep-23	LUIS FRANCISCO RINCON - COOPERATIVA DE CALISERVICIOS	Programación semana comprendida del 29 al 30 de septiembre de 2023 para la	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0122	28-sep-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 29 al 30 de septiembre de 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0123	28-sep-23	OTONIEL BAYONA PACHECO - COOPERATIVA OPLAMAR	Programación semana comprendida del 29 al 30 de septiembre de 2023 para la	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0124	28-sep-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 29 al 30 de septiembre de 2023 para la	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0125	28-sep-23	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS FABIO MOJICA FERNÁNDEZ SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Informe mensual de accidentalidad mes de agosto 2023	INFORMATIVA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. OFICIO	FECHA	REMITTE	ASUNTO	
2023S-VOCA-001647	02-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	SOLICITUD URGENTE INVENTARIO PUENTE PR 028+0580 RUTA 7008	INFORMATIVA
2023S-VOCA-002833	07-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-004730 Asunto de Oficio de Respuesta del Oficio Respuesta a entrada 2023S-VOCA-000438 de fecha 2023-08-24 - Respuesta a Denuncia Jose Lazaro Sanchez	INFORMATIVA
2023S-VOCA-002830	07-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-006345 - Inventario de puentes.	INFORMATIVA
2023S-VOCA-003122	08-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-005621	INFORMATIVA
2023S-VOCA-003198	09-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	SOLICITUD: TRASLADO RADICADO 2023E-VUVR-004673 Inconsistencias en la Alcantarilla Avenida Circunvalar.	INFORMATIVA
2023S-VOCA-004434	14-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud medidas preventivas dada la época invernal.	INFORMATIVA
2023S-VOCA-008052	27-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Traslado informe especial de policía de tránsito, para trámites de visita	INFORMATIVA
2023S-VOCA-008053	27-sep-23	WILSON BARBOSA - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-010493	INFORMATIVA
2023S-VOCA-008822	30-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3050 del 2023	SOLICITUD
2023S-VOCA-008824	30-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3041 DE 2023	INFORMATIVA
2023S-VOCA-008825	30-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3111 del 2023	INFORMATIVA
2023S-VOCA-008826	30-sep-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3040 DE 2023	INFORMATIVA



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 12

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.

31/Agosto/23 En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal. del PR 38+000 al 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000 paso critico.

Actividades = Se realiza limpieza de conetas Revestidas, en el PR 46+200; Limpieza y Recolectación de Residuos sólidos PR 44+500.

En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al 69+000 paso critico PR 51+950.

Firma =

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Ingeniero Residente

No Mat = 08202-31751 ATL

01/Sept/23 En la mañana = Tiempo soleado; Normalidad del PR 38+000 al 51+250 y del PR 53+200 al PR 53+200. paso critico en el PR 51+950.

Actividades = Se realiza limpieza de puentes y pontones en el PR 55+322; despeje de derrumbes PR 55+150; limpieza de la calzada en el PR 64+200

En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal de PR 38 al PR 53+200; paso critico en el PR 51+950 Tiempo seco.


Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Ingeniero Residente


No Mat = 08202-31751 ATL

líder

02/sept/23	En la mañana = Tiempo Seco; Transito Normal
	Actividades = Vigilancia e Inspección del Tramo Vial.
	En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000, Paso crítico PR51+950; Tiempo Seco.
	Firma. 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
23/sept/23	En la Mañana = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al PR69+000 Paso crítico PR51+950; Tiempo Nublado.
	En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000, Paso crítico en el PR51+950 Tiempo Nublado.
	Firma. 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
24/sept/23	En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000, Paso crítico PR51+950 Tiempo Nublado.
	Actividades = Se Realiza limpieza de puentes y pontones en el PR55+032; limpieza de descole PR55+861; Limpieza de Alcantarilla PR55+861

líder

En la tarde = Via Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000, Paso critico PR 51+956
Tiempo Soleado.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Ingeniero Residente

No Mar = 08202 - 31751 ATL.

05/sep/23. En la Mañana = Via Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000 Paso critico en el PR 51+950
Tiempo Soleado.

Actividades = Se realiza Rocera y desmonte en el PR 54+900;
Limpieza de Alcantarilla PR 54+918;

En la tarde = Via Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000, Paso Normal - critico PR 51+950
Tiempo Seco.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Ingeniero Residente.

No Mar = 08202 - 31751 ATL.

06/Sept/23. En la Mañana = Via Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000, Paso critico PR 51+950
Tiempo Seco.

Actividades = Limpieza de Puentes y pontones PR 55+322.
Limpieza de Alcantarilla PR 54+918; Rocera y desmonte PR 54+200.

lider

En la Tarde = Via Normal del PR38+000 al PR51+250
y del PR53+200 al PR69+000 Paso critico PR51+950
Tiempo seco.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Ingeniero Residente

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

03/sept/23. En la mañana = Via Normal del PR38+000 al PR51+250:
y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950
Tiempo seco.

Actividades = Se Realiza Actividades de limpieza de
disipador PR53+871; Limpieza de Alcantarilla PR53+871;
Limpieza de Señales Verticales PR54+000

En la Tarde = Via Normal del PR38+000 al PR51+250 y del
PR53+200 al PR69+000 Paso critico PR51+950; Tiempo
seco.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.



Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

08/sept/23. En la mañana = Via Normal del PR38+000 al 51+250 y
del PR53+200 al PR69+000, Paso critico PR51+950
Tiempo seco.

Actividades = se Realiza Actividades de Remoción de
derribos en el PR58+800


líder

	En la tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950; Tiempo Nublado.
	 Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Ingeniero Residente. No Mat = 08202 - 31751 ATL.
09/sept/23	En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000 Paso critico PR51+950; Tiempo despejado.
	En la tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950; Tiempo despejado.  Firma = Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Ingeniero Residente. No Mat = 08202 - 31751 ATL.
10/sept/23	En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950; Tiempo Nublado.
	En la tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950; Lluvias durante la tarde.
11/sept/23	En la mañana = Vía Normal del 38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso critico PR51+950; Tiempo soleado.
	Actividades = Se Realizaron Actividades de limpieza de conetas Revestidas PR53+300; Remosion de derribos PR57+500;
	líder

	<p>En la tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000. Pazo crítico PR51+450; tiempo Nublado.</p> <p>Firmo .</p> <p>Nombre = Rafael David Reyes Álvarez Ingeniero Residente. No Mat = 08202 - 31751 ATL.</p>
12/sep/23	<p>En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000. Pazo crítico PR51+450. Tiempo Nublado.</p> <p>Actividades = Se Realiza Actividades de Limpieza de disipadores PR57+656; limpieza de Alcantarilla PR57+656; Limpieza de encofe y descofe; limpieza de sembreros verticales; Limpieza y Remoción de desechos PR57+500.</p> <p>En la tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000, Pazo crítico PR51+450, tiempo Seco.</p> <p>Firmo .</p> <p>Nombre = Rafael David Reyes Álvarez Ingeniero Residente. No Mat = 08202 - 31751 ATL.</p>
13/sep/23	<p>En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Pazo crítico = PR51+450. Tiempo soleado.</p> <p>Actividades = Se Realiza Actividades de Rocera PR59+822; limpieza de cunetas Revestidas; limpieza de Alcantarilla 58+987; limpieza de drenaje</p>

líder

En la tarde = Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000 Paso critico PR 51+950 tiempo Nublado.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez


Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

14/Sept/23 En la mañana = Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000, Paso critico PR 51+950 tiempo Soleado.

Actividades = se realiza Actividades limpieza de obras de arte; limpieza de Alcantarilla PR 57+942; limpieza de defensas PR 59+300; Rocera y desmonte PR 56+070.

En la tarde = Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso critico PR 51+950 tiempo Soleado.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Ingeniero Residente

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

15/Sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000, Paso critico PR 51+950 tiempo Soleado.

Actividades = Se Realiza limpieza de Alcantarilla PR 59+400; limpieza de defensas PR 57+600; limpieza de Señales Verticales PR 57+450; limpieza de caps "disipadores".

líder

En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+230 y del PR53+206 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.
Tiempo Soleado.

Firma 


Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

16/Sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+230 y del PR53+206 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.
Tiempo Soleado.

En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+230 y del PR53+206 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.
Tiempo Soleado.

Firma 


Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

17/Sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al PR51+230 y del PR53+206 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.
Tiempo Soleado.

En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al PR51+230 y del PR53+206 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.
Tiempo Nublado.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

líder

18/sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000 Pazo crítico PR51+950; Tiempo Nublado.

Actividades = Se realiza limpieza de Señales y defensas PR60+348; PR66+350; Limpieza de Alcantarilla 60+674; Remoción de derrumbes PR60+700

En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000 Pazo crítico PR51+950; Tiempo Seco.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

19/sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000 Pazo crítico PR51+950; Tiempo Nublado.

Actividades = Limpieza de disipadores PR60+022, limpieza de cunetas Revestidas RR60+050; Limpieza de Alcantarilla PR60+022. Remoción de derrumbes PR60+850; Rocella y desmonte PR60+050

En la Tarde = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000 Pazo crítico PR51+950; Tiempo Seco.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

líder

20/Sept/23. En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al 69+000; Paso crítico PR51+950
Tiempo seco.

Actividades = Se Realizan Actividades de limpieza de defensas PR53+200; Limpieza de Alcantarilla PR54+400; Limpieza de disipadores PR59+400; Remoción de derrumbes PR59+400

En la mañana = Vía Normal del PR38+000 al 51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950
Tiempo seco.

Firma

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

21/Sept/23. En la mañana = Buen tiempo seco; Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000, Paso crítico PR51+950.

Actividades = Se Realizan Actividades de limpieza de cunetas Revestidas en el PR58+200; Limpieza de Señales Verticales en el PR58+600; Recolección de Residuos sólidos PR58+700;

En la Tarde = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000, Paso crítico PR51+950.


Firma

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

líder=

22/Sept/23.	En la mañana = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.
	En la Tarde = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.
	 Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat. = 08202 - 31751 ATL.
23/Sept/23.	En la mañana = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.
	En la Tarde = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.
	 Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat. = 08202 - 31751 ATL.
24/Sept/23.	En la mañana = Tiempo Sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.
	Actividades = Se Realizan Actividades de limpieza de cunetas Revestidas en el PR 62+050; limpieza de Alcantarilla PR 63+417.

líder=

En la Tarde = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal del PR38+000 al PR51+256 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950

Firma

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

25/sep/23

En la mañana = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal del PR38+000 al PR51+256 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.

Actividades = Se Realizaron Actividades de limpieza de cunetas Revestidas en el PR62+050; Limpieza de Alcantarilla PR63+417; Limpieza de cajas de Inspección PR63+846; Rocera y desmonte PR64+700; Se Realiza visita por parte de la Inspección 8150

En la Tarde = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal del PR38+000 al PR51+256 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

26/sep/23

En la mañana = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal del PR38+000 al PR51+256 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950.

Actividades = Se Realiza limpieza de cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarilla PR68+987; Limpieza de cunetas

líder=

22 PR 68+868; limpieza caja de inspección PR 68+725; limpieza de descole en el PR 68+725 y PR 68+868; limpieza de Señales Verticales en el PR 62+640; limpieza de defensas PR 62+200

En la tarde = Tiempo sin precipitaciones; PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; paso crítico PR 51+950

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

23 27/sept/23 En la mañana = Tiempo sin precipitaciones; PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso crítico PR 51+950.

Actividades = Se realiza limpieza de Cunetas y Rocera en el PR 61+800; Remoción de derrumbes en el PR 62+800; limpieza de Cunetas Revestidas PR 61+900.

En la tarde = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal PR 38+000 al PR 51+256 y del PR 53+200 al PR 69+000; paso crítico PR 51+950.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

28/sept/23 En la mañana = Tiempo sin precipitaciones; Vía Normal del PR 38+000 al PR 51+256

líder=

Actividades = Tiempo soleado; Via Normal de PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico en el PR51+950; Se Realizan Actividades de limpieza de Alcantarilla PR64+645; PR63+590; PR63+590; limpieza de descole PR63+685; limpieza de Señales PR64+645

En la Tarde = Tiempo Nublado; Via Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico en el PR51+950.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

9/Sept/23 En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950 Tiempo despejado.

Actividades = Se Realiza limpieza de Alcantarilla PR65+238; Rocera y desmonte PR65+950; limpieza de cunetas Revestidas PR65+140; limpieza de defensas PR65+380; limpieza de cunetas Revestidas.

En la Tarde = Tiempo con lluvias; Transito Normal del PR38+000 al PR51+250 y del PR53+200 al PR69+000; Paso crítico PR51+950 Tiempo despejado.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.


No Mat = 08202 - 31751 ATL.

líder=

2 30/sept/23 En la manana = Tiempo Soleado y Transito Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso critico en el PR 51+0950.

En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal del PR 38+000 al PR 51+250 y del PR 53+200 al PR 69+000; Paso critico en el PR 51+0950.

ACT = capacidad.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

líder=
